PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	3,92%	41,17%	Obra Física Ejecutada (%)	5,55%	59,99%
Valor de la Obra programada:	$ 108.490.631,00	$ 1.139.804.231,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 153.777.460,00	$ 1.661.018.062,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	37,25%	54,44%	**18,83%**
Durante el periodo	3,92%	5,55%	
Acumulado actual	41,17%	59,99%	

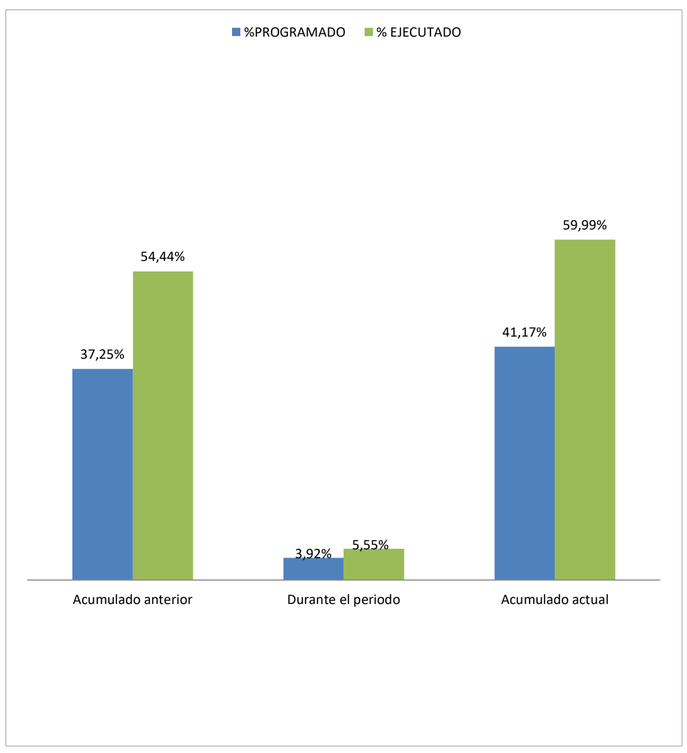

OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	6,80%	5,42%	-1,38%	42,62%	72,20%	29,58%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	3,23%	1,34%	-1,89%	57,03%	51,59%	-5,44%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	5,86%	1,24%	-4,62%	33,52%	87,21%	53,69%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0,58%	16,87%	16,29%	28,32%	57,39%	29,07%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	5,73%	9,12%	3,39%	58,88%	75,20%	16,32%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	2,30%	1,32%	-0,98%	19,54%	23,42%	3,88%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	2,93%	3,57%	0,64%	48,28%	52,94%	4,66%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**3,92%**	**5,55%**	**1,64%**	**41,17%**	**59,99%**	**18,82%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**0,00%**	**1,50%**	**1,50%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	0,00%	53,65%	53,65%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	0,00%	52,00%	52,00%	$ 20.073.306,12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	0,00%	40,63%	40,63%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.379,98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%			
			55,56%	71,81%		$ 270.732.744,10	$ 428.932.199,00	**$ 158.199.454,90**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		**$ 3.197.559.314,00**
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.151,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 419.080.656,00	
VALOR PARCIAL 4	$ 335.248.214,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.548.693.385,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.648.865.929,00	$ 1.648.865.929,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.548.693.385,00	$ 1.213.445.171,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	41,17%	**59,99%**	**18,83%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	170	**32,00**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S

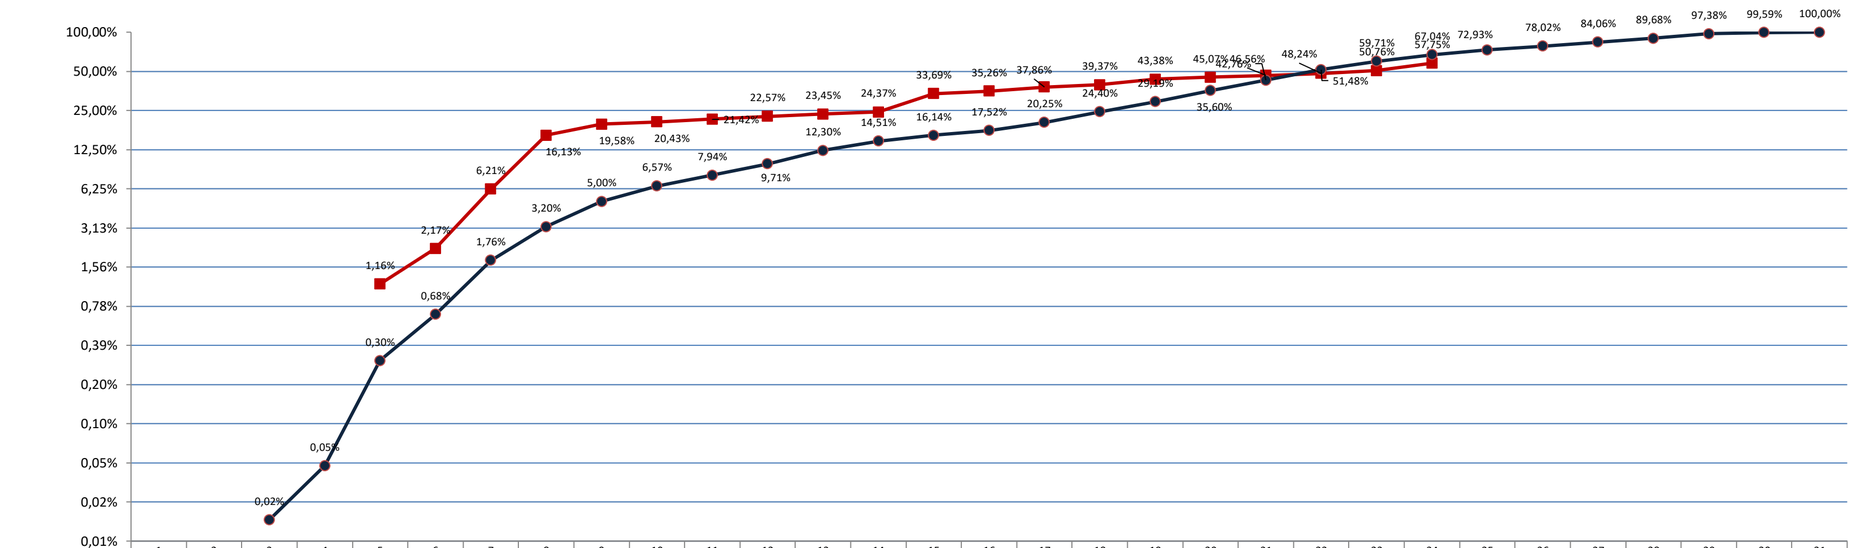

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,56%	48,24%	50,76%	57,75%							
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de instalación de platinas de anclaje, perfiles y ladrillos para la mampostería del antepecho. Todo esto se realizó en el área del cerramiento perimetral.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de levantamiento de mampostería, así como la instalación y anclaje de láminas destinadas a la tubería metálica del cerramiento perimetral. Por otra parte, se reitera la necesidad de realizar el arreglo del cerramiento en el tramo colindante con el jardín infantil, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y delimitación entre las áreas. Adicionalmente, se verificó que el personal en obra cuenta con la dotación requerida y hace uso adecuado de los EPP, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de SST.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 29,58%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral y señalización adecuado, se evidencia RCD y material acopiado cerca a los individuos arbóreos, por lo que se recomienda hacer la protección adecuada, realizar jornadas de orden y aseo y disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Adicional se reitera que esta sede debe de finalizar y ser entregada el 27 de marzo del presente año.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Fundida de dados aula modular
Instalacion de cubierta tipo Sandwish

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de la primera lámina de cubierta tipo sándwich, así como la colocación de pisos según el avance programado de obra. Se verificó que el personal asignado a estas labores se encuentra debidamente aprobado para la ejecución de las actividades y hace uso correcto de los EPP, cumpliendo con los lineamientos establecidos en SST. Adicionalmente, se recomienda mantener la supervisión constante del uso de EPP y la correcta instalación de las láminas y pisos, asegurando la estabilidad de los materiales y la seguridad del personal durante la ejecución de las actividades en altura.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por debajo de lo programado del 5,44%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:

15.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
5.1.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. Actividad programada hasta el 10 de marzo
5.1.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. Actividad programada hasta el 13 de marzo
5.1.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
12.2.4 PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
Se aclara que el porcentaje de retraso corresponde en su mayoria a el aula modular.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se reportó que se usa los puntos ecológicos dentro de la institución, se encuentra material de construcción y los residuos debidamente acopiados, alejados de sumideros pero se encuentra en varias zonas, por lo que se evidencia desorden, las zonas verdes se encuentran libres, se recomienda disponer adecuadamente los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Se manifestó que actualmente se encuentran adelantando en taller la fabricación del aula modular.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de concreto de 3000 psi para placa del área del shut de basuras y sendero peatonal que conduce al shut.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se llevaron a cabo actividades de fundición de la placa principal del sendero peatonal hacia el cuarto de almacenamiento. Se recomienda que todo el personal involucrado en la actividad haga uso adecuado del casco como medida de protección contra posibles impactos. Adicionalmente, se recomienda mantener el orden y aseo en el área de trabajo durante y al finalizar las labores, garantizando condiciones seguras y limpias tanto para los trabajadores como para la comunidad educativa.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 53,69%, Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, se acopia y protege adecuadamente el material que ingreso al igual se recomendo al contratista jornadas de orden y aseo periodicamente, e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
- Suministro e instalacion de malla electrosoldada y Fundida de placa de concreto de cancha.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las actividades de fundición de la losa maciza de concreto de la cancha en la sede Jorge Gaitán Corté. Se verificó que el personal asignado a la actividad cuenta con los EPP requeridos y que se realizaron charlas de seguridad antes de iniciar la fundición, cumpliendo con los lineamientos del SST. Adicionalmente, se constató el acompañamiento permanente del componente SST durante la ejecución de la actividad y se verificó el orden y aseo de la vía utilizada por los mixers para el ingreso del concreto, garantizando condiciones seguras y controladas tanto para el personal como para la comunidad educativa.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista. Sin embargo, hay algunos items que requieren de la programacion para que puedan ser evaluados.

4.1. Actividades programadas no ejecutadas:
16.1.2 CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 9 al 10 de marzo
16.1.3 BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 11 al 12 de marzo
16.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) programado al 9 de marzo
8.1.2 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
16.1.11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2
Las actividades programadas no ejecutadas corresponden a las relacionadas con el Shut

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se realiza la disposición de los RCD, se recomendó al contratista limpiar las áreas de acceso al frente, realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Se indicó que debe realizarse la corrección de la pintura de la puerta, en el marco del mantenimiento entregado. Adicionalmente, respecto al shut, se planteó la posibilidad de manejar dos tonos de pintura para integrarlo con el entorno, considerando el uso de un tono gris.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de adoquin en su respectiva cama de arena. Adicional se inició la instalación de viga cinta para confinar el adoquin.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de adoquín, ejecutadas conforme al cronograma de obra. Se recomienda que todo el personal involucrado mantenga el uso adecuado de los EPP, garantizando la protección durante la manipulación e instalación de los adoquines. Adicionalmente, se valida que el cerramiento perimetral del área de trabajo se encuentra en condiciones adecuadas, asegurando la delimitación del frente de obra y la protección de la comunidad educativa y del personal operativo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 16,32%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: El cerramiento en algunos tramos se encuentra en mal estado, se encuentra materiales, residuos y RCD en el frente acopiados, pero debe contar con la debida protección y señalización, por lo que se realizó un llamado de atención, las zonas verdes se van a endurecer en el frente, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: desmonte e instalación de enchape, preparación de filos en las divisiones en mampostería de los baños e instalación de pañete en muros exteriores e interiores de los baños. Adicional se realizó el pulido de piso en granito en las baterías sanitarias.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de destronque, instalación de pañete y construcción de filos en las ventanas. Se validó el uso adecuado de andamios por parte del personal operativo, garantizando estabilidad y seguridad durante la ejecución de las labores en altura. Adicionalmente, se recomienda mantener la supervisión constante del correcto uso de los EPP y de los andamios, asegurando condiciones seguras y controladas en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 3,88%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta RCD en lonas y acopiados (volumen alto), por lo que se realizó un llamado de atención para que realicen la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima, se evidencia los sanitarios anteriormente desmontados sin cubrir por lo que se recomienda al contratista realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA). Teniendo en cuenta el radicado N.2025EE296403 y el acta de visita MAR-20250903-00735 se da autorización a la tala de 16 individuos arbóreos en esta institución, ya se realizó la tala a quince (15) árboles en la zona pero queda uno (1) para terminar esta actividad por lo que se recomienda realizar el procedimiento adecuadamente, disponer todos los residuos vegetales y al finalizar la actividad silvicultural presentar el informe final con registro fotográfico al igual se debe complementar el anexo PM04-PR29-F8 para presentar ante la secretaria distrital de ambiente (SDA)

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de aplicación de pintura y destronque y pulida en el piso del salón de música. Adicional realizó actividades de excavación en el área donde va a quedar el shut y la zanja para instalar el tubo sanitario.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de aplicación de estuco en el área que fue pañetada del baño de profesores. Se recuerda que el colegio tiene programada la finalización de estas actividades para el jueves 26 de marzo del presente año, por lo que se recomienda mantener la supervisión continua del proceso y garantizar el uso adecuado de los EPP por parte del personal operativo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 4,66%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, al igual, se encuentra gran cantidad de RCD, por lo que se realizó un llamado de atención para que realicen la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Adicional se reitera que esta sede debe de finalizar y ser entregada el 24 de marzo del presente año.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizo una entrega parcial de este frente, si se llegan a realizar actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados, cabe mencionar que las actividades en este frente debio a que el contratista debe de radicar un NP para el mantenimiento de la puerta de ingreso del parqueadero, para así ser ejecutado y cumplir al 100% con esta emergencia.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de estructura metálica para la conformación del shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de pintura de la perfilería del cuarto de almacenamiento, cumpliendo con los lineamientos de calidad establecidos para la actividad. Se recomienda garantizar que el personal operativo haga uso adecuado de los EPP durante todas las actividades, así como mantener el orden y aseo en el área de trabajo para prevenir incidentes y asegurar condiciones seguras durante la ejecución de las labores.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, no se han realizado actividades esta semana, se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

FECHA:	24/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	40 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
23 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			CALIDAD DEL SERVICIO DESDE			CALIDAD DEL SERVICIO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		
400 47 994000110040	19	9	2025	3	1	2027	3	5	2026	3	5	2031	19	9	2025	3	5	2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA			POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE			RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA		
CV-100054114	8	9	2025	3	1	2027	8	9	2025	2	5	2029	10	4	2026	2	5	2029	CV – 100015150	8	9	2025	10	4	2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VIr FRENTE APROBADO	VIr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	66,78%	72,20%		42,62%		$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	50,26%	51,59%		57,03%		$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	85,97%	87,21%		33,52%		$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	40,52%	57,39%		28,32%		$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	66,08%	75,20%		58,88%		$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	22,10%	23,42%		19,54%		$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	49,37%	52,94%		48,28%		$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES		3,00%		0,00%		$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES		0,00%		0%		$ 100.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
TOTAL FRENTES DE OBRA						59,99%		32,02%		$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%		100,00%		$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%		100,00%		$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		33,74%		0,00%		$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		0,00%		0,00%		$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		3,26%		0,00%		$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%		100%		$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%		0%																							
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
TOTAL FRENTES DE OBRA						59,67%		55,56%		$ 270.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	8	1	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	2	2	9	$ -
TOTAL				
5	10	3	18	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	59,99%	0,00%	81,04%
PROGRAMADO	32,02%		
ATRASO	27,97%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			

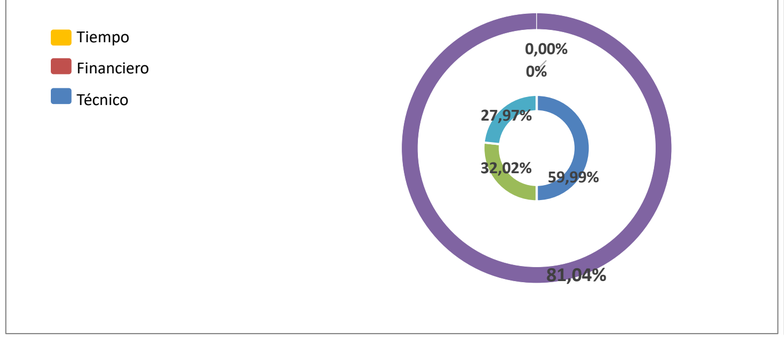

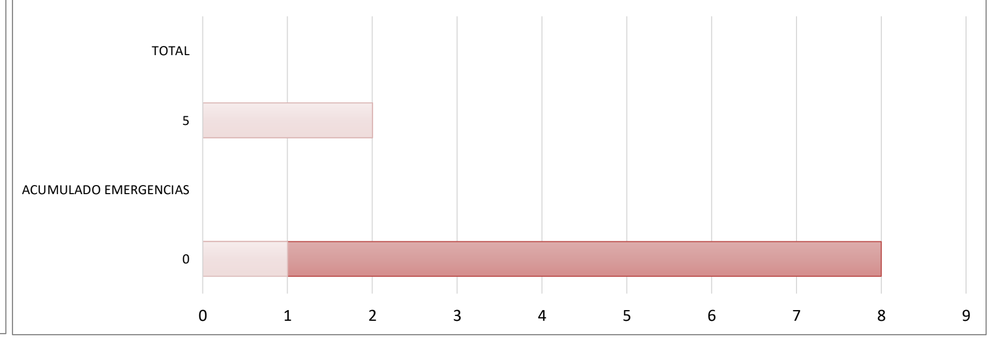

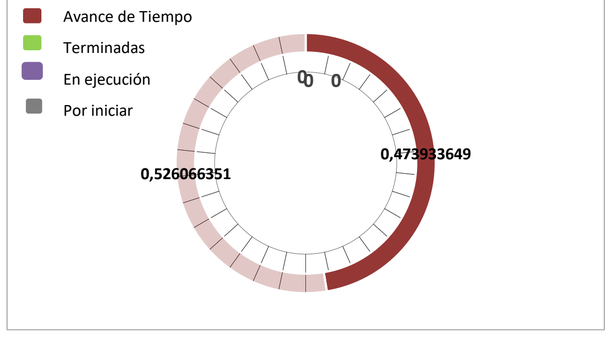

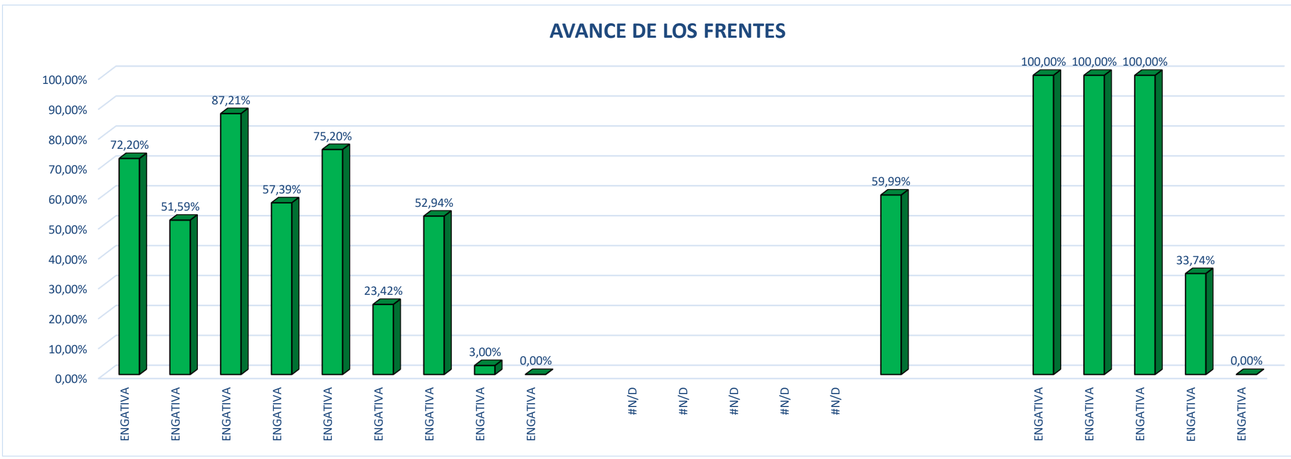

OBSERVACIONES:

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B



Instalación de ladrillo para antepecho en mampostería - Cerramiento perimetral.



Instalación de ladrillo para antepecho en mampostería - Cerramiento perimetral.



Instalación de platina para anclaje de perfil - Cerramiento perimetral.



Instalación de ladrillo para antepecho en mampostería - Cerramiento perimetral.



Instalación de platina para anclaje de perfil - Cerramiento perimetral.



Instalación de ladrillo para antepecho en mampostería - Cerramiento perimetral.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Fundida de dados esquineros



Trazado de ejes y exvacacion para dados



Mezcla para la instalación de baldosa



Instalacion de baldosas



Corte de baldosas para guardaescobas



Uso de boquillera y nivel de burbuja para la correcta inslacion de la baldosa

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Emboquillado de juntas



Limpieza de piso



Instalacion de teja tipo sandwich



Acopio de material para cubierta (poliuretano)

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Shut de basura.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Shut de basura.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Shut de basura.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Shut de basura.



Instalación de malla electrosoldada para placa - Sendero peatonal.



Instalación de malla electrosoldada para placa - Sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Shut de basura.



Instalación de malla electrosoldada para placa - Sendero peatonal.



Instalación de malla electrosoldada para placa - Sendero peatonal.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa/rampa - Shut de basuras.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Sendero peatonal.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



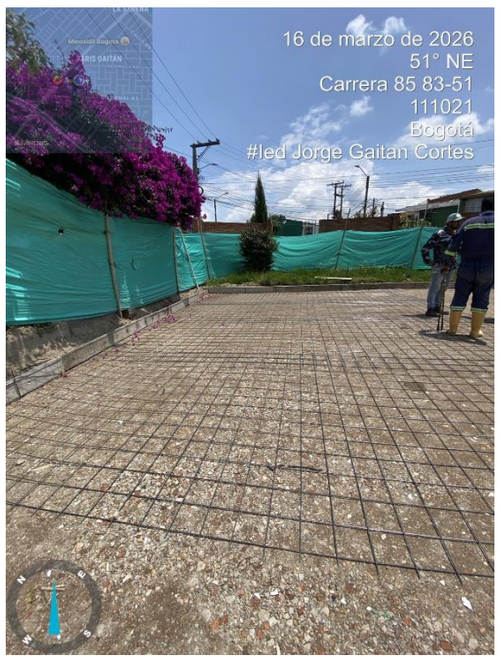


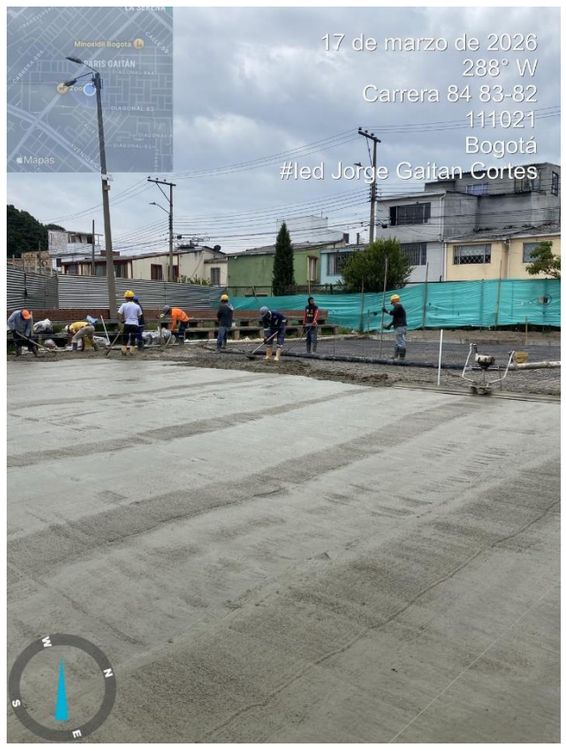

Encofrado e intalación de la malla.

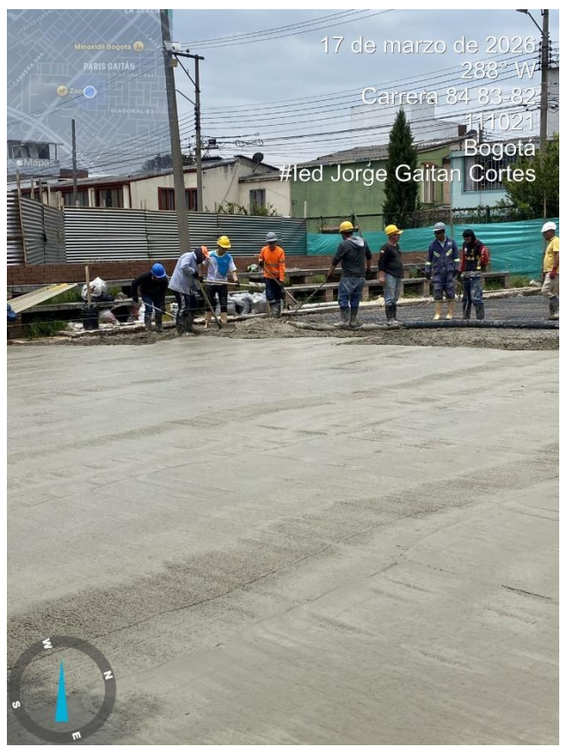


Fundida de la placa.

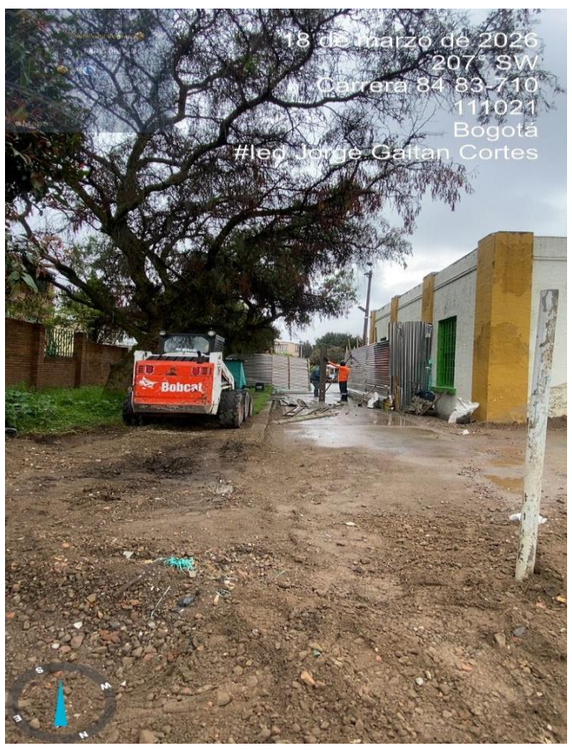

Fundida de placa



Retiro de material sobrante subbase

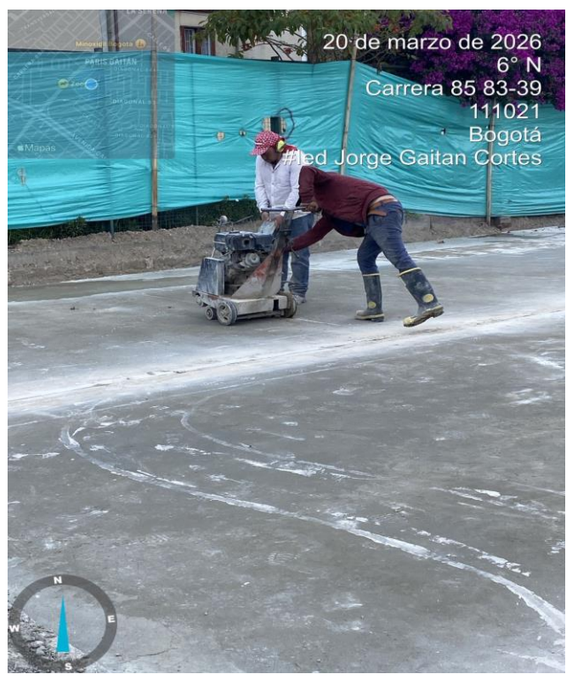

Registro de obra sin actividades

Dilataciones de placa

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Instalación de concreto para viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de concreto para viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Destronque y pulida de pisos - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Destronque y pulida de pisos - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Destronque y pulida de pisos - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Aplicación de pintura en muros internos - Aula de música.



Aplicación de pintura en muros internos - Aula de música.



Aplicación de pintura en muros internos - Aula de música.



Aplicación de pintura en muros internos - Aula de música.



Aplicación de pintura en muros internos - Aula de música.



Aplicación de pintura en muros internos - Aula de música.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Destronque y pulida de piso - aula de música.



Excavación para expandir placa donde va el shut de basuras.



Excavación para expandir placa donde va el shut de basuras.



Excavación para la instalación de tubo sanitario - Zona sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 | **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Suministro de estructura metálica para shut de basuras.



Suministro de estructura metálica para shut de basuras.



Suministro de estructura metálica para shut de basuras.



Suministro de estructura metálica para shut de basuras.



Suministro de estructura metálica para shut de basuras.



Instalación de estructura metálica para shut de basuras.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Instalación de estructura metálica para shut de basuras.



Instalación de estructura metálica para shut de basuras.
