PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	4,72%	45,89%	Obra Física Ejecutada (%)	1,46%	61,45%
Valor de la Obra programada:	$ 130.679.200,00	$ 1.270.522.983,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 40.342.852,00	$ 1.701.242.259,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	41,17%	59,99%	**15,56%**
Durante el periodo	4,72%	1,46%	
Acumulado actual	45,89%	61,45%	

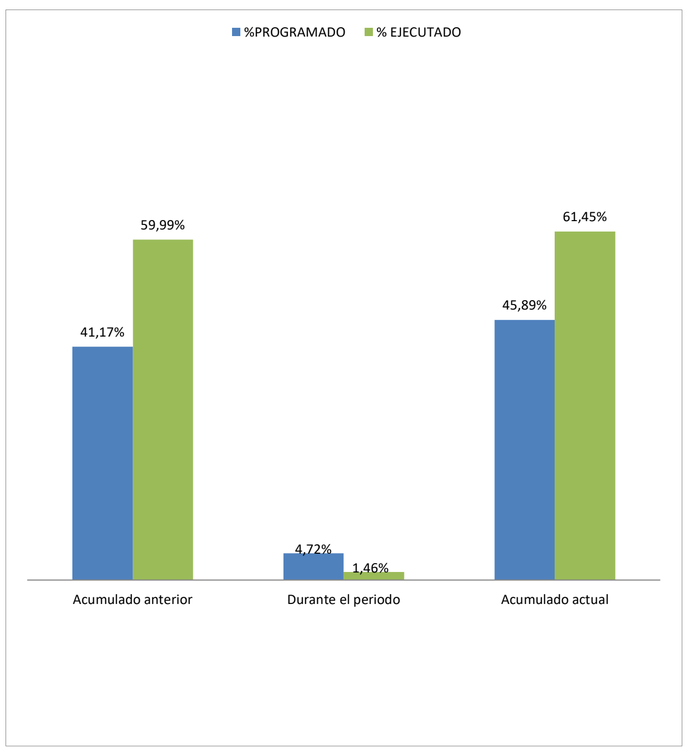

OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	1,32%	0,83%	-0,49%	43,94%	73,03%	29,09%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	3,92%	0,23%	-3,69%	60,95%	51,83%	-9,12%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	5,83%	1,73%	-4,10%	39,35%	88,94%	49,59%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	8,41%	0,00%	-8,41%	36,73%	57,39%	20,66%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	5,70%	1,93%	-3,77%	64,58%	77,13%	12,55%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	1,66%	1,79%	0,13%	21,20%	25,21%	4,01%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	6,20%	3,69%	-2,51%	54,48%	56,63%	2,15%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**4,72%**	**1,46%**	**-3,26%**	**45,89%**	**61,45%**	**15,56%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**0,00%**	**1,50%**	**1,50%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	0,00%	53,65%	53,65%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	0,00%	95,00%	95,00%	$ 20.073.306,12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	0,00%	50,09%	50,09%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.379,98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 20.000.000,00		
			55,56%	72,86%		$ 290.732.744,10	$ 428.932.199,00	**$ 138.199.454,90**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		$ 3.197.559.314,00
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.151,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 419.080.656,00	
VALOR PARCIAL 4	$ 335.248.214,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.548.693.385,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.648.865.929,00	$ 1.648.865.929,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.548.693.385,00	$ 1.548.693.385,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	45,89%	**61,45%**	**15,56%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	177	**27,54**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S

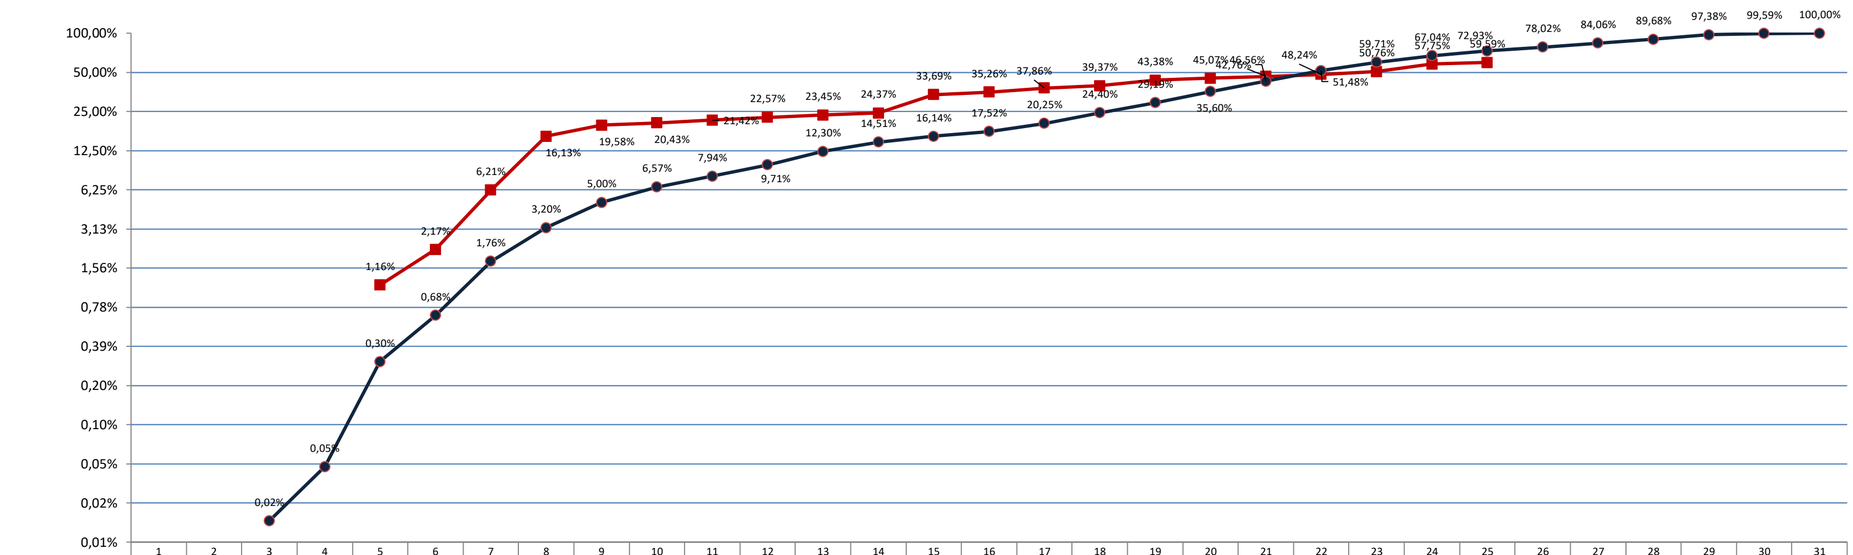

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,56%	48,24%	50,76%	57,75%	59,59%						
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de instalación de ladrillos alrededor de la columna del cerramiento perimetral. Adicional instaló el manto asfaltico faltante en la cubierta del shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en obra; en consecuencia, no fue posible realizar la verificación ni el seguimiento a los aspectos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Por lo anterior, no se generaron observaciones ni hallazgos en esta materia para el periodo en mención.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 29,09%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral y señalización adecuado, se evidencia RCD y material acopiado cerca a los individuos arbóreos, por lo que se recomienda hacer la protección adecuada, realizar jornadas de orden y aseo y disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 13 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Adicional se reitera que esta sede debe de finalizar y ser entregada el 27 de marzo del presente año.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Instalacion de piso.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de enchape. El personal se encontraba haciendo uso adecuado de los EPP, los cuales cuentan con aprobación por parte de la interventoría. Asimismo, se verificó el correcto diligenciamiento de los ATS y el acompañamiento permanente de los inspectores de SST durante la ejecución de las actividades, garantizando el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por debajo de lo programado del 9,12%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:

15.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
5.1.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. Actividad programada hasta el 10 de marzo
5.1.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. Actividad programada hasta el 13 de marzo
5.1.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
12.2.4 PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
8.1.2 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
5.1.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
2.2.16 PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).
Se aclara que el porcentaje de retraso corresponde en su mayoria a el aula modular.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, se reportó que se usa los puntos ecológicos dentro de la institución, se encuentra material de construcción y los residuos, las zonas verdes se encuentran libres, se recomienda disponer adecuadamente los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 13 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Durante el comité realizado en esta semana el contratista se comprometio a ingresar material a obra el 5 de abril y adicionalmente menciono que para el 20 ya estaria lista el aula modular en su totalidad.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de estructura metálica para la conformación del shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se inició la instalación de la estructura para el shut de basuras. Durante la actividad, se realizó recomendación al personal respecto al uso adecuado y permanente del casco como elemento de protección personal, con el fin de prevenir riesgos asociados a la labor y garantizar el cumplimiento de las normas de SST.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 49,59%, Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, se acopia y protege adecuadamente el material que ingreso al igual se recomendo al contratista jornadas de orden y aseo periodicamente, e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 13 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en obra. No obstante, se recomienda al contratista realizar el ajuste y/o mantenimiento de la puerta de cerramiento, toda vez que se encuentra en mal estado y actualmente está sostenida en un solo punto, lo que representa un riesgo de desprendimiento por acción del viento. Se sugiere atender esta situación de manera prioritaria con el fin de prevenir posibles incidentes y garantizar condiciones seguras en el área.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista. Sin embargo, hay algunos items que requieren de la programacion para que puedan ser evaluados.

4.1. Actividades programadas no ejecutadas:
16.1.2 CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 9 al 10 de marzo
16.1.3 BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 11 al 12 de marzo
16.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) programado al 9 de marzo
8.1.2 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
16.1.11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2
2.3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.
2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
La mayoria de actividades programadas no ejecutadas corresponden a las relacionadas con el Shut

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, presenta un campamento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomendó al contratista limpiar las áreas de acceso al frente, realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 13 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Durante la reunion realizada en la SED el 26 de marzo del 2026, se indicó que debe realizarse la corrección de la pintura de la puerta, en el marco del mantenimiento entregado. Adicionalmente, respecto a la cancha el contratista expuso que requiere de un NP de acabado final para la cancha, por lo que se vio la posibilidad de contemplar item 7.2.23 mas un NP de de demarcacion y diseño de los juegos que irian en la zona. Respecto al carcamo se contemplo una tapa plastica, considerando el item 2.3.2.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de viga cinta para confinar el adoquin y adicional realizó la instalación de dados en concreto para la base de la estructura del domo.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de corte de ladrillos para el ajuste de bordes. Se recomienda al personal el uso adecuado y permanente de EPP, especialmente durante la manipulación de la pulidora, con el fin de mitigar riesgos asociados a la actividad. De igual manera, se recomienda al contratista implementar jornadas de orden y aseo en el área de trabajo, así como realizar el mantenimiento y/o mejora del cerramiento perimetral, debido a que se encuentra deteriorado y sin el soporte adecuado, lo que puede generar condiciones inseguras en la obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 12,55%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: El cerramiento en algunos tramos se encuentra en mal estado, se encuentra materiales, residuos en el frente acopiados, pero debe contar con la debida protección y señalización, por lo que se realizó un llamado de atención, las zonas verdes se van a endurecer en el frente, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 13 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: instalación de pañete en muros exteriores e interiores de los baños. Adicional realizó la aplicación de pintura blanca en muros internos de las baterías sanitarias.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de estucado y lijado de muros internos, así como la limpieza de la estructura metálica de la cubierta. Se valida que el personal cuenta con la aprobación correspondiente y hace uso adecuado de EPP. Adicionalmente, se recomienda al contratista retirar los residuos vegetales generados por la tala del árbol, con el fin de mantener las condiciones de orden y seguridad en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 4,01%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta RCD en lonas y acopiados (volumen alto), por lo que se realizó un llamado de atención para que realicen la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima, se evidencia los sanitarios anteriormente desmontados sin cubrir por lo que se recomienda al contratista realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA). Teniendo en cuenta el radicado N.2025EE296403 y el acta de visita MAR-20250903-00735 se da autorización a la tala de 16 individuos arbóreos en esta institución, ya se realizó la tala a todos para bajo el procedimiento adecuado, disponer todos los residuos vegetales y al finalizar la actividad silvicultural presentar el informe final con registro fotográfico al igual se debe complementar el anexo PM04-PR29-F8 para presentar ante la secretaria distrital de ambiente (SDA)

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 13 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de aplicación de pintura en el salón de música. Adicional realizó actividades de construcción de tapa para caja de inspección sanitaria.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de ajuste de uno de los filos de la puerta, así como labores de estucado y lijado de detalles en el interior del salón de música. Se recomienda al contratista y al personal hacer uso adecuado y permanente del casco como elemento de protección personal durante la ejecución de estas actividades, con el fin de garantizar la seguridad y prevenir posibles riesgos asociados a la obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 2,15%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, al igual, se encuentra RCD en el frente, por lo que se recomendó realizar la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA) .

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 13 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizo una entrega parcial de este frente, si se llegan a realizar actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 13 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados, cabe mencionar que las actividades en este frente debio a que el contratista debe de radicar un NP para el mantenimiento de la puerta de ingreso del parqueadero, para así ser ejecutado y cumplir al 100% con esta emergencia.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de estructura metálica para la conformación del shut de basuras y cerramiento del tanque de almacenamiento.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la presencia de dos soldadores finalizando el armado de la estructura del tanque, así como un maestro realizando labores de mantenimiento en la caja de inspección. Se validó el permiso de trabajo en caliente, así como el uso adecuado de los EPP y la dotación correspondiente. Además, se verificó el correcto diligenciamiento del ATS y el uso de andamios para la ejecución segura de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción acopiado y residuos en la zona verde por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomienda jornada de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 13 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contrato de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

FECHA:	30/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	33 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
30 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
CV-100054114	8 9 2025	3 1 2027	8 9 2025	2 5 2029	10 4 2026	2 5 2029	CV – 100015150	8 9 2025	10 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VIr FRENTE APROBADO	VIr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	72,20%	73,03%	↑	43,94%	↑	$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	51,59%	51,83%	↑	60,95%	↓	$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	87,21%	88,94%	↑	39,35%	↑	$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	57,39%	57,39%	→	36,73%	↑	$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	75,20%	77,13%	↑	64,58%	↑	$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	23,42%	25,21%	↑	21,20%	↑	$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	52,94%	56,63%	↑	54,48%	↑	$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES		3,00%	↑	0,00%	↑	$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES		0,00%	→	0%	✓	$ 100.000.000																					
							→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						61,45%	↑	35,69%	↑	$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		53,65%	↑	0,00%	↑	$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		95,00%	↑	0,00%	↑	$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		50,09%	↑	0,00%	↑	$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%	↑	100%	✓	$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%	→	0%	✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						72,86%	↑	55,56%	↑	$ 270.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	8	1	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	3	1	9	$ -
TOTAL				
5	11	2	18	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	61,45%	0,00%	84,36%
PROGRAMADO	35,69%		
ATRASO	25,76%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			

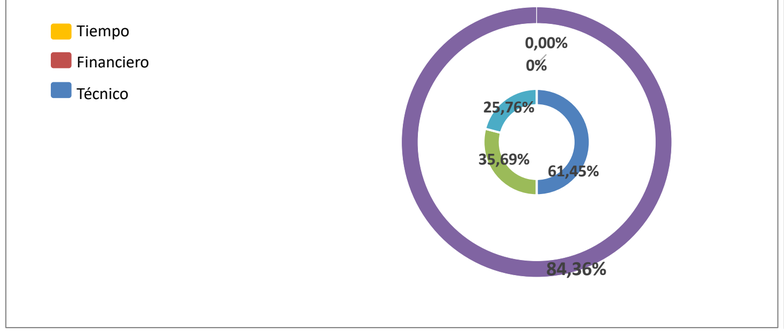

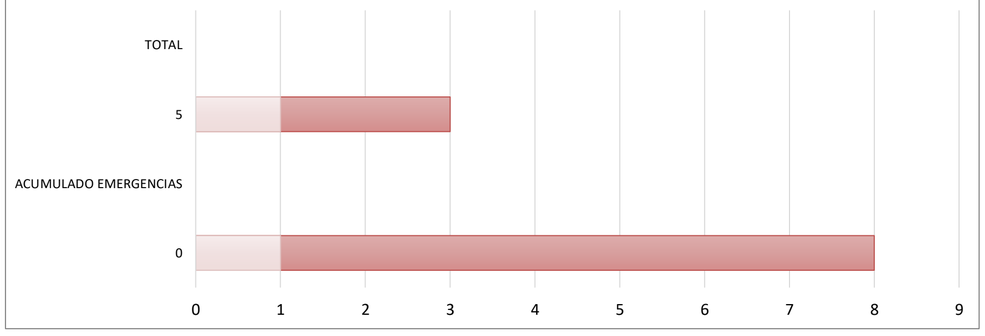

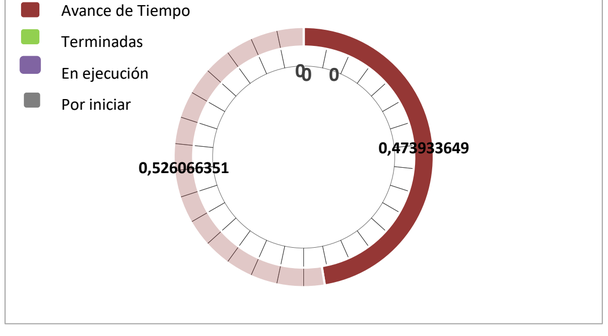

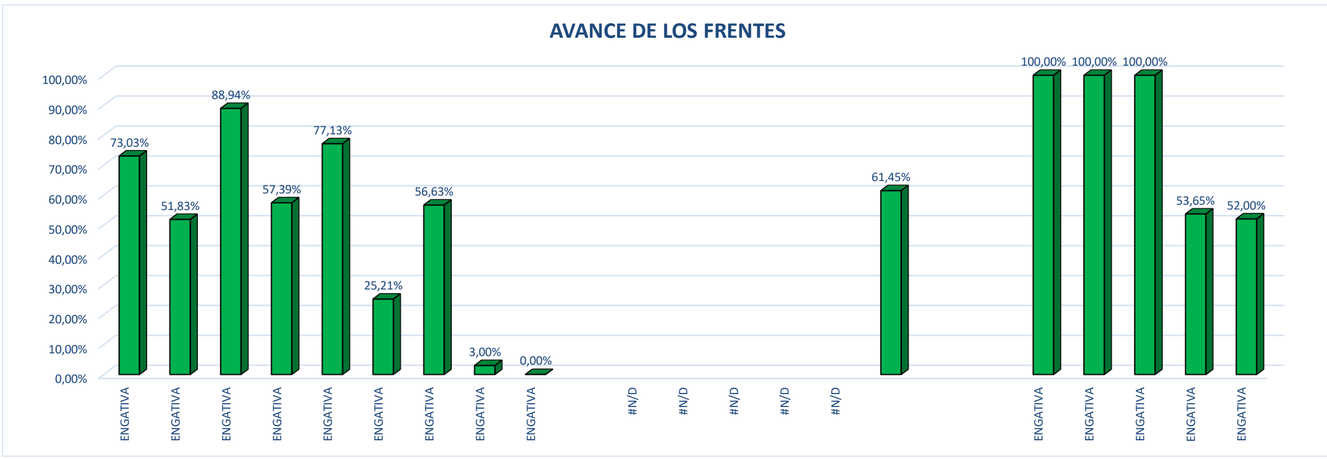

OBSERVACIONES:

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B



Instalación de mampostería para columna - Cerramiento perimetral.



Instalación de mampostería para columna - Cerramiento perimetral.



Instalación de mampostería para columna - Cerramiento perimetral.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Destronque de pioso con pulidora en salon 2



Actividad de pulida de piso en salon 2 finalizada



Inicio de instalacion de baldosa en salon 1



Corte de baldosas de enchape para agunlos del salon



Corte de baldosas para guardaescobas salon 1



Uso de boquillera para asegurar la correcta instalacion del enchape del salon 1

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Instalación de estructura metálica - Shut de basura.

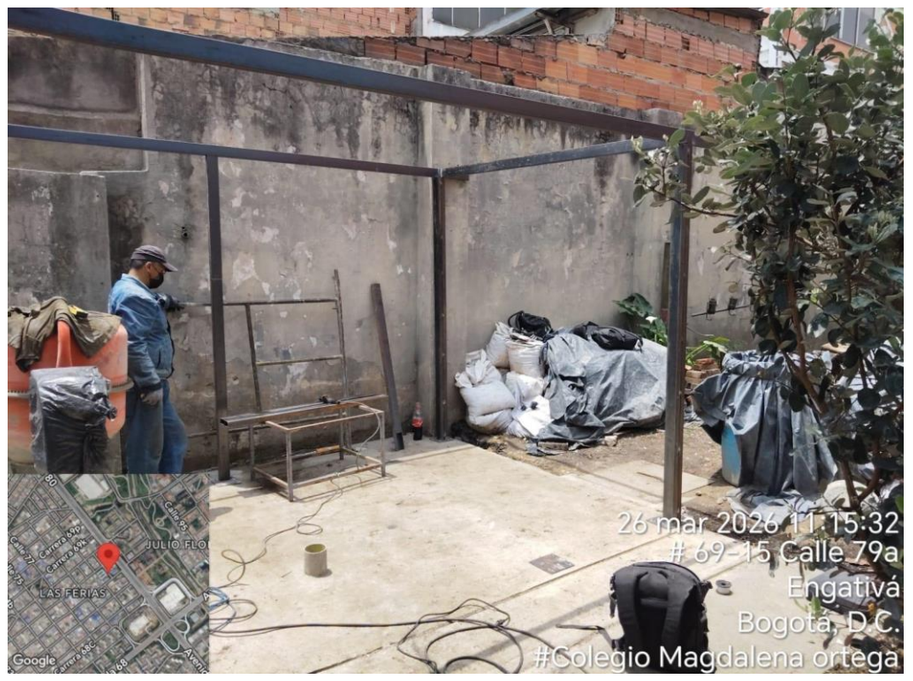

Instalación de estructura metálica - Shut de basura.



Instalación de estructura metálica - Shut de basura.



Instalación de estructura metálica - Shut de basura.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



Vista general de la obra sin actividades.



Vista general de la obra sin actividades.



Vista general de la obra sin actividades.



PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Instalación de dado en concreto reforzado - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de ventanas - Aula de música.



Instalación de ventanas - Aula de música.



Instalación de ventanas - Aula de música.



Aplicación de pintura en muros internos - Aula de música.



Aplicación de pintura en muros internos - Aula de música.



Aplicación de pintura en muros internos - Aula de música.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Instalación de estructura metálica para shut de basuras.



Instalación de estructura metálica para cerramiento de tanque de almacenamiento.

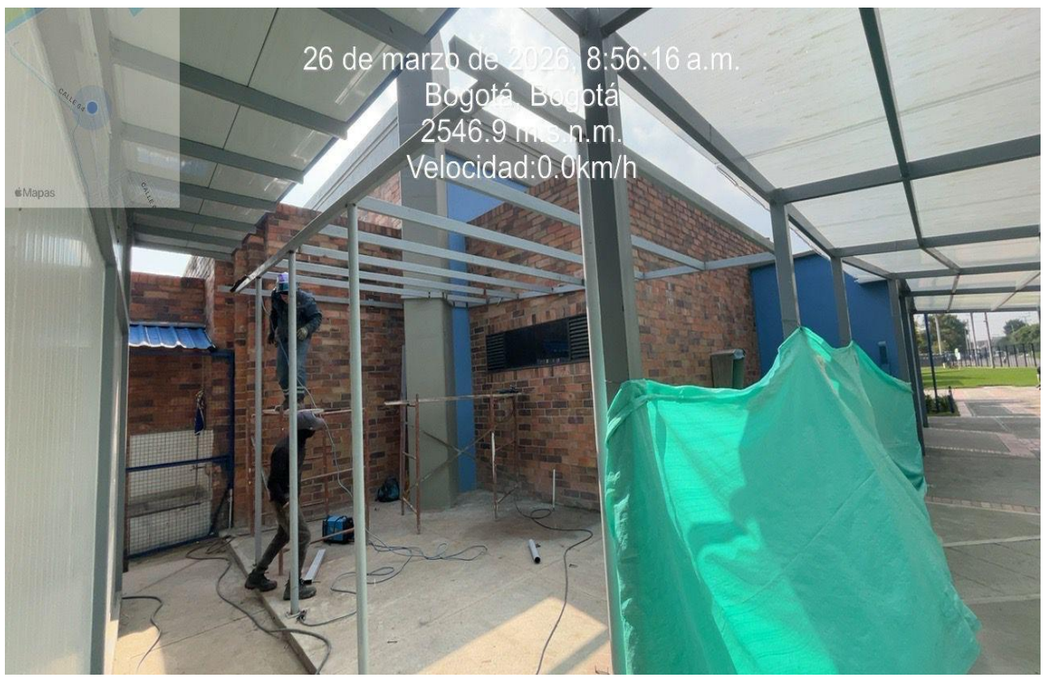

Instalación de estructura metálica para cerramiento de tanque de almacenamiento.



Instalación de estructura metálica para cerramiento de tanque de almacenamiento.



Instalación de estructura metálica para cerramiento de tanque de almacenamiento.



Instalación de estructura metálica para cerramiento de tanque de almacenamiento.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Instalación de estructura metálica para shut de basuras.



Instalación de estructura metálica para shut de basuras.
