

Id	Modo de	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración	Predeces
1		1 CONTRATO 1014-2024: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"	$ 13.045.710.276	mar 01/04/25	mar 30/06/26	383 días	
2		1.1 ACTA DE INICIO	$ 0	mar 01/04/25	mar 01/04/25	0 días	
3		1.2 ETAPA DE AUSTAMIENTO	$ 0	mar 01/04/25	lun 19/05/25	40 días	
4		1.2.1 Recopilación de información	$ 0	mar 01/04/25	sáb 19/04/25	15 días	2
5		1.2.2 Documentos preliminares	$ 0	mar 01/04/25	lun 28/04/25	22 días	
56		1.2.3 Recorrido visita preliminar a segmentos viales contractuales	$ 0	mar 01/04/25	mié 09/04/25	8 días	
57		1.2.4 Actividades previas a obra	$ 0	mar 01/04/25	lun 19/05/25	40 días	
62		1.2.5 Fin Actividades Previas	$ 0	lun 28/04/25	lun 28/04/25	0 días	10;15;20;
63		1.3 ACTIVIDADES GENERALES DE OBRA	$ 11.415.503.187	vie 02/05/25	mar 30/06/26	357,75 días	
64		1.3.1 INICIO DE OBRA	$ 0	lun 19/05/25	lun 19/05/25	0 días	3
65		1.3.2 ACTIVIDADES DE OBRA PRIMERA FASE DE INTERVENCION	$ 2.256.268.334	vie 02/05/25	mar 09/09/25	111 días	
66		1.3.2.1 GESTION, SEGUIMIENTO Y APROBACION DE PMT	$ 0	vie 02/05/25	lun 19/05/25	15 días	64CF
67		1.3.2.2 CIV 11014394 - UBICADO EN LA CRA 81 BIS DESDE CL 146A HASTA VIA CERRADA	$ 165.029.646	lun 19/05/25	jue 24/07/25	56 días	
92		1.3.2.3 CIV 11014401 - UBICADO EN LA CRA 81A DESDE CLL 146A HASTA VIA CERRADA	$ 198.330.066	lun 26/05/25	vie 25/07/25	51 días	
117		1.3.2.4 CIV 11001256 - UBICADO EN LA CL 156B DESDE CRA 97C HASTA CRA 97B	$ 238.176.306	lun 26/05/25	jue 31/07/25	56 días	
142		1.3.2.5 CIV 11005235 UBICADO EN LA CLL 140 DESDE CRA 96 HASTA VIA CERRADA	$ 272.182.010	jue 29/05/25	lun 11/08/25	61 días	
167		1.3.2.6 CIV 11005134 - UBICADO EN LA CLL 140A DESDE CRA 96 HASTA VIA CERRADA	$ 410.499.160	mié 04/06/25	mié 20/08/25	66 días	
192		1.3.2.7 CIV 11001663 UBICADO EN LA CRA 150 A DESDE CLL 143 B HASTA CLL 144	$ 185.579.429	jue 05/06/25	lun 04/08/25	51 días	
217		1.3.2.8 CIV 11008620 UBICADO EN LA CRA 86 DESDE CLL 129 A HASTA DG 129 B	$ 361.364.627	vie 20/06/25	lun 01/09/25	61 días	
244		1.3.2.9 CIV 11001816 UBICADO EN LA CRA 150 DESDE CLL 143 HASTA CLL 143 B	$ 425.107.090	lun 07/07/25	mar 09/09/25	56 días	
269		1.3.3 ACTIVIDADES DE OBRA SEGUNDA FASE DE INTERVENCION	$ 1.986.021.302	sáb 31/05/25	mar 18/11/25	146 días	
270		1.3.3.1 GESTION, SEGUIMIENTO Y APROBACION DE PMT	$ 0	sáb 31/05/25	jue 26/06/25	21 días	271CF

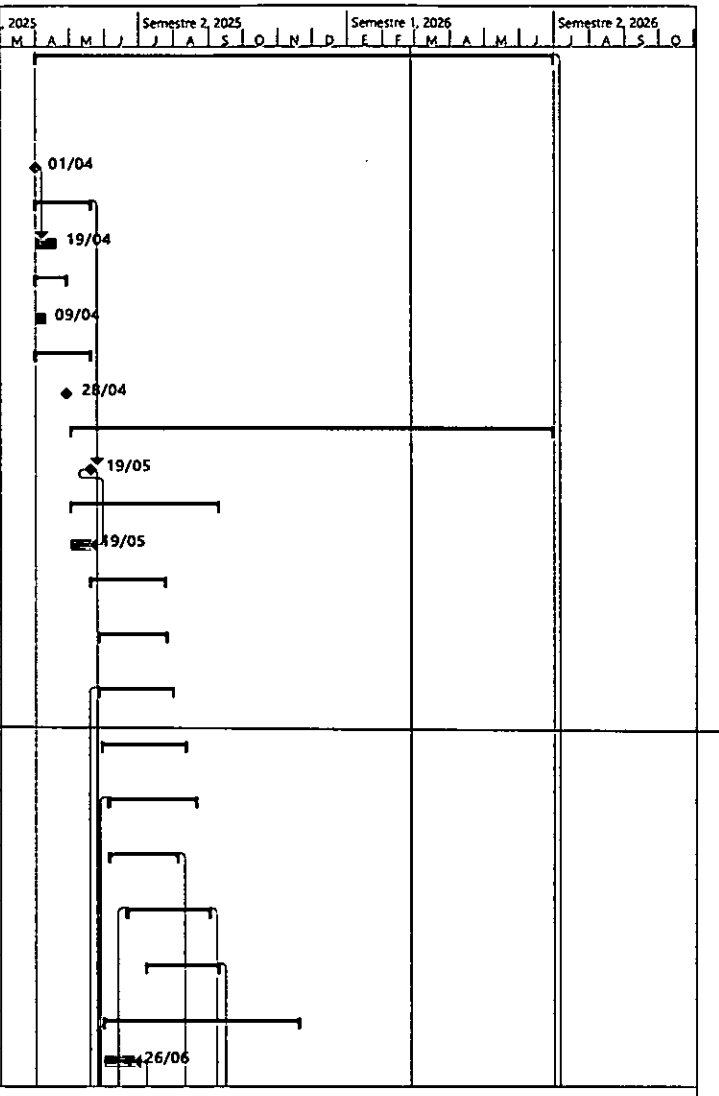


Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			

Id	Modo de	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración	Predeces
271		1.3.3.2 CIV 11001294 - UBICADO EN LA CRA 97 C DESDE CL 156 A HASTA CL 156 B	$ 223.127.382	jue 26/06/25	sáb 30/08/25	56 días	117CC+20 días
296		1.3.3.3 CIV 11008688 - UBICADO EN LA CRA 87 DESDE DG 129 B HASTA CLL 129	$ 178.006.815	mié 16/07/25	jue 18/09/25	56 días	217CC+21 días
321		1.3.3.4 CIV 11004901 - UBICADO EN LA CLL 140 D DESDE CRA 96 HASTA LINDERO	$ 364.042.819	jue 31/07/25	vie 03/10/25	56 días	167CC+45 días
346		1.3.3.5 CIV 11008733 - UBICADO EN LA CRA 84 B DESDE CLL 129 A HASTA CLL 129	$ 214.068.104	lun 04/08/25	mar 07/10/25	56 días	296CC+16 días
371		1.3.3.6 CIV 11003262 - UBICADO EN LA CRA 140 B DESDE CLL 135 HASTA CLL 137	$ 342.720.235	mar 05/08/25	mié 15/10/25	61 días	192FC+1 día
396		1.3.3.7 CIV 11008633 - UBICADO EN LA CRA 84 B DESDE CLL 129 A BIS HASTA CLL 129 A	$ 277.124.337	mar 12/08/25	mar 18/11/25	86 días	346CC+6 días
423		1.3.3.8 CIV 11004649 - UBICADO EN LA CRA 157 ENTRE LA CLL 132 D Y LA CLL 133	$ 113.776.406	vie 05/09/25	lun 10/11/25	56 días	217FC+4 días
450		1.3.3.9 CIV 11004452 - UBICADO EN LA CRA 158 A ENTRE LA CLL 136 Y LA CLL 136 A	$ 273.155.204	lun 08/09/25	mié 12/11/25	56 días	423CC+2 días
475		1.3.4 ACTIVIDADES DE OBRA TERCERA FASE DE INTERVENCION	$ 1.486.673.294	mié 10/09/25	lun 26/01/26	116 días	
476		1.3.4.1 GESTION, SEGUIMIENTO Y APROBACION DE PMT	$ 0	mar 21/10/25	vie 14/11/25	21 días	704CF;72
477		1.3.4.2 CIV 11004491 - UBICADO EN LA CRA 158 B ENTRE LA CLL 136 Y LA CLL 136 A	$ 260.683.808	mié 10/09/25	jue 13/11/25	56 días	244FC+1 día
502		1.3.4.3 CIV 11004804 - UBICADO EN LA CRA 160 B ENTRE LA CLL 135 Y LA CLL 136	$ 113.554.464	mié 24/09/25	vie 28/11/25	56 días	296FC+5 días
527		1.3.4.4 CIV 11005074 - UBICADO EN LA CRA 160 B ENTRE LA CLL 132 D Y LA CLL 133	$ 118.686.025	mar 30/09/25	jue 04/12/25	56 días	502CC+5 días
552		1.3.4.5 CIV 11003398 - UBICADO EN LA CRA 154 ENTRE LA CLL 138 A Y LA CLL 138 B	$ 103.638.448	vie 03/10/25	mar 09/12/25	56 días	321
577		1.3.4.6 CIV 11003284 - UBICADO EN LA CRA 154 ENTRE LA CLL 138 B Y LA CLL 138 C	$ 96.664.119	vie 03/10/25	mar 09/12/25	56 días	552CC
602		1.3.4.7 CIV 11003405 - UBICADO EN LA CRA 140B ENTRE CLL 135 Y CLL 13	$ 133.845.250	mié 08/10/25	vie 12/12/25	56 días	346FC+1
627		1.3.4.8 CIV 11003235 - UBICADO EN LA CRA 140 C DESDE CLL 135 HASTA CLL 137	$ 278.936.637	mié 15/10/25	jue 18/12/25	56 días	602CC+5 días
652		1.3.4.9 CIV 11002018 - UBICADO EN LA CRA 151 D DESDE CLL 142 C HASTA TR 151 G BIS	$ 390.664.543	mié 19/11/25	lun 26/01/26	56 días	396
677		1.3.5 ACTIVIDADES DE OBRA CUARTA FASE DE INTERVENCION	$ 730.123.387	jue 14/08/25	mié 21/01/26	135 días	
678		1.3.5.1 GESTION, SEGUIMIENTO Y APROBACION DE PMT	$ 0	jue 14/08/25	lun 08/09/25	21 días	450CF
679		1.3.5.2 CIV 11003706 - UBICADO EN LA CRA 141 A DESDE CLL 135 HASTA CLL 137	$ 273.712.459	vie 14/11/25	jue 08/01/26	46 días	477

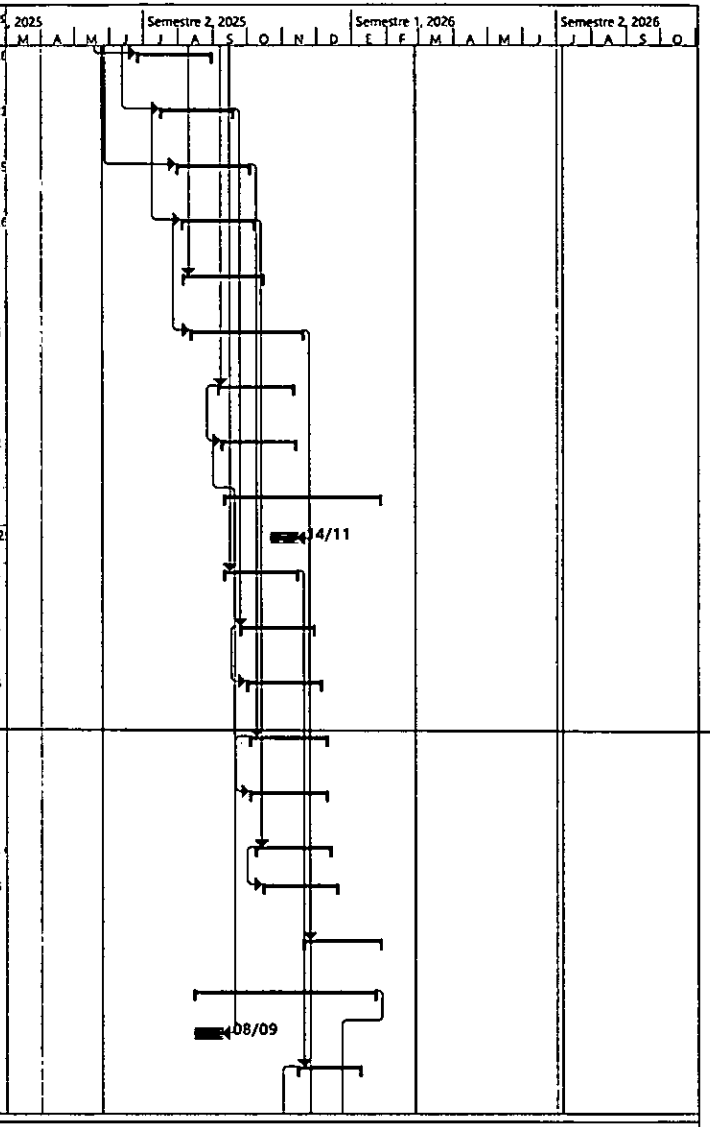


Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			

Id	Modo de	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración	Predeces
704		1.3.5.3 CIV 11001733 - UBICADO EN LA CLL 143 DESDE CRA 151 F HASTA CRA 151 D	$ 141.602.437	vie 14/11/25	mié 21/01/26	56 días	679CC
729		1.3.5.4 CIV 11001745 - UBICADO EN LA CLL 143 DESDE CRA 151 D HASTA CRA 151 C	$ 142.043.811	vie 14/11/25	mié 21/01/26	56 días	679CC
754		1.3.5.5 CIV 11003536 - UBICADO EN LA CRA 150B ENTRE LA CL 135A Y LA CLL 134A	$ 172.764.680	vie 14/11/25	mié 21/01/26	56 días	679CC
779		1.3.6 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ADICION No. 1	$ 3.091.403.728	vie 02/01/26	jue 30/04/26	100,75 días	
780		1.3.6.1 APROPIACION DE DISEÑOS	$ 0	vie 02/01/26	sáb 31/01/26	25 días	677FC-15
781		1.3.6.2 GESTION, SEGUIMIENTO Y APROBACION DE PMT	$ 0	vie 02/01/26	sáb 31/01/26	25 días	780FF
782		1.3.6.3 CIV 11004789 - UBICADO EN LA CRA 159 DESDE CLL 133 A CLL134	$ 216.187.056	lun 02/02/26	lun 20/04/26	66 días	781
783		1.3.6.4 CIV 11004427 - UBICADO EN LA CRA 158 DESDE CLL 136 A CLL 136A	$ 328.655.087	jue 12/02/26	jue 30/04/26	66 días	781
784		1.3.6.5 CIV 11004894 - UBICADO EN LA CLL 129D DESDE CRA 152 BIS A CRA 153	$ 409.849.287	jue 12/02/26	jue 30/04/26	66 días	781
785		1.3.6.6 CIV 11004362 - UBICADO EN LA CRA 154 A BIS DESDE CLL 132D A CLL 133	$ 163.856.203	lun 02/02/26	lun 20/04/26	66 días	781
786		1.3.6.7 CIV 11005364 - UBICADO EN LA CRA 129 DESDE CLL 129B A CLL 130	$ 566.502.964	lun 02/02/26	lun 20/04/26	66 días	781
787		1.3.6.8 CIV 11004887 - UBICADO EN LA CRA 160B DESDE CLL 135 A CLL 134	$ 152.328.236	jue 12/02/26	lun 20/04/26	56 días	786CC+10
788		1.3.6.9 CIV 11004987 - UBICADO EN LA CRA 160B DESDE CLL 134 A CLL 133	$ 152.100.757	jue 12/02/26	lun 20/04/26	56 días	787CC
789		1.3.6.10 CIV 11003187 - UBICADO EN LA CRA 154 DESDE CLL 138D A CLL 138C	$ 126.255.662	jue 12/02/26	lun 20/04/26	56 días	787CC
790		1.3.6.11 CIV 11003492 - UBICADO EN LA CRA 154 DESDE CLL 138A A CLL 13	$ 116.309.007	jue 12/02/26	lun 20/04/26	56 días	787CC
791		1.3.6.12 CIV 11003416 - UBICADO EN LA CLL 136A DESDE CRA 151 A CRA 150C	$ 172.637.938	lun 02/03/26	lun 20/04/26	41 días	787CC+15 días
792		1.3.6.13 CIV 11004268 - UBICADO EN LA CRA 154A BIS DESDE CLL 133 A CLL 134	$ 156.827.515	lun 02/03/26	lun 20/04/26	41 días	787CC+15 días
793		1.3.6.14 CIV 11004168 - UBICADO EN LA CRA 154A BIS DESDE CLL 134 A CLL 135	$ 147.611.365	lun 02/03/26	lun 20/04/26	41 días	787CC+15 días
794		1.3.6.15 CIV 11007355 - UBICADO EN LA CRA 119B BIS DESDE CLL 127 A VIA CERRADA	$ 155.701.699	lun 02/03/26	lun 20/04/26	41 días	787CC+15 días
795		1.3.6.16 CIV 11003445 - UBICADO EN LA CRA 150B DESDE CLL 135A CLL 136A	$ 226.580.953	lun 02/03/26	lun 20/04/26	41 días	787CC+15 días
796		1.3.7 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ADICION No. 2	$ 1.834.702.079	mar 31/03/26	vie 26/06/26	71 días	
797		1.3.7.1 APROPIACION DE DISEÑOS	$ 0	mar 14/04/26	jue 30/04/26	15 días	779FC-15
798		1.3.7.2 GESTION, SEGUIMIENTO Y APROBACION DE PMT	$ 0	mar 31/03/26	jue 30/04/26	25 días	797FF

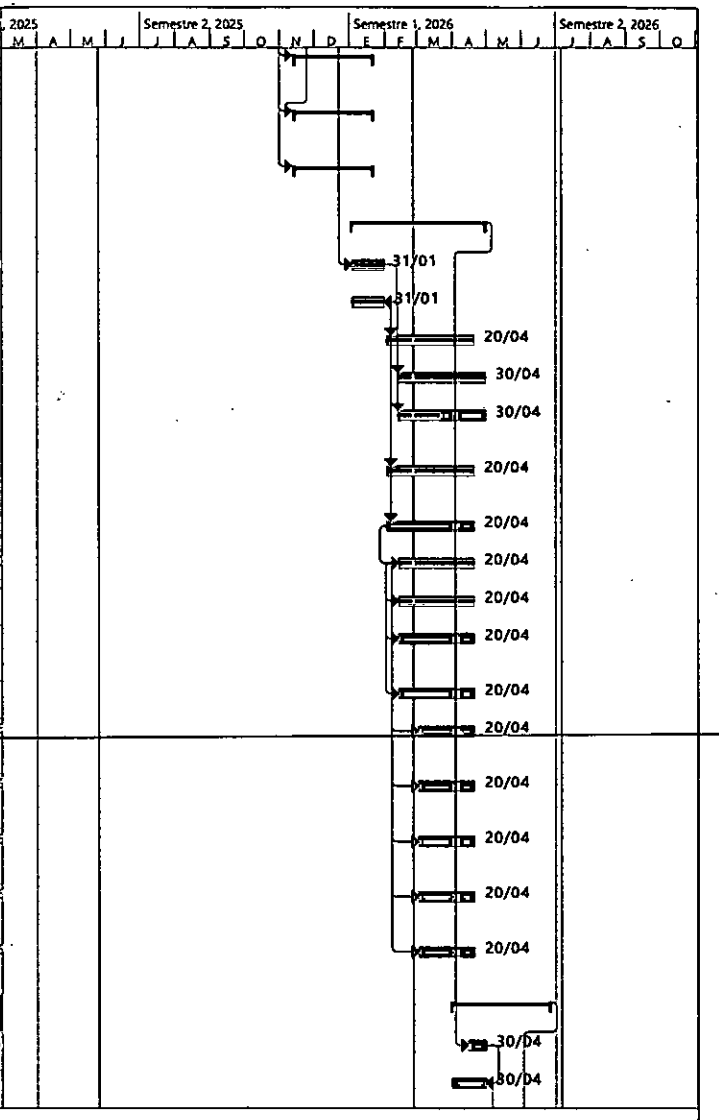

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración	Predeces
799		1.3.7.3 CIV11007251 - UBICADO EN LA CRA 119 F DESDE CLL 128 A CLL 128 B	$ 175.870.000	lun 04/05/26	vie 26/06/26	45 días	798FC+1 día
800		1.3.7.4 CIV11002546 - UBICADO EN LA DG 138 F DESDE CRA 150 A A CRA 150 B	$ 265.360.000	lun 04/05/26	sáb 13/06/26	35 días	799CC
801		1.3.7.5 CIV11002518 - UBICADO EN LA DG 138 F DESDE CRA 150 B A CRA 150 C	$ 233.250.000	lun 04/05/26	sáb 13/06/26	35 días	800CC
802		1.3.7.6 CIV11003223 - UBICADO EN LA CRA 154 C DESDE CLL 138 D A CLL 139	$ 83.600.000	lun 04/05/26	mié 10/06/26	32 días	800CC
803		1.3.7.7 CIV11002642 - UBICADO EN LA CLL 139 DESDE CRA 152 A CRA 152 A	$ 162.440.000	vie 08/05/26	lun 22/06/26	36 días	802CC+5 días
804		1.3.7.8 CIV11002608 - UBICADO EN LA CLL 139 DESDE CRA 151 D A CRA 152	$ 106.563.600	vie 08/05/26	lun 22/06/26	36 días	803CC
805		1.3.7.9 CIV11002586 - UBICADO EN LA CLL 139 DESDE CRA 151 C A CRA 151 D	$ 88.486.200	vie 08/05/26	lun 22/06/26	36 días	804CC
806		1.3.7.10 CIV11002737 - UBICADO EN LA CLL 138 D BIS DESDE CRA 151 C A CRA 151 B	$ 189.268.200	jue 14/05/26	sáb 20/06/26	30 días	805CC+5 días
807		1.3.7.11 CIV11002788 - UBICADO EN LA CLL 138 D BIS DESDE CRA 151 D A CRA 151 C	$ 81.972.000	jue 14/05/26	sáb 20/06/26	30 días	806CC
808		1.3.7.12 CIV11003907 - UBICADO EN LA CRA 153 DESDE CLL 135 A CLL 136	$ 109.593.000	jue 21/05/26	vie 26/06/26	30 días	807CC+5
809		1.3.7.13 CIV11003997 - UBICADO EN LA CRA 153 DESDE CLL 134 A CLL 135	$ 103.455.000	jue 21/05/26	vie 26/06/26	30 días	808CC
810		1.3.7.14 CIV11004082 - UBICADO EN LA CRA 153 DESDE CLL 133 A CLL 134	$ 115.364.700	jue 21/05/26	vie 26/06/26	30 días	809CC
811		1.3.7.15 CIV11004180 - UBICADO EN LA CRA 153 DESDE CLL 132 D A CLL 13	$ 119.479.379	jue 21/05/26	vie 26/06/26	30 días	810CC
812		1.3.8 ACTIVIDADES DE OBRAS ADICIONALES	$ 20.311.063	sáb 13/06/26	mar 30/06/26	12 días	796FC-10
813		~~1.3.9 FIN ACTIVIDADES DE OBRA~~	~~$ 0~~	~~mar 30/06/26~~	~~mar 30/06/26~~	~~0 días~~	~~812~~
814		1.4 COMPONENTES Y OTROS	$ 1.630.207.089	lun 19/05/25	mar 30/06/26	343 días	
815		1.4.1 GESTION AMBIENTAL	$ 838.392.228	lun 19/05/25	mar 30/06/26	343 días	64
816		1.4.2 GESTION SOCIAL	$ 326.041.402	lun 19/05/25	mar 30/06/26	343 días	64
817		1.4.3 PLANES DE MANEJO DE TRAFICO	$ 465.773.459	lun 19/05/25	mar 30/06/26	343 días	64
818		2 FIN DE CONTRATO	$ 0	mar 30/06/26	mar 30/06/26	0 días	1

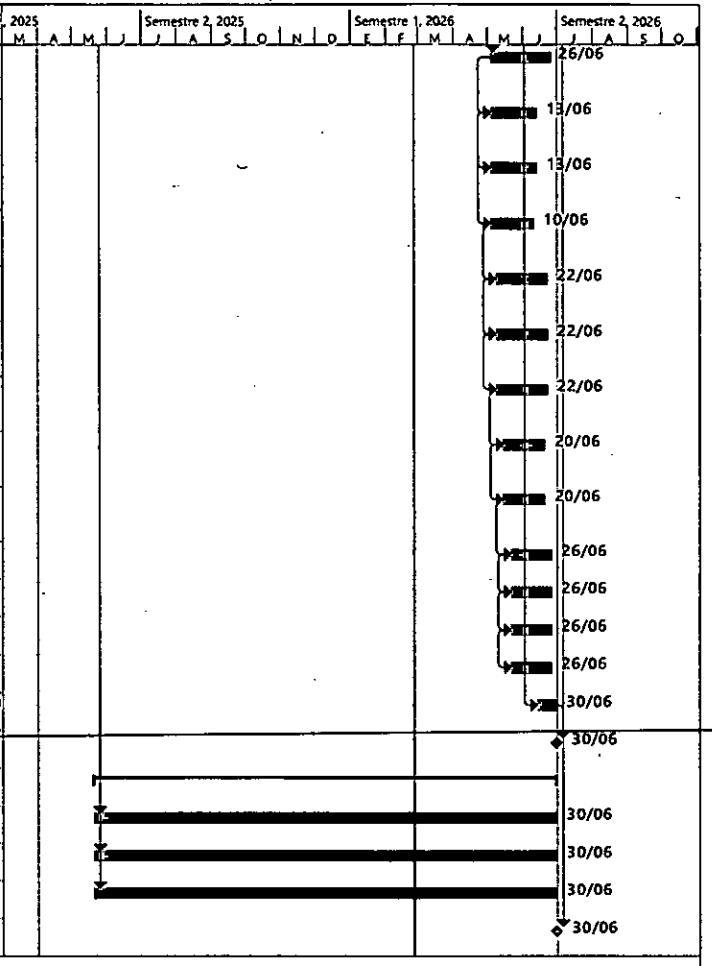

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
