Barranquilla, 07 de abril de 2026

CINP–573–090-1253

Señores
CONCEP S.A.S.
Atn.: **Ricardo J. Cogollo P.**
Representante Legal
Barranquilla

REF.: Contrato 1957 de 2025: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5".

Asunto: Solicitud de Prórroga No. 2 – Lote 5

Cordial saludo.

En nuestra calidad de consultores del Contrato No. 1957 de 2025, cuyo objeto corresponde a la elaboración de los estudios y diseños para la infraestructura fluvial en los municipios de Solita y Solano -Caquetá, suscrito con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, nos permitimos presentar a esa Interventoría la solicitud de prórroga No.2 del plazo contractual, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Antecedentes Contractuales

- El contrato identificado con el número 1957 de 2025, cuyo objeto es "estudios y diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional. Lote 5", fue adjudicado el 11 de noviembre de 2025 mediante el proceso de selección CMA-DTE-SPI-044-2025 en la plataforma SECOP II.

- Mediante Acta de Inicio suscrita el [16/DIC/2025], se dio inicio formal a la ejecución del Contrato, estableciéndose como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025, conforme al plazo inicialmente pactado.

- Mediante la suscripción de la Prorroga No. 1 el 24/12/2025 al contrato 1957 de 2025 de Consultoría, se amplió el plazo para la ejecución de las actividades de estudios y diseños hasta el 30 de abril de 2026.

2. Justificación técnica para la Prórroga

En el marco de la ejecución del Contrato No. 1957 de 2025, la Consultoría presenta las siguientes situaciones que han incidido en el desarrollo del cronograma contractual, las cuales corresponden a circunstancias no imputables ni a la Entidad contratante ni a la Consultoría:

• Que la Consultoría ha adelantado y entregado oportunamente aquellos volúmenes que no dependen de los resultados de ensayos de laboratorio, los cuales no hacen parte de la ruta crítica del proyecto, garantizando la continuidad en la ejecución contractual. En este sentido, se han remitido los siguientes productos:

- Volumen I – Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso, entregado el 13 de febrero de 2026.
- Volumen III – Geología y morfología, entregado el 4 de marzo de 2026.
- Volumen II – Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico, entregado el 11 de marzo de 2026.
- Volumen VI – Estudio de transporte, pasajeros y/o carga y caracterización de la embarcación tipo, entregado el 19 de marzo de 2026.
- Volumen VII – Estudio de alternativas y selección de la alternativa de diseño, entregado el 27 de marzo de 2026.
- Volumen V – Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinámica fluvial, entregado el 31 de marzo de 2026.

• Que actualmente los ensayos de laboratorio asociados a las muestras de suelos (geotecnia) y a los monitoreos ambientales constituyen la ruta crítica del proyecto, toda vez que sus resultados son indispensables para la elaboración, validación y entrega de los volúmenes restantes. De acuerdo con la programación de los laboratorios, dichos resultados estarán disponibles el **24 de abril** de 2026.

• Que los resultados de laboratorio impactan directamente la elaboración del Volumen IV – Estudio de Geotecnia, el cual a su vez es insumo fundamental para el desarrollo del Volumen VIII – Estudio y diseño estructural del muelle y obras complementarias. Este último constituye un componente estructurante del proyecto, del cual dependen otros volúmenes como el Volumen IX – Diseño arquitectónico y urbanístico del terminal o muelle, así como los componentes de gestión, presupuesto y evaluación, incluyendo los Volúmenes X, XI, XII, XIII y XIV.

• Que, teniendo en cuenta que la entrega de los resultados de laboratorio está prevista para el 24 de abril de 2026, fecha para la cual restarían únicamente seis (6) días calendario para la finalización del plazo contractual vigente, dicho término resulta insuficiente para adelantar de manera integral la elaboración, revisión, ajuste y consolidación de los volúmenes que dependen de estos insumos, en particular aquellos asociados a la geotecnia, diseño estructural y demás componentes derivados, razón por la cual se hace necesario contar con un plazo adicional que permita garantizar la calidad técnica y la adecuada finalización de los productos contractuales.

• Que, en consecuencia, y con base en la fecha estimada de entrega de los resultados de laboratorio, se ha estructurado una programación técnica para la culminación de los volúmenes que hacen parte de la ruta crítica del proyecto, estableciendo las siguientes fechas tentativas de entrega:

- Volumen IV – Estudio de Geotecnia: 15 de mayo de 2026.
- Volumen X – Gestión ambiental, social y sostenibilidad: 10 de mayo de 2026.
- Volumen VIII – Estudio y diseño estructural del muelle y obras complementarias: 20 de mayo de 2026.

- Volumen IX – Diseño arquitectónico y urbanístico del terminal o muelle: 20 de mayo de 2026.
- Volumen XII – Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto: 20 de mayo de 2026.
- Volumen XIII – Estudio de evaluación socioeconómica del proyecto: 20 de mayo de 2026.
- Volumen XI – Gestión predial y catastral: 21 de mayo de 2026.
- Volumen XIV – Informe final ejecutivo: 30 de mayo de 2026.

• Que, adicionalmente, se presentaron dificultades logísticas relevantes para el acceso a los municipios de Solita y Solano, en el departamento de Caquetá, los cuales requieren una combinación de transporte aéreo, terrestre y fluvial. El acceso implica desplazamiento aéreo desde Bogotá a Florencia, seguido de un recorrido terrestre aproximado de cinco (5) horas por vía terciaria hasta Solita, y posteriormente un trayecto fluvial de aproximadamente tres (3) horas por el río Caquetá hasta Solano.

• Que las condiciones de acceso, sumadas a la dependencia de horarios de transporte fluvial y la limitada disponibilidad de embarcaciones, generaron restricciones en la movilización del personal técnico y de los equipos de perforación. Estos equipos, debido a su peso y características, requirieron el uso de embarcaciones de mayor capacidad, lo cual implicó coordinaciones logísticas adicionales y retrasos en su movilización y desmovilización.

• Que, en consecuencia, mientras no se cuente con los resultados de laboratorio y no se consoliden los análisis técnicos derivados de estos, no es posible avanzar en la totalidad de los volúmenes que hacen parte de la ruta crítica del proyecto.

• Que, en consideración de lo anterior, se requiere un término adicional de treinta **(30) días** calendario, el cual permitirá: (i) la recepción de resultados de laboratorio, (ii) la elaboración y validación del Volumen IV, (iii) el desarrollo del Volumen VIII y (iv) la integración de los volúmenes subsiguientes dependientes, garantizando la calidad técnica de los productos y el cumplimiento integral del objeto contractual.

3. **Redistribución de recursos:**

   Teniendo en cuenta que la Prórroga No. 2 contempla un (1) mes adicional, y que la dedicación del personal del Grupo No. 1 está definida para cuatro (4) meses, se requiere extender dicha dedicación por un (1) mes adicional, por un valor de $33.568.800, con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo ampliado; así mismo, se incluye un (1) informe mensual adicional, correspondiente al periodo de la prórroga, por un valor de $400.000.

   La presente solicitud no implica adición de recursos, toda vez que el balance se realiza mediante la redistribución interna con cargo a los ítems No. 45 (Perforaciones en roca y/o conglomerado y/o aluviones y/o coluviones), ya que se conocen los metros lineales definitivos de perforación en roca tanto en Solita y Solano, y el ítem No. 50 (Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares) del contrato.

4. **Solicitud**

   Con fundamento en lo expuesto, el Consultor solicita respetuosamente a la Interventoría:

- Emitir concepto favorable para la prórroga del plazo contractual, por un término **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**, entre el **[30/04/2026]** y el **[30/05/2026]**, sin adición al valor del contrato.
- Tener en cuenta que se adjunta una programación actualizada de actividades como soporte técnico del requerimiento.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las observaciones que la Interventoría estime pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO MNF




JOSE EUSEBIO DE LA HOZ
Director de Consultoría

C.C. Ing. Ricardo J. Cogollo P. – Director Interventoría – CONCEP S.A.S.
Anexo: Programación de actividades actualizada.
C.C. Ing. Paola Mahecha Quintero - Apoyo a la Supervisión. – INVIAS

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: (605) 3395171
E-mail.: info@inproyectos.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

CRONOGRAMA: Página 1

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0			**Cronograma general del proyecto**	**148,75 días?**	**mar 16/12/25**	**sáb 30/05/26**
1			Orden de Inicio	0 días	mar 16/12/25	mar 16/12/25
2	**1**		**HITO I & II**	**148,75 días?**	**mar 16/12/25**	**sáb 30/05/26**
3			**INFORMES SEMANALES**	**114,88 días**	**lun 22/12/25**	**lun 27/04/26**
23			**INFORMES MENSUALES**	**83,13 días**	**lun 5/01/26**	**lun 6/04/26**
28			**METODOLOGIAS**	**6 días**	**mar 16/12/25**	**mar 23/12/25**
29			Entrega de Metodologías revisadas y aprobadas por interventoría	6 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25
30			Orden de inicio - Campo	0 días	mar 16/12/25	mar 16/12/25
31	**1.1**		**VOLUMEN I: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN**	**33 días**	**lun 5/01/26**	**vie 13/02/26**
32	1.1.7		Entrega de volumen revisado y aprobado por interventoría	33 días	lun 5/01/26	vie 13/02/26
33	**1.2**		**VOLUMEN II - ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**31,25 días?**	**lun 9/02/26**	**mié 11/03/26**
34			**MUNICIPIO DE SOLITA**	**11 días?**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**
35			Movilización Personal y Equipos	2,25 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26
36			Red Geodesica	2,25 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26
37			Instalación de Mira y Sensor de Niveles	2,25 días	jue 12/02/26	vie 13/02/26
38			Batimetría y Topografia	3,25 días	sáb 14/02/26	mar 17/02/26
39			Vuelo LiDAR	2,25 días?	mar 17/02/26	mié 18/02/26
40			Aforo liquido	1,13 días	vie 13/02/26	vie 13/02/26
41			**MUNICIPIO DE SOLANO**	**7,75 días?**	**jue 19/02/26**	**jue 26/02/26**
42			Red Geodesica	2,25 días?	jue 19/02/26	vie 20/02/26
43			Instalación de mira y sensor de niveles	1,13 días?	vie 20/02/26	sáb 21/02/26
44			Batimetría y topografia	3 días?	dom 22/02/26	mar 24/02/26
45			Vuelo LiDAR	2,25 días?	mié 25/02/26	jue 26/02/26
46			Aforo Liquido	1 día?	dom 22/02/26	dom 22/02/26
47			PROCESAMIENTO Y ENTREGA	27 días	jue 12/02/26	mié 11/03/26
48	**1.3**		**VOLUMEN III - ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y MORFOLOGÍA**	**65,13 días**	**mar 23/12/25**	**mié 4/03/26**
49	1.3.1		Planificación del trabajo de campo	15 días	mar 23/12/25	mié 7/01/26
50	1.3.3		Caracterización geológica	10 días	mié 7/01/26	mar 20/01/26
51	1.3.8		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	5 días	mar 27/01/26	lun 2/02/26
52	1.3.9		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	5 días	lun 9/02/26	vie 13/02/26
53	1.3.7		Entrega de volumen revisado y aprobado por interventoría	5 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26
54	**1.4**		**VOLUMEN IV - ESTUDIO DE GEOTÉCNIA**	**89,25 días**	**mar 10/02/26**	**vie 15/05/26**
55	**1.4.8**		**MUNICIPIO DE SOLITA**	**53,63 días**	**mar 10/02/26**	**lun 6/04/26**
56	1.4.8.1		Exploracion directa del subsuelo	9 días	jue 12/02/26	vie 20/02/26
57	1.4.8.2		Exploración indirecta del subsuelo (lineas sismicas)	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26
58	1.4.8.3		Ensayos de laboratorio - Bloque I	10 días	dom 22/02/26	mar 3/03/26

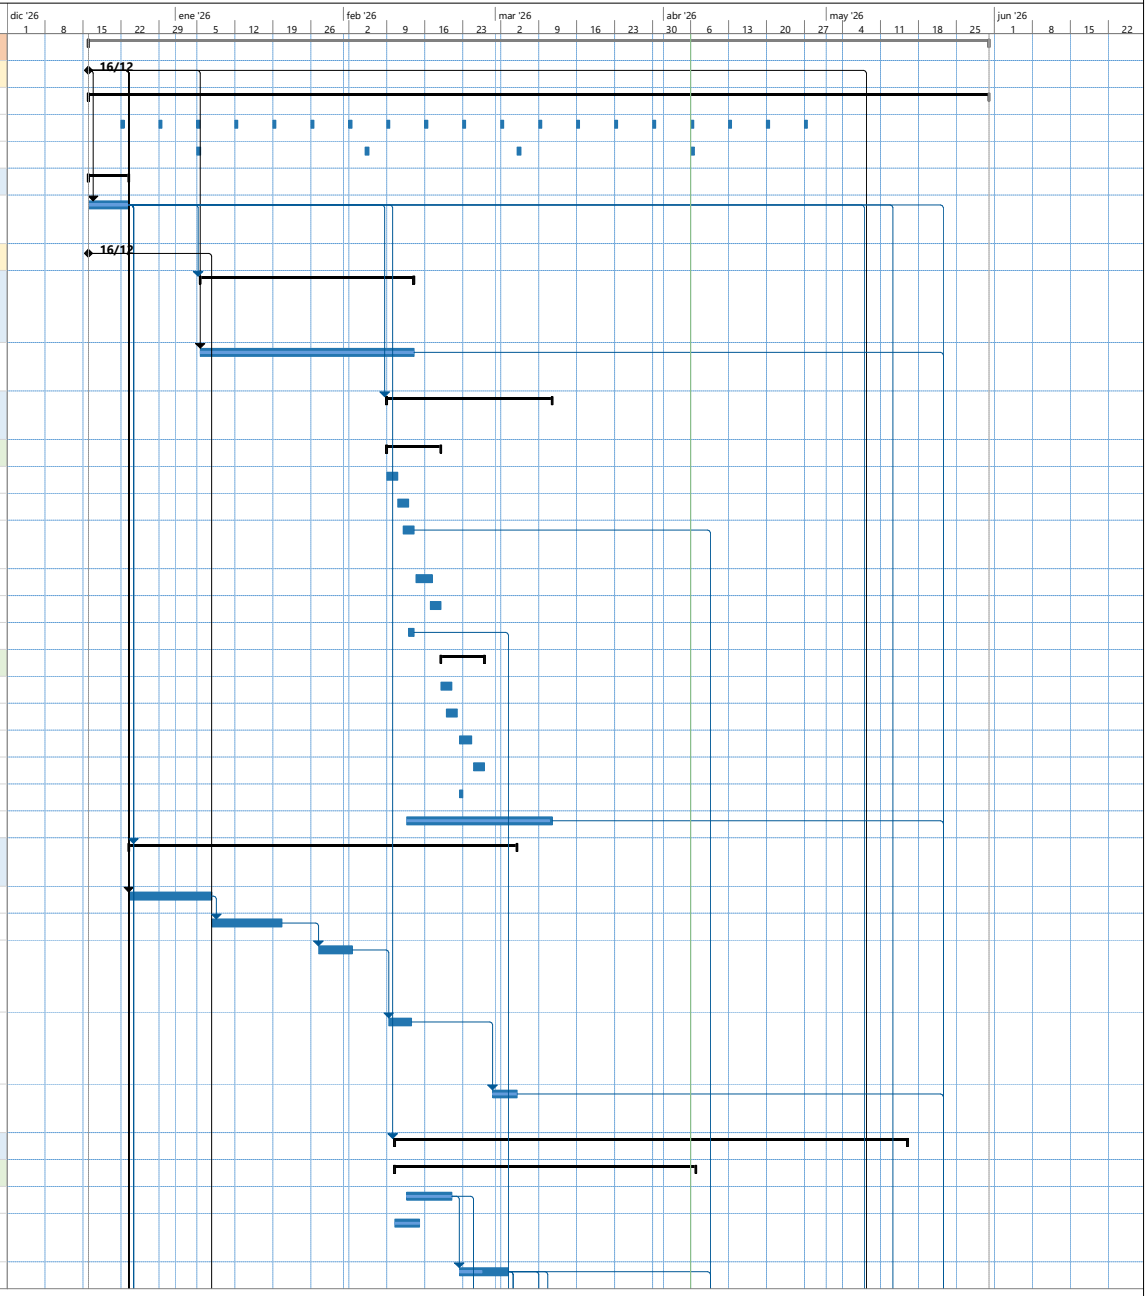


Proyecto: Cronograma general
Fecha: lun 6/04/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

CRONOGRAMA: Página 2

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
59	1.4.8.5		Ensayos de laboratorio - Bloque II	10 días	lun 9/03/26	mié 18/03/26
60	1.4.8.6		Ensayos de laboratorio - Bloque III	10 días	jue 26/03/26	lun 6/04/26
61			**MUNICIPIO DE SOLANO**	**52,25 días**	**sáb 14/02/26**	**jue 9/04/26**
62			Exploracion directa del subsuelo	14 días	mié 25/02/26	mar 10/03/26
63			Exploracion indirecta del subsuelo (lineas sismicas)	5 días	sáb 14/02/26	mié 18/02/26
64			Ensayos de laboratorio - Bloque I	10 días	mar 10/03/26	vie 20/03/26
65			Ensayos de laboratorio - Bloque II	10 días	vie 20/03/26	mié 1/04/26
66			Ensayos de laboratorio - Bloque III	13 días	vie 27/03/26	jue 9/04/26
67			PROCESAMIENTO Y ENTREGA	17,38 días	vie 10/04/26	vie 15/05/26
68	**1.5**		**VOLUMEN V - ESTUDIO DE HIDROLOGÍA. HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	**89,5 días**	**mar 23/12/25**	**mar 31/03/26**
69	1.5.1		Planificación del trabajo de campo	15 días	mar 23/12/25	mié 7/01/26
70	1.5.2		Salida de campo - Análisis de dinámica fluvial	10 días	mié 7/01/26	mar 20/01/26
71	1.5.3		Modelación hidráulica	5 días	mar 3/03/26	sáb 7/03/26
72	1.5.7		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	5 días	vie 13/03/26	mié 18/03/26
73	1.5.4		Entrega de volumen revisado y aprobado por interventoría	5 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26
74	**1.6**		**VOLUMEN VI - ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS**	**79,5 días**	**mar 23/12/25**	**jue 19/03/26**
75	1.6.1		Recopilación de información	16 días	mar 23/12/25	jue 8/01/26
76	1.6.3		Identificación de embarcación tipo	14 días	jue 8/01/26	mar 27/01/26
77	1.6.4		Análisis operativo	18 días	mar 27/01/26	lun 16/02/26
78	1.6.7		Entrega de volumen revisado y aprobado por interventoría	16 días	mar 3/03/26	jue 19/03/26
79	**1.7**		**VOLUMEN VII - ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	**134 días**	**mar 23/12/25**	**mié 20/05/26**
80	1.7.1		Definición de criterios	7 días	mar 23/12/25	mar 30/12/25
81	1.7.2		Formulación de alternativas	10 días	mar 3/03/26	vie 13/03/26
82	1.7.3		Evaluación multicriterio	9 días	vie 20/03/26	mar 31/03/26
83	1.7.4		Entrega de volumen revisado y aprobado por interventoría	7 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26
84	**1.8**		**VOLUMEN VIII - ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**133 días**	**mar 23/12/25**	**mié 20/05/26**
85	1.8.1		Revisión de criterios	10 días	mar 23/12/25	vie 2/01/26
86	1.8.2		Modelación estructural	10 días	vie 2/01/26	mié 14/01/26
87	1.8.3		Diseño propuesto	15 días	jue 9/04/26	lun 27/04/26
88	1.8.4		Diseño de obras complementarias	5 días	lun 4/05/26	vie 8/05/26
89	1.8.7		Entrega de volumen revisado y aprobado por interventoría	9 días	dom 10/05/26	mié 20/05/26
90	**1.9**		**VOLUMEN IX - DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANISTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	**133,38 días**	**mar 23/12/25**	**mié 20/05/26**
91	1.9.2		Programa arquitectónico	15 días	mar 23/12/25	mié 7/01/26

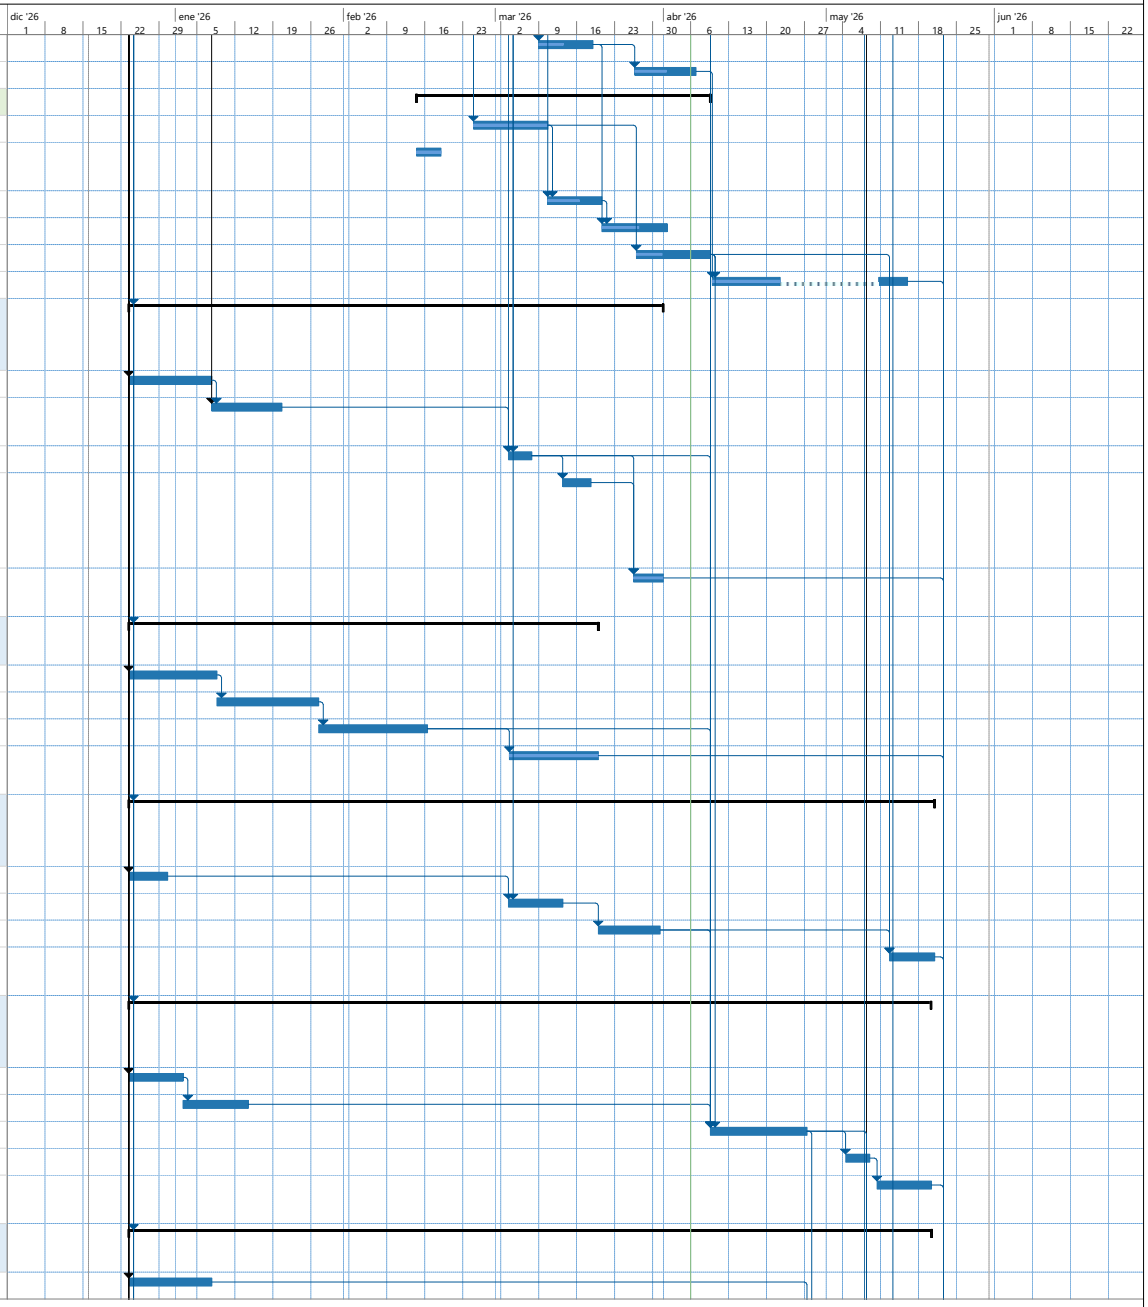


Proyecto: Cronograma general
Fecha: lun 6/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

CRONOGRAMA: Página 3

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
92	1.9.3		Diseño base	10 días	lun 27/04/26	vie 8/05/26
93	1.9.4		Articulación urbanística	5 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26
94	1.9.7		Entrega de volumen revisado y aprobado por interventoría	5 días	jue 14/05/26	mié 20/05/26
95	**1.2**		**VOLUMEN X - GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**124,88 días**	**mar 23/12/25**	**dom 10/05/26**
96	1.2.1		Visita - Identificación de impactos y recoleccion de muestras	5 días	mar 23/12/25	dom 28/12/25
97	1.2.2		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor	15 días	dom 28/12/25	mié 14/01/26
98	1.2.3		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría	15 días	mié 14/01/26	lun 2/02/26
99	1.2.4		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría	15 días	lun 2/02/26	mié 18/02/26
100	1.2.8		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	15 días	mié 18/02/26	mié 4/03/26
101	1.2.9		Estudio de monitoreos ambientales	34 días	jue 5/03/26	vie 10/04/26
102	1.2.7		Entrega de volumen revisado y aprobado por interventoría	20 días	jue 16/04/26	dom 10/05/26
103	**1.2**		**VOLUMEN XI - GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**134,88 días**	**mar 23/12/25**	**jue 21/05/26**
104	1.2.1		Revisión normativa predial	23 días	mar 23/12/25	vie 16/01/26
105	1.2.2		Información catastral	23 días	lun 19/01/26	sáb 14/02/26
106	1.2.6		Entrega de volumen revisado y aprobado por interventoría	10 días	dom 10/05/26	jue 21/05/26
107	**1.3**		**VOLUMEN XII - ESTUDIO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**10 días**	**vie 8/05/26**	**mié 20/05/26**
108	1.3.1		Extracción de cantidades y análisis de precios unitarios	5 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26
109	1.3.5		Entrega de volumen revisado y aprobado por interventoría	5 días	mié 13/05/26	mié 20/05/26
110	**1.4**		**VOLUMEN XIII - ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA**	**5 días**	**mié 13/05/26**	**mié 20/05/26**
111	1.4.6		Entrega de volumen revisado y aprobado por interventoría	5 días	mié 13/05/26	mié 20/05/26
112	**1.5**		**VOLUMEN XIV - INFORME FINAL EJECUTIVO**	**7 días**	**vie 22/05/26**	**sáb 30/05/26**
113	1.5.1		Entrega de Volumen revisado y aprobado por la interventoría	7 días	vie 22/05/26	sáb 30/05/26
114			Fin	0 días	sáb 30/05/26	sáb 30/05/26

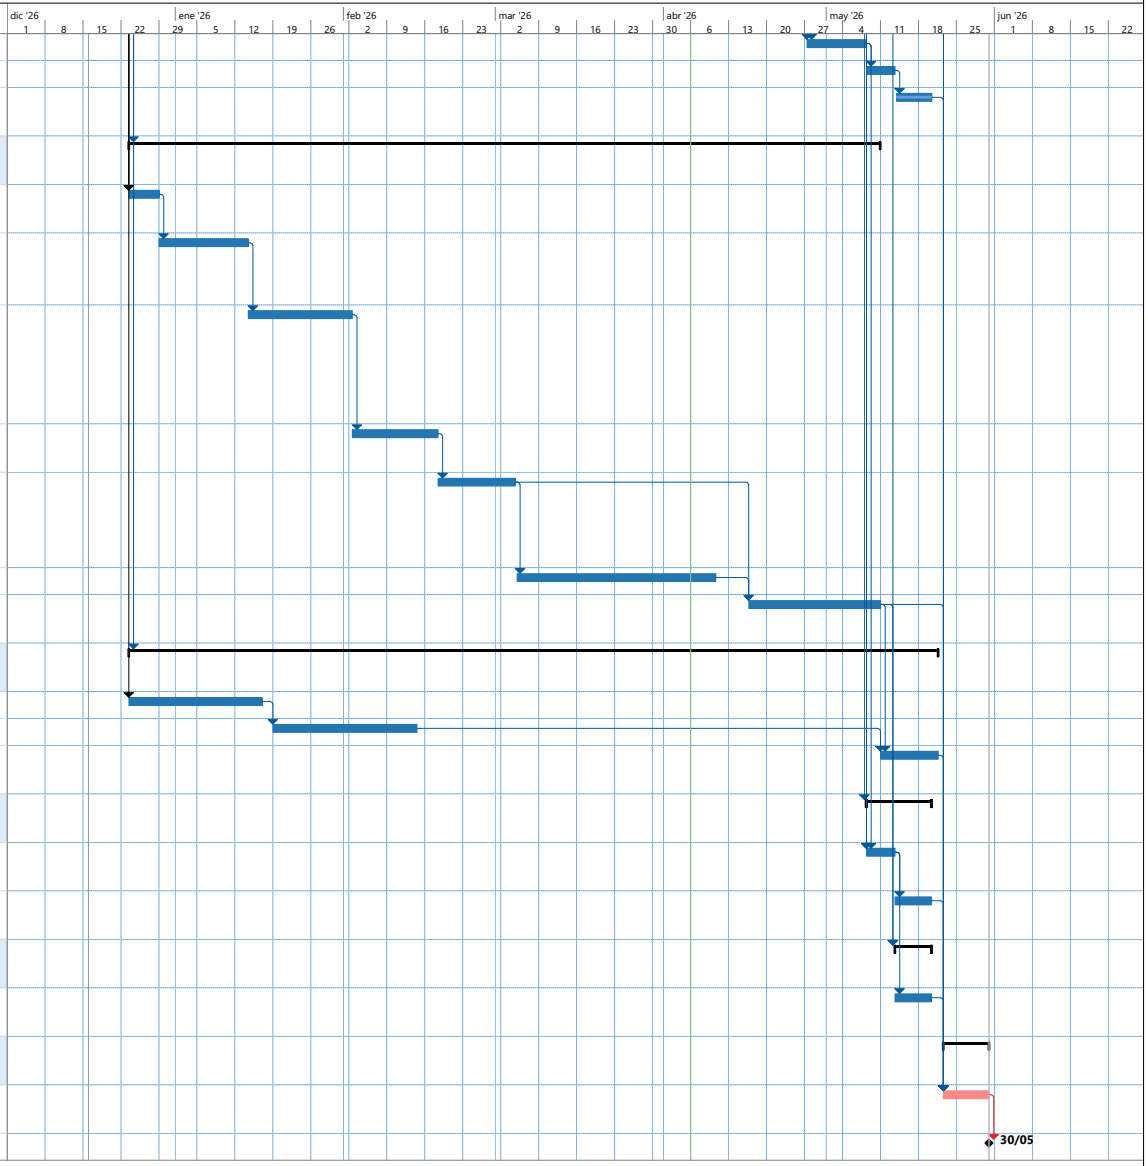

Proyecto: Cronograma general
Fecha: lun 6/04/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual
