CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 177 DE 2025

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE IBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCIÓN NO. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”

CONTRATO DE OBRA No. 174 DE 2025

OBJETO:

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCIÓN NO. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL No. 1

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS

Ingeniero Civil

ABRIL 2026

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 4
1. OBJETIVOS 5
1.1 OBJETIVO GENERAL 5
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8
2.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 9
3. ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 10
3.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO 10
3.2 MINUTAS Y ACTAS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA 10
3.3 CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO 10
3.4 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
3.5 MINUTAS Y ACTAS LEGALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
3.6 CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
3.7 VINCULACIÓN, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA. 12
3.8 VINCULACIÓN, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 12
4. ÁREA TÉCNICA 13
4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL No. 1. 13
4.2 AVANCE FÍSICO DE OBRA 30
4.3 ACTUACIONES DE LA INTERVENTORIA 35
4.4 BITÁCORA DE OBRA 35
5. ÁREA FINANCIERA 36
5.1 ANTICIPO 36

5.2 EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRA 36
5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA DE INTERVENTORIA 36
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 37
6.1 CONCLUSIONES 37
6.2 RECOMENDACIONES 37
7. ANEXOS 38
- Seguridad social personal contratista de obra. 38
- Acta parcial No. 1 del contratista. 38
- Memorias de cantidades. 38
- RUT contratista. 38
- Certificación parafiscales contratista. 38
- Factura contratista. 38
- Certificación bancaria contratista. 38

HOSAC Hospital Santa Ana de los Caballeros Empresa Social del Estado Ansermanuevo - Valle del Cauca	**CONTRATO DE OBRA No. 174 DE 2025** **INFORME ACTA PARCIAL No. 1** **07 DE ABRIL DE 2026**	**MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS** **Ingeniero Civil**

INTRODUCCIÓN

En el marco del proyecto de infraestructura referente a la recuperación de los puestos de salud municipales, en este caso para la comunidad del corregimiento de “El Villar”, municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca, el ingeniero civil MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS, se permite mostrar el avance de la adecuación del puesto de salud del sector, en cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el marco del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 177 DE 2025, el cual tiene por objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE IBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCIÓN No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”.

El presente informe corresponde a la evaluación del acta parcial No. 1, de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 174 DE 2025, celebrado entre el hospital Santa Ana de los Caballeros y la firma CEIMCOL GROUP, cuyo objeto es: “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCIÓN No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Verificar el avance del acta parcial No. 1, ejecutado de obra física, por parte del contratista de obra.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir el estado del contrato en función de las actividades realizadas en sitio.
- Verificar el avance físico del proyecto en cada una de las actividades descritas en el presupuesto oficial.
- Describir el análisis financiero en la que se encuentra el proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto denominado “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCIÓN No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”, corresponde a la adecuación de los espacios del puesto de salud del corregimiento de El Villar en el municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca, con el cual se pretende mejorar las condiciones para la prestación del servicio a la comunidad del sector.

El proyecto dentro de su contexto, contempla la remodelación de la cubierta, mejoramiento de pisos y paredes, enchape de baterías sanitarias, reposición de la red eléctrica y la instalación de cielo raso. Este proyecto se lleva a cabo por parte del hospital Santa Ana de los Caballeros, con recursos girados por el ministerio de salud, según resolución 1984 de 2024.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el corregimiento denominado “El Villar”, del municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca.



Imagen 1. Localización Geográfica Municipio de Ansermanuevo – Valle del Cauca.

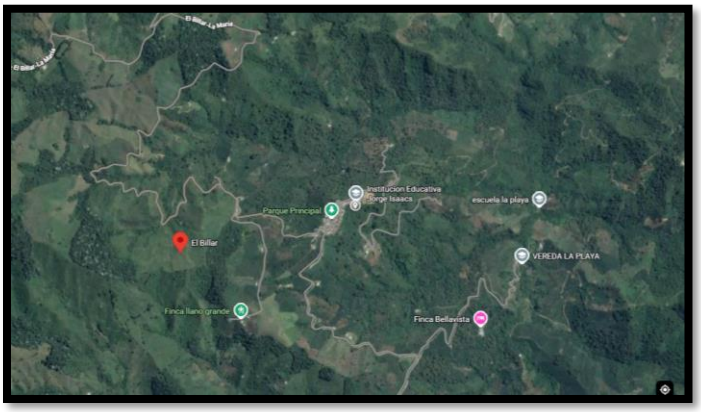


Imagen 2. Localización Geográfica del Corregimiento de El Villar.

https://www.google.com/maps/place/El+Billar,+Ansermanuevo,+Valle+del+Cauca/@4.8186958,-76.1004502,3311m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e380cba2b6a5275:0x36f14943f51b9dca!8m2!3d4.81673!4d-76.1!16s%2Fg%2F1tfqb86n?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Fuente: Google Maps.

2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS Nit: 891.900.446-6
CONTRATO DE OBRA No:	174 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCIÓN NO. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA:	GEIMCOL GROUP S.A.S. R.L: KLINGER YAMILETH CARDONA C.C. 66.850.906
INTERVENTORÍA:	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
VALOR CONTRATO DE OBRA:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($442.669.774)
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA:	TREINTA (30) DIAS.
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2026

2.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS Nit: 891.900.446-6
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	177 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE IBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCIÓN NO. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA:	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS C.C. 16.804.000
VALOR CONTRATO DE OBRA:	VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($23.225.780,00)
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA:	TREINTA (30) DIAS.
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2026

3. ÁREA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

3.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 174-2025, se encuentra vigente con acta de inicio de obra legalizada el 26 de diciembre de 2025 y en ejecución, con un plazo de tres (03) meses y hasta la fecha no se ha realizado ninguna suspensión o prorroga al contrato, por lo que la fecha programada de terminación es el 26 de abril de 2025.

3.2 MINUTAS Y ACTAS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relacionan las actas legales y minutas suscritas por parte del contratista de la obra, GEIMCOL GROUP S.A.S., hasta el periodo de redacción de este informe.

ACTAS / MINUTAS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA	
Minuta del Contrato	22 de diciembre de 2025
Acta de inicio de Obra	26 de diciembre de 2025

3.3 CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan las pólizas a favor de HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS – MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA, según los parámetros descritos en el TERMINO 9 (GARANTÍA) del contrato de obra No. 174-2025.

GEIMCOL GROUP S.A.S					**VIGENCIA**	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**AMPARO**	**PÓLIZA N°**	**VALOR**	**%**	**DESDE**	**HASTA**
ASEGURADORA SOLIDARIA	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	465-74-994000004577	$284.700.000	10%	22-DIC-2025	01-ABR-2026
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	465-47-994000015244	$88.533.954,80	20%	22-DIC-2025	01-AGO-2026
ASEGURADORA SOLIDARIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	465-47-994000015244	$44,266,977.40	10%	22-DIC-2025	01-ABR-2029

	SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	465-47-994000015244	$132,800,932.20	30%	POR 5 AÑOS	
VALOR TOTAL ASEGURADO			**$ 550.301.864.40**			

3.4 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato No. 177 de 2025, se encuentra vigente y en ejecución desde la suscripción del acta de inicio el día 26 de diciembre de 2025, teniendo como fecha de terminación final de 26 de abril de 2025.

3.5 MINUTAS Y ACTAS LEGALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

A continuación, se relacionan las actas legales y minutas suscritas por parte del contratista de la interventoria, ingeniero MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS., hasta el periodo de redacción de este informe.

ACTAS / MINUTAS LEGALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Minuta del Contrato	23 de diciembre de 2025
Acta de inicio de Obra	26 de diciembre de 2025

3.6 CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

A continuación, se relacionan las pólizas a favor de HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS – MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA, del contrato de interventoria No. 177-2025.

INGENIERÍAS DE OCCIDENTE SAS					**VIGENCIA**	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**AMPARO**	**PÓLIZA N°**	**VALOR**	**%**	**DESDE**	**HASTA**
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	420-47-994000049261	$ 2.322.578,00	10%	23/12/2025	30/07/2027

ASEGURADORA SOLIDARIA	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	420-47-994000049261	$ 1.161.289,00	5%	23/12/2025	30/03/2029
ASEGURADORA SOLIDARIA	CALIDAD DEL SERVICIO	420-47-994000049261	$ 2.322.578,00	10%	30/03/2026	30/03/2031
VALOR TOTAL ASEGURADO			**$ 5.806.445,00**			

3.7 VINCULACIÓN, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA.

Se relaciona el personal profesional en obra por parte del contratista de obra.

N°	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Edgar Leodán Armero López	DIRECTOR	50%
2	Iván Mauricio Torres	RESIDENTE	100%
3	Angie Lorena Coba Álvarez	PROFESIONAL SGSST	100%
4	Luis Gonzaga Carmona	MAESTRO DE OBRA	100%

En los anexos, se relaciona La información correspondiente a pagos de seguridad social y parafiscales del contratista de obra.

3.8 VINCULACIÓN, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

A continuación, se relaciona el personal activo en obra por parte de la interventoria y la seguridad social correspondiente.

N°	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS	ING. DIRECTOR	50%
2	NATALIA ANDREA RESTREPO MEJÍA	ING. RESIDENTE	100%

En los anexos, se relaciona La información correspondiente a pagos de seguridad social y parafiscales del personal de interventoria.

_____

4. ÁREA TÉCNICA


4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL No. 1.

En el presente periodo, el contratista de obra ejecuto las siguientes actividades:

Demolición de pisos: Se llevo a cabo la demolición y el retiro de la baldosa existente en todas las áreas del puesto de salud.




Demolición de enchape de pared: Se retiro el enchape de pared de los baños existentes.

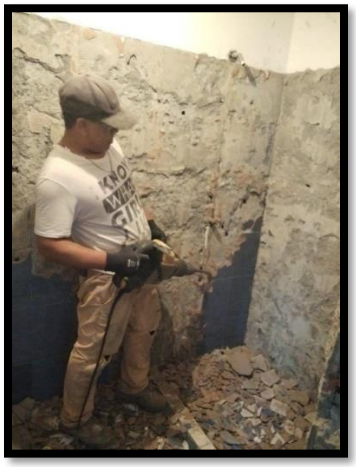

Demolicion de rampa existente: Se demolio rampa existente que no cumplía con las condiciones técnicas para acceso de personar con limitación de la movilidad.



Desmonte de aparatos sanitarios: Se retiraron los sanitarios de los cinco baños existentes.

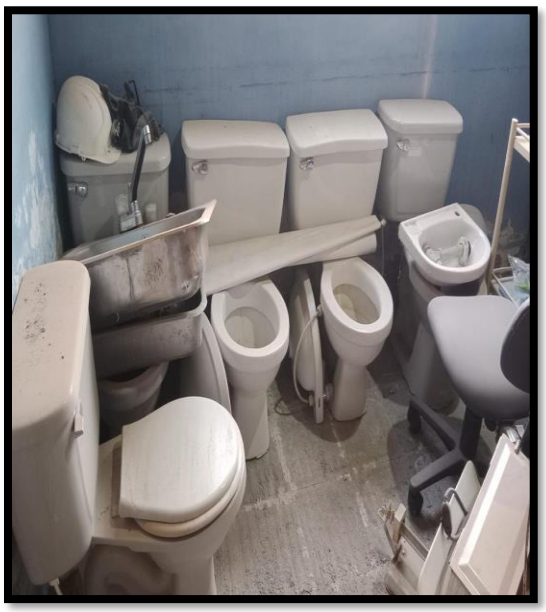

Desmonte de puertas: Se retiraron las puertas existentes en el interior del puesto de salud.



Demolicion guarda escoba: Se realizo la demolición y retiro del guarda escoba en las diferentes áreas.



Instalación llave de paso: Se realizo la conexión de la llave de paso principal para suministro de agua al puesto de salud.




Instalación de red hidráulica: Se realizo la instalación de la tubería hidráulica, tanto en muros como elevada.





Instalación de tubería sanitaria: Se reemplazo la tubería sanitaria de la red existente.



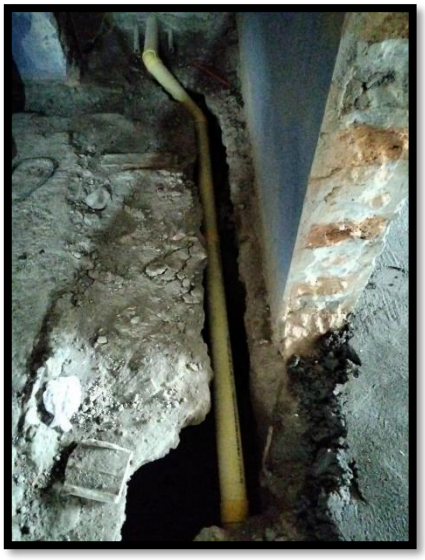

Punto de agua fría pvc: Se realizo la instalación de los puntos de agua necesarios, tanto en las baterías sanitarias, como en la zona de lavado.



Teja sándwich 1C acero galv-1C foil vinilo: Se instalo toda la teja de la cubierta existente.



C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO - 1/2" RH : Se instalo en la parte interna, el cielo falso de las diferentes áreas.



CERÁMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3-4: Se instalo la cerámica correspondiente de las baterías sanitarias.



ESTUCO PLÁSTICO MURO [PASTA]: Se avanzo en la aplicación del estuco plástico en muros internos.



RELLENO EXTERIOR MURO: Se avanzo en el relleno de muros internos.



RASQUETEADA-LIJADA-RESANE: Se avanzo en el relleno de muros internos.



DESMONTE LAVAMANOS CERÁMICO: Se retiraron los lavamos en cerámica existentes.



DESMONTE LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE: Se retiraron los lavamos en acero inoxidable existentes.



CONSTRUCCIÓN RAMPA DE INGRESO: Se avanza en la construcción de rampa para acceso de personas con limitaciones.



ALISTADO PISO EN MORTERO 1:3 (E:8.0 CM): Se instalo el alistado de piso en las diferentes áreas.



HOSAC Hospital Santa Ana de los Caballeros Empresa Social del Estado Ansermanuevo - Valle del Cauca	**CONTRATO DE OBRA No. 174 DE 2025** **INFORME ACTA PARCIAL No. 1** **07 DE ABRIL DE 2026**	**MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS** **Ingeniero Civil**

DEMOLICIÓN ALFAJÍA EXTERIOR: Se demolieron las alfajías del jardín de la fachada.



DESMONTE DE CAMILLA DE ODONTOLOGÍA: Se desmonto con extremo cuidado, la camilla existente de odontología empotrada al suelo con conexiones eléctricas e hidráulicas.



DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO: Se demolió mesones existentes en granito en áreas de odontología, consultorios 1 y consultorio 3.



PINTURA DE CERCHA ACTUAL: Se realizo la pintura con compresor, de las cerchas metálicas de la cubierta.



PERFIL DE 8CM X 4CM: Se instalaron perfiles para brindar soporte a la teja de la cubierta.



DEMOLICIÓN Y RETIRO MATERAS EXTERIORES + RELLENO Y FUNDICIÓN DE PLACA: Se demolieron las materas ubicadas en la fachada.



REPELLO ÁREA GUARDAESCOBAS: Se repello el área de guardaescobas en las diferentes áreas.



REPELLO ÁREA PAREDES: Se repellaron las áreas necesarias de los muros mas deteriorados.



REPELLO CULATAS: Se repellaron las culatas exteriores en la parte de atrás.



REPELLO VANOS PUERTAS: Se repellaron los vanos de las puertas existentes.



CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN: Se construyó el andes de la fachada.



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO SOSCO 3" X 2": Se instalaron las rejillas en los desagües existentes.



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULACIÓN DE 1/2": Se instalaron las válvulas en los baños existentes.



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORTINA 1/2"-250 PSI RED WHITE: Se instalo válvula en la parte exterior.



4.2 AVANCE FÍSICO DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			OBRA EJECUTADA
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**	**UN**	**TOTAL ACUMULADO** **CANTIDAD**
01	**OBRAS PRELIMINARES URBANISTICAS**		
010216	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3	0,00
10	**OBRAS PRELIMINARES**		
100124	CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=2.10M	ML	0,00
100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	239,64
100419	DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2	0,00
100505	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	245,04
100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	5,00
100308	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	137,10
100539	RETIRO TUBERIA AGUA-DESAGUE PVC-HF-AC-XXX	ML	0,00
100551	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	0,00
15	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
150306	ARREGLO PUNTO SANITARIO	UND	22,00
110118	CAJA INSPECCION 70x 70 CM [CONCRETO]	UND	0,00
110119	CAJA INSPECCION 90x 90 CM [CONCRETO]	UND	0,00
150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	0,00
150104	TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	0,00

150107	TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)	ML	0,00
150110	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	0,00
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		
160801	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	22,00
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	0,00
176016	CABLE TRENZADO 3X12 HL-FR AWG-NORMAL	ML	0,00
173003	TUBERIA EMT 3/4	ML	0,00
18	**ESTRUCTURA - CUBIERTA**		
180823	TEJA SANDWICH 1C-ACERO GALV-1C FOIL VINILO E=30MM	M2	245,04
180323	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 20C	ML	0,00
180404	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO - 1/2" RH	M2	167,27
180410	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO	M2	0,00
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	0,00
182146	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -2.5MM C.12	ML	0,00
130801	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KLS	0,00
20	**PISOS Y ENCHAPES**		
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	0,00
200228	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3-4	M2	82,65
190806	ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60 RECTIFICADO	M2	0,00
21	**CARPINTERIA MADERA**		

211102	NAVE MAD. RH 81-100 -1N-BATIENTE ENTAMBORADA	UND	0,00
210409	MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH 15MM	ML	0,00
25	**DUCTOS Y CANALIZACIONES**		
250403	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	0,00
250425	TAZA ALONGADO ENTRADA SUPERIOR	UND	0,00
250518	GRIFO LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA MEDIA	UND	0,00
250712	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATAS	UND	0,00
250438	ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM	UND	0,00
26	**VIDRIOS - ESPEJOS**		
260202	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	0,00
29	**ESTUCO Y PINTURA**		
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	466,54
290102	RELLENO EXTERIOR MURO	M2	233,27
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	538,69
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	0,00
290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	0,00
31	**LIMPIEZA Y VARIOS**		
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	0,00
33	**EQUIPO Y MAQUINARIA DE OBRA**		

330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS	UND	0,00
OE	**OBRAS EXTRAS**		
OE-01	DESMONTE LAVAMANOS CERAMICO	UND	5,00
OE-02	DESMONTE LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE	UND	6,00
OE-03	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE DOBLE NAVE EN ALUMINIO ENTAMBORADA (A: 1.5M-2.0M_ H: 2.0M-2.2M) +MARCO EN ALUMINIO + CERRADURA	M2	0,00
OE-04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA SENCILLA (A: 0.6M-1.0M_ H: 2.0M-2.2M)	M2	0,00
OE-05	BARRAS DE SEGURIDAD PARA SANITARIO EN U PARED O FIJA PISO EN ACERO INOX_WC PMR	UND	0,00
OE-06	DEMOLICIÓN RAMPA EN LOSETA GRES	M2	14,55
OE-07	CONSTRUCCIÓN RAMPA DE INGRESO	M2	10,40
OE-08	SALIDA S1 EMT_INTERRUPTOR SENCILLO	UND	0,00
OE-09	SALIDA TOMA 120 V EMT	UND	0,00
OE-10	PANEL LED 60X60 48W, INCLUYE MARCO SOPORTE.	UND	0,00
OE-11	SALIDA LAMP EMT	UND	0,00
OE-12	BALA PANEL LED CIRCULAR 18 W INCRUSTAR	UND	0,00
OE-13	APERTURA DE VANOS EN CIELO FALSO LAMPARA, VENTANILLAS DE INSPECCION.	UND	0,00
OE-14	DUCHA SENCILLA	UND	0,00
OE-15	ALISTADO PISO EN MORTERO 1:3 (E:8.0 CM)	M2	167,27

OE-16	PASAMANO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES	ML	0,00
OE-17	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	M2	0,00
OE-18	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA	UN	0,00
OE-19	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EXTERIOR	ML	8,70
OE-20	DESMONTE DE CAMILLA DE ODONTOLOGÍA	UND	1,00
OE-21	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO	M2	7,64
OE-22	PINTURA DE CERCHA ACTUAL	ML	215,00
OE-23	PERFIL DE 8CM X 4CM	UND	20,00
OE-24	GRANIPLAST FACHADA	M2	0,00
OE-25	DEMOLICIÓN Y RETIRO MATERAS EXTERIORES + RELLENO Y FUNDICIÓN DE PLACA	UND	2,00
OE-26	REPELLO ÁREA GUARDAESCOBAS	ML	137,10
OE-27	REPELLO ÁREA PAREDES	M2	83,71
OE-28	REPELLO CULATAS	M2	72,15
OE-29	REPELLO VANOS DE PUERTAS	ML	59,11
OE-30	CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN	M2	6,31
OE-31	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE REJILLA DE PISO SOSCO 3" X 2"	UND	6,00
OE-32	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VALVULA REGULACIÓN DE 1/2"	UND	7,00
OE-33	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VALVULA CORTINA 1/2"-250 PSI RED WHITE	UND	1,00

OE-34	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PLÁSTICA 6" X 6" (15 X 15 CM)	UND	0,00
OE-35	INCREMENTO EN COSTO DIRECTO POR DISTANCIA Y GRADO DE DIFICULTAD (DCTO 1.22-0475 DE 2025_GOBERNACIÓN DEL VALLE)	UND	0,05

4.3 ACTUACIONES DE LA INTERVENTORIA

La interventoría ha realizado el seguimiento, control y supervisión al contrato de obra, según lo estipulado en el contrato de interventoría **No. 177-2025**. De acuerdo en lo planteado en la ley 80 de 1983.

Durante el periodo comprendido en este informe que corresponde al periodo de este informe mensual, la interventoría realizó las siguientes actuaciones.

- Realizo las inspecciones constantes en tiempo real de las actividades ejecutadas.

- Verifico el equipo en obra constantemente.

- Comprobó la afiliación a la seguridad social de cada uno de los trabajadores en obra.

- Atendió frecuentemente las inquietudes de la comunidad con relación al proyecto.

4.4 BITÁCORA DE OBRA

En la bitácora de obra se registra diariamente las actividades de obra ejecutadas, se realiza el control del personal, el estado del tiempo, la relación del equipo usado, observaciones, recomendaciones y/o sugerencias que se consideren importantes para tener en registro. La bitácora de obra se realiza conjuntamente entre el contratista de obra y la interventoría, la cual debe ser firmada por el personal autorizado de ambas partes.

5. ÁREA FINANCIERA

5.1 ANTICIPO

El proyecto con conto con avance por concepto de anticipo.

5.2 EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRA

Se presenta el balance financiero del contrato de obra, el cual se encuentra en blanco, debido a que no se ha realizado ningún pago de acta parcial correspondiente a la fecha de este informe.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR DEL CONTRATO	$442.669.774,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	--
SALDO POR EJECUTAR	--
PORCENTAJE EJECUTADO	--

5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA DE INTERVENTORIA

Para el periodo comprendido en este informe mensual de interventoría se presenta el balance financiero del contrato el cual se encuentra en blanco, debido a que no se ha realizado ningún pago de acta parcial correspondiente a la fecha de este informe.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR DEL CONTRATO	$23.225.780,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	--
SALDO POR EJECUTAR	--
PORCENTAJE EJECUTADO	--


6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe, se ha obtenido un avance físico del 70%, sin embargo, el contratista, con la presentación del acta parcial No. 1, esta cobrando un porcentaje del 42,38%.
- Los rendimientos de las actividades no han sido muy eficientes, por lo que, se tienen retrasos en el proyecto.
- Los estándares de calidad del proyecto están garantizados gracias a la buena ejecución por parte del contratista.

6.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista mantener el acopio del material suficiente para garantizar un avance continuo y no generar retrasos.
- Continuar con lo debida señalización de los diferentes frentes de obra, velando constantemente por su buen estado para garantizar su correcta función
- Mejorar los rendimientos de ejecución para poder que no se sigan generan atrasos en la obra.



ING. MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS

Director Interventoria

7. ANEXOS

- Seguridad social personal contratista de obra.
- Acta parcial No. 1 del contratista.
- Memorias de cantidades.
- RUT contratista.
- Certificación parafiscales contratista.
- Factura contratista.
- Certificación bancaria contratista.

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900594576	3	CEIMCOL GROUP SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	ADMON	CRA 35A 4A 60	CALI-VALLE	3154418037	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	54139671	9499527274	E	2026/02/18	2026/02/11	BANCO AV VILLAS	0	$10,123,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON (15 Afiliados)																								$34,614,148	$5,538,700			$34,614,148	$1,385,100			$34,483,186	$1,379,800			$34,614,148		$1,819,900		$0	$0		$10,123,500
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								$3,657,813	$585,300			$3,657,813	$146,400			$3,526,851	$141,100			$3,657,813		$15,600		$0	$0		$888,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																								$3,657,813	$585,300			$3,657,813	$146,400			$3,526,851	$141,100			$3,657,813		$15,600		$0	$0		$888,400
1	CC	1144149553	ORDOÑEZ YISETH													X					23030 1	12	$700,362	$112,100	EPS01 0	12	$700,362	$28,100	CCF57	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$700,362	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$163,000
2	CC	1144149553	ORDOÑEZ YISETH							X											23030 1	18	$1,440,000	$230,400	EPS01 0	18	$1,440,000	$57,600	CCF57	18	$1,440,000	$57,600	14-11	18	$1,440,000	0.522%	$7,600	18	$0	$0	Si	$353,200
3	CC	38550792	SANDOVAL ANGIE	X																	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS00 5	26	$1,517,451	$60,700	CCF57	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	0.522%	$8,000	26	$0	$0	Si	$372,200
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)																								$7,750,905	$1,240,200			$7,750,905	$310,100			$7,750,905	$310,100			$7,750,905		$188,900		$0	$0		$2,049,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																								$7,750,905	$1,240,200			$7,750,905	$310,100			$7,750,905	$310,100			$7,750,905		$188,900		$0	$0		$2,049,300
4	CC	66850906	CARDONA YAMILETH																		25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS01 0	30	$6,000,000	$240,000	CCF57	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	2.436%	$146,200	30	$0	$0	Si	$1,586,200
5	CC	63448314	ECHEVERRI DIANA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)																								$23,205,430	$3,713,200			$23,205,430	$928,600			$23,205,430	$928,600			$23,205,430		$1,615,400		$0	$0		$7,185,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)																								$23,205,430	$3,713,200			$23,205,430	$928,600			$23,205,430	$928,600			$23,205,430		$1,615,400		$0	$0		$7,185,800
6	CC	1007753298	ANDRADE JUAN																		25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS03 7	30	$2,300,000	$92,000	CCF57	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
7	CC	12752238	ARMERO EDGAR							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	1006343585	BAHOS ESTEBAN																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS01 0	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
9	CC	1143939324	BENAVIDES MICHAEL							X											23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	1116443310	COBA ANGIE																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS03 7	30	$2,100,000	$84,000	CCF57	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	Si	$650,200
11	CC	1108654778	CORTES JUAN							X											23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 0	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	PT	6636827	GONZALEZ ROMER							X											23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPSC3 4	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	PT	5275168	MOLINA ABRAHAN							X											23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 8	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
14	PT	4907063	MOLINA JORGE							X											23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 8	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	CC	67019458	QUESADA PAOLA							X											23020 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS01 2	30	$2,300,000	$92,000	CCF57	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
16	CC	94320328	TORRES IVAN							X											25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS00 5	30	$4,000,000	$160,000	CCF57	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
Total			**Afiliados(15)**																					$34,614,148	$5,538,700			$34,614,148	$1,385,100			$34,483,186	$1,379,800			$34,614,148		$1,819,900		$0	$0		$10,123,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$5,538,700	$0	$0	$5,538,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,771,200	$0	$0	$2,771,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,399,500	$0	$0	$2,399,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$368,000	$0	$0	$368,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,819,900	$0	$0	$1,819,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,819,900	$0	$0	$1,819,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,379,800	$0	$0	$1,379,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	15	$1,379,800	$0	$0	$1,379,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$1,385,100	$0	$0	$1,385,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$92,000	$0	$0	$92,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$475,800	$0	$0	$475,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$316,200	$0	$0	$316,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$290,800	$0	$0	$290,800
TOTAL				**15**	**$10,123,500**	**$0**	**$0**	**$10,123,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900594576	3	CEIMCOL GROUP SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	ADMON	CRA 35A 4A 60	CALI-VALLE	3154418037	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	147720654	9501512953	E	2026/03/18	2026/03/17	BANCO AV VILLAS	0	$9,864,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON (15 Afiliados)																								$33,957,241	$5,433,700			$33,957,241	$1,356,500			$33,957,241	$1,356,500			$33,957,241		$1,717,700		$0	$0		$9,864,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								$4,150,905	$664,200			$4,150,905	$166,100			$4,150,905	$166,100			$4,150,905		$21,800		$0	$0		$1,018,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																								$4,150,905	$664,200			$4,150,905	$166,100			$4,150,905	$166,100			$4,150,905		$21,800		$0	$0		$1,018,200
1	CC	1144149553	ORDOÑEZ YISETH																			230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF57	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	Si	$588,600
2	CC	38550792	SANDOVAL ANGIE																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)																								$7,750,905	$1,240,200			$7,750,905	$310,100			$7,750,905	$310,100			$7,750,905		$188,900		$0	$0		$2,049,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																								$7,750,905	$1,240,200			$7,750,905	$310,100			$7,750,905	$310,100			$7,750,905		$188,900		$0	$0		$2,049,300
3	CC	66850906	CARDONA YAMILETH																			25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF57	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	2.436%	$146,200	30	$0	$0	Si	$1,586,200
4	CC	63448314	ECHEVERRI DIANA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)																								$22,055,431	$3,529,300			$22,055,431	$880,300			$22,055,431	$880,300			$22,055,431		$1,507,000		$0	$0		$6,796,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)																								$22,055,431	$3,529,300			$22,055,431	$880,300			$22,055,431	$880,300			$22,055,431		$1,507,000		$0	$0		$6,796,900
5	CC	1007753298	ANDRADE JUAN		X																	25-14	15	$1,150,000	$184,000	EPS037	15	$1,150,000	$46,000	CCF57	15	$1,150,000	$46,000	14-11	15	$1,150,000	6.960%	$80,100	15	$0	$0	Si	$356,100
6	CC	12752238	ARMERO EDGAR																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1006343585	BAHOS ESTEBAN																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
8	CC	1143939324	BENAVIDES MICHAEL																			230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS010	29	$1,692,542	$67,800	CCF57	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	6.960%	$117,900	29	$0	$0	Si	$524,400
9	CC	1143939324	BENAVIDES MICHAEL											X								230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$0	CCF57	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
10	CC	1116443310	COBA ANGIE																			230301	25	$1,750,000	$280,000	EPS037	25	$1,750,000	$70,000	CCF57	25	$1,750,000	$70,000	14-11	25	$1,750,000	6.960%	$121,800	25	$0	$0	Si	$541,800
11	CC	1116443310	COBA ANGIE														L					230301	5	$350,000	$56,000	EPS037	5	$350,000	$14,000	CCF57	5	$350,000	$14,000	14-11	5	$350,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$84,000
12	CC	1108654778	CORTES JUAN																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	PT	6636827	GONZALEZ ROMER																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
14	PT	5275168	MOLINA ABRAHAN		X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	PT	4907063	MOLINA JORGE																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
16	CC	67019458	QUESADA PAOLA																			230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS012	30	$2,300,000	$92,000	CCF57	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
17	CC	94320328	TORRES IVAN																			25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF57	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
Total			**Afiliados(15)**																					$33,957,241	$5,433,700			$33,957,241	$1,356,500			$33,957,241	$1,356,500			$33,957,241		$1,717,700		$0	$0		$9,864,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$5,433,700	$0	$0	$5,433,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,624,600	$0	$0	$2,624,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,441,100	$0	$0	$2,441,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$368,000	$0	$0	$368,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,717,700	$0	$0	$1,717,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,717,700	$0	$0	$1,717,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,356,500	$0	$0	$1,356,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	15	$1,356,500	$0	$0	$1,356,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$1,356,500	$0	$0	$1,356,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$92,000	$0	$0	$92,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$553,900	$0	$0	$553,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$200,100	$0	$0	$200,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$300,200	$0	$0	$300,200
TOTAL				**15**	**$9,864,400**	**$0**	**$0**	**$9,864,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900594576	3	CEIMCOL GROUP SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	ADMON	CRA 35A 4A 60	CALI-VALLE	3154418037	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	229475029	9503143823	E	2026/04/21	2026/04/16	BANCO AV VILLAS	0	$8,353,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON (13 Afiliados)																						**$29,188,705**	**$4,670,600**			**$29,188,705**	**$1,168,100**			**$29,188,705**	**$1,168,100**			**$29,188,705**		**$1,347,000**		**$0**	**$0**		**$8,353,800**
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						**$4,150,905**	**$664,200**			**$4,150,905**	**$166,100**			**$4,150,905**	**$166,100**			**$4,150,905**		**$21,800**		**$0**	**$0**		**$1,018,200**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																						**$4,150,905**	**$664,200**			**$4,150,905**	**$166,100**			**$4,150,905**	**$166,100**			**$4,150,905**		**$21,800**		**$0**	**$0**		**$1,018,200**
1	CC	1144149553	ORDOÑEZ YISETH																	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF57	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	Si	$588,600
2	CC	38550792	SANDOVAL ANGIE																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)																						**$7,750,905**	**$1,240,200**			**$7,750,905**	**$310,100**			**$7,750,905**	**$310,100**			**$7,750,905**		**$188,900**		**$0**	**$0**		**$2,049,300**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																						**$7,750,905**	**$1,240,200**			**$7,750,905**	**$310,100**			**$7,750,905**	**$310,100**			**$7,750,905**		**$188,900**		**$0**	**$0**		**$2,049,300**
3	CC	66850906	CARDONA YAMILETH																	25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF57	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	2.436%	$146,200	30	$0	$0	Si	$1,586,200
4	CC	63448314	ECHEVERRI DIANA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (9 Afiliados)																						**$17,286,895**	**$2,766,200**			**$17,286,895**	**$691,900**			**$17,286,895**	**$691,900**			**$17,286,895**		**$1,136,300**		**$0**	**$0**		**$5,286,300**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (9 Afiliados)																						**$17,286,895**	**$2,766,200**			**$17,286,895**	**$691,900**			**$17,286,895**	**$691,900**			**$17,286,895**		**$1,136,300**		**$0**	**$0**		**$5,286,300**
5	CC	12752238	ARMERO EDGAR		X															25-14	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF57	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
6	CC	1006343585	BAHOS ESTEBAN																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1143939324	BENAVIDES MICHAEL		X															230301	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF57	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
8	CC	1116443310	COBA ANGIE																	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF57	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	Si	$650,200
9	CC	1108654778	CORTES JUAN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	PT	6636827	GONZALEZ ROMER																	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS005	20	$1,167,270	$46,700	CCF57	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$361,500
11	PT	6636827	GONZALEZ ROMER												X					230301	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$23,400	CCF57	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$140,200
12	PT	4907063	MOLINA JORGE																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	67019458	QUESADA PAOLA																	230201	25	$1,916,667	$306,700	EPS012	25	$1,916,667	$76,700	CCF57	25	$1,916,667	$76,700	14-11	25	$1,916,667	6.960%	$133,500	25	$0	$0	Si	$593,600
14	CC	67019458	QUESADA PAOLA														L			230201	5	$383,334	$61,400	EPS012	5	$383,334	$15,400	CCF57	5	$383,334	$15,400	14-11	5	$383,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$92,200
15	CC	94320328	TORRES IVAN																	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF57	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
Total			**Afiliados(13)**																			$29,188,705	$4,670,600			$29,188,705	$1,168,100			$29,188,705	$1,168,100			$29,188,705		$1,347,000		$0	$0		$8,353,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,670,600	$0	$0	$4,670,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,281,800	$0	$0	$2,281,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,020,700	$0	$0	$2,020,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$368,100	$0	$0	$368,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,347,000	$0	$0	$1,347,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,347,000	$0	$0	$1,347,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,168,100	$0	$0	$1,168,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$1,168,100	$0	$0	$1,168,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,168,100	$0	$0	$1,168,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$92,100	$0	$0	$92,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$521,200	$0	$0	$521,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,400	$0	$0	$114,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$370,300	$0	$0	$370,300
TOTAL				**13**	**$8,353,800**	**$0**	**$0**	**$8,353,800**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LOGISTICO EMPRESARIAL GROUP S.A.S. identificado(a) con NI 901812744 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ENRIQUE VANEGAS GUTIERREZ identificado(a) con CC 1113791652

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503597612	247374745	E	2026-04-23	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		$1,750,905	4%	$70,100
9503597612	247374745	E	2026-04-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$1,750,905	16%	$280,200
9503597612	247374745	E	2026-04-23	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30																		$1,750,905		$0
9503597612	247374745	E	2026-04-23	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30																		$1,750,905		$0
9503597612	247374745	E	2026-04-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30																		$0	0%	$0
9503597612	247374745	E	2026-04-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30																		$0	0%	$0
9503597612	247374745	E	2026-04-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$1,750,905	6.96%	$121,900
9503597612	247374745	E	2026-04-23	CCF	CCF68	COMCAJA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$1	4%	$100

Este certificado se expide el día 2026-04-23 a las 09:29.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LOGISTICO EMPRESARIAL GROUP S.A.S. identificado(a) con NI 901812744 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS GONZAGA CARMONA GONZALEZ identificado(a) con CC 89000152

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503597612	247374745	E	2026-04-23	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		$1,750,905	4%	$70,100
9503597612	247374745	E	2026-04-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$1,750,905	16%	$280,200
9503597612	247374745	E	2026-04-23	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30																		$1,750,905		$0
9503597612	247374745	E	2026-04-23	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30																		$1,750,905		$0
9503597612	247374745	E	2026-04-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30																		$0	0%	$0
9503597612	247374745	E	2026-04-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30																		$0	0%	$0
9503597612	247374745	E	2026-04-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$1,750,905	6.96%	$121,900
9503597612	247374745	E	2026-04-23	CCF	CCF68	COMCAJA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$1	4%	$100

Este certificado se expide el día 2026-04-23 a las 09:29.

ACTA PARCIAL No. 1

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUD

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS
PUESTO DE SALUD VILLAR

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO - VALLE

HOSAC

CONTRATO No. 174-2025

OBJETO CONTRACTUAL: "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"

CONTRATISTA OBRA: CEIMCOL GROUP S.A.S **NIT:** 900594576-3

CONTRATANTE: HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA

INTERVENTORÍA: MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS

VALOR INICIAL: $ 442.669.678

VALOR ADICIONAL ACUMULADO -$ 0

VALOR TOTAL: $ 442.669.678

FECHA DE INICIO : viernes, 26 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL (DIAS): 90
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: miércoles, 25 de marzo de 2026

PRORROGA No.1 (DIAS) 30
FECHA DE FINALIZACIÓN 2: sábado, 25 de abril de 2026

PRORROGA No.2 (DIAS) N.A
FECHA DE FINALIZACIÓN 3: N.A

MODIFICACIÓN No.1 martes, 7 de abril de 2026
MODIFICACIÓN No.2 NA

ACTA PARCIAL DE OBRA

No.1

FECHA DE ACTA: 15/03/2026

VALOR ACTA: $ 187.603.532

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No.01 DE ABRIL 6 DE 2026		OBRA EJECUTADA						SALDO POR EJECUTAR	
								ACTA No.1		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO			
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UN	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	ALO	CANTIDAD	VALOR
01	**OBRAS PRELIMINARES URBANISTICAS**														
010216	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3	911,10	2.351	$ 2.141.577	848,82	$ 1.995.196	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	848,82	$ 1.995.196
					$ 2.141.577		**$ 1.995.196**		**$ -**		**$ -**		**##**		**$ 1.995.196**
10	**OBRAS PRELIMINARES**														
100124	CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=2.10M	ML	210,00	25.406	$ 5.335.197	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -
100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	163,70	10.970	$ 1.795.854	239,64	$ 2.628.926	0,00	$ -	239,64	$ 2.628.926	239,64	##	0,00	$ -
100419	DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2	163,70	6.075	$ 994.543	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -
100505	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	210,00	8.147	$ 1.710.954	245,04	$ 1.996.419	0,00	$ -	245,04	$ 1.996.419	245,04	##	0,00	$ -
100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	5,00	44.082	$ 220.408	5,00	$ 220.408	0,00	$ -	5,00	$ 220.408	5,00	##	0,00	$ -
100308	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	196,20	4.641	$ 910.554	145,55	$ 675.500	0,00	$ -	137,10	$ 636.274	137,10	##	8,45	$ 39.225
100539	RETIRO TUBERIA AGUA-DESAGUE PVC-HF-AC-XXX	ML	178,00	12.133	$ 2.159.727	178,00	$ 2.159.727	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	178,00	$ 2.159.727
100551	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	10,00	11.544	$ 115.436	12,00	$ 138.523	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	12,00	$ 138.523
					$ 13.242.674		**$ 7.819.502**		**$ -**		**$ 5.482.026**		**##**		**$ 2.337.476**
15	**INSTALACIONES SANITARIAS**														
150306	ARREGLO PUNTO SANITARIO	UND	10	43.522	$ 435.216	22,00	$ 957.475	0,00	$ -	22,00	$ 957.475	22,00	##	0,00	$ -
110118	CAJA INSPECCION 70x 70 CM [CONCRETO]	UND	2	491.931	$ 983.862	2,00	$ 983.862	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	2,00	$ 983.862
110119	CAJA INSPECCION 90x 90 CM [CONCRETO]	UND	3	589.826	$ 1.769.479	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -
150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	5	65.848	$ 329.242	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -
150104	TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	33	18.996	$ 622.122	48,00	$ 911.812	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	48,00	$ 911.812
150107	TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)	ML	51	24.642	$ 1.261.165	51,00	$ 1.256.729	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	51,00	$ 1.256.729
150110	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	31	28.755	$ 894.002	48,00	$ 1.380.254	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	48,00	$ 1.380.254
					$ 6.295.087		**$ 5.490.133**		**$ -**		**$ 957.475**		**##**		**$ 4.532.658**
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**														
160801	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	10	52.265	$ 522.648	22,00	$ 1.149.825	0,00	$ -	22,00	$ 1.149.825	22,00	##	0,00	$ -
					$ 522.648		**$ 1.149.825**		**$ -**		**$ 1.149.825**		**##**		**$ -**
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	23	36.870	$ 848.010	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -
176016	CABLE TRENZADO 3X12 HL-FR AWG-NORMAL	ML	137	8.920	$ 1.222.040	500	$ 4.460.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	500,00	$ 4.460.000
173003	TUBERIA EMT 3/4	ML	162	16.820	$ 2.724.840	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -
					$ 4.794.890		**$ 4.460.000**		**$ -**		**$ -**		**##**		**$ 4.460.000**
18	**ESTRUCTURA - CUBIERTA**														
180823	TEJA SANDWICH 1C-ACERO GALV-1C FOIL VINILO E=30MM	M2	210	183.404	$ 38.514.844	245	$ 44.940.865	0,00	$ -	245,04	$ 44.940.865	245,04	##	0,00	$ -
180323	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 20C	ML	58	14.075	$ 816.373	58	$ 816.373	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	58,00	$ 816.373
180404	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO - 1/2" RH	M2	160	86.527	$ 13.818.374	167	$ 14.473.116	0,00	$ -	167,27	$ 14.473.116	167,27	##	0,00	$ -
180410	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO	M2	15	76.457	$ 1.123.915	15	$ 1.123.915	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	14,70	$ 1.123.915
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	58	121.343	$ 7.037.865	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -
182146	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -2.5MM C.12	ML	426	184.863	$ 78.751.591	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -
130801	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KLS	1.387	14.834	$ 20.573.287	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -

					$ 160.636.249		$ 61.354.270		$ -		$ 59.413.982		##		$ 1.940.288
20	**PISOS Y ENCHAPES**															
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	172	$ 23.774	$ 4.089.107	146	$ 3.460.336	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	145,55	$ 3.460.336
200228	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3-4	M2	195	$ 81.562	$ 15.928.974	93	$ 7.585.593			82,65	$ 6.740.737	82,65	##		$ 844.856
190806	ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60 RECTIFICADO	M2	160	$ 225.453	$ 36.072.498	158	$ 35.516.440	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	157,53	$ 35.516.440
					$ 56.090.579		$ 46.562.369		$ -		$ 6.740.737		##		$ 39.821.631
21	**CARPINTERIA MADERA**															
211102	NAVE MAD. RH 81-100 -1N-BATIENTE ENTAMBORADA	UND	13	$ 812.856	$ 10.567.134	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -
210409	MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH 15MM	ML	7	$ 554.112	$ 3.878.782	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -
					$ 14.445.916		$ -		$ -		$ -		##		$ -
25	**DUCTOS Y CANALIZACIONES**															
250403	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	5	611.895	$ 3.059.476	5	$ 3.059.476	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	5,00	$ 3.059.476
250425	TAZA ALONGADO ENTRADA SUPERIOR	UND	5	965.075	$ 4.825.376	5	$ 4.825.376	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	5,00	$ 4.825.376
250518	GRIFO LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA MEDIA	UND	5	223.022	$ 1.115.110	5	$ 1.115.110	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	5,00	$ 1.115.110
250712	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATAS	UND	1	290.449	$ 290.449	1	$ 290.449	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	1,00	$ 290.449
250438	ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM	UND	1	424.378	$ 424.378	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	0,00	$ -
					$ 9.714.788		$ 9.290.410		$ -		$ -		##		$ 9.290.410
26	**VIDRIOS - ESPEJOS**															
260202	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	5	61.666	$ 308.330	5,00	$ 308.330	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	5,00	$ 308.330
					$ 308.330		$ 308.330		$ -		$ -		##		$ 308.330
29	**ESTUCO Y PINTURA**															
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	860	13.736	$ 11.812.641	631	$ 8.667.100	0,00	$ -	466,54	$ 6.408.276	466,54	##	164,45	$ 2.258.824
290102	RELLENO EXTERIOR MURO	M2	290	17.246	$ 5.001.234	252	$ 4.352.757	0,00	$ -	233,27	$ 4.022.923	233,27	##	19,13	$ 329.833
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	1.150	4.510	$ 5.186.042	631	$ 2.845.532	0,00	$ -	538,69	$ 2.429.296	538,69	##	92,30	$ 416.236
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	934	13.725	$ 12.818.850	508	$ 6.978.752	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	508,48	$ 6.978.752
290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	290	25.542	$ 7.407.035	123	$ 3.129.140	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	122,51	$ 3.129.140
					$ 42.225.803		$ 25.973.281		$ -		$ 12.860.495		##		$ 13.112.786
31	**LIMPIEZA Y VARIOS**															
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	210	100.042	$ 21.008.820	210,00	$ 21.008.820	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	210,00	$ 21.008.820
					$ 21.008.820		$ 21.008.820		$ -		$ -		##		$ 21.008.820
33	**EQUIPO Y MAQUINARIA DE OBRA**															
330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS	UND	3	53.471	$ 160.412	3,00	$ 160.412	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	3,00	$ 160.412
					$ 160.412		$ 160.412		$ -		$ -		##		$ 160.412
OE	**OBRAS EXTRAS**															
OE-01	DESMONTE LAVAMANOS CERAMICO	UND	0,00	$ 44.082	$ -	5,00	$ 220.408	0,00	$ -	5,00	$ 220.408	5,00	##	0,00	$ -
OE-02	DESMONTE LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	$ 44.082	$ -	6,00	$ 264.489	0,00	$ -	6,00	$ 264.489	6,00	##	0,00	$ -
OE-03	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE DOBLE NAVE EN ALUMINIO ENTAMBORADA (A: 1.5M-2.0M_ H: 2.0M-2.2M) +MARCO EN ALUMINIO + CERRADURA	M2	0,00	$ 1.240.548	$ -	4,02	$ 4.983.281	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	4,02	$ 4.983.281
OE-04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA SENCILLA (A: 0.6M-1.0M_ H: 2.0M-2.2M)	M2	0,00	$ 1.201.773	$ -	21,32	$ 25.620.118	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	21,32	$ 25.620.118
OE-05	BARRAS DE SEGURIDAD PARA SANITARIO EN U PARED O FIJA PISO EN ACERO INOX_WC PMR	UND	0,00	$ 819.406	$ -	2,00	$ 1.638.811	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	2,00	$ 1.638.811
OE-06	DEMOLICIÓN RAMPA EN LOSETA GRES	M2	0,00	$ 58.143	$ -	14,55	$ 846.155	0,00	$ -	14,55	$ 846.155	14,55	##	0,00	$ -
OE-07	CONSTRUCCIÓN RAMPA DE INGRESO	M2	0,00	$ 198.262	$ -	10,40	$ 2.061.925	0,00	$ -	10,40	$ 2.061.925	10,40	##	0,00	$ -
OE-08	SALIDA S1 EMT_INTERRUPTOR SENCILLO	UND	0,00	$ 228.595	$ -	16,00	$ 3.657.514	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	16,00	$ 3.657.514
OE-09	SALIDA TOMA 120 V EMT	UND	0,00	$ 227.291	$ -	18,00	$ 4.091.233	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	18,00	$ 4.091.233
OE-10	PANEL LED 60X60 48W, INCLUYE MARCO SOPORTE.	UND	0,00	$ 217.826	$ -	18,00	$ 3.920.868	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	18,00	$ 3.920.868
OE-11	SALIDA LAMP EMT	UND	0,00	$ 221.230	$ -	18,00	$ 3.982.142	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	18,00	$ 3.982.142
OE-12	BALA PANEL LED CIRCULAR 18 W INCRUSTAR	UND	0,00	$ 47.377	$ -	11,00	$ 521.149	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	11,00	$ 521.149
OE-13	APERTURA DE VANOS EN CIELO FALSO LAMPARA, VENTANILLAS DE INSPECCION.	UND	0,00	$ 25.661	$ -	29,00	$ 744.160	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	29,00	$ 744.160
OE-14	DUCHA SENCILLA	UND	0,00	$ 152.721	$ -	2,00	$ 305.443	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	2,00	$ 305.443
OE-15	ALISTADO PISO EN MORTERO 1:3 (E:8.0 CM)	M2	0,00	$ 69.108	$ -	167,27	$ 11.559.481	0,00	$ -	167,27	$ 11.559.481	167,27	##	0,00	$ -
OE-16	PASAMANO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES	ML	0,00	$ 704.257	$ -	8,00	$ 5.634.056	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	8,00	$ 5.634.056
OE-17	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	M2	0,00	$ 96.230	$ -	11,43	$ 1.100.005	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	11,43	$ 1.100.005
OE-18	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA	UN	0,00	$ 350.000	$ -	11,00	$ 3.850.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	11,00	$ 3.850.000
OE-19	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EXTERIOR	ML	0,00	$ 8.529	$ -	8,70	$ 74.202	0,00	$ -	8,70	$ 74.202	8,70	##	0,00	$ -
OE-20	DESMONTE DE CAMILLA DE ODONTOLOGÍA	UND	0,00	$ 154.820	$ -	1,00	$ 154.820	0,00	$ -	1,00	$ 154.820	1,00	##	0,00	$ -
OE-21	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO	M2	0,00	$ 56.862	$ -	7,64	$ 434.312	0,00	$ -	7,64	$ 434.312	7,64	##	0,00	$ -
OE-22	PINTURA DE CERCHA ACTUAL	ML	0,00	$ 23.255	$ -	215,00	$ 4.999.825	0,00	$ -	215,00	$ 4.999.825	215,00	##	0,00	$ -

OE-23	PERFIL DE 8CM X 4CM	UND	0,00	$ 200.000	$ -	20,00	$ 4.000.000	0,00	$ -	20,00	$ 4.000.000	20,00	##	0,00	$ -
OE-24	GRANIPLAST FACHADA	M2	0,00	$ 52.602	$ -	290,0	$ 15.254.580	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	290,00	$ 15.254.580
OE-25	DEMOLICIÓN Y RETIRO MATERAS EXTERIORES + RELLENO Y FUNDICIÓN DE PLACA	UND	0,00	$ 1.480.000	$ -	2,00	$ 2.960.000	0,00	$ -	2,00	$ 2.960.000	2,00	##	0,00	$ -
OE-26	REPELLO ÁREA GUARDAESCOBAS	ML	0,00	$ 9.500	$ -	140,00	$ 1.330.000	0,00	$ -	137,10	$ 1.302.450	137,10	##	2,90	$ 27.550
OE-27	REPELLO ÁREA PAREDES	M2	0,00	$ 35.517	$ -	83,71	$ 2.973.132	0,00	$ -	83,71	$ 2.973.132	83,71	##	0,00	$ -
OE-28	REPELLO CULATAS	M2	0,00	$ 40.818	$ -	72,15	$ 2.945.019	0,00	$ -	72,15	$ 2.945.019	72,15	##	0,00	$ -
OE-29	REPELLO VANOS DE PUERTAS	ML	0,00	$ 11.959	$ -	59,11	$ 706.896	0,00	$ -	59,11	$ 706.896	59,11	##	0,00	$ -
OE-30	CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN	M2	0,00	$ 198.262	$ -	6,31	$ 1.250.042	0,00	$ -	6,31	$ 1.250.042	6,31	##	0,00	$ -
OE-31	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE REJILLA DE PISO SOSCO 3" X 2"	UND	0,00	$ 28.954	$ -	6,00	$ 173.724	0,00	$ -	6,00	$ 173.724	6,00	##	0,00	$ -
OE-32	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VALVULA REGULACIÓN DE 1/2"	UND	0,00	$ 41.567	$ -	7,00	$ 290.969	0,00	$ -	7,00	$ 290.969	7,00	##	0,00	$ -
OE-33	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VALVULA CORTINA 1/2"-250 PSI RED WHITE	UND	0,00	$ 125.213	$ -	1,00	$ 125.213	0,00	$ -	1,00	$ 125.213	1,00	##	0,00	$ -
OE-34	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PLÁSTICA 6" X 6" (15 X 15 CM)	UND	0,00	$ 30.413	$ -	6,00	182.478	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	##	6,00	$ 182.478
OE-35	INCREMENTO EN COSTO DIRECTO POR DISTANCIA Y GRADO DE DIFICULTAD (DCTO 1.22-0475 DE 2025_GOBERNACIÓN DEL VALLE)	UND	0,00	$ 331.587.774	$ -	0,10	$ 33.158.777	0,00	$ -	0,05	$ 16.579.389	0,05	##	0,05	$ 16.579.389
					$ -		**$ 146.015.226**		**$ -**		**$ 53.922.450**		**##**		**$ 92.092.777**

SUB TOTAL			**$ 331.587.774**	**$ 331.587.774**		**$ 140.526.990**	**#**	**$ 191.060.784**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 331.587.774**	**$ 331.587.774**		**$ 140.526.990**	**#**	**$ 191.060.784**
Administración	23,5%	77.923.127	$ 77.923.127		$ 33.023.843	#	$ 44.899.284
imprevistos	1%	3.315.878	$ 3.315.878		$ 1.405.270	#	$ 1.910.608
Utilidad	9%	29.842.900	$ 29.842.900		$ 12.647.429	#	$ 17.195.471
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 111.081.904**	**$ 111.081.904**		**$ 47.076.542**	**#**	**$ 64.005.363**
VALOR TOTAL OBRA		**$ 442.669.678**	**$ 442.669.678**		**$ 187.603.532**	**#**	**$ 255.066.146**

TOTAL PRESUPUESTO	**$ 442.669.678**
ANTICIPO	**$ -**
PAGOS ACTAS ANTERIORES	**$ -**
VALOR PRESENTE ACTA ANTES DE IVA	**$ 187.603.532**
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	**$ -**
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	**$ -**
AMORTIZACIÓN ACUMULADA A LA PRESENTE ACTA	**$ -**
(VALOR PRESENTE ACTA) - (AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA) (VALOR A PAGAR)	**$ 187.603.532**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 255.066.146**
SALDO POR AMORTIZAR	**$ -**
% DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA	**42,38%**
% DE EJECUCIÓN ACUMULADA	**42,38%**

Vo.Bo.

YAMILETH CARDONA KLINGER
R.L. CEMCOL GROUP S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

Vo.Bo.

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
INTERVENTOR

Vo.Bo.

MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
R.L. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
CONTRATANTE

MEMORIAS DE CANTIDADES

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (M2)**
100305	**DEMOL.ENCHAPE CERAMICO**	**M2**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Piso Interno	13,61	12,29		1,00	167,27
			Ingreso	4,67	1,01		1,00	4,72
			Wc Sala de Espera					
			Paredes	5,99		1,85	1,00	11,08
			Wc Pediatría					
			Paredes	5,86		1,85	1,00	10,84
			Wc Consultorio 3					
			Paredes	6,90		1,85	1,00	12,77
			Wc Odontologia					
			Paredes	4,77		1,85	1,00	8,82
			Wc Consultorio 2					
			Paredes	6,62		1,85	1,00	12,25
			Cuarto de Aseo					
			Paredes	6,43		1,85	1,00	11,90
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					**-**
			TOTAL ÍTEM					**239,64**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (M2)**
100505	**DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO**	**M2**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Cubierta área 1	13,88	7,42		1,00	102,99
			Cubierta área 2	13,58	4,54		1,00	61,68
			Cubierta área 3	13,09	6,14		1,00	80,37
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**245,04**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (Und)
100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			WC Sala de Espera				1,00	1,00
			WC Consultorio 2				1,00	1,00
			WC Odontologia				1,00	1,00
			WC Consultorio 3				1,00	1,00
			WC Pediatria				1,00	1,00
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**5,00**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (ML)**
100308	**DEMOL.GUARDAESCOBA**	**ML**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Sala de Espera y Pasillos	31,19			1,00	31,19
			Farmacia	11,94			1,00	11,94
			Consultorio 1	15,20			1,00	15,20
			LV	7,98			1,00	7,98
			Consultorio 2	17,83			1,00	17,83
			Odontologia	16,25			1,00	16,25
			Consultorio 3	16,46			1,00	16,46
			Pediatria	15,47			1,00	15,47
			Fachada	4,78			1,00	4,78
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**137,10**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**
100551	**DESM.MARCO + NAVE SENCILLA**	**UND**



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (Und)**
LUGAR	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
Puerta de Acceso				2,00	2,00
WC Sala de Espera				1,00	1,00
Pediatria				1,00	1,00
WC Pediatria				1,00	1,00
Farmacia				1,00	1,00
LV				1,00	1,00
Odontologia				1,00	1,00
WC Odontologia				1,00	1,00
Consultorio 2				1,00	1,00
Consultorio 3				1,00	1,00
WC Consultorio 3				1,00	1,00
PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
TOTAL ÍTEM					**0,00**

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (UN)**
150306	**ARREGLO PUNTO SANITARIO**	**UND**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Sanitarios				5,00	5,00
			Lavamanos Ceramicos				5,00	5,00
			Lavamanos Acero Inox				6,00	6,00
			Duchas				3,00	3,00
			Lavatraperos				1,00	1,00
			Punto_Odontología				1,00	1,00
			Orinal				1,00	1,00
								0,00
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**22,00**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (PTO)**
160801	**PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2**	**PTO**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Sanitarios				5,00	5,00
			Lavamanos Ceramicos				5,00	5,00
			Lavamanos Acero Inox				6,00	6,00
			Duchas				3,00	3,00
			Lavatraperos				1,00	1,00
			Punto_Odontología				1,00	1,00
			Orinal				1,00	1,00
								0,00
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**22,00**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (M2)**
180823	**TEJA SANDWICH 1C-ACERO GALV-1C FOIL VINILO E=30MM**	**M2**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Cubierta área 1	13,88	7,42		1,00	102,99
			Cubierta área 2	13,58	4,54		1,00	61,68
			Cubierta área 3	13,09	6,14		1,00	80,37
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**245,04**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (M2)
180404	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO - 1/2" RH	M2	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Cieloraso Interior	13,61	12,29		1,00	167,27
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**167,27**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (M2)**
200228	**CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3-4**	**M2**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Wc Sala de Espera					
			Piso	1,90	1,42		1,00	2,70
			Paredes	5,99		1,80	1,00	10,78
			Wc Pediatría					
			Piso	1,39	1,86		1,00	2,59
			Paredes	5,86		1,80	1,00	10,55
			Consultorio 3					
			Piso	0,95	2,83		1,00	2,69
			Paredes	6,90		1,85	1,00	12,77
			Wc Odontologia					
			Piso	1,22	1,48		1,00	1,81
			Paredes	4,77		1,85	1,00	8,82
			Wc Consultorio 2					
			Piso	1,20	2,42		1,00	2,90
			Paredes	6,62		1,85	1,00	12,25
			Cuarto de Aseo					
			Piso	1,35	2,15		1,00	2,90
			Paredes	6,43		1,85	1,00	11,90
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**82,65**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA


HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (M2)
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Muros Interiores	132,32		2,60	1,00	344,03
			Fachadas Frontal + Lateral	33,54		2,60	1,00	87,20
			Fachada Lateral	13,58		2,60	1,00	35,31
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**466,54**

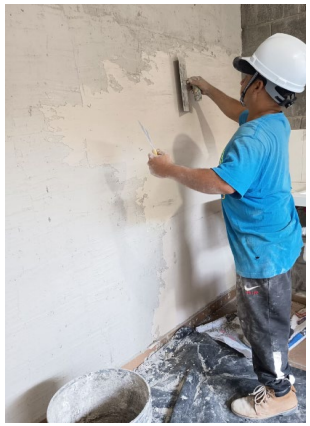



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (M2)
290102	RELLENO EXTERIOR MURO	M2	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Muros Interiores	132,32		2,60	0,50	172,02
			Fachadas Frontal + Lateral	33,54		2,60	0,50	43,60
			Fachada Lateral	13,58		2,60	0,50	17,65
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**233,27**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (M2)
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Muros Interiores	132,32		2,60	1,00	344,03
			Fachadas Frontal + Lateral	33,54		2,60	1,00	87,20
			Fachada Lateral	13,58		2,60	1,00	35,31
			Fachada Lateral Izquierda	13,45		3,00	1,00	40,35
			Fachada Posterior	12,80		3,00	1,00	38,40
			Vanos Ventanas	*2,00*		*1,10*	*-3,00*	*-6,60*
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**538,69**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (Und)**
OE 01	**DESMONTE LAVAMANOS CERAMICO**	**UND**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			WC Sala de Espera				1,00	1,00
			WC Pediatria				1,00	1,00
			WC Consultorio 2				1,00	1,00
			WC Consultorio 3				1,00	1,00
			WC Odontologia				1,00	1,00
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**5,00**





HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (Und)
OE 02	DESMONTE LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE	UND	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			WC Consultorio 1				1,00	1,00
			WC Consultorio 2				1,00	1,00
			WC Odontologia				2,00	2,00
			WC Consultorio 3				1,00	1,00
			WC Pediatria				1,00	1,00
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					
			TOTAL ÍTEM					**6,00**





HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (M2)
OE 06	DEMOLICIÓN RAMPA EN LOSETA GRES	M2	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Rampa 1	7,06	0,8		1,00	5,65
			Gradas	2,05	1,3		1,00	2,67
			Rampa 2	4,80	1,3		1,00	6,24
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**14,55**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (Und)
OE 07	CONSTRUCCIÓN RAMPA DE INGRESO	M2	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Fachada Frontal	8,00	1,3		1,00	10,40

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA


HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (M2)**
OE 15	**ALISTADO PISO EN MORTERO 1:3 (E:8.0 CM)**	**M2**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Area Total	13,61	12,29		1,00	167,27
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**167,27**

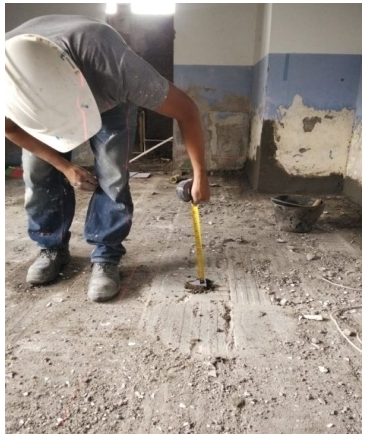



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (ML)
OE 19	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EXTERIOR	ML	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Fachada Frontal	4,50			1,00	4,50
			Fachada Frontal	4,20			1,00	4,20
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**8,70**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (Und)
OE 20	DESMONTE DE CAMILLA DE ODONTOLOGÍA	UND	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Odontologia				1,00	1,00



PAGADO ACTAS ANTERIORES	-
TOTAL ÍTEM	**1,00**

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (M2)**
OE 21	**DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO**	**M2**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Consultorio 1	3,15	0,6		1,00	1,89
			Consultorio 2	2,71	0,6		1,00	1,63
			Odontología	3,52	0,6		1,00	2,11
			Consultorio 3	1,41	0,6		1,00	0,85
			Pediatria	1,94	0,6		1,00	1,16
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**7,64**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (ML)**
OE 22	**PINTURA DE CERCHA ACTUAL**	**ML**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Cubierta				215,00	215,00
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**215,00**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (Und)**
OE 23	**PERFIL DE 8CM X 4CM**	**UND**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Cubierta				20,00	20,00
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**20,00**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (Und)
				LARGO	ANCHO	ALTO		
OE 25	DEMOLICIÓN Y RETIRO MATERAS EXTERIORES + RELLENO Y FUNDICIÓN DE PLACA	UND	LUGAR					
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Fachada Frontal				2.00	2.00

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (ML)**
OE 26	**REPELLO ÁREA GUARDAESCOBAS**	**ML**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Sala de Espera y Pasillos	31,19			1,00	31,19
			Farmacia	11,94			1,00	11,94
			Consultorio 1	15,20			1,00	15,20
			LV	7,98			1,00	7,98
			Consultorio 2	17,83			1,00	17,83
			Odontologia	16,25			1,00	16,25
			Consultorio 3	16,46			1,00	16,46
			Pediatria	15,47			1,00	15,47
			Fachada	4,78			1,00	4,78
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**137,10**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (M2)**
OE 27	**REPELLO ÁREA PAREDES**	**M2**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Sala de Espera	7,61		0,90	1,00	6,85
			Farmacia	6,32		1,33	1,00	8,41
			Consultorio 1	4,73		0,93	1,00	4,40
			LV	2,42		1,12	1,00	2,71
			Consultorio 2	8,47		1,05	1,00	8,89
			Odontologia	7,91		1,27	1,00	10,05
			Consultorio 3	8,15		0,84	1,00	6,85
			Pediatria	6,25		1,38	1,00	8,63
			Fachadas	18,20		1,48	1,00	26,94
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**83,71**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (M2)**
OE 28	**REPELLO CULATAS**	**M2**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Fachada Lateral Izquierda	13,45		3,00	1,00	40,35
			Fachada Posterior	12,80		3,00	1,00	38,40
			Vanos Ventanas	*2,00*		*1,10*	*-3,00*	*-6,60*
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**72,15**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (ML)**
OE 29	**REPELLO VANOS DE PUERTAS**	**ML**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Farmacia		0,92	2,05	1,00	5,02
			Consultorio 1		0,92	1,98	1,00	4,88
			LV		0,75	2,05	1,00	4,85
			Consultorio 2		0,92	2,05	1,00	5,02
			WC Consultorio 2		0,62	2,00	1,00	4,62
			Odontologia		0,92	2,05	1,00	5,02
			WC Odontologia		0,90	2,03	1,00	4,96
			Consultorio 3		0,92	2,05	1,00	5,02
			WC Consultorio 3		0,90	1,93	1,00	4,76
			Pediatria		0,92	2,05	1,00	5,02
			WC Pediatria		0,93	2,00	1,00	4,93
			WC Sala de Espera		0,91	2,05	1,00	5,01
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**59,11**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (M2)**
OE 30	**CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN**	**M2**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			**ACTA PARCIAL DE OBRA No.1**					
			Fachada Frontal	4,85	1,3		1,00	6,31
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**6,31**

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (UND)**
OE 31	**SUMINISTRO E INTALACIÓN DE REJILLA DE PISO SOSCO 3" X 2"**	**UND**	**LUGAR**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			WC Sala de Espera				1,00	1,00
			LV				1,00	1,00
			WC Consultorio 2				1,00	1,00
			WC Odontologia				1,00	1,00
			WC Consultorio 3				1,00	1,00
			WC Pediatria				1,00	1,00
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**6,00**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (UND)
OE 32	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VALVULA REGULACIÓN DE 1/2"	UND	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			WC Sala de Espera				1,00	1,00
			LV				1,00	1,00
			WC Consultorio 2				1,00	1,00
			WC Odontologia				1,00	1,00
			WC Consultorio 3				1,00	1,00
			WC Pediatria				1,00	1,00
			Ingreso Edificación_Rampa				1,00	1,00
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**7,00**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
NIT 891.900.446-6
CORREGIMIENTO EL VILLAR_MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO_VALLE DEL CAUCA

HOSAC

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | **ACTA PARCIAL No.01**

CONTRATO OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No.174-2025_"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
CONTRATISTA DE OBRA	CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
UBICACIÓN:	CRA 3-CALLE 4 _CORREGIMIENTO DEL VILLAR

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
7	4	2026

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (UND)
OE 33	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VALVULA CORTINA 1/2"-250 PSI RED WHITE	UND	LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO		
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1					
			Esquina Derecha_Fachada Frontal Edificación				1,00	1,00
			PAGADO ACTAS ANTERIORES					-
			TOTAL ÍTEM					**1,00**



HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E.
R.L. MONICA MARIA ZAPATA VICUÑA
CONTRATANTE

CEIMCOL GROUP S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

RUT CONTRATISTA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141235592337

(415)7707212489984(8020) 000014123559233 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 4 5 7 6	3	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CEIMCOL GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 35 A 4 A 60

42. Correo electrónico ycardona@ceimcolgroup.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 6 4 3 1 6 5 4	6 0 2 3 7 5 3 0 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 5 0 1 0 1	4 6 6 3	2 0 1 3 0 2 1 9					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	6	2									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
62 - Impuesto nacional sobre productos plá

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARDONA KLINGER YAMILETH

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141235592337

(415)7707212489984(8020) **000014123559233 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 4 5 7 6	3	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2
73. Fecha	2 0 1 3 0 2 1 9	2 0 1 4 0 8 2 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 2 2 1	2 0 1 4 1 0 1 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 8 6 4 9 1 9	1 3 7 5 1
78. Departamento	7 6	7 6
79. Ciudad/Municipio	8	8

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 2 1 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 6 1 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141235592337

(415)7707212489984(8020) **000014123559233 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 4 5 7 6	3	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 5 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 6 8 5 0 9 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDONA	KLINGER	YAMILETH	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141235592337

(415)7707212489984(8020) **000014123559233 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 4 5 7 6	3	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 6 4 2 0 4 3	4	1 1 8 7 3 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MALDONADO	CASTAÑEDA	OLGA	TERESA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 6 0 5 1 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141235592337

(415)7707212489984(8020) **000014123559233 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 4 5 7 6	3	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 4 3 9 0	

162. Nombre del establecimiento: CEIMCOL GROUP S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1	

165. Dirección: CL 45 86 47 OF 1 404 CON PARQUES DEL LILI I

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 0 2 3 8 4 9 9 5 4		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES CONTRATISTA

CEIMCOL GROUP
NIT. 900.594.576-3

ANEXO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **YAMILETH CARDONA KLINGER,** identificado con cedula de ciudadanía N°66.850.906, en mi condición de Representante Legal de **CEIMCOL GROUP SAS** identificada con Nit 900594576-3 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de mayo de 2005.

Dado en Cali, a los (28) días del mes de abril del año 2026

Cordialmente

CEIMCOL GROUP SAS
NIT 900594576-3
YAMILETH CARDONA KLINGER
C.C. No. 66.850.906 de Cali
Profesión INGENIERA INDUSTRIAL
Dirección CRA 35 A ·4ª - 60
Teléfonos 3116431654
Santiago de Cali

OLGA TERESA MALDONADO
Contador Publica
TP 118735-T


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
118735-T
OLGA TERESA
MALDONADO CASTAÑEDA
C.C. 31642043
RESOLUCION INSCRIPCION 129 FECHA 2006/05/18
UNIVERSIDAD DEL VALLE
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ
L/8601


38756
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

FACTURA CONTRATISTA

CEIMCOL GROUP S.A.S.
NIT 900.594.576-3
CL 45 86 47 OF 1 404 CON PARQUES DEL LILI
I
Tel: (032) 3116431654
Cali - Colombia
ycardona@ceimcolgroup.com

Factura electrónica de venta
No. FE 169

Señores	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO (VALLE DEL CAUCA).		
NIT	891.900.446-6	**Teléfono**	(602) 3216472130
Dirección	Cra 8 N° 8-57	**Ciudad**	Ansermanuevo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 08:11
Expedición	29/04/2026, 08:11
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 - ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	1.00	138,749,746.32

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y siete millones seiscientos tres mil quinientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Anticipo de Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 187,603,532.00

Total Bruto	138,749,746.32
Administración 23.50%	32,606,190.39
Imprevistos 1.00%	1,387,497.46
Utilidad 9.00%	12,487,477.17
IVA 19%	2,372,620.66
Total a Pagar	187,603,532.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102154911 aprobado en 20251126 prefijo FE desde el número 143 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 3.3
CUFE: 0de4be5e51b60442df5f6fa540ea877b547e4ba312bb5ced921ff2fb4851a67983fb41c93a90e51f65929978844f6b53

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACIÓN BANCARIA CONTRATISTA

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que CEIMCOL GROUP S.A.S identificado con el documento No. 900.594.576

posee en la oficina CALIMA (129) una cuenta corriente

No. 121146815 desde el 23 de septiembre de 2019

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 15 dias del mes de enero de 2026

Atentamente,

Luis Enrique Medina

Gerente Oficina 120

Esta certificación tiene un costo de $ 0,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1
