| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
|---|
| CONVENIO No. 1808-2024, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2026 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE - FASE I | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |
| **BENEFICIARIO:** | DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $20.000.000.000,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $20.000.000.000,00 |
| | **TOTAL APORTES DEL CONVENIO** | | $40.000.000.000,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 08/07/2024 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 01/06/2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | MARLENY RIVERA GALEANO | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | MARLENY RIVERA GALEANO | 04/10/2025 | A LA FECHA |
| | TITO LORENZO LOVO CARRETERO | 15/09/2025 | 03/10/2025 |
| | MARLENY RIVERA GALEANO | 21/08/2024 | 14/09/2025 |
| | SERGIO SANJUAN SANTIAGO | 13/08/2024 | 20/08/2024 |
| | EDGAR RICARDO GONZALEZ PATIÑO | 08/07/2024 | 12/08/2024 |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | SERGIO O. BERNAL J. | 07/10/2025 | 31/12/2025 |
| | HAVID NUMA MARCHENA | 11/02/2025 | 31/12/2025 |
| | HAVID NUMA MARCHENA | 22/08/2024 | 25/12/2024 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No.98424 | 08/07/2024 | 31/12/2024 |
| | No.825 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| | No. 3026 | 09/01/2026 | 31/12/2026 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 3002507 | 20/09/2024 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 20/09/2024 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA MODIFICACIÓN: se modificó la cláusula sexta-FORMA DE PAGO. | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 04/10/2024 |
| | PRIMERA PRÓRROGA: con nuevo plazo de ejecución hasta el 24 de diciembre de 2025. | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 09/05/2025 |
| | SEGUNDA PRÓRROGA: con nuevo plazo de ejecución hasta el 1 de junio de 2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23/10/2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA EXPEDICIÓN: 22/10/2024 | |
| | FECHA DESDE: 20/09/2024 | |
| | FECHA: 25/08/2026 | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 575.575.000 | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 264.983.000 | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | N/A | |
| **VALOR DE IMPLEMENTACIÓN** | $ 38.393.442.000 | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $ 766.000.000 | |
| **VALOR ADICIONAL DE IMPLEMENTACIÓN** | N/A | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | A). Requisitos de legalización del convenio. B). Incorporación del recurso al presupuesto de la Entidad. C). Aprobación del cronograma del convenio. | NO APLICA | 28/03/2025 | $ 7.000.000.000 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A). Acto administrativo de adjudicación del contrato de Estudios, Diseños, Implementación e Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación de contrato de Interventoría. C). Actas de Inicio de los contratos derivados. | NO APLICA | 25/08/2025 | $ 7.000.000.000 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | contra entrega de la certificación del supervisor del convenio designado por el departamento que acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. | 40% | 26/12/2025 | $ 3.000.000.000 |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | A. La certificación del supervisor del convenio designado por el DEPARTAMENTO que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” debidamente diligenciado. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 3.000.000.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | C. Entrega de toda la documentación requerida para efectos de la liquidación del convenio. | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $17.000.000.000 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL DEPARTAMENTO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

**3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO**

**Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3002507 | Cumplimiento | $8.000.000.000 | 20/09/2024 | 25/08/2026 |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños e implementación***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. CAS-OAJ-LP-009-2024** | *Realizar la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fase I, del Departamento de Casanare* | | $ 37.390.300.786 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 | | R.L. RUBEN DARIO GÓMES VALLEJO C.C.79.723.597 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 21/05/2025 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 04/04/2026 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 37.390.300.786 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA | | |
| **PÓLIZA No.** | No. 85194 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 30/12/2024 | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños e implementación***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. CAS-OAJ-CMA-002-2025** | *Interventoria técnica, financiera, juridica, administrativa y ambiental para la "implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del casanare - fase i.* | | $ 1.029.823.343,00 |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S. NIT. 900.115.339-0 | | DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ C.C.74.859.089 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 21/05/2025 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y** | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 05/05/2026 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 1.029.823.343,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **PÓLIZA No.** | 57-44-101006998 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 2025/04/11 | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL DEPARTAMENTO: DICIEMBRE DE 2025 | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | x | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | $8.056.698.075 | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | X | |
| OTROS | X | |

## 6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO


| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN** | **87%** |
| **% EJECUTADO DE IMPLEMENTACIÓN** | **61%** |

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2026:

Se realizó seguimiento al convenio durante el mes de febrero de 2026 mediante correos electrónicos, oficios y reuniones de seguimiento, se requirieron documentos contractuales que están dentro de las cláusulas que son obligaciones específicas del Departamento.

Actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2026:

Cronograma aprobado el 23/10/2025 en la segunda prórroga al convenio

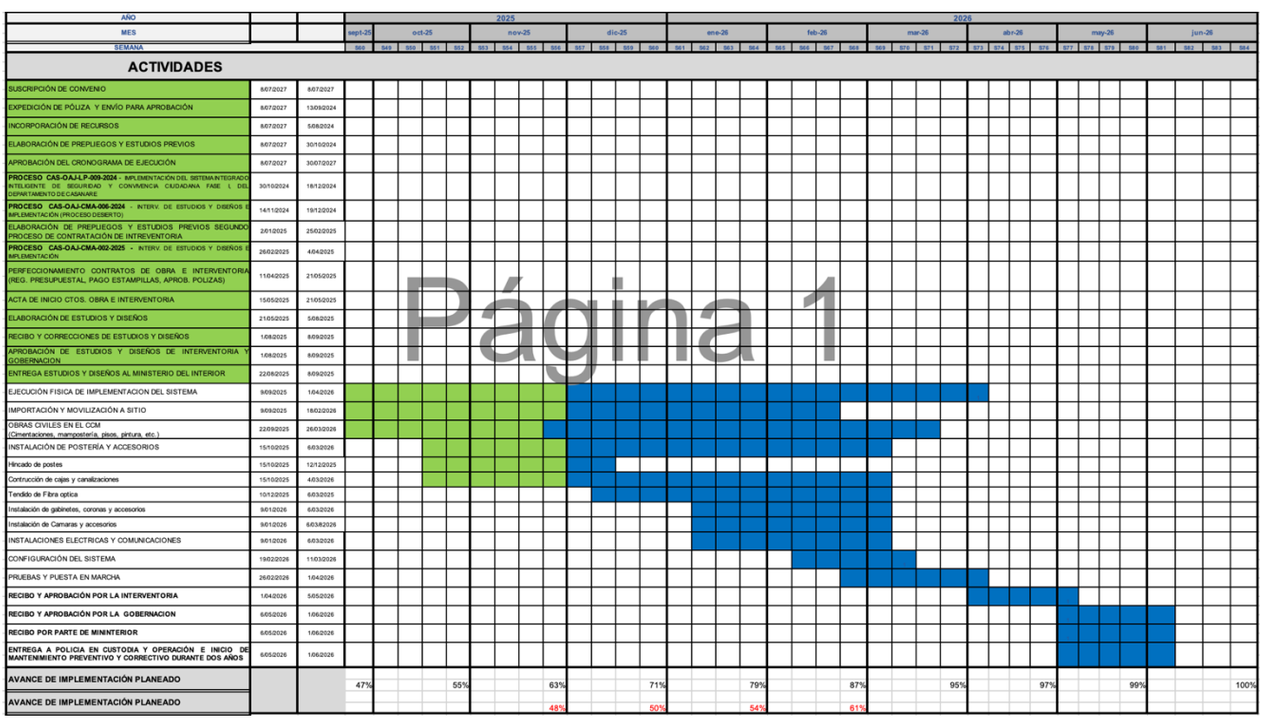


Página 1

A corte 28 de febrero de 2026, se presenta un retraso del 26%, sin embargo se debe hacer un control de cambios al cronograma de implementación, teniendo en cuenta el cronograma de ejecución que realizó el contratista derivado de implementación, y aprobó el contratista derivado de interventoría el cual se encuentra dentro de los tiempos contractuales del convenio. Para poder tener el retraso real de la implementación.

Durante los días 3 y 4 de febrero de 2026, se realizó visita de seguimiento al proyecto con presencia de representantes del Ministerio del Interior, Gobernación del Casanare y contratistas derivados, en el cual se presentaba el siguiente avance:

**Avance Ejecutado 53,81 % de 65,98 % Programado**
**Diferencia 12,17 %**




**El Consorcio Llano Seguro 2024 ha establecido un plan de choque integral con el objetivo de finalizar la implementación física en febrero e iniciar la fase de pruebas en marzo. La estrategia se divide en dos componentes principales:**

- **Planta Externa:** Se han asignado tres Grupos para cubrir un alcance total de 83 puntos PTZ, 70 multisensores, 32 puntos LPR y más de 137,000 metros de fibra óptica. Para cumplir con estos volúmenes, se desplegarán hasta 14 frentes de trabajo simultáneos, los cuales cuentan con el soporte de un equipo del Consorcio dedicado exclusivamente a la preconfiguración de equipos.

- **Planta Interna:** Las actividades se encuentran bajo la ejecución de un grupo especializado, quien coordina 5 frentes de trabajo paralelos en áreas de estructuras de concreto, mampostería, acabados e instalaciones hidrosanitarias. Se destaca la asignación de dos cuadrillas independientes dedicadas específicamente a las instalaciones eléctricas y al montaje de equipos, con el fin de acelerar el cierre operativo del CCM

## Inconvenientes Surgidos

- **Falla y Reparación Estructural - Placa 5° Piso** En obra de la construcción del CCM (centro de control y monitoreo) se detectaron huecos y falta de material en la placa del quinto piso. Este problema se originó desde la construcción original del edificio debido a tuberías que obstruyeron el paso del concreto. Para garantizar la seguridad, se realizó una reparación técnica que incluyó la limpieza del acero, el uso de adhesivos especializados y rellenos de alta resistencia. Este proceso generó un retraso en el cronograma, pues fue necesario obtener un diagnóstico experto y la validación de la interventoría para asegurar una solución definitiva y estructuralmente segura.



- **Retraso en Cubierta - 6° Piso (CCM):** Se presentó un desfase en el cronograma debido a dos factores críticos: la complejidad logística del transporte desde Bogotá hacia Yopal y los tiempos requeridos para finalizar el estudio estructural de montaje. Estas variables obligaron a reprogramar la fase de instalación; sin embargo, el material ya se encuentra en obra y el personal especializado del proveedor inició las labores de instalación durante la presente semana.





- **Traslado de Material de Planta Interna y Externa:** El envío de materiales desde Bogotá hacia Yopal presentó retrasos debido a la gestión de sitios seguros para su almacenamiento y a la adquisición de pólizas de transporte con cobertura de almacenaje. Estas gestiones se completaron exitosamente durante la última semana de enero con la compra de las pólizas requeridas. En consecuencia, el despacho del material está programado para el lunes 3 de febrero con destino a Yopal.

## Situación Critica

- **Devolución de Cámaras PTZ a Proveedor:** El Consorcio Llano Seguro 2024 informó que las cámaras recibidas no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, por lo cual fueron devueltas al proveedor. Se cuenta con un soporte documental que programa la llegada de los equipos de reemplazo a Colombia para la tercera semana de marzo; esta situación representa un riesgo potencial de retraso para la entrega final del proyecto.




Luego se realizó la visita al CCM y se realizaron las siguientes recomendaciones:

Se revisó el sitio definido para las unidades condensadoras de los aires acondicionado, y se recomendó una reubicación de estas, teniendo en cuenta que el lugar dispuesto, es un espacio de circulación de personas, adicionalmente, se solicita que se valide la tecnología usada, puesto que, al tener cada unidad manejadora con su propia condensadora, requiere mucho espacio para las condensadoras, así como para las tuberías y el cableado.

Asegurar que las ventanas tengan un recubrimiento polarizado, para disminuir la carga térmica por incidencia del sol.

En el cuarto de equipos del CCM, aparte de polarizar la ventana, también se haga una división en drywall para disminuir la carga térmica del mismo.

En las divisiones de drywall que se piense montar pantallas, se debe asegurar que esta cuenta con refuerzo de piso a techo.

Teniendo en cuenta que se evidencio que al cuarto de equipos del CCM se le está ingresando la UPS, se requiere que se vuelva a hacer el cálculo de carga térmica, para asegurar las condiciones del cuarto y la selección de equipos de aire acondicionado.

Revisar el pase entre pisos para la acometida eléctrica, pasando de una vez los ductos, para asegurar la disponibilidad de espacio puesto que en la visita se evidenció un posible riesgo en el pase entre pisos planteado.

Se revisó el espacio proyectado para la planta eléctrica y se recomendó instalar de una vez la tubería para el cableado eléctrico, para asegurar que el ducto propuesto para los pases entre pisos, si tiene la facilidad y disponibilidad de espacio.

Luego se realizó recorrido a las obras en calle en donde se realizaron las siguientes recomendaciones:

Se debe asegurar que, una vez intervenido el espacio para las canalizaciones, el espacio se debe dejar tal cual se encontró, arreglando la vía o los andenes intervenidos

Con respecto a la tierra se indicó lo siguiente:

1. Empalme no certificado del conductor de puesta a tierra.
2. Ausencia de métodos permitidos por RETIE para empalmes.
3. Conductor de puesta a tierra sin protección mecánica.
4. Ingreso de conductores sin ductería ni accesorios de protección.
5. Caja de inspección sin organización ni elementos normalizados.

Concepto técnico

La instalación evaluada NO CUMPLE con los requisitos establecidos en el RETIE 2024, presentando no conformidades críticas que impiden su certificación y representan riesgo para la seguridad.

Recomendaciones técnicas

1. Eliminar empalmes artesanales.
2. Ejecutar empalmes mediante soldadura exotérmica o conectores certificados.
3. Proteger el conductor de puesta a tierra.
4. Canalizar correctamente los conductores.
5. Instalar barra de tierra e identificación.
6. Verificar continuidad y resistencia de puesta a tierra.
7. Documentar correcciones para certificación RETIE.

Recomendación final:
No energizar ni dar por recibida la instalación hasta corregir las no conformidades.

De esta visita quedaron los siguientes compromisos:

| Responsable | Actividad | Fecha límite |
|---|---|---|
| **Contratista Implementador** | Corregir los empalmes de acuerdo a la recomendación | Próximo informe |
| **Contratista Implementador** | Actualizar las memorias de cálculo de carga térmica para el CCM | Próximo informe |
| **Interventoría** | Entregar aval a la Gobernación para el pago parcial | 5 de febrero 2026 |
| **Gobernación del Casanare** | Entregar al Ministerio del Radicado de solicitud de pago, con el respectivo informe financiero | 12 de febrero 2026 |
| **Contratista Implementador** | Informe correspondiente a los inconvenientes con las cámaras | 6 de febrero de 2026 |
| **Contratista Implementador** | Entregar el plan de choque para la adecuación del CCM detallado por actividades | 6 de febrero de 2026 |
| **Interventoría** | Hacer seguimiento diario al plan de choque presentado por el contratista de implementación | diario |

El 10 de febrero de 2026, se llevó a cabo reunión de seguimiento virtual con presencia de representantes del Ministerio del Interior, Gobernación del Casanare e Interventoría, donde la Gobernación del Casanare y la Interventoría presentaron el plan de choque para poner al día las actividades retrasadas, de esta reunión quedaron los siguientes compromisos:

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Crear Drive compartido con acceso a las partes | Interventoría | Inmediato |
| 2 | Cargar cronogramas oficiales (planta interna y externa) | Interventoría | Inmediato |
| 3 | Actualizar avances con registro fotográfico | Interventoría y Gobernación | Cada 1-2 días |
| 4 | Hacer seguimiento técnico al plan de choque | Ministerio del Interior | Permanente |
| 5 | Mantener bitácora técnica actualizada | Interventoría | Permanente |

El 13 de febrero de 2026, mediante correo electrónico, Ministerio del Interior solicitó al departamento del Casanare, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones anteriores, sin tener respuesta por parte de la gobernación.

El 24 de febrero de 2026, se llevó a cabo reunión de seguimiento virtual, con presencia de representantes del Ministerio del Interior, Gobernación del Casanare y contratistas derivados, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones anteriores, de la cual se resalta lo siguiente:

- El proceso de pago parcial No. 1 continúa **sin aprobación**, constituyendo un **cuello de botella administrativo** que afecta la legalización de recursos (~$17.000 millones)
- Incumplimiento del plan de choque.

  - Baja disponibilidad de personal en obra.
  - Retrasos en:
    - Obras civiles (especialmente planta interna)
    - Instalación y llegada de equipos (solo ~50% entregados)
  - Problemas logísticos (bodega, transporte, preconfiguración).

De la reunión quedaron los siguientes compromisos

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Reanudar mesa de trabajo con participación de representantes legales para definir soportes de pago | Gobernación de Casanare | 25 de febrero de 2026 |
| 2 | Revisar y corregir documentación del acta parcial No. 1 | Consorcio Llano Seguro | 25 de febrero de 2026 |
| 3 | Verificar requisitos y emitir concepto definitivo sobre pago parcial | Interventoría | Pendiente mesa técnica |
| 4 | Informar resultados de la mesa al Ministerio | Gobernación | Posterior a reunión |
| 5 | Continuar seguimiento técnico a ejecución del proyecto | Ministerio e Interventoría | Permanente |
| 6 | Revisar plan de choque y ajustar cronograma de ejecución | Contratista | Inmediato |

Al finalizar el mes se presenta la siguiente curva S


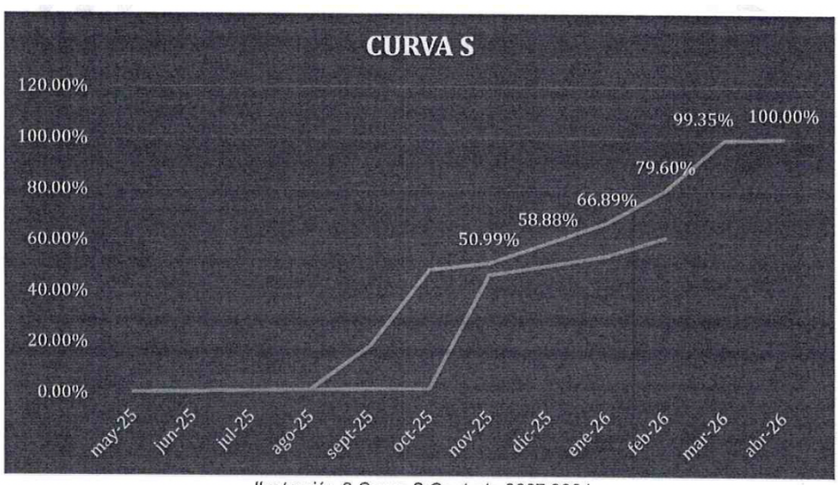




*Ilustración 2 Curva S Contrato 3007 2024*

Presentando un retraso de 18,5% de acuerdo al cronograma se implementación de los contratistas derivados. Evidenciando que el contratista de implementación no ha sido efectivo con el plan de choque, así como las acciones que ha realizado la interventoría, no han sido suficientes para lograr que el contratista de implementación se ponga al día en su ejecución.


**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: Registro fotográfico**

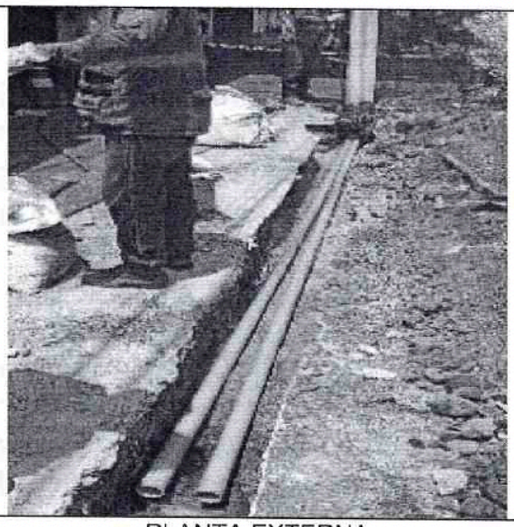


PLANTA EXTERNA

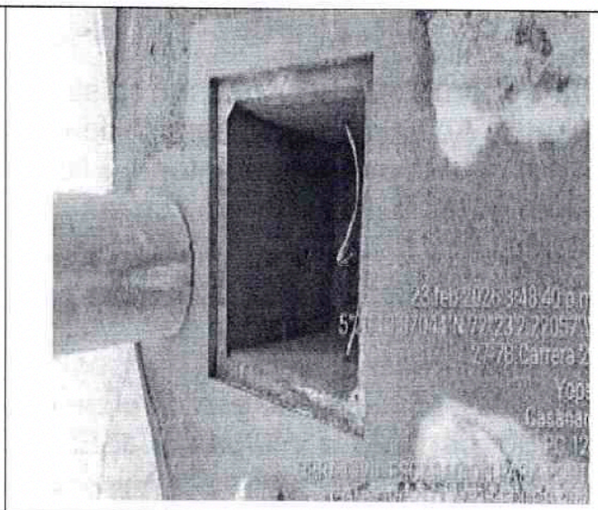


PLANTA EXTERNA

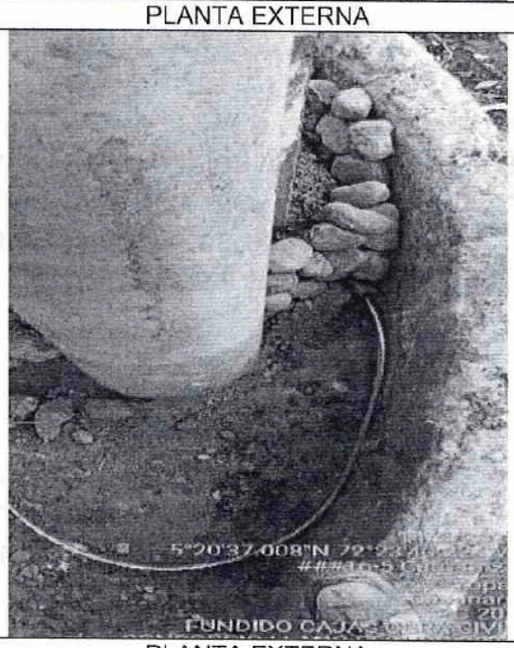


PLANTA EXTERNA

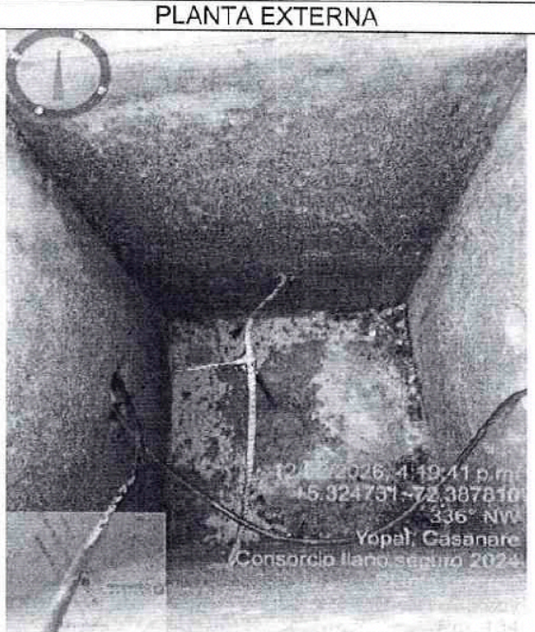

PLANTA EXTERNA

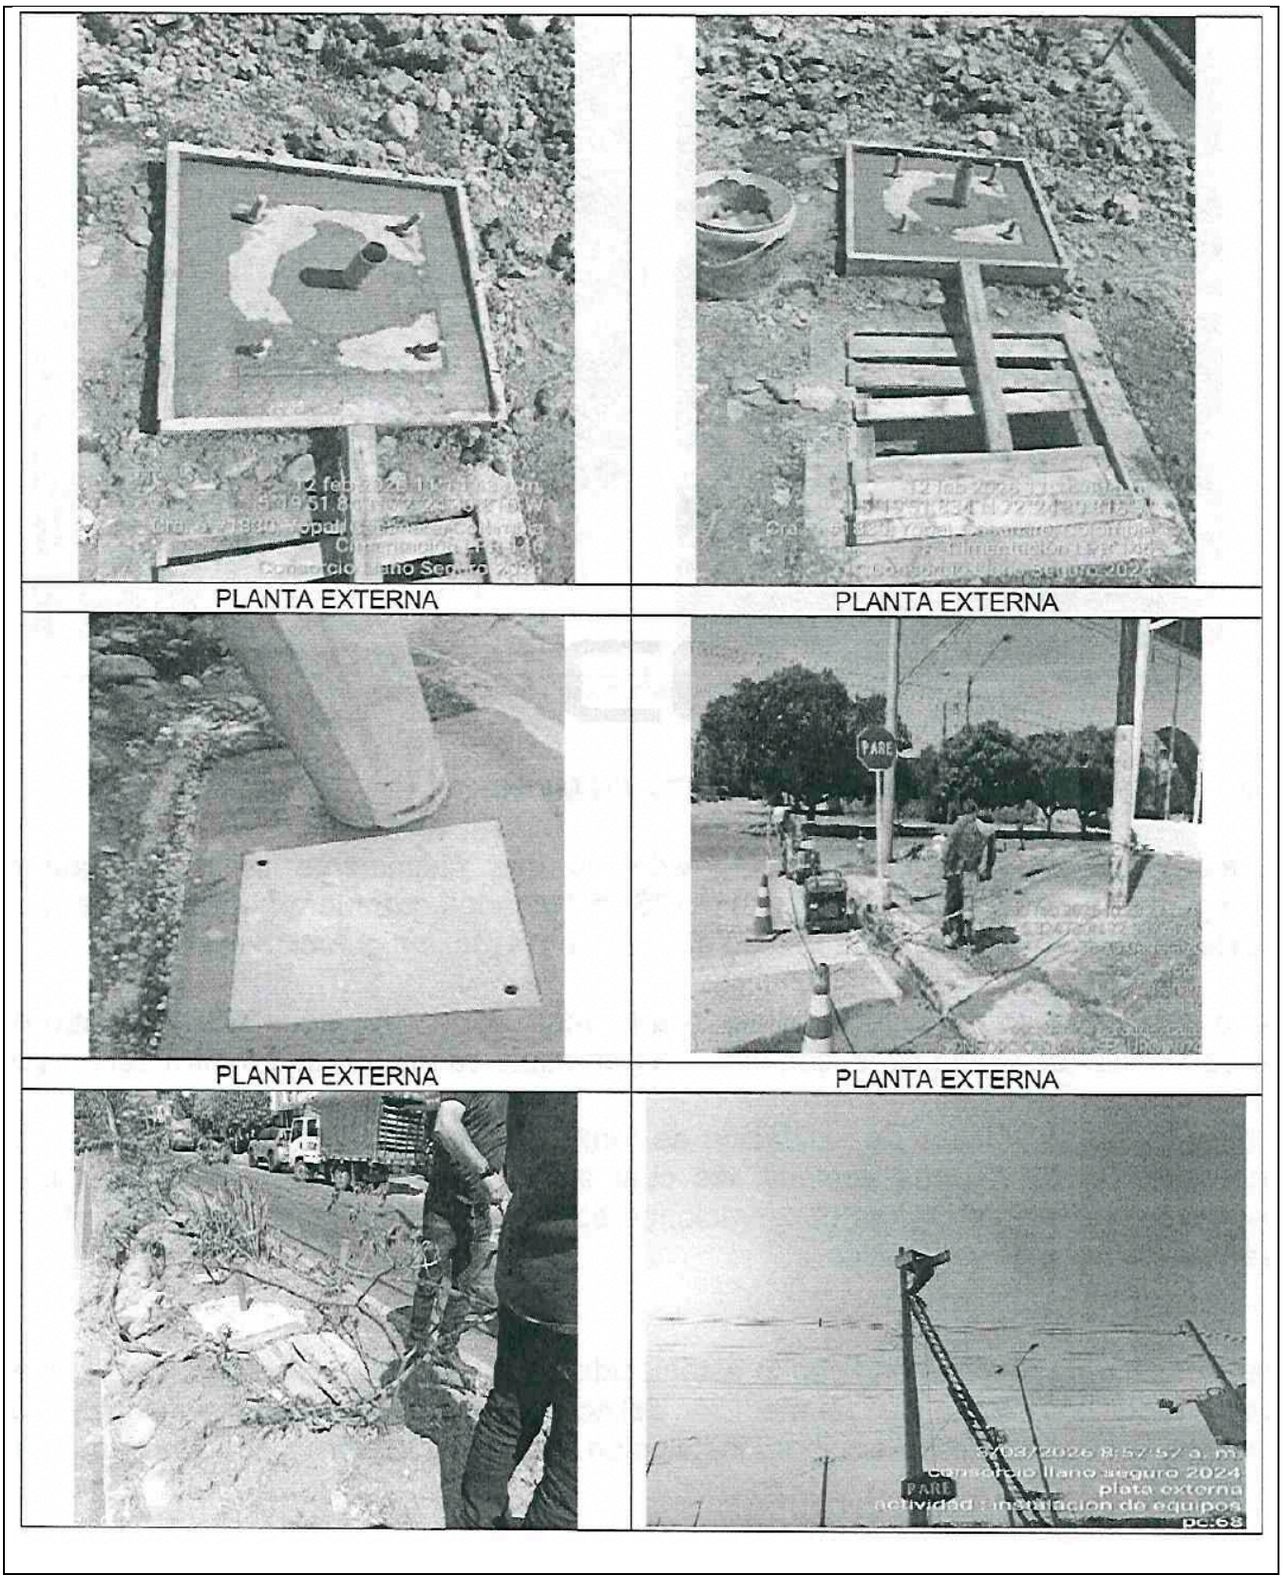
PLANTA EXTERNA
PLANTA EXTERNA
PLANTA EXTERNA
PLANTA EXTERNA
PARE
PARE

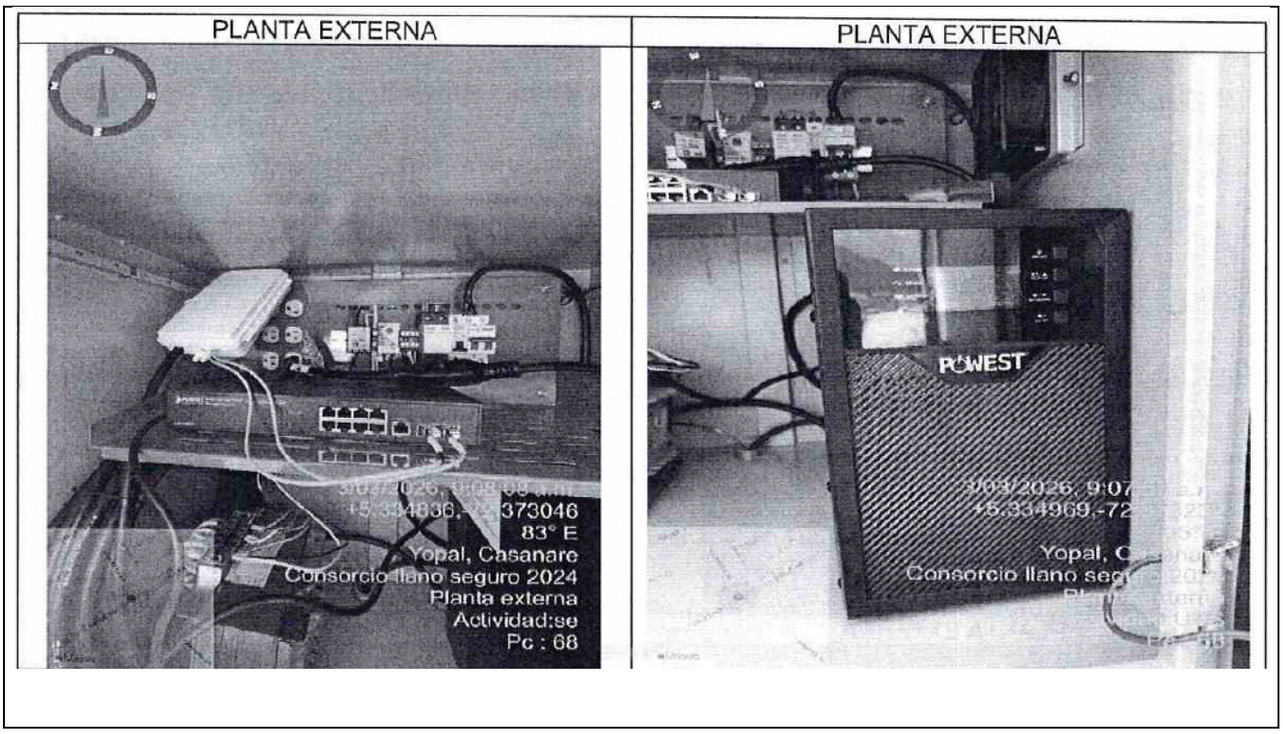


**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 y 5 de junio de 2025 | 3 y 4 de febrero de 2026 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **MARLENY RIVERA GALEANO**<br>Supervisora Convenio No. 1808 de 2024<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON | **Elaboró: SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ**<br>Apoyo a la supervisión SIES<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON |

Outlook

## Seguimiento a los compromisos

**Desde** Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>
**Fecha** Vie 13/02/2026 10:02
**Para** Hector Julio Ramos Prieto <hector.ramos@casanare.gov.co>
**CC** mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>

Cordial saludo

En atencion al convenio 1808 de 2024, amablemente solicito informar y enviar los soportes de los compromisos adquiridos en la visita de seguimiento durante los días 3 y 4 de febrero de 2025.

| Responsable | Actividad | Fecha límite |
|---|---|---|
| **Contratista Implementador** | Corregir los empalmes de acuerdo a la recomendación | Próximo informe |
| **Contratista Implementador** | Actualizar las memorias de cálculo de carga térmica para el CCM | Próximo informe |
| **Interventoría** | Entregar aval a la Gobernación para el pago parcial | 5 de febrero 2026 |
| **Gobernación del Casanare** | Entregar al Ministerio del Radicado de solicitud de pago, con el respectivo informe financiero | 12 de febrero 2026 |
| **Contratista Implementador** | Informe correspondiente a los inconvenientes con las cámaras | 6 de febrero de 2026 |
| **Contratista Implementador** | Entregar el plan de choque para la adecuación del CCM detallado por actividades | 6 de febrero de 2026 |
| **Interventoría** | Hacer seguimiento diario al plan de choque presentado por el contratista de implementación | diario |

Así mismo, el pasado 10 de febrero en la reunión virtual de seguimiento, se acordó crear un Drive compartido entre las partes, sin embargo, a la fecha no se encuntra la bitácora técnica cargada en el mismo,

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|
| 4 | Hacer seguimiento técnico al plan de choque | Ministerio del Interior | Permanente |
| 5 | Mantener bitácora técnica actualizada | Interventoría | Permanente |

Por lo anterior, amablemente solicito el cumplimiento de los compromisos y así poder llevar a feliz termino la ejecución del convenio.

Cordialmente,




**Subdirección de Proyectos SCC**
**Sergio Oswaldo Bernal Jiménez**
sergio.bernal@mininterior.gov.co
Celular: 3183516693
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá,
Colombia
www.mininterior.gov.co

| | |
|---|---|
| ACTA | REUNION DE SEGUIMIENTO |
| FECHA | 03-02-2026 al 04-02-2026 |
| CIUDAD | Bogotá |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO | 1808-2024 |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I. |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | 53,81% |
| MOTIVO: | Visita de verificación en sitio. |

**ANTECEDENTES DEL CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | $20.000.000.000,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | $20.000.000.000,00 |
| | **TOTAL APORTES DEL CONVENIO** | $40.000.000.000,00 |
| **FECHA DE INICIO** | 20/09/2024 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 01/06/2026 | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA MODIFICACIÓN: se modificó la cláusula sexta-FORMA DE PAGO. | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 04/10/2024 |
| | PRIMERA PRÓRROGA: con nuevo plazo de ejecución hasta el 24 de diciembre de 2025. | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 09/05/2025 |
| | SEGUNDA PRÓRROGA: con nuevo plazo de ejecución hasta el 1 de junio de 2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23/10/2025 |

## ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | A). Requisitos de legalización del convenio. B). Incorporación del recurso al presupuesto de la Entidad. C). Aprobación del cronograma del convenio. | NO APLICA | 28/03/2025 | $ 7.000.000.000 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A). Acto administrativo de adjudicación del contrato de Estudios, Diseños, Implementación e Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación de contrato de Interventoría. C). Actas de Inicio de los contratos derivados. | NO APLICA | 25/08/2025 | $ 7.000.000.000 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | contra entrega de la certificación del supervisor del convenio designado por el departamento que acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y | 40% | 26/12/2024 | $ 3.000.000.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $14.000.000.000 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 0,00 |

## INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños e implementación***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. CAS-OAJ-LP-009-2024** | *Realizar la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fase I, del Departamento de Casanare* | $ 37.390.300.786 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 | R.L. RUBEN DARIO GÓMES VALLEJO C.C.79.723.597 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 21/05/2025 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 04/04/2026 | |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA | |
| **PÓLIZA No.** | No. 85194 | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 30/12/2024 | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños e implementación***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. CAS-OAJ-CMA-002-2025** | *Interventoria técnica, financiera, juridica, administrativa y ambiental para la "implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del casanare - fase i.* | $ 1.029.823.343,00 |
| **Nombre contratista** | SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S. NIT. 900.115.339-0 | DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ C.C.74.859.089 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 21/05/2025 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 05/05/2026 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | $ 1.029.823.343,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |
| **PÓLIZA No.** | 57-44-101006998 | |

| FECHA DE LA PÓLIZA | 2025/04/11 |
|---|---|

**DESARROLLO DE LA REUNION**

**Asistentes:**

- **Marleny Rivera** – Representante Ministerio del Interior – Supervisora convenio 1808 de 2024.
- **Julio Ramos -** Representante Gobernación del Casanare -Supervisor convenio 1808 de 2024
- **Mauricio Montoya** – Representante Gobernación del Casanare – Apoyo a la supervisión Gobernación.
- **Elian Rodriguez -** Representante Gobernación del Casanare – Apoyo a la supervisión Gobernación.
- **Diego Rojas** – Representante Interventoría – Representante Legal
- **Diego Mora -** Representante Interventoría – Profesional de apoyo
- **Juan Torres -** Representante Implementador – Director de Proyectos
- **Helbert Rivera -** Representante Implementador – Ingeniero Residente
- **Nataly Martinez -** Representante Implementador – Prof SST

**Objetivo de la reunión**

Verificar en sitio los avances correspondientes a la fase de implementación, específicamente en los puntos de instalación de cámaras de videovigilancia y en el Centro de Control y Monitoreo (CCM), con el fin de constatar el avance certificado por el ente territorial y la interventoría. (Convenio 1808 de 2024)

Agenda

1. Revisión compromisos anteriores
2. Presentación del avance
3. Visita al CCM
4. Visita a los puntos de cámara
5. Compromisos

---

**1.** Revisión compromisos anteriores

**Compromisos anteriores**

| Responsable | Actividad | Fecha límite | Observación |
|---|---|---|---|
| **Contratista Implementador** | Subsanación de los informes de septiembre y octubre de 2025 a interventoría | 22 de enero de 2026 | Se enviaron y volvieron a ser observados, hoy 4 de febrero se entrega con las observaciones corregidas |
| **Contratista Implementador** | Entrega de acta de entrega parcial solicitada por almacén de la Gobernación a interventoría | 22 de enero de 2026 | El 2 de febrero completo toda la documentación solicitada |
| **Interventoría** | Entregar aval a la Gobernación para el pago parcial | 27 de enero de 2026 | Interventoría lo está revisando y el 5 de febrero de 2026 entregará el aval |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gobernación del Casanare** | Entregar al Ministerio del Radicado de solicitud de pago | 30 de enero de 2026 | El 12 de febrero es la nueva fecha de compromiso |
| **Contratista Implementador** | Informe correspondiente a los inconvenientes con las cámaras | 27 de enero de 2026 | Se está recolectando las evidencias y se presentará el 6 de febrero de 2026 |
| **Contratista Implementador** | Plan de choque | 27 de enero de 2026 | Se entrego hoy 4 de febrero de 2026 |

Ministerio ve con preocupación la ejecución financiera, evidenciando un posible incumplimiento del convenio 1808 de 2024, de acuerdo a **las OBLIGACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO:** numeral "**19.** Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del convenio.", teniendo en cuenta que a la fecha se han desembolsado 17 mil millones de pesos, y a hoy el reporte del avance de ejecución certifica por la interventoría y la supervisión del Departamento es un 53,81%, no se ha ejecutado oportunamente los trámites para ejecutar los recursos financieros, puesto que al día de hoy no han realizado la respectiva legalización de los recursos con las facturas del avance parcial. Así mismo la supervisión del Departamento está incumpliendo los compromisos pactados anteriormente.

Durante la visita se realizó el plan de choque para intervención en calle, sin embargo, el contratista se compromete a entregar a mas tardar el 6 de febrero el plan de choque detallado para la intervención del CCM, por lo anterior la interventoría hará el seguimiento diario a este plan de choque, y reportará cualquier desvió o incumplimiento a este plan.

**2.** Presentación del avance

**Avance Ejecutado 53,81 % de 65,98 % Programado**
**Diferencia 12,17 %**

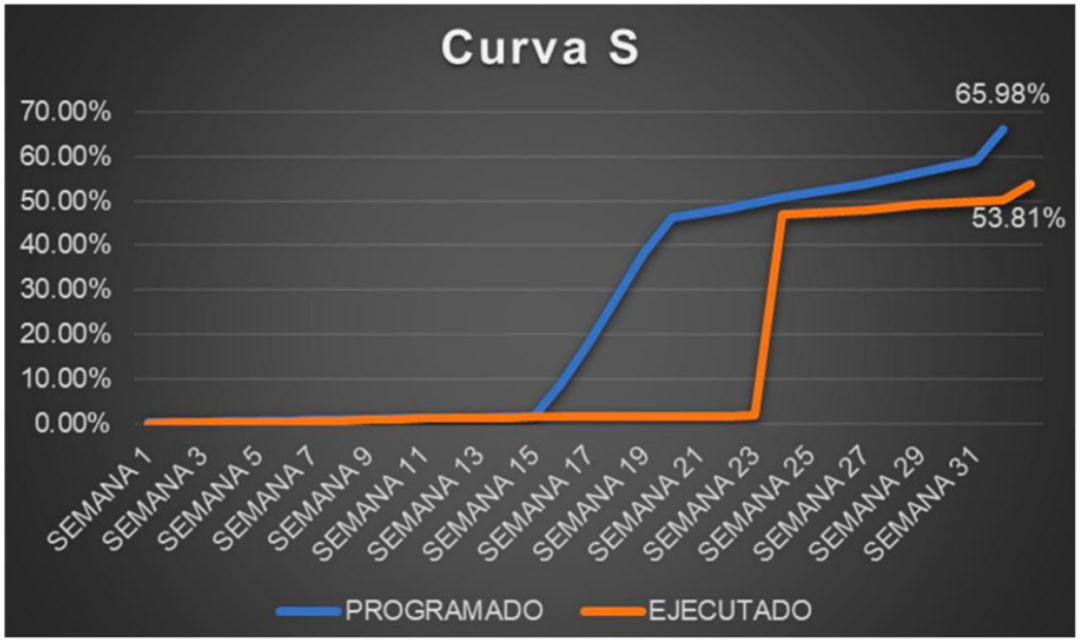

## Etapas en ejecución

| SUMINISTRO E INSTALACION | ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA |
|---|---|
| Compra y montaje de cámaras, altavoces, fibra óptica y equipamiento de (SIES) | Edecuacion de los espacios fisicos |
| **21 Semanas** ( desde 08 de Septiembre 2025) | **5 Semanas** (desde 15 de Febrero hasta el 21 de Marzo de 2026) |
|  |  |

**El Consorcio Llano Seguro 2024 ha establecido un plan de choque integral con el objetivo de finalizar la implementación física en febrero e iniciar la fase de pruebas en marzo. La estrategia se divide en dos componentes principales:**

- **Planta Externa:** Se han asignado tres Grupos para cubrir un alcance total de 83 puntos PTZ, 70 multisensores, 32 puntos LPR y más de 137,000 metros de fibra óptica. Para cumplir con estos volúmenes, se desplegarán hasta 14 frentes de trabajo simultáneos, los cuales cuentan con el soporte de un equipo del Consorcio dedicado exclusivamente a la preconfiguración de equipos.

- **Planta Interna:** Las actividades se encuentran bajo la ejecución de un grupo especializado, quien coordina 5 frentes de trabajo paralelos en áreas de estructuras de concreto, mampostería, acabados e instalaciones hidrosanitarias. Se destaca la asignación de dos cuadrillas independientes dedicadas específicamente a las instalaciones eléctricas y al montaje de equipos, con el fin de acelerar el cierre operativo del CCM

## Inconvenientes Surgidos

- **Falla y Reparación Estructural - Placa 5° Piso** En obra de la construcción del CCM (centro de control y monitoreo) se detectaron huecos y falta de material en la placa del quinto piso. Este problema se originó desde la construcción original del edificio debido a tuberías que obstruyeron el paso del concreto. Para garantizar la seguridad, se realizó una reparación técnica que incluyó la limpieza del acero, el uso de adhesivos especializados y rellenos de alta resistencia. Este proceso generó un retraso en el cronograma, pues fue necesario obtener un diagnóstico experto y la validación de la interventoría para asegurar una solución definitiva y estructuralmente segura.



- **Retraso en Cubierta - 6° Piso (CCM):** Se presentó un desfase en el cronograma debido a dos factores críticos: la complejidad logística del transporte desde Bogotá hacia Yopal y los tiempos requeridos para finalizar el estudio estructural de montaje. Estas variables obligaron a reprogramar la fase de instalación; sin embargo, el material ya se encuentra en obra y el personal especializado del proveedor inició las labores de instalación durante la presente semana.





- **Traslado de Material de Planta Interna y Externa:** El envío de materiales desde Bogotá hacia Yopal presentó retrasos debido a la gestión de sitios seguros para su almacenamiento y a la adquisición de pólizas de transporte con cobertura de almacenaje. Estas gestiones se completaron exitosamente durante la última semana de enero con la compra de las pólizas requeridas. En consecuencia, el despacho del material está programado para el lunes 3 de febrero con destino a Yopal.

## Situación Critica

- **Devolución de Cámaras PTZ a Proveedor:** El Consorcio Llano Seguro 2024 informó que las cámaras recibidas no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, por lo cual fueron devueltas al proveedor. Se cuenta con un soporte documental que programa la llegada de los equipos de reemplazo a Colombia para la tercera semana de marzo; esta situación representa un riesgo potencial de retraso para la entrega final del proyecto.





El contratista evaluará el plan de instalación de las cámaras de acuerdo a la carta del fabricante, con fecha 20 de marzo de 2026. (carta adjunta)

**3.** Visita al CCM

Ministerio evidencia un retraso significativo en el avance de las obras, el contratista informa que ya está ingresando más personal implementando el plan de choque presentado, para ponerse al día con las actividades.

**Registro fotográfico**



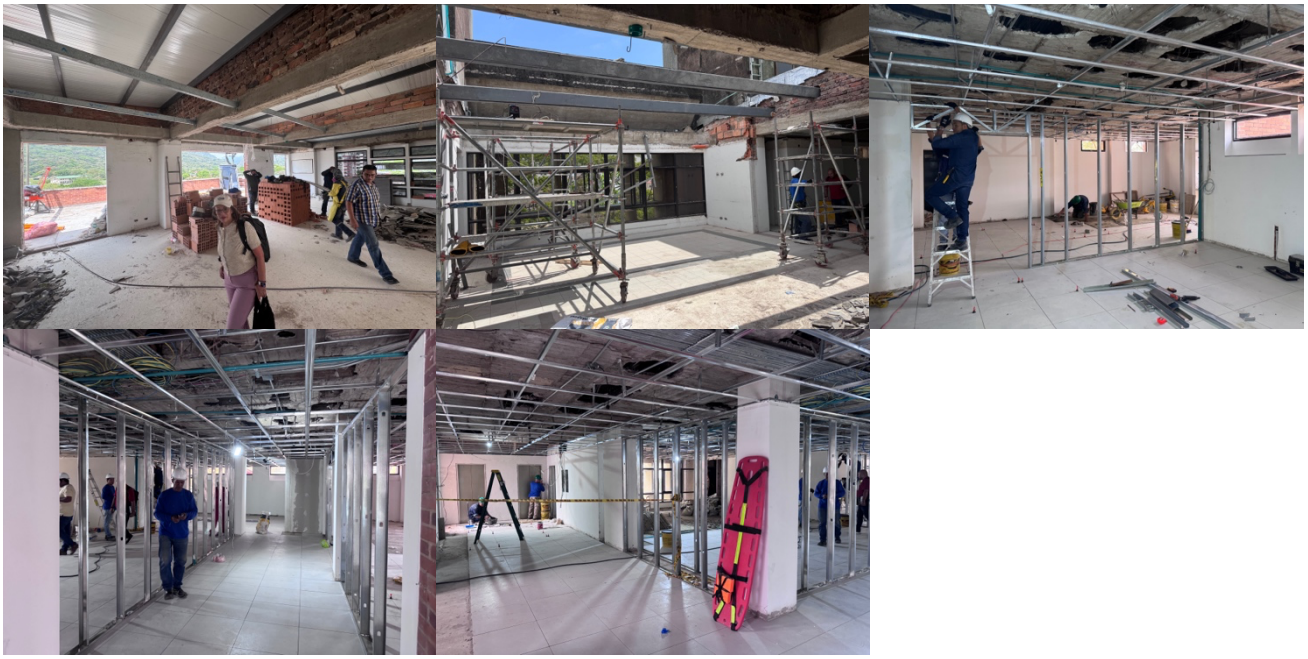

Recomendaciones

Se revisó el sitio definido para las unidades condensadoras de los aires acondicionado, y se recomendó una reubicación de estas, teniendo en cuenta que el lugar dispuesto, es un espacio de circulación de personas, adicionalmente, se solicita que se valide la tecnología usada, puesto que, al tener cada unidad manejadora con su propia condensadora, requiere mucho espacio para las condensadoras, así como para las tuberías y el cableado.

Asegurar que las ventanas tengan un recubrimiento polarizado, para disminuir la carga térmica por incidencia del sol.

En el cuarto de equipos del CCM, aparte de polarizar la ventana, también se haga una división en drywall para disminuir la carga térmica del mismo.

En las divisiones de drywall que se piense montar pantallas, se debe asegurar que esta cuenta con refuerzo de piso a techo.

Teniendo en cuenta que se evidencio que al cuarto de equipos del CCM se le está ingresando la UPS, se requiere que se vuelva a hacer el cálculo de carga térmica, para asegurar las condiciones del cuarto y la selección de equipos de aire acondicionado.

Revisar el pase entre pisos para la acometida eléctrica, pasando de una vez los ductos, para asegurar la disponibilidad de espacio puesto que en la visita se evidenció un posible riesgo en el pase entre pisos planteado.

Planta eléctrica



Se recomienda instalar de una vez la tubería para el cableado eléctrico, para asegurar que el ducto propuesto para los pases entre pisos, si tiene la facilidad y disponibilidad de espacio.

**4.** Visita a los puntos de cámara











Recomendaciones

Se debe asegurar que, una vez intervenido el espacio para las canalizaciones, el espacio se debe dejar tal cual se encontró, arreglando la vía o los andenes intervenidos

Análisis técnico con respecto a la puesta a tierra

De la inspección visual realizada, se evidencian las siguientes no conformidades técnicas:

1. Empalme no certificado del conductor de puesta a tierra.
2. Ausencia de métodos permitidos por RETIE para empalmes.
3. Conductor de puesta a tierra sin protección mecánica.
4. Ingreso de conductores sin ductería ni accesorios de protección.
5. Caja de inspección sin organización ni elementos normalizados.

2. Concepto técnico

La instalación evaluada NO CUMPLE con los requisitos establecidos en el RETIE 2024, presentando no conformidades críticas que impiden su certificación y representan riesgo para la seguridad.

3. Recomendaciones técnicas

1. Eliminar empalmes artesanales.
2. Ejecutar empalmes mediante soldadura exotérmica o conectores certificados.
3. Proteger el conductor de puesta a tierra.
4. Canalizar correctamente los conductores.
5. Instalar barra de tierra e identificación.
6. Verificar continuidad y resistencia de puesta a tierra.
7. Documentar correcciones para certificación RETIE.

Recomendación final:
No energizar ni dar por recibida la instalación hasta corregir las no conformidades.

**5.** Visita bodega





**6.** compromisos

| Responsable | Actividad | Fecha límite |
|---|---|---|
| **Contratista Implementador** | Corregir los empalmes de acuerdo a la recomendación | Próximo informe |
| **Contratista Implementador** | Actualizar las memorias de cálculo de carga térmica para el CCM | Próximo informe |
| **Interventoría** | Entregar aval a la Gobernación para el pago parcial | 5 de febrero 2026 |
| **Gobernación del Casanare** | Entregar al Ministerio del Radicado de solicitud de pago, con el respectivo informe financiero | 12 de febrero 2026 |
| **Contratista Implementador** | Informe correspondiente a los inconvenientes con las cámaras | 6 de febrero de 2026 |
| **Contratista Implementador** | Entregar el plan de choque para la adecuación del CCM detallado por actividades | 6 de febrero de 2026 |
| **Interventoría** | Hacer seguimiento diario al plan de choque presentado por el contratista de implementación | diario |

**FIRMA DE ASISTENTES:** se adjunta la lista de asistentes

| Interior | PROCESO | PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES | VERSIÓN | 08 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO | LISTA DE ASISTENTES | PÁGINA | 1 de 2 |
| | | | FECHA VIGENCIA | 09/09/2024 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tema: | Visita de verificación segnce convenio 1808 de 2024 | | | | | |
| Responsable u organizador: | Ministerio del Interior | Dependencia: | Sub. de Seguridad | | | |
| Ciudad: | Topol - Casanare | Lugar y/o enlace: | Topol - Casanare | ☒ Presencial ☐ Virtual | Fecha: Día 3-4 / Mes 02 / Año 2026 | Hora inicial 8:00 AM / Hora final 5:00 PM |
| Tipo ☐ Comité ☐ Junta ☒ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____ | | | | | | |

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE):** Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

| Nº | NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | EDAD | SN | PD | PE | ¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI | NO | PN | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CARGO / ROL | CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Andres Mora P | 1.118.537599 | 27 | H | | | | X | | SECOB SAS | Ingeniero | Proyectos@secob.com.co | 3143790859 | |
| 2 | Mauricio Montoya | 79485804 | 56 | | | | | X | | S-Cob | S-Cob | [illegible] | 3125880222 | |
| 3 | Helbert Leonel Rivera Cañas | 1123945609 | 37 | | | | | X | | CLS 2024 | Ing Residente | lmivera@tsg.net.co | 3213745219 | |
| 4 | Juan Marco Torres Nova | 1019004203 | 39 | | | | | X | | CLS 2024 | Dir Proyectos | juan.torres@violetec.com.co | 3223391301 | |
| 5 | Norbely Martinez | 1116613143 | 37 | | | | | X | | CLS 2024 | Prof. SST | yolada.martinez@tsg.net.co | 3188528941 | |
| 6 | Elian Rodriguez Barrio | 1006405249 | 25 | | | | | X | | Cob Casanare | Prof. Apoyo | elianrodriguez29855@gmail.com | 3219908205 | |
| 7 | Diego Rojas Gómez | 74859089 | 44 | H | — | — | | X | | SECOB | T/C | diego.rojas@SECOB.COM.CO | 3106065856 | |
| 8 | Julio Romero Prieto | 74745537 | 43 | | | | | X | | [illegible] | Secretario | gobierno@tocaria.gov.co | 3157969278 | |
| 9 | Juan Dario Acosta | 1098713542 | 35 | | | | | X | | CLS 2024 | Ing Residente | juan.acosta@tsg.com.co | 3164061977 | |
| 10 | Carlos Obando A. | 1122770S | 44 | | | | | X | | CLS 2024 | Ing. Residente | carlos.obando@tsg.net.co | 3103297455 | 1122770S |
| 11 | Sergio O Bernal J. | 80549186 | 41 | H | — | NA | | X | | Min Interior | Apoyo Supervisión | sergio.bernal@mininterior.gov.co | 3163516693 | |
| 12 | Marleny Rivera G. | 43[illegible]09 | — | — | | | | X | | MINISTERIO | SUPERVISOR | marleny.rivera@mininterior.gov.co | 3185826140 | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

# “SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.”




**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1808 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**CONTRATO OTROS ATIPICOS E INNOMINADOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 (CONSORCIO LLANO SEGURO 2024)**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° SECOP II CAS-OAJ-CMA-002-2025 Y No. INTERNO 1328 de 2025 (SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS - SECOB**

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6


# Avance Ejecutado 53,81 % de 65,98 % Programado
# Diferencia 12,17 %

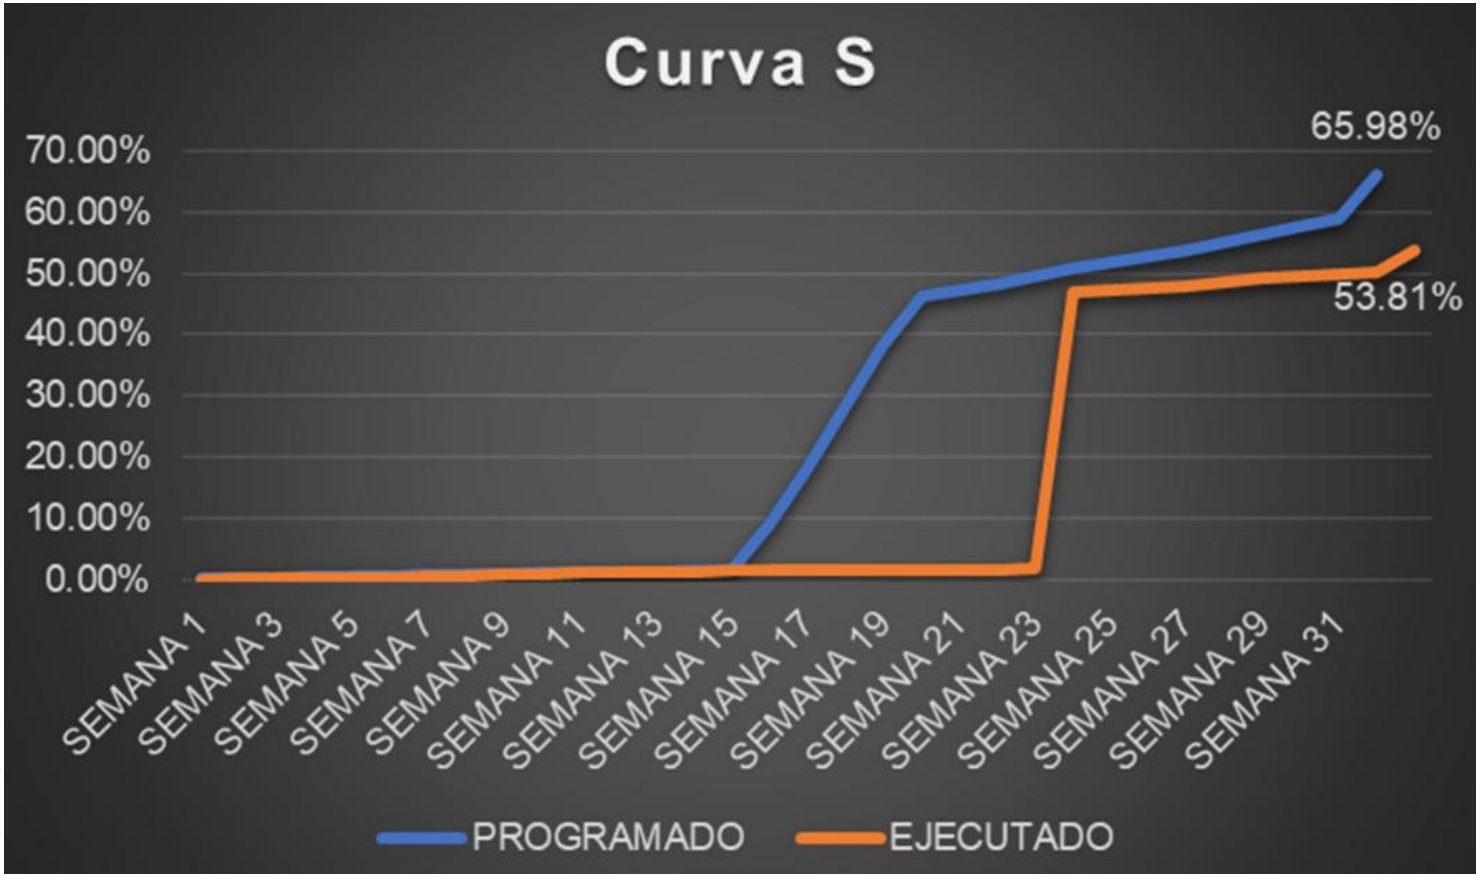

# “SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.”

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

## Etapas Principales del Proyecto:

| ESTUDIOS Y DISEÑOS | SUMINISTRO E INSTALACION | ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA | CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA | CAPACITACION Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO | SOPORTE Y MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Planificación técnica y diseño de la red y del centro de monitoreo | Compra y montaje de cámaras, altavoces, fibra óptica y equipamiento de (SIES) | Edecuacion de los espacios fisicos | Instalación de software, integración de sistemas y pruebas de funcionamiento | Entrenamiento del personal a cargo de la operación | Servicio continuo para asegurar el funcionamiento permanente |
| **14 Semanas** (desde 21 de Mayo de 2025) | **21 Semanas** ( desde 08 de Septiembre 2025) | **5 Semanas** (desde 15 de Febrero hasta el 21 de Marzo de 2026) | **1 Semanas** (desde 22 de Marzo hasta el 28 de Marzo 2026) | **1 Semanas** (desde 29 de Marzo hasta el 04 de abril de 2026) | **104 Semanas** (Dos Años) |
|  |  |  |  |  |  |

Plan de Choque Consorcio Llano seguro 2024

## Etapas Principales del Proyecto:

Plan de Choque Consorcio Llano seguro 2024


**El Consorcio Llano Seguro 2024 ha establecido un plan de choque integral con el objetivo de finalizar la implementación física en febrero e iniciar la fase de pruebas en marzo. La estrategia se divide en dos componentes principales:**

- **Planta Externa:** Se han asignado tres Grupos para cubrir un alcance total de 83 puntos PTZ, 70 multisensores, 32 puntos LPR y más de 137,000 metros de fibra óptica. Para cumplir con estos volúmenes, se desplegarán hasta 14 frentes de trabajo simultáneos, los cuales cuentan con el soporte de un equipo del Consorcio dedicado exclusivamente a la preconfiguración de equipos.

- **Planta Interna:** Las actividades se encuentran bajo la ejecución de un grupo especializado, quien coordina 5 frentes de trabajo paralelos en áreas de estructuras de concreto, mampostería, acabados e instalaciones hidrosanitarias. Se destaca la asignación de dos cuadrillas independientes dedicadas específicamente a las instalaciones eléctricas y al montaje de equipos, con el fin de acelerar el cierre operativo del CCM

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

# Avance Ejecucion CCM Ed. Emiro Sossa

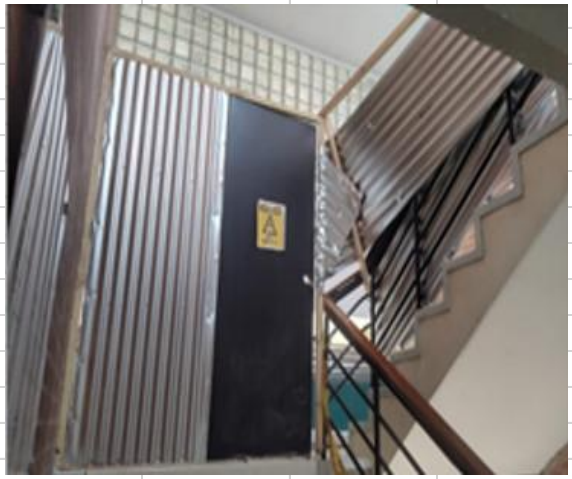






# Avance Ejecucion CCM Ed. Emiro Sossa















# Avance Ejecucion CCM Ed. Emiro Sossa


















# Avance Ejecucion Planta Externa














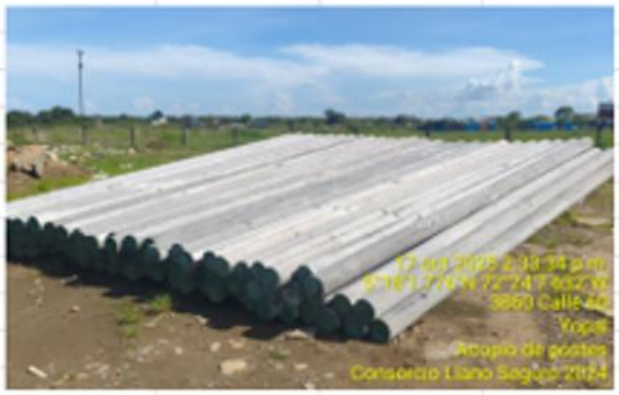




# Avance Ejecucion Planta Externa


















# Inconvenientes Surgidos

- **Falla y Reparación Estructural - Placa 5° Piso** En obra de la construcción del CCM (centro de control y monitoreo) se detectaron huecos y falta de material en la placa del quinto piso. Este problema se originó desde la construcción original del edificio debido a tuberías que obstruyeron el paso del concreto. Para garantizar la seguridad, se realizó una reparación técnica que incluyó la limpieza del acero, el uso de adhesivos especializados y rellenos de alta resistencia. Este proceso generó un retraso en el cronograma, pues fue necesario obtener un diagnóstico experto y la validación de la interventoría para asegurar una solución definitiva y estructuralmente segura.



# Inconvenientes Surgidos

- **Retraso en Cubierta - 6° Piso (CCM):** Se presentó un desfase en el cronograma debido a dos factores críticos: la complejidad logística del transporte desde Bogotá hacia Yopal y los tiempos requeridos para finalizar el estudio estructural de montaje. Estas variables obligaron a reprogramar la fase de instalación; sin embargo, el material ya se encuentra en obra y el personal especializado del proveedor inició las labores de instalación durante la presente semana.





- **Traslado de Material de Planta Interna y Externa:** El envío de materiales desde Bogotá hacia Yopal presentó retrasos debido a la gestión de sitios seguros para su almacenamiento y a la adquisición de pólizas de transporte con cobertura de almacenaje. Estas gestiones se completaron exitosamente durante la última semana de enero con la compra de las pólizas requeridas. En consecuencia, el despacho del material está programado para el lunes 3 de febrero con destino a Yopal.

# Situación Critica

- **Devolución de Cámaras PTZ a Proveedor:** El Consorcio Llano Seguro 2024 informó que las cámaras recibidas no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, por lo cual fueron devueltas al proveedor. Se cuenta con un soporte documental que programa la llegada de los equipos de reemplazo a Colombia para la tercera semana de marzo; esta situación representa un riesgo potencial de retraso para la entrega final del proyecto.



# PLAN DE CHOQUE Y CIERRE PROYECTO CCTV YOPAL - CONSORCIO LLANO SEGURO 2024

| | | PERSONAL DEDICADO | CANT EJEC | PTE X EJEC | TOTAL | % | OBSERVACION | FEBRERO 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | MARZO 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Planta Externa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | HINCADO DE POSTES | | 158 | 3 | 161 | 98,14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | 0 |
| 2 | PUNTO DE CANALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | CANALIZACIÓN (SUBDUCTADO) | | 82 | 103 | 185 | 44,32% | | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | | | | | | | | | 103 | 0 |
| 2.2 | CAJAS 60X60 | | 69 | 116 | 185 | 37,30% | | | | | 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | | | | | | | | | 116 | 0 |
| 2.3 | CAJAS 40X40 | | 66 | 116 | 182 | 36,26% | | | | | 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | | | | | | | | | 116 | 0 |
| 2.4 | BAJANTES | | 50 | 128 | 178 | 28,09% | | | | | 6 | 6 | 5 | 7 | | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | | 1 | | | | | | | 128 | 0 |
| 3 | SISTEMA PUESTA TIERRA - ACOMETIDA ELÉCTRICA | | 36 | 149 | 185 | 19,46% | | | | | 6 | 6 | 6 | 5 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 3 | | | | | | 149 | 0 |
| 4 | CIMENTACION ESTRUCTURAS LPR | | 0 | 32 | 32 | 0,00% | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 32 | 0 |
| 5 | INSTALACION DE ESTRUCTURA LPR | | 0 | 32 | 32 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | | 5 | | | | | | | 32 | 0 |
| 6 | INSTALACIÓN DE GABINETES Y CORONAS | | 140 | 45 | 185 | 75,68% | | | | | | | | 3 | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | | 8 | 3 | 3 | 7 | | 2 | | | 8 | 4 | | | | | 45 | 0 |
| 7 | INSTALACIÓN UPS + SWITCH | | 0 | 185 | 185 | 0,00% | | | | | | | | | | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | 185 | 0 |
| 8 | INSTALACION PARLANTES | | 0 | 100 | 100 | 0,00% | | | | | | | | | | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | 100 | 0 |
| 9 | INSTALACION PUNTOS CAMARAS LPR | | 0 | 32 | 32 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 7 | | 2 | 7 | 8 | | | | | 32 | 0 |
| 10 | INSTALACION CAMARAS MULTISENSOR + BRAZO | | 0 | 70 | 70 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | 70 | 0 |
| 11 | INSTALACION CAMARAS PTZ + BRAZO | | 0 | 83 | 83 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -83 |
| 12 | INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA | | 122428 | 15100 | 137528 | 89,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -15100 |
| 13 | INSTALACION NODOS DE CONCENTRACION | | 0 | 3 | 3 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 | 0 |
| 14 | INSTALACION RADIOENLACE | | 0 | 1 | 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 0 |

**Observaciones Generales del plan de choque**

| | |
|---|---|
| 1 | Cuadrilla de Izaje Esctructuras/Postes |
| 1 | Cuadrilla Montaje Equipos |
| 3 | Cuadrilla de canalizaciones |
| 1 | Cuadrilla de tierras bajantes y acometidas |
| 1 | cuadrilla de Cimentación Estructuras LPR |
| 1 | Cuadrilla Montaje Equipos |
| 1 | Cuadrilla Fibra Optica |

# PLAN DE CHOQUE Y CIERRE PROYECTO CCTV YOPAL - SOMOS EXPERTOS

| | | PERSONAL DEDICADO | CANT EJEC | PTE X EJEC | TOTAL | % | OBSERVACION | FEBRERO 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | MARZO 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Planta Externa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 1 | HINCADO DE POSTES | 1x3 | 75 | 1 | 76 | 98,68% | Punto NIATA (Resuelto Permiso) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 2 | PUNTO DE CANALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2.1 | CANALIZACIÓN (SUBDUCTADO) | 3X3 | 31 | 54 | 85 | 36,47% | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 54 | 0 |
| 2.2 | CAJAS 60X60 | | 24 | 61 | 85 | 28,24% | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 61 | 0 |
| 2.3 | CAJAS 40X40 | | 29 | 61 | 90 | 32,22% | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 61 | 0 |
| 2.4 | BAJANTES | 1x3 | 18 | 67 | 85 | 21,18% | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | 67 | 0 |
| 3 | SISTEMA PUESTA TIERRA - ACOMETIDA ELÉCTRICA | | 13 | 72 | 85 | 15,29% | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | 72 | 0 |
| 4 | CIMENTACION ESTRUCTURAS LPR | 1x3 | 0 | 14 | 14 | 0,00% | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 14 | 0 |
| 5 | INSTALACION DE ESTRUCTURA LPR | 1x3 | 0 | 14 | 14 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | 14 | 0 |
| 6 | INSTALACIÓN DE GABINETES Y CORONAS | 1x3 | 70 | 15 | 85 | 82,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | 15 | 0 |
| 7 | INSTALACIÓN UPS + SWITCH | | 0 | 85 | 85 | 0,00% | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | 85 | 0 |
| 8 | INSTALACION PARLANTES | | 0 | 43 | 43 | 0,00% | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | 43 | 0 |
| 9 | INSTALACION PUNTOS CAMARAS LPR | 1x3 | 0 | 14 | 14 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 2 | | 2 | 2 | 4 | | | | | 14 | 0 |
| 10 | INSTALACION CAMARAS MULTISENSOR + BRAZO | | 0 | 28 | 28 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 3 | | 3 | 2 | | | | | | 28 | 0 |
| 11 | INSTALACION CAMARAS PTZ + BRAZO | | 0 | 43 | 43 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -43 |
| 12 | INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA | 1x3 | 59663 | 9276 | 68939 | 86,54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -9276 |
| 13 | INSTALACION NODOS DE CONCENTRACION | 1X3 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

**Observaciones Generales del plan de choque**

| | |
|---|---|
| 1 | Cuadrilla de Izaje Esctructuras/Postes |
| 1 | Cuadrilla Montaje Equipos |
| 3 | Cuadrilla de canalizaciones |
| 1 | Cuadrilla de tierras bajantes y acometidas |
| 1 | cuadrilla de Cimentación Estructuras LPR |
| 1 | Cuadrilla Montaje Equipos |

# PLAN DE CHOQUE Y CIERRE PROYECTO CCTV YOPAL - JAVIER CAMACHO

| | | PERSONAL DEDICADO | CANT EJEC | PTE X EJEC | TOTAL | % | OBSERVACION | FEBRERO 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | MARZO 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Planta Externa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | HINCADO DE POSTES | 1x3 | 50 | 2 | 52 | 96,15% | Marginal con problema técnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| 2 | PUNTO DE CANALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | CANALIZACIÓN (SUBDUCTADO) | 2X3 | 22 | 37 | 59 | 37,29% | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 37 | 0 |
| 2.2 | CAJAS 60X60 | | 16 | 43 | 59 | 27,12% | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 43 | 0 |
| 2.3 | CAJAS 40X40 | | 9 | 43 | 52 | 17,31% | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 43 | 0 |
| 2.4 | BAJANTES | | 9 | 43 | 52 | 17,31% | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 43 | 0 |
| 3 | SISTEMA PUESTA TIERRA - ACOMETIDA ELÉCTRICA | 1x2 | 0 | 59 | 59 | 0,00% | | | | | | | | 2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | 59 | 0 |
| 4 | CIMENTACION ESTRUCTURAS LPR | 1x2 | 0 | 7 | 7 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 |
| 5 | INSTALACION DE ESTRUCTURA LPR | 1x3 | 0 | 7 | 7 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | | 7 | 0 |
| 6 | INSTALACIÓN DE GABINETES Y CORONAS | 1x3 | 47 | 12 | 59 | 79,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | | | 12 | 0 |
| 7 | INSTALACIÓN UPS + SWITCH | | 0 | 59 | 59 | 0,00% | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 0 |
| 8 | INSTALACION PARLANTES | | 0 | 37 | 37 | 0,00% | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 0 |
| 9 | INSTALACION PUNTOS CAMARAS LPR | | 0 | 7 | 7 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | 7 | 0 |
| 10 | INSTALACION CAMARAS MULTISENSOR + BRAZO | | 0 | 29 | 29 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | | 3 | | | | | | 29 | 0 |
| 11 | INSTALACION CAMARAS PTZ + BRAZO | | 0 | 23 | 23 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -23 |
| 12 | INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA | 1x3 | 34050 | 5570 | 39620 | 85,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -5570 |
| 13 | INSTALACION NODOS DE CONCENTRACION | 1X3 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Observaciones Generales del plan de choque**

| | |
|---|---|
| 1 | Cuadrilla de Izaje Esctructuras/Postes |
| 1 | Cuadrilla de canalizaciones y Cimentacion Estructuras |
| 1 | Cuadrilla de tierras bajantes y acometidas |
| 1 | Cuadrilla Montaje Equipos |

# PLAN DE CHOQUE Y CIERRE PROYECTO CCTV YOPAL - RUBEN DELGADO

| | | PERSONAL DEDICADO | CANT EJEC | PTE X EJEC | TOTAL | % | OBSERVACION | FEBRERO 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | MARZO 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Planta Externa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | HINCADO DE POSTES | | 33 | 0 | 33 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | PUNTO DE CANALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | CANALIZACIÓN (SUBDUCTADO) | 1X6 | 29 | 12 | 41 | 70,73% | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 |
| 2.2 | CAJAS 60X60 | | 29 | 12 | 41 | 70,73% | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 |
| 2.3 | CAJAS 40X40 | | 28 | 12 | 40 | 70,00% | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 |
| 2.4 | BAJANTES | | 23 | 18 | 41 | 56,10% | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | | 1 | | 2 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 18 | 0 |
| 3 | SISTEMA PUESTA TIERRA - ACOMETIDA ELÉCTRICA | 1x3 | 23 | 18 | 41 | 56,10% | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 18 | 0 |
| 4 | CIMENTACION ESTRUCTURAS LPR | 1x6 | 0 | 11 | 11 | 0,00% | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 |
| 5 | INSTALACION DE ESTRUCTURA LPR | 1x3 | 0 | 11 | 11 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 |
| 6 | INSTALACIÓN DE GABINETES Y CORONAS | 1x3 | 23 | 18 | 41 | 56,10% | | | | | | | | 3 | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | 18 | 0 |
| 7 | INSTALACIÓN UPS + SWITCH | | 0 | 41 | 41 | 0,00% | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | 41 | 0 |
| 8 | INSTALACION PARLANTES | | 0 | 20 | 20 | 0,00% | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 20 | 0 |
| 9 | INSTALACION PUNTOS CAMARAS LPR | | 0 | 11 | 11 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | | 2 | | | | | | 11 | 0 |
| 10 | INSTALACION CAMARAS MULTISENSOR + BRAZO | | 0 | 13 | 13 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | | | | | 13 | 0 |
| 11 | INSTALACION CAMARAS PTZ + BRAZO | | 0 | 17 | 17 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -17 |
| 12 | INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA | 1x3 | 28715 | 254 | 28969 | 99,12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -254 |
| 13 | INSTALACION NODOS DE CONCENTRACION | 1x3 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 14 | INSTALACION RADIOENLACE | 1x3 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Observaciones Generales del plan de choque**

| Interior | PROCESO | PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES | VERSIÓN | 08 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO | LISTA DE ASISTENTES | PÁGINA | 1 de 2 |
| | | | FECHA VIGENCIA | 09/09/2024 |

| Tema: | Reunión de Seguimiento Convenio 1808 de 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable u organizador: | Ministerio del Interior | Dependencia: | | | | | |
| Ciudad: Bogotá | Lugar y/o enlace: Edificio Bancol | ☒ Presencial ☐ Virtual | Fecha | | | Hora inicial 10:00 | |
| Tipo ☐ Comité ☐ Junta ☒ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____ | | | Día | Mes | Año | Hora final 12:30 | |
| | | | 20 | 01 | 26 | | |

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE)**: Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

| N° | NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | EDAD | SN | PD | PE | ¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI | NO | PN | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CARGO / ROL | CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulud Ramos | 74795537 | 43 | | | | | X | | Coordinación Convenio | Secretario Gobierno | gobierno@concordia.gov.co | 3157969278 | |
| 2 | Mauricio Montoya | 79482825C | | | | | | X | | Gob Cundinamarca | Apoyo Técnico | gobierno@cundinamarca.gov.co | 3138888222 | |
| 3 | Rosa Pedraza Mora P | 1118537597 | 27 | H | | | | X | | SECOB SAS | Prof de Apoyo | Proyectos@secob.com.co | 3142350959 | |
| 4 | Diego Rojas Gómez | 74854089 | 49 | H | — | — | | X | | SECOB SAS | RL | diego.rojas@SECOB.COM.CO | 3108861356 | |
| 5 | Osvaldo Plata M | 12205162 | 46 | H | | | | X | | Contratista Llano Seguro | PM | neider.plata@tsg.net.co | 3118777602 | |
| 6 | John Heberto Diaz | 7187235 | 40 | | | | | X | | CLSeguro | Ing Apoyo | Jheberto@tsg.net.co | 3115156541 | |
| 7 | Camila Ramirez Espin | 1083647182 | 38 | M | | | | X | | CLLanos Seguro | Abogada | Camila.ramirez@TSG.NET.CO | 3192271594 | |
| 8 | W. Felipe Bolaños A. | 1084254271 | 35 | H | | | | X | | CLS 2024 | Operaciones | wbolanos@tsg.net.co | 3115488348 | |
| 9 | Juan Mario Torres Nova | 1019004203 | 39 | H | | | | X | | CLS 2024 | Gte Proyectos | juan.torres@violtec.com.co | 3223391301 | |
| 10 | Marleny Rivera G. | 63430009 | — | — | | | | X | | SUPERVI 6343 | PROFESIO ESPEC. | marleny.rivera@mininterior.gov.co | 63430009 | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| ACTA | REUNION DE SEGUIMIENTO |
| FECHA | 10-02-2026 |
| CIUDAD | Reunión Virtual |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO | 1808-2024 |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I. |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | 54% |
| MOTIVO: | Reunión de seguimiento |

**ANTECEDENTES DEL CONVENIO**

| |
|---|
| FECHA DE INICIO CONVENIO: 20/09/2024 |
| FECHA TERMINACION DEL CONVENIO DE ACUERDO A LA SEGUNDA PRORROGA: 01/06/2026 |
| VALOR DEL CONVENIO $40.000.000.000 |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

**Asistentes:**

- **Sergio Oswaldo Bernal Jiménez** – Ministerio del Interior
- **Héctor Zambrano** – Ingeniero Civil – Ministerio del Interior
- **Mauricio Montoya** – Apoyo a la Supervisión – Gobernación del Casanare
- **Diego Mora** – Interventor

1. Objetivo de la reunión

Seguimiento a compromisos previos y revisión del Plan de Choque – CCM Yopal Casanare CONV 1808 - 2024

2. Temas tratados

- Verificación de compromisos adquiridos en la reunión anterior.
- Presentación del ingeniero designado para seguimiento al plan de choque.
- Revisión del Plan de Choque (planta externa y planta interna).
- Definición de metodología de seguimiento y control.
- Compromisos y cierre.

3. Desarrollo de la reunión

### 3.1 Verificación de compromisos anteriores

Se recuerda que en la reunión anterior se establecieron dos compromisos principales:

- Designación de un profesional por parte del Ministerio del Interior para realizar seguimiento al plan de choque.
- Presentación del Plan de Choque correspondiente al CCM.

Se informa que fue designado el **Ingeniero Héctor Zambrano**, quien apoyará el seguimiento técnico del plan de choque a partir de la fecha.

---

### 3.2 Presentación del Plan de Choque

La Gobernación informa que el contratista presentó formalmente el **Plan de Choque el día 6 de febrero de 2026**, mediante oficio, incluyendo:

- Plan de choque de **planta externa**.
- Plan de choque de **planta interna (obra civil – CCM)**.

El interventor manifiesta que el documento fue revisado y que el plan contempla:

- Actividades con retraso.
- Cantidades a ejecutar.
- Programación diaria de actividades.
- Identificación de subcontratistas (planta externa).
- Asignación de cuadrillas (13 cuadrillas en planta interna).
- Proyección de cierre de actividades de planta externa para el 5 de marzo.

Se evidencia que el plan presentado oficialmente el 6 de febrero contiene ajustes frente al documento preliminar socializado en reunión anterior.

### 3.3 Observaciones técnicas

Se realizaron las siguientes observaciones:

- Algunas actividades no se visualizaban claramente en el cronograma inicialmente compartido.
- El interventor aclaró que el plan oficial incluye el detalle por capítulos presupuestales (APUs), incluyendo:
    - Actividades hidrosanitarias.

  - Instalaciones eléctricas.
  - Mampostería.
  - Pisos y enchapes.
  - Cubierta e impermeabilización.
  - Construcciones especiales (planta eléctrica).
- Se solicitó compartir el cronograma actualizado de planta interna para su respectivo seguimiento paralelo al de planta externa.

### 3.4 Metodología de seguimiento acordada

Se acordó implementar el siguiente esquema de control:

1. **Creación de un Drive compartido**, con acceso para:
   - Ministerio del Interior
   - Gobernación
   - Interventoría
2. En el Drive se incluirá:
   - Cronograma planta externa.
   - Cronograma planta interna.
   - Archivo Excel editable con:
     - Cantidades programadas.
     - Cantidades ejecutadas.
     - Diferencias.
   - Registro fotográfico.
   - Seguimiento por fechas (día a día).
3. Se agregará una columna de avance ejecutado frente a lo programado.
4. Se realizará actualización periódica (cada 1 o 2 días) del avance.
5. Se dejará soporte fotográfico y justificación en caso de incumplimiento de metas diarias.
6. Se recomendó mantener la **bitácora actualizada** con las actividades ejecutadas y novedades encontradas en obra.

## 4. Compromisos

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Crear Drive compartido con acceso a las partes | Interventoría | Inmediato |
| 2 | Cargar cronogramas oficiales (planta interna y externa) | Interventoría | Inmediato |
| 3 | Actualizar avances con registro fotográfico | Interventoría y Gobernación | Cada 1-2 días |

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|
| 4 | Hacer seguimiento técnico al plan de choque | Ministerio del Interior | Permanente |
| 5 | Mantener bitácora técnica actualizada | Interventoría | Permanente |

5. Cierre de la reunión

El señor **Hector Fabio Zambrano R** agradeció el apoyo por parte de la interventoría y contratista para dar cumplimiento a los compromisos realizados en el acta.

**FIRMA DE ASISTENTES:** se adjunta la lista de asistentes de teams

Participantes

| Nombre | Primera unión | Última salida | Duración de la reunión |
|---|---|---|---|
| SJ Sergio Oswaldo Bernal Jiménez sergio.bernal@mininterior.gov.co | 2:01 p.m. | 2:27 p.m. | 26m 29s |
| MM Mauricio Mon... (No comprobado) | 2:01 p.m. | 2:27 p.m. | 25m 55s |
| DM Diego Mora (No comprobado) | 2:02 p.m. | 2:27 p.m. | 24m 32s |

Hector Fabio Zambrano Rodriguez 2:01 2: 27pm 26m 29s

| | |
|---|---|
| ACTA | REUNION DE SEGUIMIENTO |
| FECHA | 24-02-2026 |
| CIUDAD | Reunión Virtual |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO | 1808-2024 |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I. |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | 60% |
| MOTIVO: | Reunión de seguimiento |

**ANTECEDENTES DEL CONVENIO**

| |
|---|
| FECHA DE INICIO CONVENIO: 20/09/2024 |
| FECHA TERMINACION DEL CONVENIO DE ACUERDO A LA SEGUNDA PRORROGA: 01/06/2026 |
| VALOR DEL CONVENIO $40.000.000.000 |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

1 OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la visita técnica realizada los días 3 y 4 de febrero de 2026, así como verificar el estado de ejecución técnica, administrativa y financiera del Convenio No. 1808 de 2024.

2 ASISTENTES

**Ministerio del Interior**

- Marleny Rivera Galeano – Supervisora del convenio
- Sergio Oswaldo Bernal Jiménez – Apoyo a la supervisión
- Héctor Fabio Zambrano Rodríguez – Apoyo técnico (obra civil)

**Gobernación de Casanare**

- Diana Carolina Niño – Apoyo jurídico
- Mauricio Montoya – Apoyo técnico
- Mónica Pérez – Apoyo jurídico Secretaría de Gobierno

**Contratista – Consorcio Llano Seguro 2024**

- Juan Mario Torres Nova – Gerente de Proyecto
- Camila Alejandra Ramírez Espinel – Asesora legal
- Neider Oswaldo Plata Muñoz – Gerente de proyectos TSG

**Interventoría**

- Diego Mora – Apoyo técnico
- Ulder Norbey González Meche – Profesional administrativo y financiero
- Edison Javier Montañez Chaparro – Ingeniero civil

## 3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 3.1 Seguimiento a compromisos administrativos (Pago Parcial No. 1)

- Se evidenció **incumplimiento del compromiso** de emisión de aval por parte de la interventoría para el pago parcial, cuyo plazo venció el **5 de febrero de 2026**.
- La Gobernación manifestó que:
  - Persisten **diferencias de interpretación jurídica** entre interventoría y contratista.
  - Existen **observaciones formales y de fondo** en la documentación.
  - El proceso presenta **retrasos reiterados desde diciembre de 2025**.
- La interventoría indicó:
  - La documentación fue radicada **extemporáneamente (14 de febrero)**.
  - Existen **incumplimientos en soportes de nómina y pagos parafiscales**.
  - No se puede emitir aval sin cumplimiento integral de requisitos contractuales.
- El contratista argumentó:
  - Cumplimiento de obligaciones de seguridad social.
  - Existencia de un acuerdo previo (20 de enero) para **subsanar con certificaciones firmadas**.
  - Disposición para corregir inconsistencias documentales.

**Conclusión:**
El proceso de pago parcial No. 1 continúa **sin aprobación**, constituyendo un **cuello de botella administrativo** que afecta la legalización de recursos (~$17.000 millones).

### 3.2 Problemática identificada

- Falta de claridad en los **soportes exigidos para validación del pago**.
- Diferencias entre lo acordado en actas y su interpretación.
- Deficiencias en la **gestión documental del contratista**.
- Impacto en la **legalización de recursos del Ministerio** (riesgos fiscales y disciplinarios).

### 3.3 Ejecución del proyecto (avance físico)

- **Avance real:** 60,01%
- **Avance programado:** 76,4%
- **Retraso:** 16,39% (incremento frente a medición anterior)

**Observaciones:**

- Incumplimiento del plan de choque.
- Baja disponibilidad de personal en obra.
- Retrasos en:
  - Obras civiles (especialmente planta interna)
  - Instalación y llegada de equipos (solo ~50% entregados)
- Problemas logísticos (bodega, transporte, preconfiguración).

3.4 Situación financiera del contratista

- El contratista manifiesta **afectación crítica de flujo de caja**.
- Se reporta:
  - Falta de pagos a proveedores
  - Dificultades para continuar operación
- Se advierte posible **riesgo de paralización del proyecto**.

3.5 Intervenciones relevantes

- El Ministerio expresa **preocupación por retrocesos reiterados**.
- La Gobernación anuncia:
  - Solicitud de **concepto jurídico formal**
  - Decisión de actuar conforme a lo establecido en actas y normativa
- Interventoría mantiene postura sobre cumplimiento estricto de requisitos.

4 COMPROMISOS

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Reanudar mesa de trabajo con participación de representantes legales para definir soportes de pago | Gobernación de Casanare | 25 de febrero de 2026 |
| 2 | Revisar y corregir documentación del acta parcial No. 1 | Consorcio Llano Seguro | 25 de febrero de 2026 |
| 3 | Verificar requisitos y emitir concepto definitivo sobre pago parcial | Interventoría | Pendiente mesa técnica |
| 4 | Informar resultados de la mesa al Ministerio | Gobernación | Posterior a reunión |
| 5 | Continuar seguimiento técnico a ejecución del proyecto | Ministerio e Interventoría | Permanente |
| 6 | Revisar plan de choque y ajustar cronograma de ejecución | Contratista | Inmediato |

5 CONCLUSIONES

- El proyecto presenta **riesgos críticos en su ejecución**, principalmente por temas administrativos y financieros.
- Existe un **desalineamiento entre las partes** frente a los requisitos de aprobación de pagos.
- El retraso en la ejecución continúa aumentando, evidenciando **ineficacia del plan de choque**.
- Se requiere **decisión urgente en mesa técnica** para destrabar el proceso de pagos.

6 OBSERVACIONES FINALES

El Ministerio del Interior deja constancia de la **posible afectación a la legalización de recursos públicos**, así como de la necesidad de adoptar medidas inmediatas para evitar impactos mayores en la ejecución del convenio.

| **FIRMA DE ASISTENTES:** se adjunta la lista de asistentes de teams |
|---|

| 2. Participantes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Primera entrada | Última salida | Duración de la reunión | Correo electrónico | Id. de participante (UPN) | Rol | | |
| Sergio Oswaldo Bernal Jiménez | 2/24/26 | | | | | | 3:00:27 PM | 2/24/26 | 4:54:33 PM |
| Neider Oswaldo Plata Muñoz (Externo) | 2/24/26 | | | | | | 2:57:31 PM | 2/24/26 | 4:31:44 PM |
| Marleny Rivera Galeano | 2/24/26 | | | | | | 2:57:41 PM | 2/24/26 | 3:59:20 PM |
| HECTOR FABIO ZAMBRANO RODRIGUEZ | 2/24/26 | | | | | | 3:00:56 PM | 2/24/26 | 4:31:53 PM |
| Juan Mario Torres Nova (Externo) | 2/24/26 | | | | | | 3:02:09 PM | 2/24/26 | 4:31:46 PM |
| Camila Alejandra Ramirez Espinel (Externo) | 2/24/26 | | | | | | 3:02:25 PM | 2/24/26 | 4:26:44 PM |
| Mauricio Montoya (No comprobado) | 2/24/26 | | | | | | 3:02:36 PM | 2/24/26 | 4:31:46 PM |
| Diego Mora (No comprobado) | 2/24/26 | | | | | | 3:02:40 PM | 2/24/26 | 3:03:31 PM |
| Ulder Norbey Gonzalez Meche (No comprobado) | 2/24/26 | | | | | | 3:03:38 PM | 2/24/26 | 4:34:59 PM |
| Diego Mora (No comprobado) | 2/24/26 | | | | | | 3:03:53 PM | 2/24/26 | 4:31:44 PM |
| Mònica Pèrez Patiño | 2/24/26 | | | | | | 3:04:03 PM | 2/24/26 | 4:32:02 PM |
| Ulder Norbey Gonzalez Meche (No comprobado) | 2/24/26 | | | | | | 3:04:11 PM | 2/24/26 | 4:31:52 PM |
| Mónica Pérez (No comprobado) | 2/24/26 | | | | | | 3:04:37 PM | 2/24/26 | 4:34:42 PM |
| Diana Niño (No comprobado) | 2/24/26 | | | | | | 3:06:21 PM | 2/24/26 | 3:59:40 PM |
| EDISSON JAVIER MONTAÑEZ CHAPARRO (No comprobado) | 2/24/26 | | | | | | 3:10:35 PM | 2/24/26 | 4:32:04 PM |
| ULDER NORBEY GONZALEZ MECHE (Externo) | 2/24/26 | | | | | | 3:24:47 PM | 2/24/26 | 5:01:56 PM |
