FECHA (D/M/A): 15-12-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: UNO	CANTIDAD: 72,06 TON
ZONA: DOS	FRENTE DE TRABAJO: 4
COMUNA: ROBLEDO	
BARRIO: SAN GERMAN	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00AM	INICIO DEMOLICIÓN 9:00AM, LLUVIAS EN LA TARDE Y CUADRILLA INCOMPLETA
TERMINACIÓN: 2:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: LLUVIAS M INTENSIDAD A LAS 1PM HASTA 2:30 PM

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL EN LA CR 94 ENTRE CL 60 Y CL 65 LADO OCCIDENTAL PERMITIENDO EL FLUJO CONTINUO DE VEHICULOS.

EN LA INTERVENCIÓN DEL BACHE UNO SE AFECTA CUATRO LÍNEAS PEATONALES; LAS CUALES SE DEBAN REPONER CON POSTERIORIDAD.

SE INTERVIENEN CUATRO BACHES QUE PRESENTABAN FRACTURA EN LA CARPETA ASFALTICA Y DESPRENDIMIENTO DEL MISMO.

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN TRANSCURRIERON CON NORMALIDAD, LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE MEZCLA FUE INTERRUMPIDA POR LLUVIA QUEDANDO A MEDIO HACER LA PRIMERA CAPA DEL BACHE DOS; TENIENDO QUE RETOMARLA UNA HORA Y MEDIA DESPUES.

SE INICIÓ DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DESPUES DE LAS 9:00AM DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE DEL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA POR TEMAS DE ORDEN PUBLICO EN GUARROTA.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Manuel Delgado Vallejo	NOMBRE: JOHN FREDY RIVERA
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: CARLOS TORO	NOMBRE: JOSE LUIS GUZMAN A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 6-12-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	MANUEL FERNANDEZ DELGADO	X		CONSORCIO
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	CARLOS CARMONA	X		ESTRUCTURAS Y PAV
4	Rastrillero	MIGUEL ANGEL GUERRA	X		ESTRUCTURAS Y PAV
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	VICTOR ALFONZO TEJEDA		X	ESTRUCTURAS Y PAV
7	Ayudante	JULIAN AGUDELO	X		ESTRUCTURAS Y PAV
8	Ayudante	DENIS PINO.	X		ESTRUCTURAS Y PAV
9	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ	X		ESTRUCTURAS Y PAV
10	Ayudante				
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME AGUIRRE	X		ESTRUCTURAS Y PAV
17	Operador compresor	N/A JAVIER RAMIREZ	X		ALFYCON S.A.S
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	CARLOS CARMONA			ESTRUCTURAS Y PAV
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	HENRY ALBERTO ARIAS	X		
29	Conductor Volqueta(s)				
30	AUX VIAL	DIANA GALVIS CALCEDO	X		CONSORCIO

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	MUSQUERA LP 655	X		
2	Compresor	INGERSOLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MACANITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM FC-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	LFK 835 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-12-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001354	165304	1A	CR 74 CL 60-20	1,66	1,90	0,13	3,15	0,41	0,98
4001354	165304	1B	CR 74 CL 60-20	3,21	3,99	0,13	12,81	1,67	4
4001354	165303	2A	CR 74 CL 60-24	3,16	3,91	0,11	11,09	1,22	2,93
4001354	165303	2B	CR 74 CL 60-24	1,81	1,81	0,11	3,28	0,36	0,86
4001354	165310	3	CR 74 CL 60-28	2,61	1,41	0,11	3,68	0,40	0,97
4001354	165309	4	CR 74 CL 60-30	4,61	1,91	0,11	8,81	0,97	2,32
TOTALES							42,81	5,03	12,06

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
235547	TTQ 095	12,06	12,06	140	23210	TTQ 095	SENCILLA	1	PROPIO

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-12-2025

10. ESQUEMAS

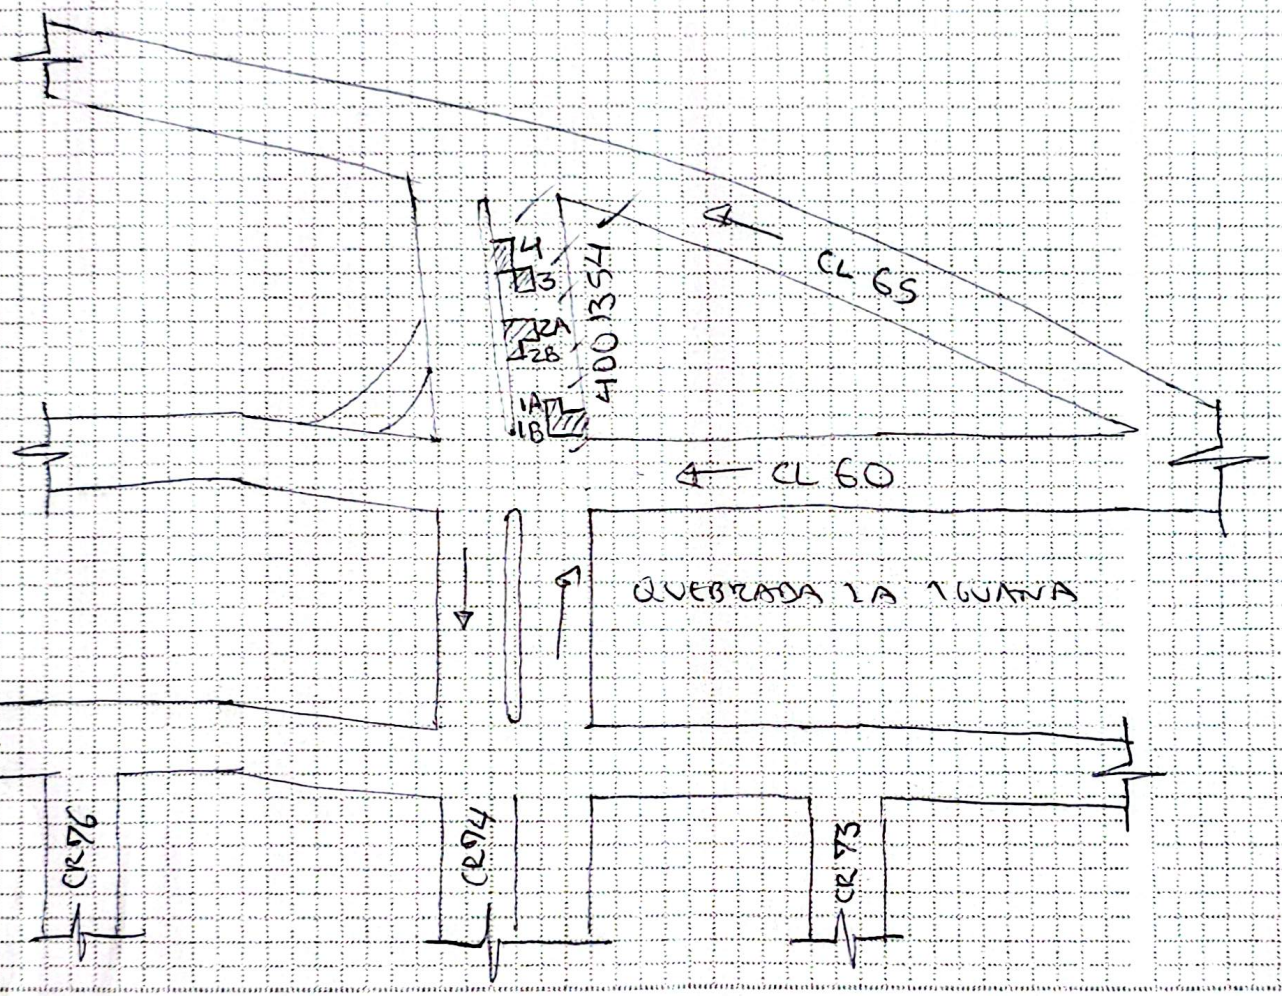

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	CUATRO
RANGO:	UNO	CANTIDAD:	12,06 TON
BARRIO	SAN GERMAN.	DIRECCIÓN	CR 74 ENTRE CL 60 Y CL 65

Powered by CamScanner

EST Y PAVDS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 235547

FECHA: 15/12/2025

HORA: 10:39:52 AM

CONDUCTOR: JHON ESTRADA

PLACA: TTO095

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: ~~890706386~~

PESO BRUTO: 19.57 Tonnes

PESO TARA: 7.51 Tonnes

PESO NETO: 12.06 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140 C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 41.01 Tonnes

Manuel Delgado

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 25210**

PROVEEDOR: Vialmol 2025

VALE POR UN VIAJE: Escombro

15/12/25

PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

PROCOPAL S.A.

NIT. 890.906.338-0

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
