FECHA (D/M/A): 16-12-2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual - Baches
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,05 Ton.
ZONA	2
COMUNA	7 Robledo
BARRIO	La Pilarica
FRENTE DE TRABAJO:	4

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 A.M
TERMINACIÓN: 5:00 P.M

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado
TARDE: lluvias

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se observa este frente sin barricada, sin lona banner en camión y campero en volqueta, No tiene extintor se solicita urgente estos elementos en este frente.

se inicia la actividad instalando la señalización y el cerramiento parcial en dirección cl 73 # 72A-64, Posteriormente se realiza lo marcación de el área a intervenir, para dar paso a la demolición. Finalizada la demolición se realiza imprimación con emulsión asfáltica.

La Volqueta llega al sitio a las 11:30 A.M. y comienza la instalación de la mezcla a las 12:30 p.m. (MDC-19 TIBIA+RAP) la cual registra 140°C. de temperatura. Una vez terminada la instalación de la mezcla y su debida compactación, se realiza el cargue manual de escombros a la Volqueta. Se hace limpieza y aseo en toda el área intervenida La jornada finaliza con normalidad a las 5:00p.m

5. VISITANTES

Jorge Morales

6. FIRMAS

NOMBRE: Manuel Delgado Vallejo (Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA)	Daniel Sanchez (Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: (Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA)	NOMBRE: Jose Luis Guzman. A (Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR)

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-12-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Manuel Delgado Vallejo	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona	✓		
4	Rastrillero	Miguel Guerra	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Peivi Pino	✓		
7	Ayudante	Alberto Suarez.	✓		
8	Ayudante	Julian Agudelo	✓		
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jaime AGuirre.	✓		
17	Operador compresor	Javier Ramirez.	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Henry Arias	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Andrés Quintero	✓		
	~~Dian~~ Aux. Vial	Diana Galvis.	✓		
	Aux. Vial.	Leidy Zapata	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	✓		
2	Compresor	Ingersoll Rand	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	FECON FC-30	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	LKK 838 Chevrolet	✓		
16	Volqueta(s)	TTO-095	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-12-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO NUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
40044 03	163898	1A	Cl 73 # Cr 72A-64	7,50	4,00	0,14	30,00	4,20	10,08
4004403		1B	Cl 73 # Cr 72A-64	2,50	2,35	0,14	5,88	0,82	1,97
TOTALES							35,88	5,02	12,05

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
235586	TTO-095	12,05		140° C	25211	TTO-095	sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-12-2025

10. ESQUEMAS

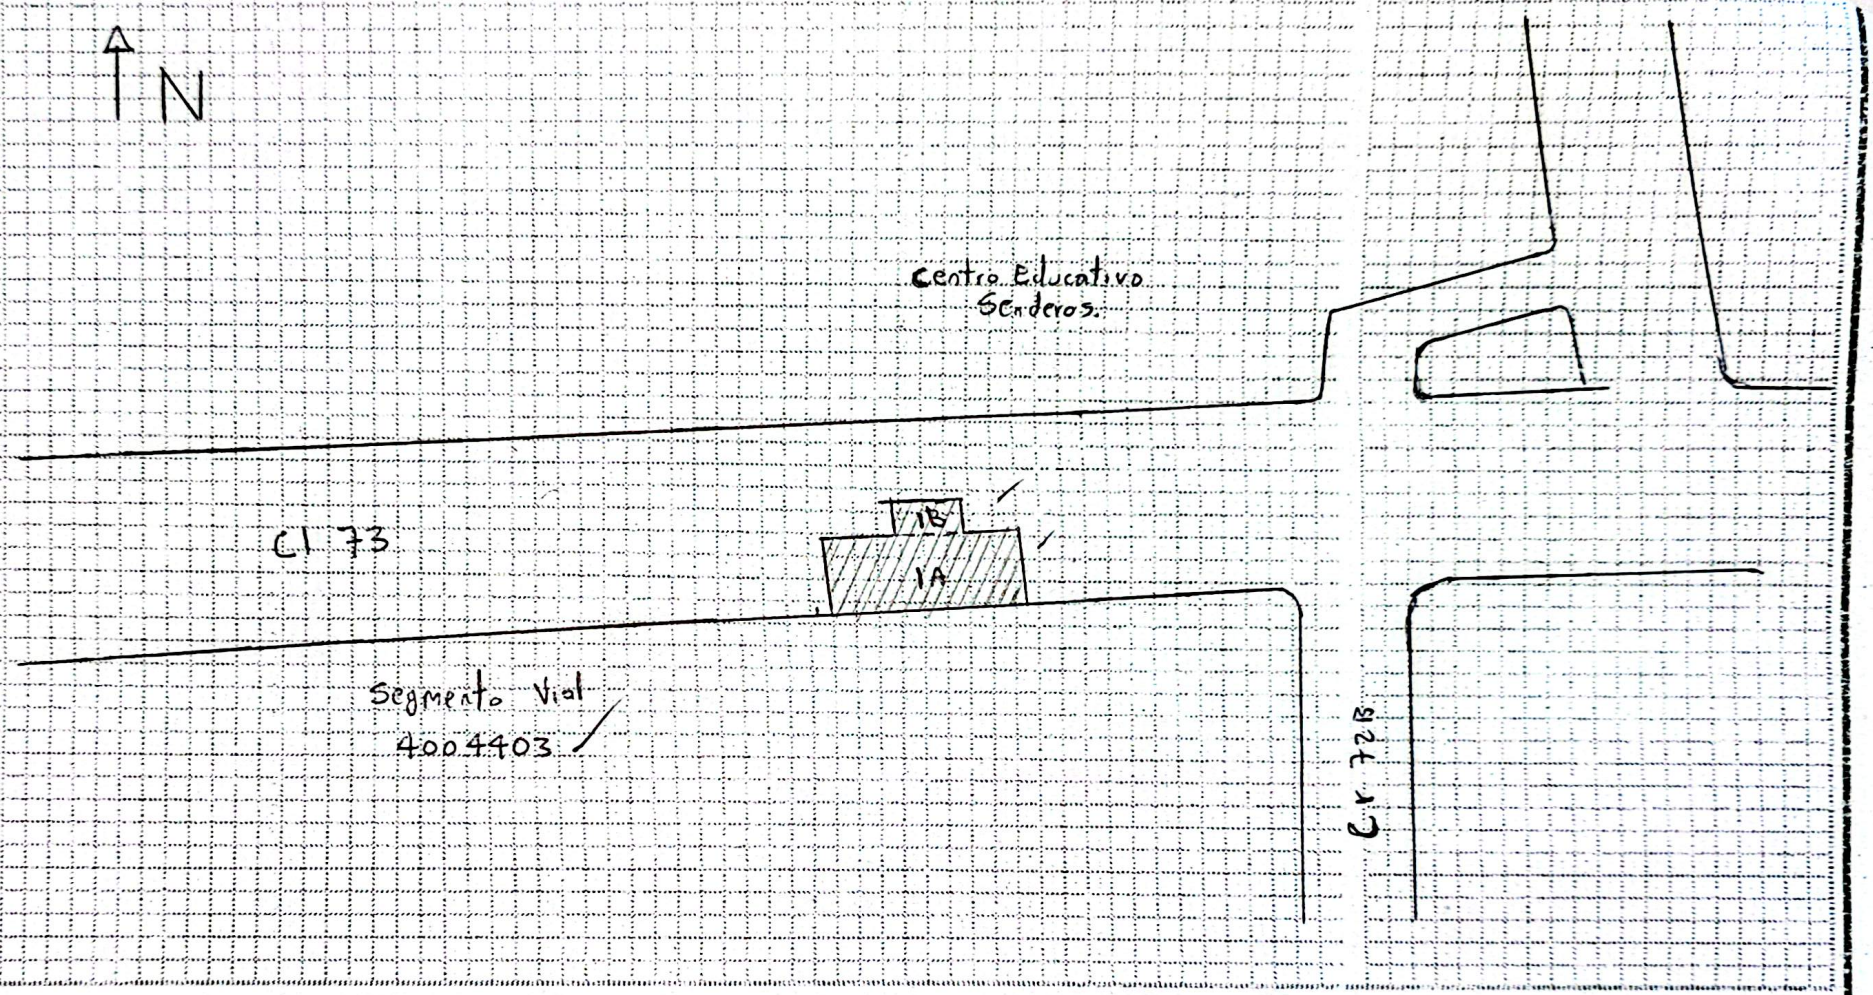

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual - Baches	FRENTE	4
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,05 Ton
BARRIO	Pilarica	DIRECCIÓN	Cl 73 # 72 A - 64

Powered by CamScanner

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Constructores

TIQUETE DE BASCULA: 235586

FECHA: 16/12/2025

HORA: 8:52:24 AM

CONDUCTOR: JHON ESTRADA

PLACA: TT0095

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 19.57 Tonnes

PESO TARA: 7.52 Tonnes

PESO NETO: 12.05 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 41.02 Tonnes

Manuel Delgado.

Daniel Sánchez. Interventoría

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25211

PROVEEDOR: Vial 2020

VALE POR UN VIAJE: Cumbia

PLACA No: TT 0095 — CAPACIDAD: — M3

DESTINO: Procopal — PROCOPAL S.A. NIT. 890.906.388-0

RECIBIDO POR: Manuel Delgado.

16/12/25

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Daniel Sánchez Interventoría

Powered by CamScanner
