FECHA (D/M/A): 19-12-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual - Baches
RANGO: 4	CANTIDAD: 10,13 Ton
ZONA: 2	FRENTE DE TRABAJO: 4
COMUNA: 7. Robledo	
BARRIO: La Pilarica	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 A.M	
TERMINACIÓN: 4:00 P.M.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Nublado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inician actividades a las 7.00 A.M, llega el camión al sitio de intervención y se instala la señalización y el cerramiento. Se demarcan las áreas afectadas a intervenir y se comienza con la demolición de cada una de estas, posteriormente se hace retiro de los escombros, se limpia el área y se procede con la imprimación con emulsión asfáltica. Llega la volqueta al sitio con 10,13 Ton de mezcla asfáltica (MDC-19 TIBIA + RAP) con temperatura de 140°C. Se realiza la instalación de la misma y se compacta mecanicamente. Además del sitio de intervención principal se realiza recebo pendiente del día anterior en dirección Cl 73 x Cr 73A-18, además de otro recebo pendiente en Cr 25 A x Cl 56-12. Sector el pinal. Una vez instalada la mezcla asfáltica se realiza el cargue manual de escombros en la volqueta y se hace limpieza del área intervenida. Contratista hace limpieza e inventario de los equipos, herramientas y señalización para su entrega una vez finalizada la jornada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Manuel Diego Vallejo Manuel Vallejo	Daniel Sánchez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G.	NOMBRE: José Luis Guzmán. S
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-12-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Manuel Delgado Vallejo	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona	✓		
4	Rastrillero	Miguel Guerra	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Deivi Pino	✓		
7	Ayudante	Alberto Suarez	✓		
8	Ayudante	Julian Agudelo	✓		
9	Ayudante	Victor Mejia	✓		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jaime Aguirre	✓		
17	Operador compresor	Javier Ramirez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Henry Arias	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero	✓		
	Aux Vial	Diana Galvis	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP-6500	✓		
2	Compresor	Ingersoll Rand	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	Fecon FC-30	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	LKS-838 Chevrolet	✓		
16	Volqueta(s)	TTO - 095 International	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-12-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED.	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
400 4403	164839	1A	Cl 73 x Cr 72A 80	4,60	3,10	0,15	14,26	2,14	5,13
400 4403	164 839	1B	Cl 73 x Cr 72A 80	2,00	1,80	0,15	3,60	0,54	1,30
400444	165434	2	Cl 73 x Cr 73 A-18	4,40	3,10	0,06	13,64	0,82	1,96
5011018	165448	3	Cr 25 A x Cl 56-12.	5,70	1,82	0,07	10,37	0,73	1,74
TOTALES							41,87	4,22	10,13

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
235699	TTO-095	10,13	10,13	140°C.	25214	1	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19 - 12 - 2023

10. ESQUEMAS

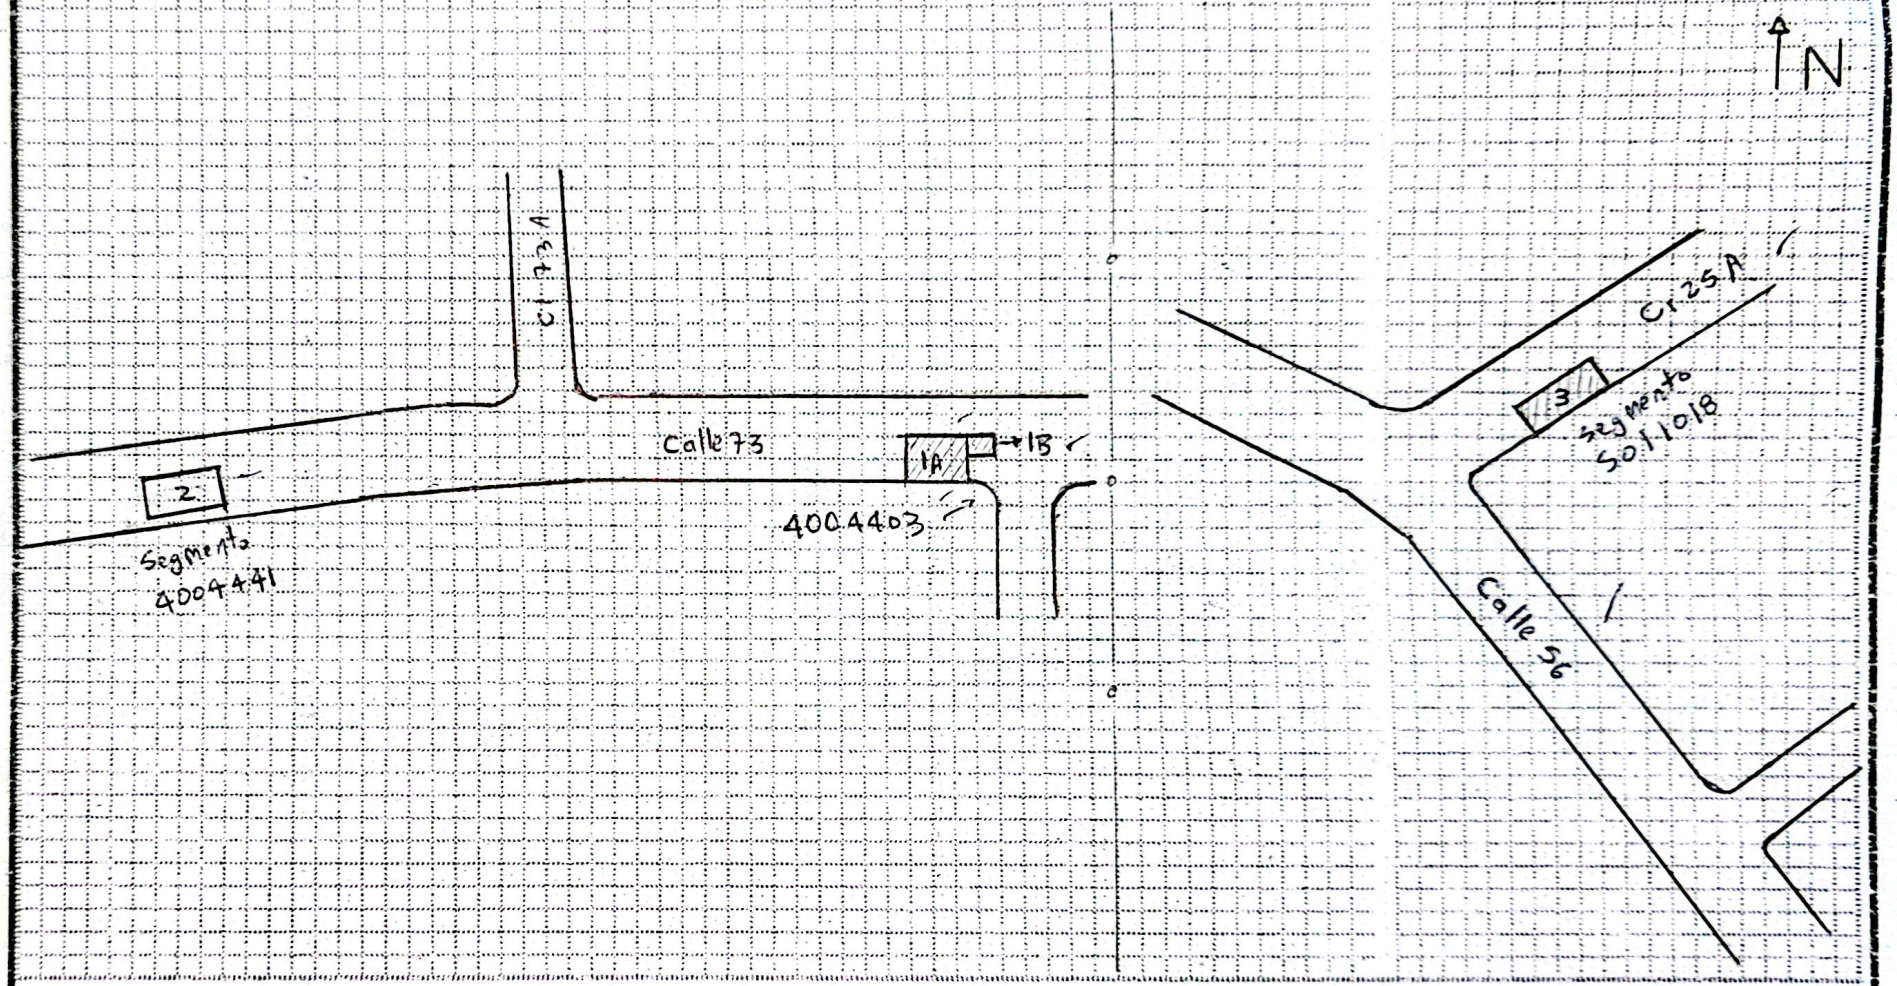

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	4
RANGO:	1	CANTIDAD:	10, 13 Ton
BARRIO	La pilarica	DIRECCIÓN	Cl 73 x Cr 72 A - 80

Powered by CamScanner

EST 5 POUNDS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros

PROCOPAL S.A.
DESPACHO BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235699

FECHA: 19/12/2025

HORA: 9:35:50 AM

CONDUCTOR: JHON ESTRADA

PLACA: TTD095

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 17.63 Tonnes

PESO TARA: 7.50 Tonnes

PESO NETO: 10.13 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 8

TOTAL DESPACHADA: 81.26 Tonnes

Daniel Delgad.

Daniel Sánchez Interventoría

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS

Nº 25214

PROVEEDOR: Victoria 2025

VALE POR UN VIAJE: Escombro

14/12/25

PLACA No: TTO015 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit. 800.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones

Manuel Alguedo

Firma Autorizada

Powered by CamScanner
