FECHA (D/M/A): 04 DIC - 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1 CANTIDAD: 11.10 TON.

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: El pinal

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 AM
TERMINACIÓN: 3:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: ———

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
- CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BALIZAS, PASADO MEDIA HORA DE ESTE CERRAMIENTO LA COMUNIDAD, INCLUYENDO LOS COORDINADORES DE TRES RUTAS QUE HAY EN LA ZONA HACEN EL CIERRE TOTAL DE LA CUADRA DONDE ESTAN LAS INTERVENCIONES.
- MARCACION, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN LOS DIFERENTES BACHES IDENTIFICADOS.
- ACOPIO TEMPORAL DE ESCOMBROS. - NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN LOS BACHES EN INTERVENCIÓN.
- IMPRIMACIÓN DE BACHES. - LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNR 969 CON 11.10 TON DE MEZCLA MDC CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PROCOPAL A LAS 11:00 AM. - CHEQUEO TEMPERATURA 140°.
- EXTENSION DE MEZCLA. - NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE LA MEZCLA EN BACHES, EN 1- 2 CAPAS.
- RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS.
- RETIRO DE SEÑALIZACION VERTICAL.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: MARTHA LÓPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: [illegible] TORO	NOMBRE: José Luis Guzmán. S
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04 - DIC - 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Sí	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SEENS	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLS	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	ALBIN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
10	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SEENS			
17	Operador compresor	MAURICIO(NO) ANTONIO MANRIQUE	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JUAN CARLOS OSSA	X		
	CONTRATADOR 1	LAURA MELISA HERNANDEZ	X		
	CONTRATADOR 2	ANA AGUIRRE	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Sí	No	
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SNR969	X		
		UNIDAD SANITARIA.	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04- DIC- 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4004692	164965	1A	CL 56A CR 25AA-07	4.16	2,96	0.13	11.48	1.49	3,58
4004692	164965	1B	CL 56A CR 25AA-07	2.12	0,96	0.13	2,04	0,27	0,65
4004692	164917	2A	CL 56A CR 25A-16	2,50	3,50	0,13	8,75	1.14	2,74
4004692	164917	2B	CL 56A CR 25A-16	1.60	2,38	0,13	3,81	0,50	1,20
4004692	164918	3	CL 56A CR 25A-20	2,58	3,65	0,13	9,42	1,22	2,93
TOTALES							35,50	4.62	11.10

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235401	SNP969	11.10		140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24636	SNP969	SENCILLA	1	PROCOPSL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04 - DIC / 25

10. ESQUEMAS

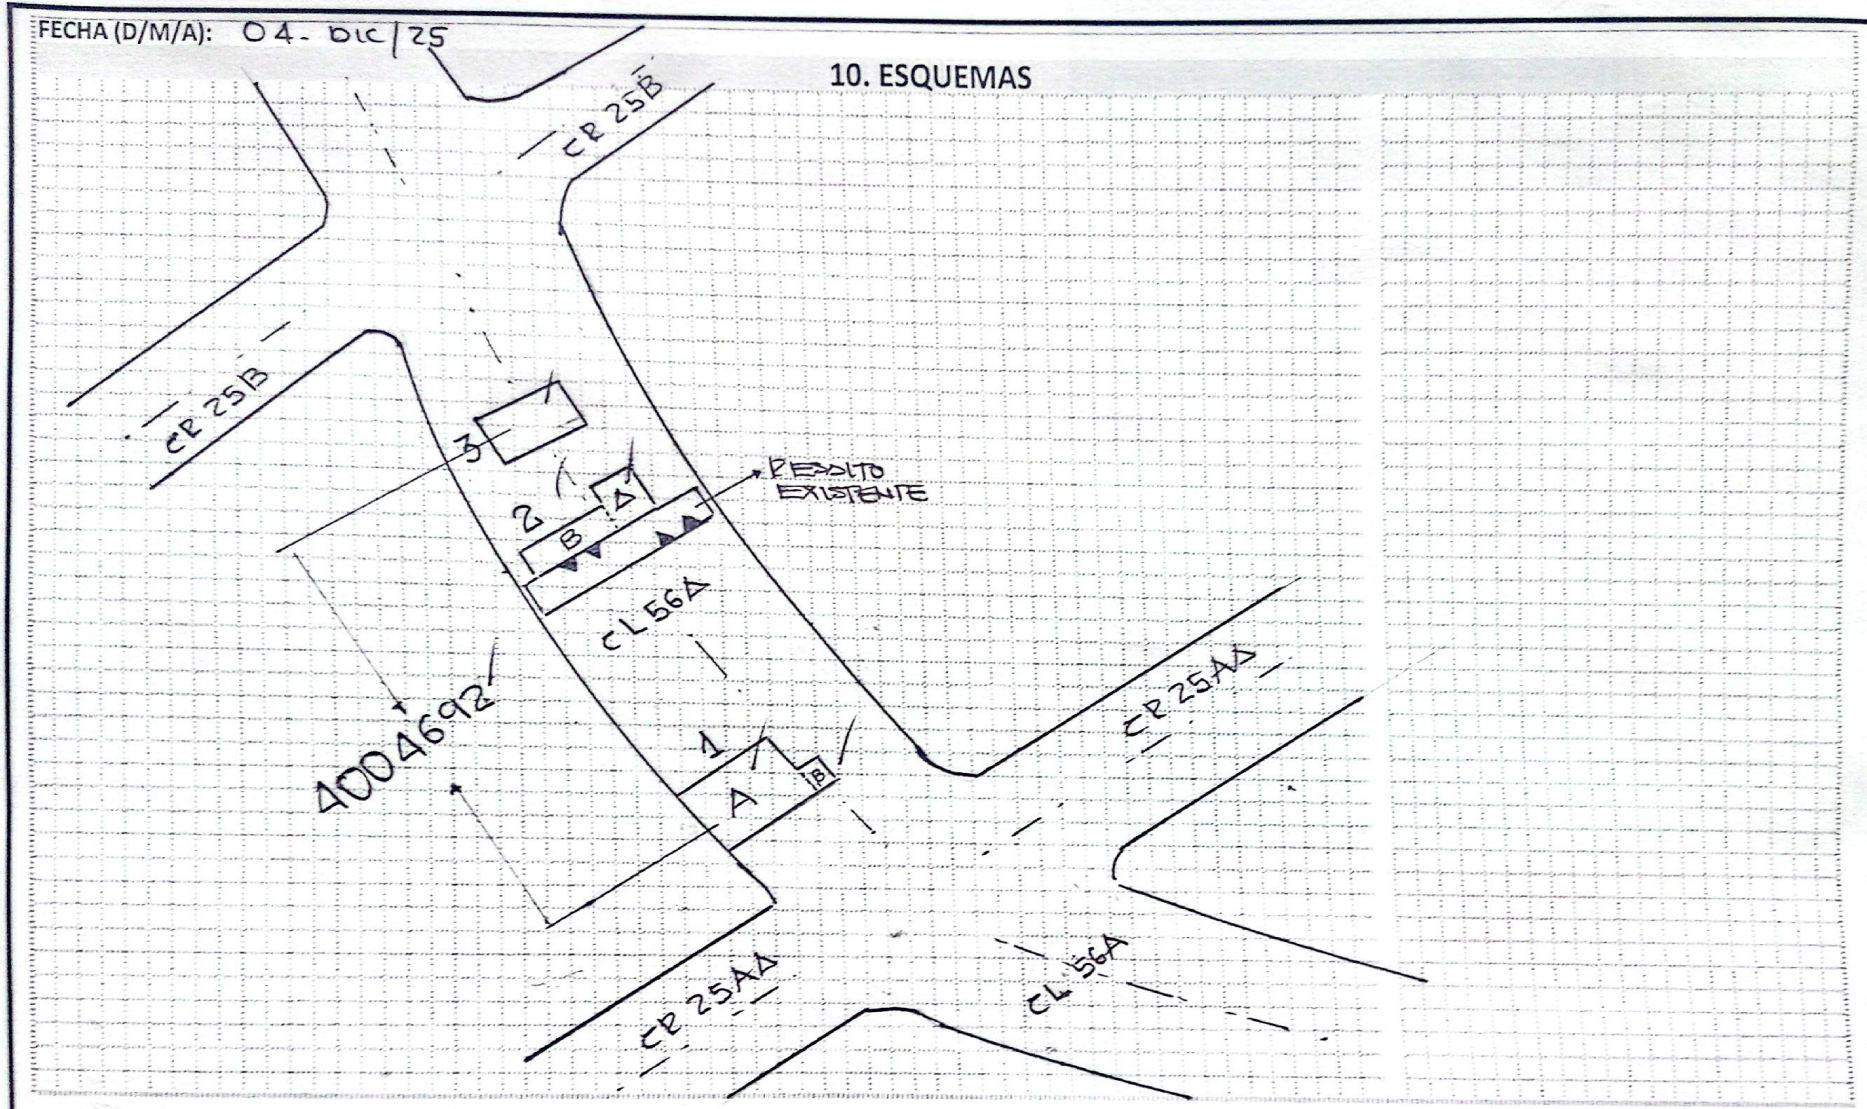

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	11.10 TON.	CANTIDAD:	
BARRIO	EL PINAL	DIRECCIÓN	CL 56A CR 25AA - 16	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

REVISIONES DEL 04 DIC |2025.

PROCOPAL S.A.
DESPACHO BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235401

FECHA: 04/12/2025

HORA: 9:37:51 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR969

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.97 Tonnes

PESO TARA: 7.87 Tonnes

PESO NETO: 11.10 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 39.99 Tonnes

MARTHA LÓPEZ

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24636

PROVEEDOR: Vial Sud

VALE POR UN VIAJE: Escombros

4-12-25

PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Ducupal / 2058 - F9

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0
Wilson Soto
Firma Autorizada

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LÓPEZ

Powered by CamScanner
