FECHA (D/M/A): 11 DIC 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1 | CANTIDAD: 10.00 TON

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: El Pinal

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 Am
TERMINACIÓN: 3:00 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

. SE INICIAN ACTIVIDADES CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGÚN LO INDICA EL PMT.
. CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BALIZAS.
. MARCACION, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN CADA BACHE IDENTIFICADO
. ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR EXISTENTE EN CADA UNO DE LOS BACHES EN INTERVENCIÓN
IMPRIMACIÓN DE BACHES.
LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNR969, CON 10.00TON DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBA PROCEDENTE DE LA PLANTA PROCOPAL A LAS 11:15 AM.
. CHEQUEO DE TEMPERATURA EN MEZCLA 153°C
. EXTENSIÓN DE MEZCLA
. NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS
. RECOLECCION DE ESCOMBROS.
. RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Wilson Serna Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: MARTHA LOPEZ Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11 DIC - 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ESPRILLA	X		
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	ALAIN DE JESÚS JULIO GARCIA	X		
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
10	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	EVER USUGA	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	?	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	ES 330			
2	Compresor	KAESER M50			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA			
10	Placa vibratoria	FECON			
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043			
16	Volqueta(s)	SNR969			
		unidad sanitaria			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11- DIC -2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	A (m)	e (m)	(m2)	(m3)	(kg)
5011648	165186	1A	CR24CL56C-57	8,25	1,76	0,14	14,52	2,03	4,87
5011648	165186	1B	CR24CL56C-57	0,90	1,06	0,14	0,95	0,13	0,31
5011648	165107	2	CR24CL56C-64	2,60	1,84	0,13	4,78	0,62	1,49
5011648	165188	3	CR24CL56C-64+5M	1,70	1,85	0,13	3,15	0,41	0,98
5011648	165189	4A	CR24CL56C-50	1,74	2,63	0,08	4,58	0,37	0,89
5011648	165189	4B	CR24CL56C-50	3,30	2,30	0,08	7,59	0,61	1,46
TOTALES							35,57	4,17	10,00

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
235506	SNB969	10,00		140	24640	SNB969	SENCILLA	1	PRECOPOL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11 DIC - 2025

10. ESQUEMAS

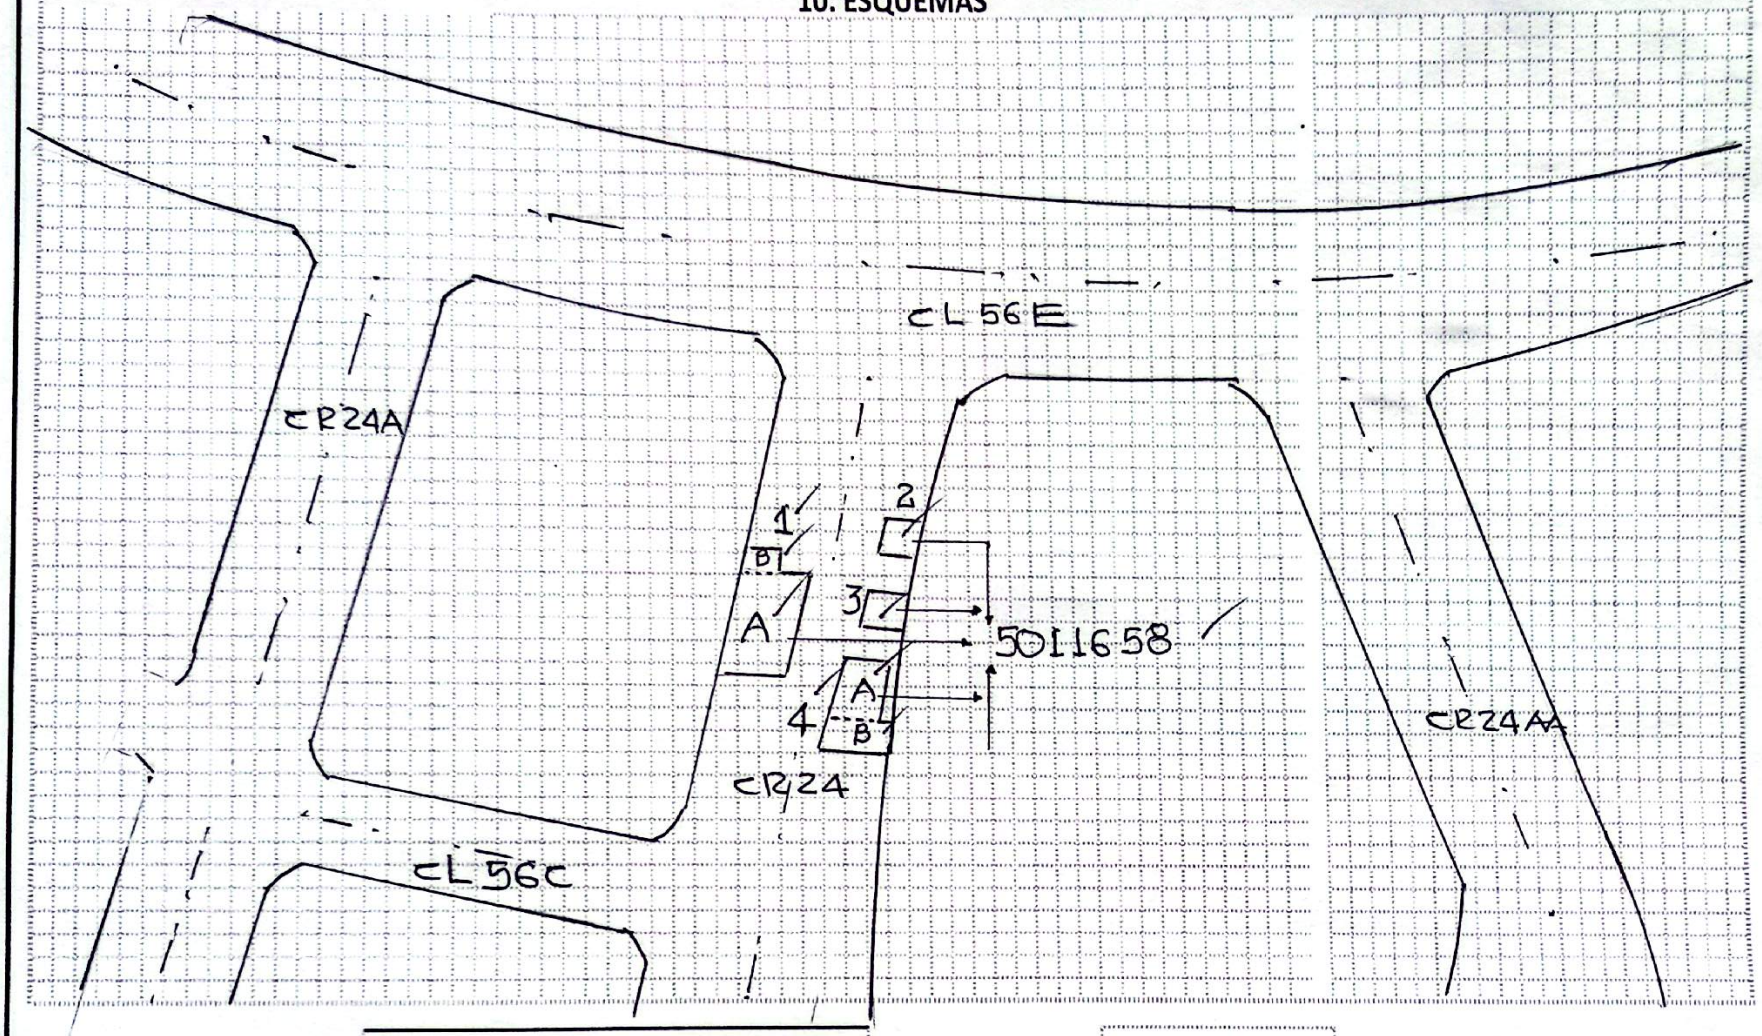

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.00 TON	CANTIDAD:	
BARRIO	EL PINAL	DIRECCIÓN	CR24CL 56C - 64	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 11 DIC | 2025

PROCOPAL S.A.

Ingeniería de Materiales

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235506

FECHA: 11/12/2025

HORA: 9:52:04 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR969

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 17.86 Tonnes

PESO TARA: 7.86 Tonnes

PESO NETO: 10.00 Tonnes

MARTHA LOPEZ

PRODUCTO:1

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 9

TOTAL DESPACHADA: 91.96 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24640

PROVEEDOR: Vial Mol

VALE POR UN VIAJE: Esrambón

11-12-25

PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Principal 2058 F 9

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA G. LOPES

Powered by CamScanner
