FECHA (D/M/A): 16 DIC 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: 1 CANTIDAD: 10.14 TON.

ZONA 3
COMUNA 8
BARRIO EL PINAL

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 AM
TERMINACIÓN: 2:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: ←

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA NUBLADO
TARDE SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE INICIAN ACTIVIDADES CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGÚN LO INDICA EL PMT

. CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BALIZAS.

. MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACION, RETIRO DE LAS CARPETAS ASFALTICAS EXISTENTE EN LOS DIFERENTES BACHES IDENTIFICADOS.

. ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICION Y EXCAVACIÓN

. NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN CADA UNO DE LOS BACHES EN INTERVENCIÓN.

. IMPRIMACIÓN DE BACHES.

. LLEGADA DE VOLQUETAS SENCILLAS SNR969, CON 10.14 TON. DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PREDIAL A LAS 10:30 AM

. CHEQUEO DE TEMPERATURA 150°C

. EXTENSIÓN DE MEZCLA

. NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.

. RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS.

. RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Wilson Perea	NOMBRE: MARTHA G. LOPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Tapia	NOMBRE: Jose Luis Guzman. A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16 DIC 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SEENS	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLS	X		
4	Rastrillero	JOHSN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ESPEILLS	X		
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	ALBIN DE JESUS JOLLO GAICIA	X		
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
10	Ayudante	SANTIAGO MUNOZ.	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SEENS	X		
17	Operador compresor		X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WAITER MUNOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JUAN CARLOS OSSA	X		
		Laura Melisa Hernandez	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	ES 330			
2	Compresor	KAESER M50			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA			
10	Placa vibratoria	FECAU			
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque	6TX043		NO	
15	Camión	6TX043	X		
16	Volqueta(s)	SNB969	X		
		Unidad Sanitaria			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16 DIC 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5011670	162518	1A	CR24CL56C-04	6.85	2.20	0.13	15.07	1.96	4.70
5011670	162518	1B	CR24CL56C-04	1.85	0.95	0.13	1.76	0.23	0.55
5011670	165343	2A	CR24CL56BB-47	3.10	1.75	0.08	5.43	0.43	1.03
5011670	165343	2B	CR24CL56BB-47	5.45	2.48	0.08	13.52	1.08	2.59
5011670	165301	3 2da capa	CR24CL56BB-65	3.20	3.30	0.05	10.56	0.53	1.27
TOTALES							46.34	4.23	10.14

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
235588	SNP969	10.14		141	24643	SNP969	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16 DIC 2025

10. ESQUEMAS

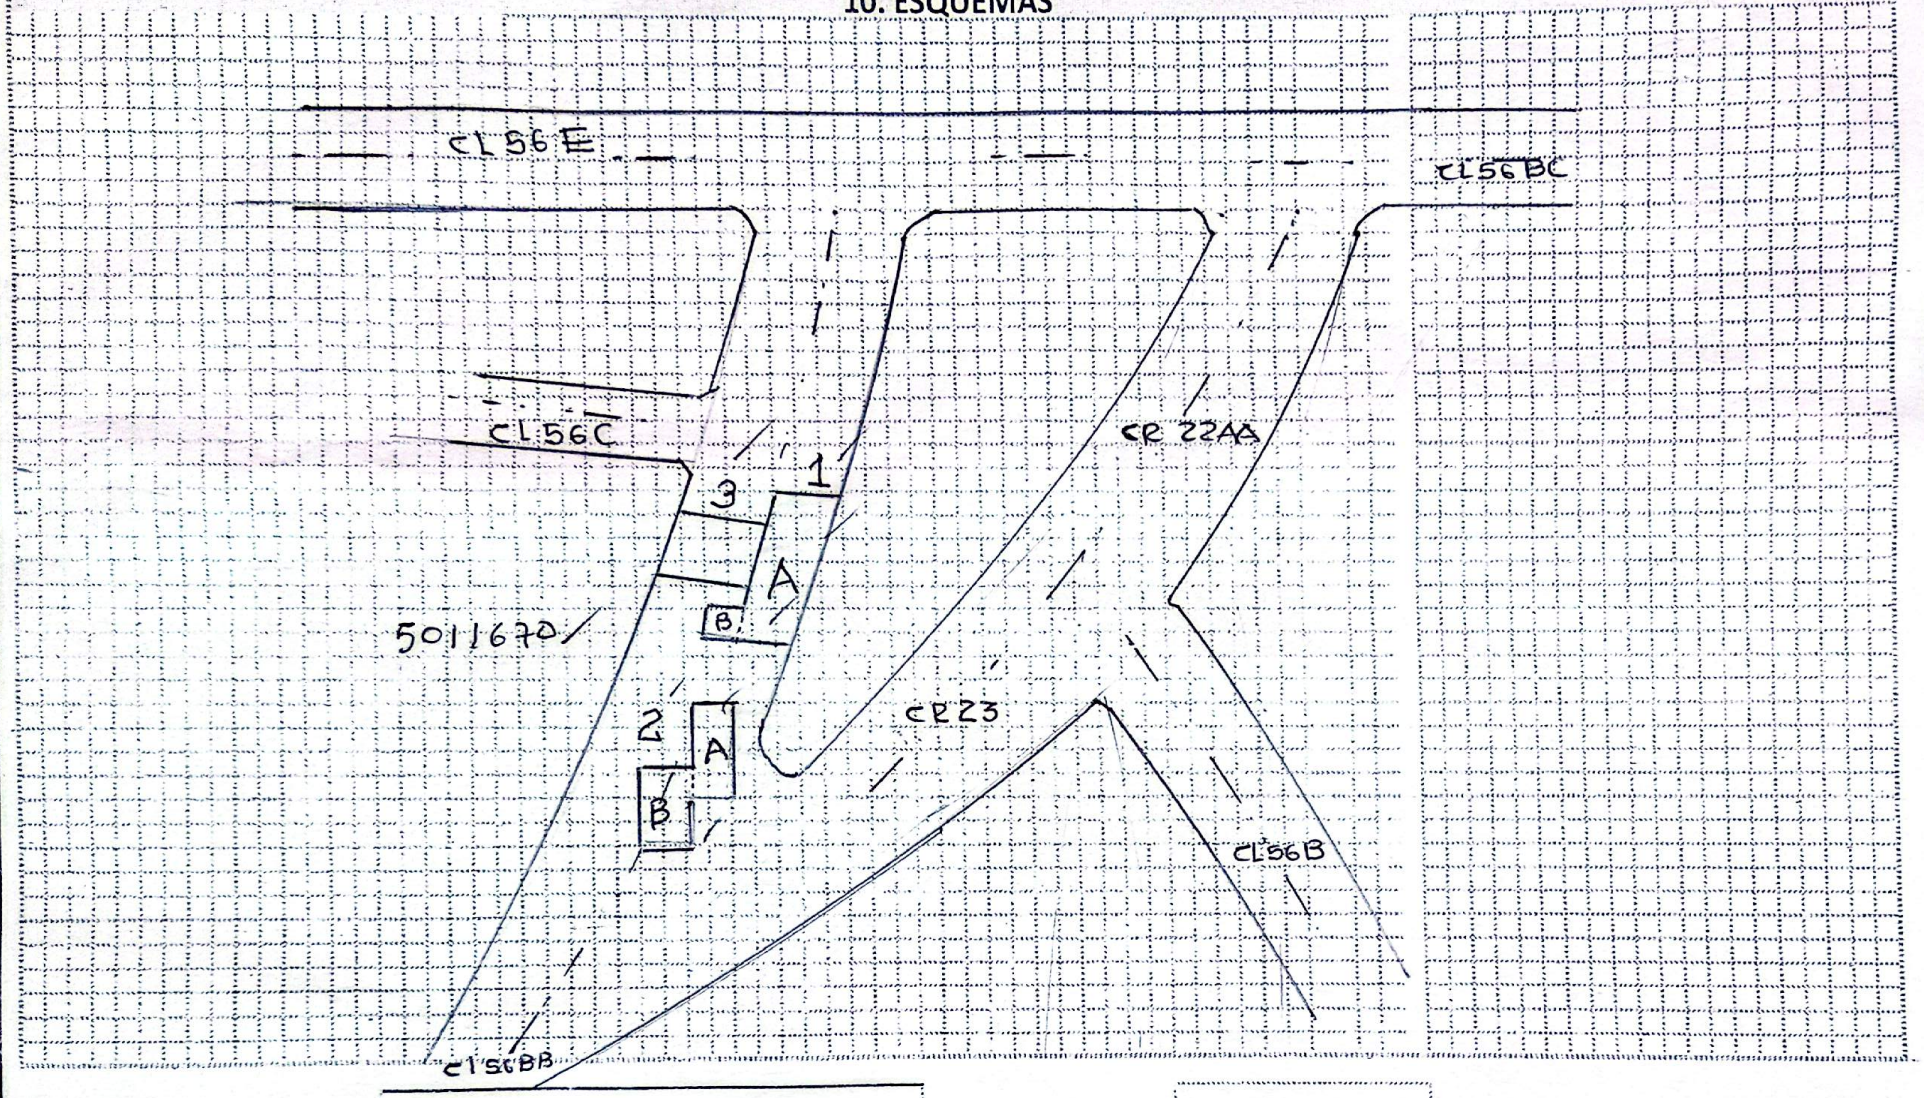

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	9	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.14 TON	CANTIDAD:
BARRIO	EL PINAL	DIRECCIÓN	CR 24 CL 56C-04	DIRECCIÓN

Powered by CamScanner

PEMISIONES DEL 16 DIC /2025.

ESTRUCTURAS PAVIMENTOS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235583

FECHA: 16/12/2025

HORA: 9:04:30 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR969

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.08 Tonnes

PESO TARA: 7.94 Tonnes

PESO NETO: 10.14 Tonnes

PRODUCTO: 1

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MAX 19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 6

TOTAL DESPACHADA: 62.16 Tonnes

MARTHA LOPEZ

Estructuras y Pavimentos sas

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS N° 8139

PROVEEDOR: [illegible]

N° 24643

VALOR POR UN VIAJE: Escombro

16-12-25

PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal Zona 59

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellin/ Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner
