FECHA (D/M/A): 17 DIC 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: 1

CANTIDAD: 10.03 TON

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: EL PINAL

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 4:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

.SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
.CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BALIZAS.
.DEMOLICIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y RETIRO DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN CADA UNO DE LOS BACHES IDENTIFICADOS
.ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
.NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN CADA BACHE EN INTERVENCIÓN
.IMPRIMACIÓN DE BACHES.
.LLEGADA DE VOLQUETAS SENCILLAS SNR969, CON 10.03 TON DE MEZCLA MDC19 CON ASPTIBIS, PROCEDENTE DE LA PLANTA PROCOPAL A LAS 11:00 AM.
.CHEQUEO DE TEMPERATURA EN MEZCLA 141°C
.EXTENSIÓN DE MEZCLA
.NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
.RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
.RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: William A Serna	NOMBRE: MARTHA LÓPEZ
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE: José Luis Guzmán A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17. DIC - 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SEBAS			
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA			
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ESPRILLA			
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA			
8	Ayudante	ALBIN DE JESUS JULIO GARCIA			
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE			
10	Ayudante	SANTIAGO MUNOZ			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SEBAS			
17	Operador compresor	WEIMAR USUGA BAEZA			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ			
29	Conductor Volqueta(s)	JUAN CARLOS OSSA			
		LAURA MELISA HERNANDEZ			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	CA 330			
2	Compresor	KAESER M50			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA			
10	Placa vibratoria	FECON			
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043			
16	Volqueta(s)	SNR 969			
		Unidad sanitaria			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17 dic 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5011662	157313	1A	CR 23 CL 56B B - 20	2.25	2.35	0.11	5.29	0.58	1.39
5011662	157313	1B	CR 23 CL 56BB - 20	1.54	1.48	0.11	2.28	0.25	0.60
5011662	165352	2A	CR 23 CL 56BB - 26	2.97	1.77	0.11	5.26	0.58	1.39
5011662	165352	2B	CR 23 CL 56BB - 26	1.45	1.88	0.11	2.73	0.30	0.72
5011667	165350	3	CR 23 CL 56BB - 30	2.25	1.50	0.13	3.38	0.44	1.06
5011662	165351	4	CR 23 CL 56BB - 32	6.65	1.35	0.12	8.98	1.08	2.59
5011670	165343	5A 2da capa	CR 24 CL 56B B - 47	3.10	1.75	0.05	5.43	0.27	0.65
5011670	165343	5B 2da capa	CR 24 CL 56BB - 47	5.45	2.48	0.05	13.52	0.68	1.63
TOTALES							46.87	4.18	10.03

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235641	SNR969	10.03		141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24644	SNR969	SENCILLA	1	PROCOPSL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17 DIC 2025

10. ESQUEMAS

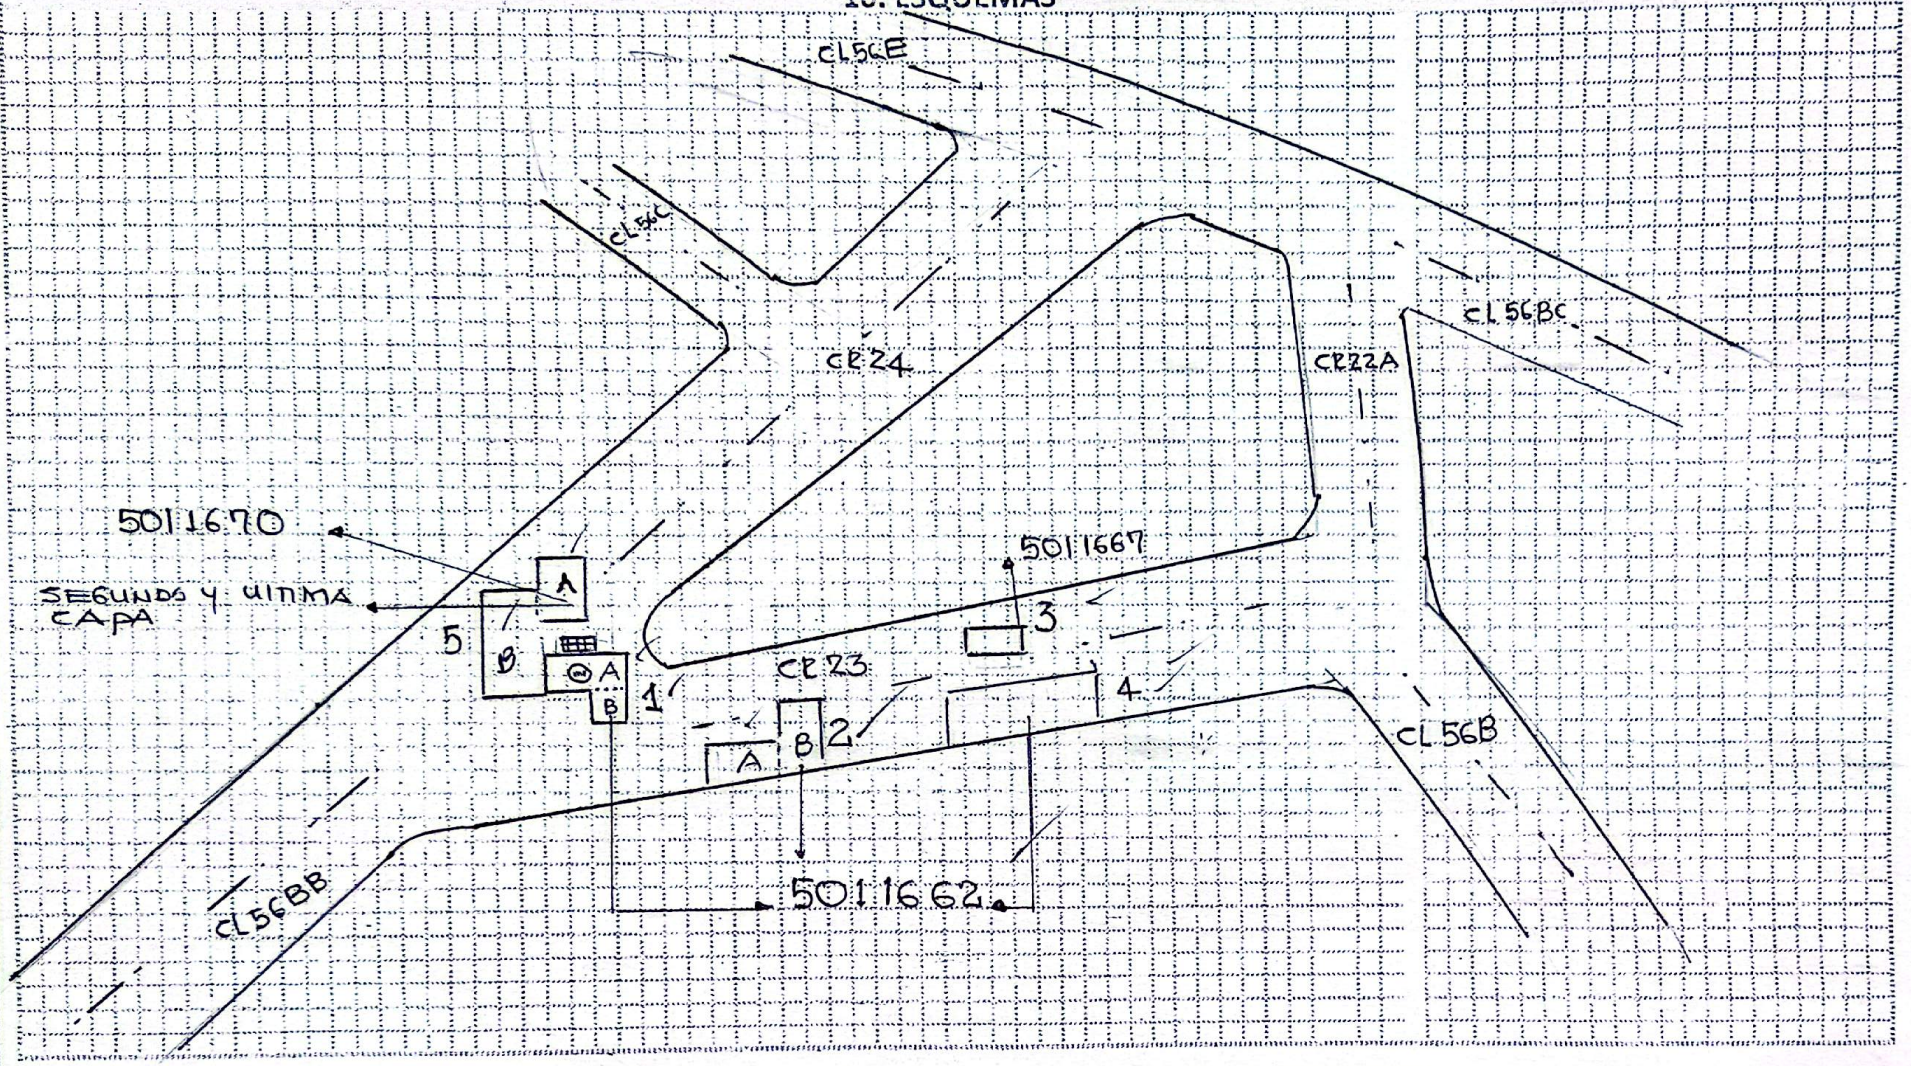

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	9	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.03 TON.	CANTIDAD:
BARRIO	EL PINAL	DIRECCIÓN	CR23 CL56BB-30	DIRECCIÓN

Powered by CamScanner

EMISIONES DEL 17 DIC | 2025

S S Y PAVIDS

PROCOPAL S.A.
DESPACHO BASCULA

PROCOPAL S.A.

Ingeniería

TIQUETE DE BASCULA: 235441

FECHA: 17/12/2025

HORA: 9:45:17 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR969

OBRA: 27

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 17.99 Tonnes

PESO TARA: 7.91 Tonnes

PESO NETO: 10.08 Tonnes

MARTHA LOPES

PRODUCTO: 12

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 49.10 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24644

PROVEEDOR: Val Mid

VALE POR UN VIAJE: Escombros

17-12-25

PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal 205 FF9

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Wilson Serna
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPES

Powered by CamScanner
