FECHA (D/M/A): 11-12-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO:	
CANTIDAD:	D.Asf= 13,81M2, 29.70M2 Retiro Adoquín
ZONA	6
COMUNA	16 Belén
BARRIO	El Nogal - Los Almendros
FRENTE DE TRABAJO:	10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 A.M.	—
TERMINACIÓN: 5:00 P.M.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleado
TARDE	Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Llegada del camión 7:00 A.M.

La jornada inicia a las 7:00 A.M con la instalación de la señalización según lo estipulado en el PMT. Se instala punto ecológico y cerramiento del sitio a intervenir. Se hace corte de pavimento (7,15 M), posteriormente se hace demolición de pavimento, especificamente dos rampas existentes, en total fueron demolidos 13,81 m^2 de pavimento Luego se continúa con la demolición de vigas de confinamiento en concreto (0,80 m^3), simultáneamente se hace desmonte de 29,70 m^2 de adoquin, se deja superficie preparada para realizar excavación en la jornada siguiente. Se hace acopio de RCD en un costado de la via y se deja cubierto con plástico.

La jornada finaliza a las 5:00p.m

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Daniel Arroyo Noreña	Daniel Sánchez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Arroyo G	NOMBRE: José Luis Guzmán. A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11 - 12 - 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIo.
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Samuel Orozco Noriega	✓		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo (Oficial)	✓		Ingealquipos
7	Ayudante	Ruben Ojeda	✓		Ingealquipos
8	Ayudante	Julian Parra	✓		Ingealquipos
9	Ayudante	Raul Betancurt	✓		Ingealquipos
10	Ayudante	Stiven Anzola	✓		Ingealquipos
11	Ayudante	Luis Urrutia (Compresorista)	✓		Ingealquipos
12	Ayudante	Luis Manuel Guerrero (Compresorista)	✓		Ingealquipos
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux. Vial	Angela Gonzalez	✓		Consorcio Vialmed

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11- 12- 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002683	Demolicion	Asfalto	Cl 32F # 74B - 176	1,55	3,80		5,89 ✓		
4002683	Demolicion	Asfalto	Cl 32F # 74B - 176	0,30	3,45		1,03 ✓		
4002683	Demolicion	Asfalto	Cl 32F # 74B - 176	1,00	3,75		3,75 ✓	- 13,81 m²	
4002683	Demolicion	Asfalto	Cl 32F # 74B - 176	0,85	3,70		3,14 ✓		
4002683	Demolicion	Concreto	Cl 32F # 74B - 176	0,15	3,00	0,35		0,16 m³	
	5 Vigas	de						x 5	
	Confinamiento							0,80 m³ ✓	
4002683	Desmonte	Adoquin	Cl 32F # 74B - 176	2,60	3,00		7,80		
4002683	Desmonte	Adoquin	Cl 32F # 74B - 176	2,35	3,00		7,05		
4002683	Desmonte	Adoquin	Cl 32F # 74B - 176	2,40	3,00		7,20		
4002683	Desmonte	Adoquin	Cl 32F # 74B - 176	2,55	3,00		7,65		
							29,70 m² ✓		
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
	D. Asfalto por M12?			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-12-2025

10. ESQUEMAS

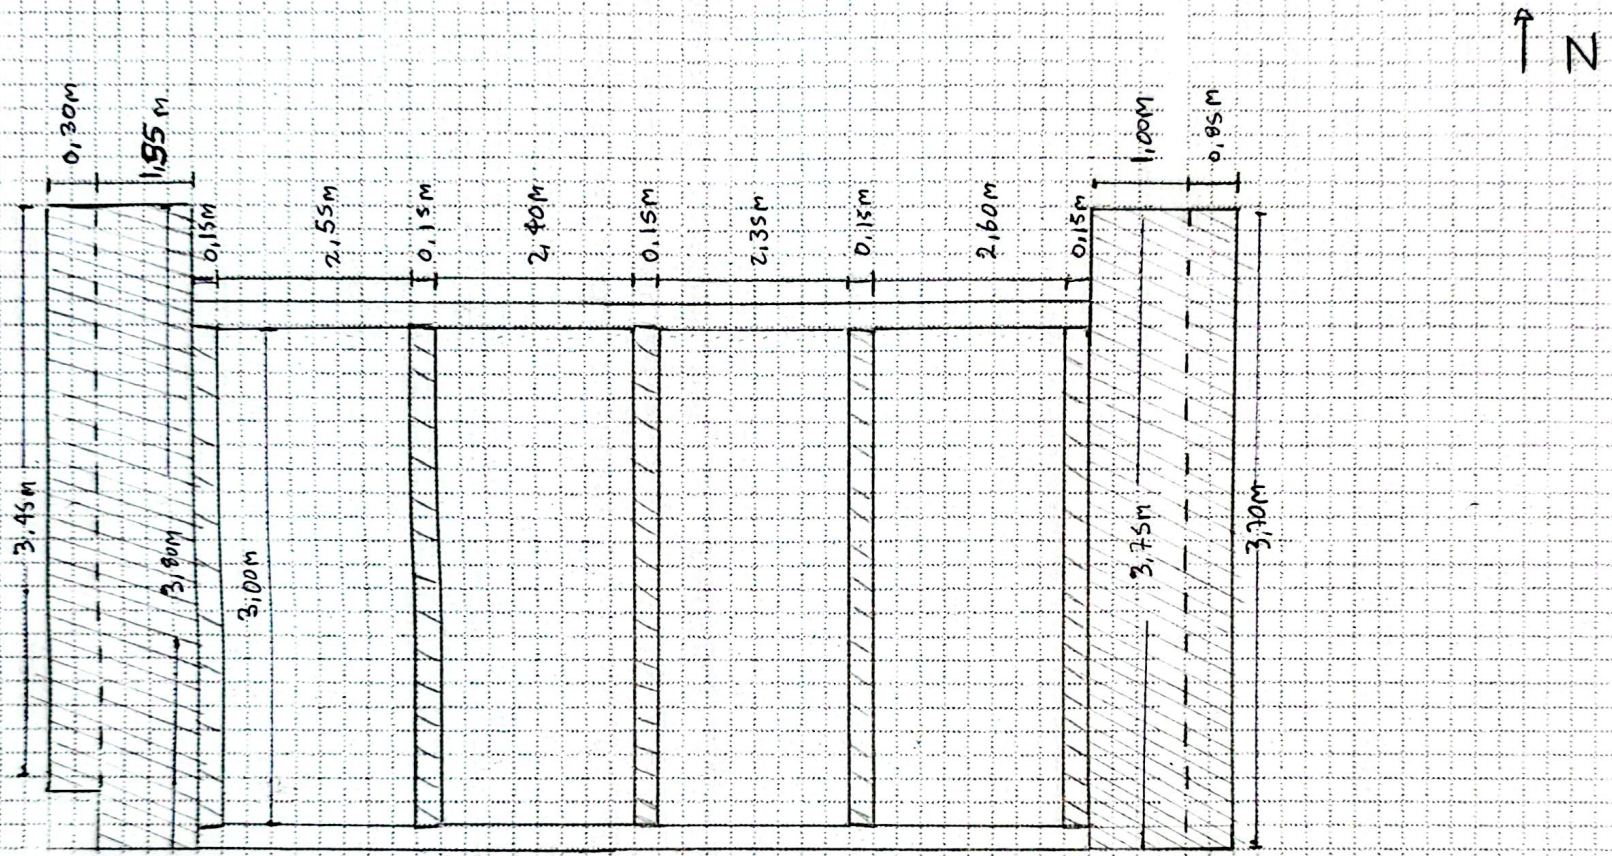

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras complementarias	FRENTE	10.
RANGO:		CANTIDAD:	13,81m², 0,80m³; 29,70m².
BARRIO	El Nogal - Los Almendros	DIRECCIÓN	Cl 32F # 74B-176

Powered by CamScanner
