FECHA (D/M/A): 17-12-2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO:	—
CANTIDAD:	15,17 m^2 Desmonte y reinstalación Adoquín
ZONA	6
COMUNA	16 Belén
BARRIO	El Nogal - Los Almendros
FRENTE DE TRABAJO:	10

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 A.M	—
TERMINACIÓN: 5:00 P.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleado
TARDE	Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

La jornada inicia a las 7:00 A.M en dirección Diagonal 75B x Transversal 32BB sitio en el cual se instala señalización y cerramiento para realizar actividades de mantenimiento de adoquín, en este caso se interviene un sólo módulo de toda la estructura, se desmontan los adoquines y se seleccionan y se limpian las piezas. Se nivela la superficie con arena y posteriormente se procede con la reinstalación de los adoquines, se aplica arena fina y se vibra con la placa vibratoria. En total el área intervenida fue de 15,17 m^2. Al final del día se hace limpieza al área de trabajo y se recogen los equipos. La jornada finaliza a las 5:00 p.m.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Daniel Urrego Naranjo Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniel Sánchez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Gerzuai. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-12-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Samuel Orozco Noriega	✓		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo (oficial)	✓		
7	Ayudante	Yeisman Mosquera	✓		
8	Ayudante	Robert Jimenez	✓		
9	Ayudante	Stiven Anzola	✓		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux Vial	Angela Gonzalez	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama			
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	Planta eléctrica	Toyama	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-12-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001574	R. y Reinst Asf.	9	Diagonal 75B x Transversal 32BB	4,10	3,70		15,17		
4001574	Excavacion		Diagonal 75B x Transversal 32BB	4,10	3,70	0,03		0,46	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-12-2025

10. ESQUEMAS

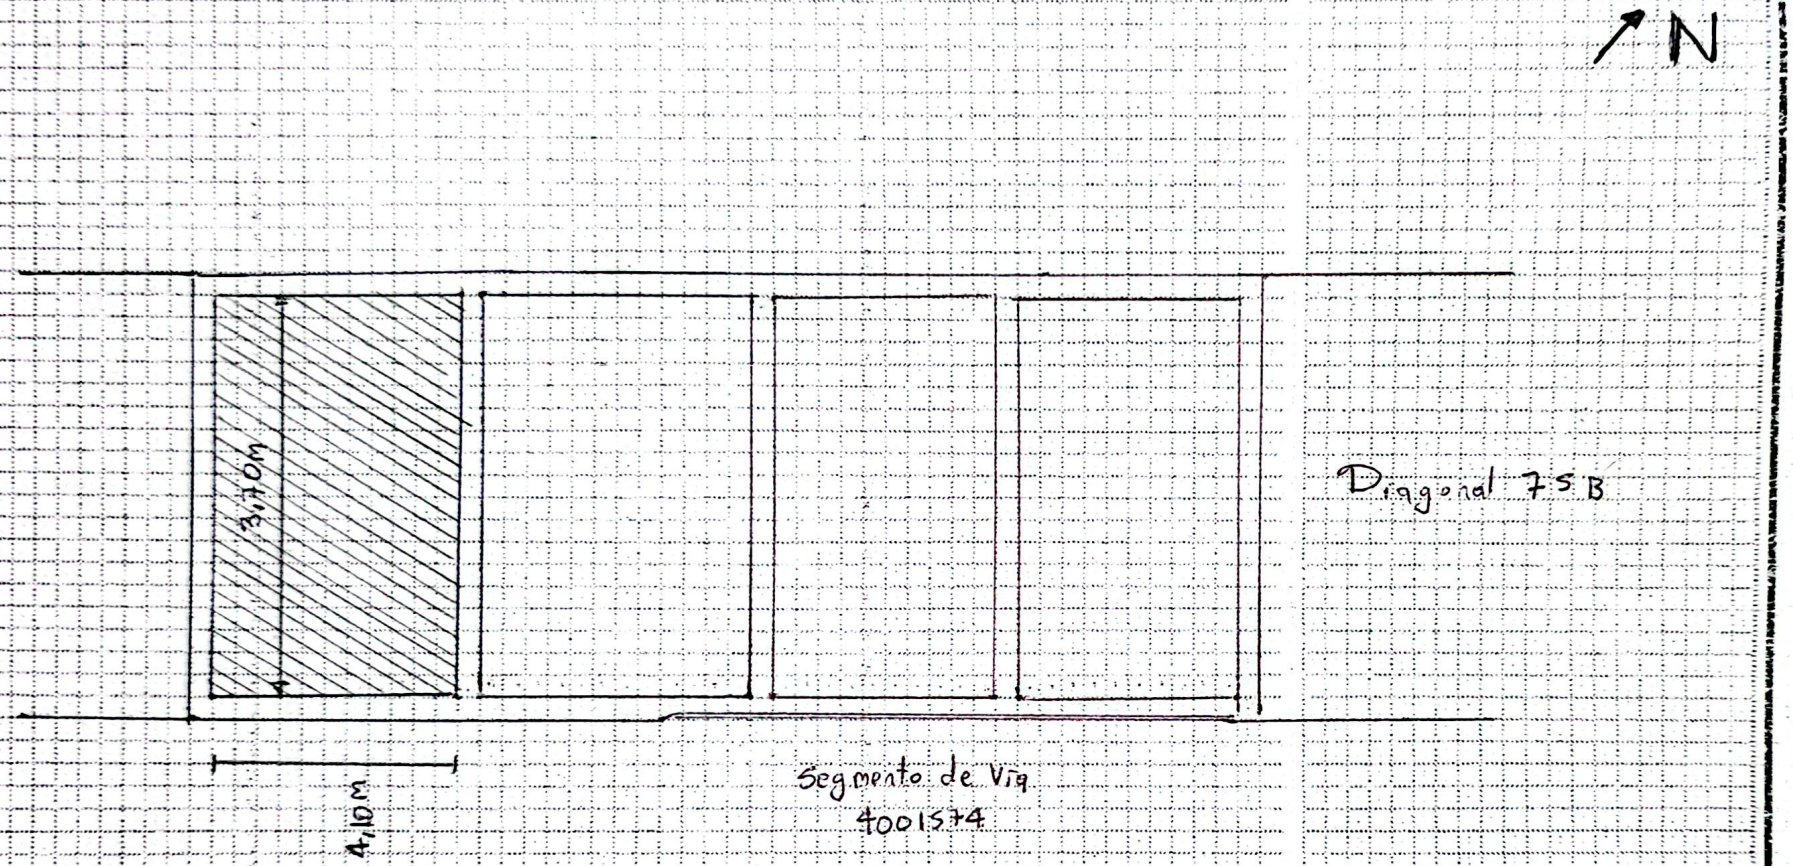

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias.	FRENTE	10.
RANGO:		CANTIDAD:	15,17M² ; 0,46M³
BARRIO	El Nogal - Los Almendros	DIRECCIÓN	Diagonal 75B x Transversal 32BB.

Powered by CamScanner
