FECHA (D/M/A): 12-12-2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Pavimentación

RANGO: Masivo | CANTIDAD: 66.85 m³ - 160.44 TN

ZONA: 5

COMUNA: 14 El Poblado

BARRIO: 1401 Barrio Colombia

FRENTE DE TRABAJO: 16

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 pm

TERMINACIÓN: 7:30 am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada nocturna, último viaje de mezcla llega a las 6:20 am la cual retrasa las actividades constructivas

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SECO

NOCHO TARDE: SECO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización vertical PMT
- Demarcación de las áreas de intervención
- Inicia demolición pavimento existente con fresadora
- Se solicita instalación de cono Bamer para volquetes
- Se observan instalados 5 flashers
- No hay cinta de señalización para los huecos se solicita instalación de cinta. Se debe cenar el frente.
- Se realiza limpieza de las superficies intervenidas
- Imprimación con emulsión asfáltica
- Colocación mezcla de alto modulo MAM-25
- Se realiza vibrocompactación mezcla asfáltica MAM-25
- Se realiza sellado con compactador de llantas.
- Se presenta tramo de 11m sin faltante de mezcla, debido a la pertaña de 16cm, se pedirá producir mezcla para aplicar en el tramo faltante, en la espera y jornada extendida.
- Se realiza rampa a los dos elementos (MH y Cámara Acd.), de espesor a elemento de 6cm. (garantizar seguridad vial)
- Vibrocompactación y sellado con compactador de llantas.

5. VISITANTES

Jorge Morales - Inspección

6. FIRMAS

NOMBRE: Luis Daniel Echeverry Vidal
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Luis Fernando Castro R.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

James S Taborda
Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12 - 12 - 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis Maria de la Rosa	X		Consorcio Vial Nte 2025 Pavimentar
2	Encargado	Jorge Iwan Jaramillo Henao	X		
3	Liguero	Daniel Payares	X		
4	Rastrillero	Jhon Mario Velasquez	X		
5	Rastrillero	Jhonatan Maya	X		
6	Ayudante				
7	Ayudante	Nelson Zapata	X		
8	Ayudante	Naisin Padilla	X		
9	Ayudante	Daniel Ortega	X		
10	Ayudante	Jhon Ramirez	X		
11	Ayudante	Gustavo Quintana	X		
12	Ayudante	Wilmar Cuevas Pino (Cornillo)	X		
13	Ayudante	Oscar Fabio Cantillo	X		
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Jhon Fredy Ramirez	X		
18	Operador fresadora	Fredy Ramirez	X		
19	Operador finisher	Jorge Hugo Arias	X		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Omar Londoño	X		
22	Operador Compactador llantas	Jhonny Rios	X		
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Alexander Zapata	X		
25	Operador Mini cargador	Andres Rodas	X		
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque	Carlos Moreno	X		
28	Conductor Camión	Andres Restrepo	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Luis Humberto Ortiz	X		
		Wilder Tamayo Gomez	X		
		Carlos Lozada Cifuentes	X		
		Jhon Mafia Pargja	X		
		Jose Quintana Alvarez	X		
		Cesar Gomez Rios	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Kaeser 1840 - M50	X		
3	Fresadora	Wirtgen - W150 CF	X		
4	Finisher	Dynapac atlas copco SD-900	X		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Atlas copco - Dancpac	X		
7	Compactador llantas	Dinapac - CP 140	X		
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Hino 500 fc - WKX 298	X		
10	Placa vibratoria	Jecom fc - 30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador	Hyundai - HSL 850 - 7A	X		
13	Barredora				
14	Carrotanque	Chevrolet - Kodiak TRP 786	X		
15	Camión	Chevrolet - TMX 83A	X		
16	Volqueta(s)	TRK 257 - TQW 949 - SNZ 329	X		
		TRK 32A - SYZ 403 - TRK 251	X		
		TQW 859	X		
	01 800 MOVI	SYE	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-12-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000634		1	CL 29 CR 43A CR 43A+57	62.15	3.63	0.204	229.60	46.02	110.46
2000635		2	CL 29 CR 43A+117 CR 43G	28.12	3.63	0.204	102.08	20.82	49.98
2000634	fresado		CL 29 CR 43A CR 43A+57	62.15	3.63	0.26	225.60	58.66	
2000635	fresado		CL 29 CR 43A+117 CR 43G	28.12	3.63	0.26	102.08	26.54	
2000634	Topografia		CL 29 CR 43A CR 43A+57	1.00					
TOTALES									160.44

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
532314	TRK252	22.04	22.04	166
532315	EDW849	22.01	44.05	167
532316	SNZ329	22.04	66.09	170
532317	TRK324	21.01	87.10	167
532318	STZ403	21.14	108.24	165
532319	TRK251	21.05	129.29	168
532320	EQW865	21.01	150.30	170
532330	TRK252	10.14	160.44	165

BOTADA DE ESCOMBROS


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
34270	TRK324	Doble	1	Pavimentar
34271	SRM029	Doble	1	Acceso la 30
34272	TRK257	Doble	1	Acceso la 30
34273	TRF301	Doble	1	Pavimentar
34274	TRF426	Doble	1	Pavimentar
34275	SRM029	Doble	1	Pavimentar
34276	TRK257	Doble	1	Pavimentar
34277	TRF301	Doble	1	Pavimentar
34278	TRF426	Doble	1	Pavimentar
34279	TRK252	Doble	1	Pavimentar
34280	TRK251	Doble	1	Pavimentar

ULACIÓN

Powered by CamScanner

FECHA(D/M/A): 12-12-2025

9. ESQUEMAS

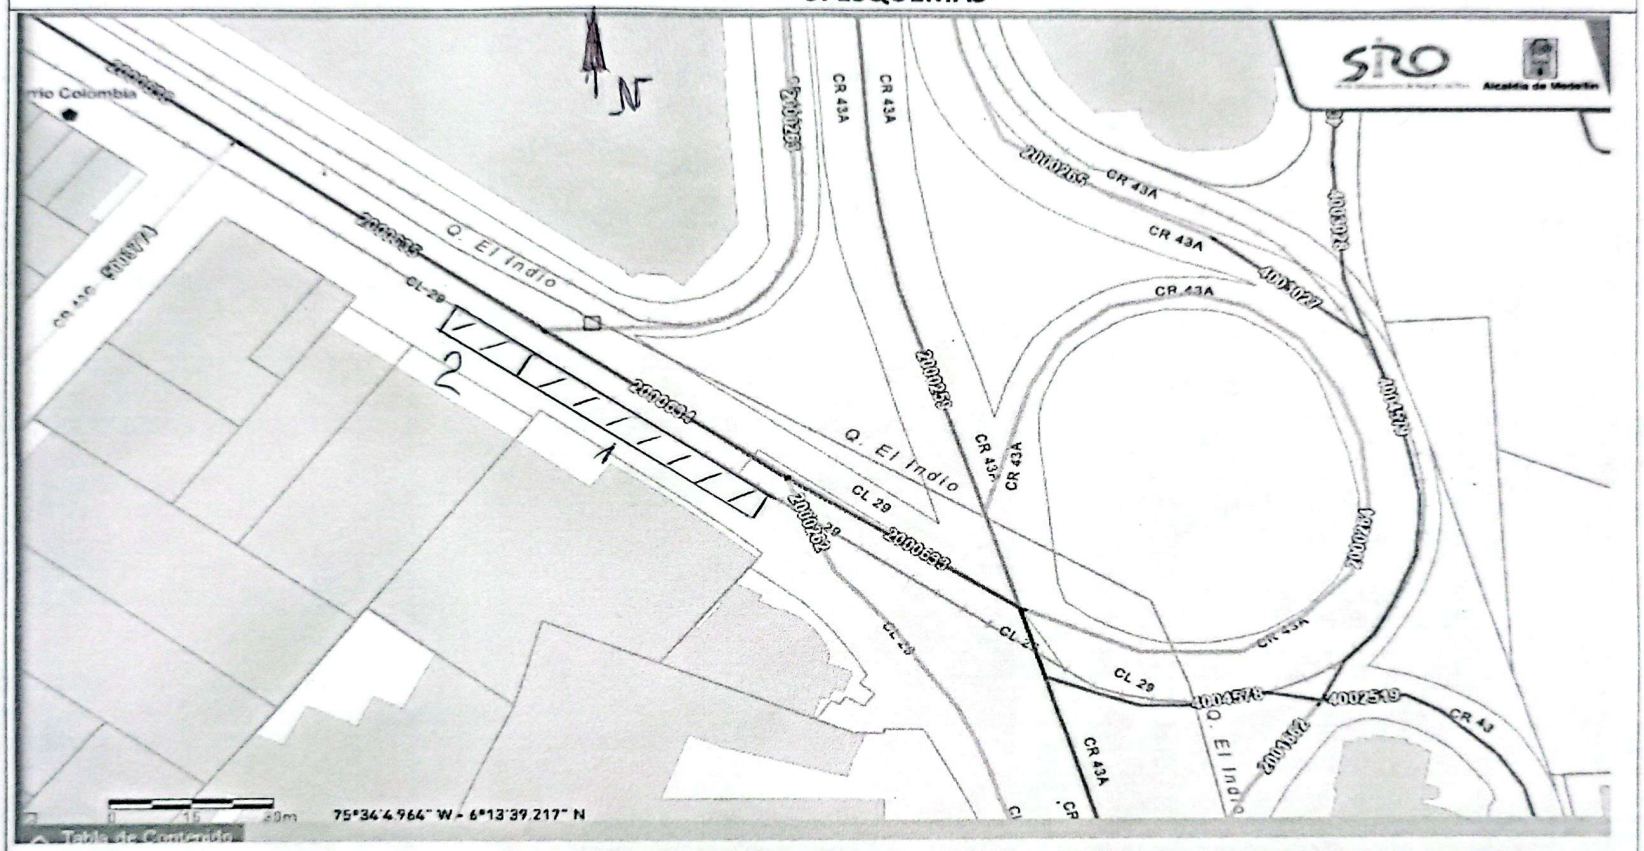

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Pavimentación	**CUADRILLA:**	16
RANGO:	Masivo	**CANTIDAD:**	66.85 m^3 - 160.44 TN
BARRIO	Barrio Colombia	**DIRECCION:**	CL 29 CR 43A CR 43A #57

Powered by CamScanner

Jamos S Tabarda

20251212 22:07

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532314
PLACA: IRK252
CONDUCTOR: Luis Humberto Ortiz Antonio

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 22,04 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.860,00
PESO BRUTO:33.900,00

ENTRADA: 12 dic 2025 -m10:25 p.
SALIDA: 12 dic 2025 -m 10:25 p.
TEMPERATURA:166,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Jamos S Tabarda

20251212 22:29

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532315
PLACA: EBW849
CONDUCTOR: Wilder Erney Tamayo Gomez

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 22,01 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.970,00
PESO BRUTO:34.980,00

ENTRADA: 12 dic 2025 -m10:29 p.
SALIDA: 12 dic 2025 -m 10:29 p.
TEMPERATURA:167,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

wilder tamayo
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Jamos S Tabarda

20251212 22:30

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532316
PLACA: SNZ329
CONDUCTOR: Carlos Enrique Lozada Cifuentes

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 22,04 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.120,00
PESO BRUTO:34.160,00

ENTRADA: 12 dic 2025 -m10:30 p.
SALIDA: 12 dic 2025 -m 10:30 p.
TEMPERATURA:170,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Carlos Lozada
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Powered by CamScanner

James S Taborda

20251212 22:33

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532317
PLACA: TRK324
CONDUCTOR: JHON FREDY MEJIA PAREJA

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 21,01 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.710,00
PESO BRUTO:32.720,00

ENTRADA: 12 dic 2025 -m10:34 p.
SALIDA: 12 dic 2025 -m 10:34 p.
TEMPERATURA:167,00

Santiago Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Jorge Jilo
FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

James S Taborda

20251212 22:37

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532318
PLACA: STZ403
CONDUCTOR: Jose Alberto Quintana Alvarez

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 21,14 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.060,00
PESO BRUTO:33.200,00

ENTRADA: 12 dic 2025 -m10:51 p.
SALIDA: 12 dic 2025 -m 10:51 p.
TEMPERATURA:0,00

Santiago Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Jorge Jilo
FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

James S Taborda

20251212 22:51

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532319
PLACA: TRK251
CONDUCTOR: Cesar Augusto Gomez Rios

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 21,05 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.890,00
PESO BRUTO:32.940,00

ENTRADA: 12 dic 2025 -m11:14 p.
SALIDA: 12 dic 2025 -m 11:14 p.
TEMPERATURA:168,00

Santiago Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

CESAR
FIRMA DEL CONDUCTOR

Jorge Jilo
FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Powered by CamScanner

Jamos S Taborda

20251212 23:14

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532320
PLACA: EOW855
CONDUCTOR: Carlos Mario Mesa Mesa

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 21,01 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.990,00
PESO BRUTO:34.000,00

ENTRADA: 12 dic 2025 -m11:20 p.
SALIDA: 12 dic 2025 -m 11:20 p.
TEMPERATURA:170,00

Santiago Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Wilder Tamayo
FIRMA DEL CONDUCTOR

Jorge J16
FIRMA DEL CLIENTE

Luis Jaramillo

CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Jamos S Taborda

20251213 04:59

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532330
PLACA: TRK252
CONDUCTOR: Luis Humberto Ortiz Antonio

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 10,14 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.860,00
PESO BRUTO:22.000,00

ENTRADA: 13 dic 2025 -m05:07 a.
SALIDA: 13 dic 2025 -m 05:07 a.
TEMPERATURA:165,00

Santiago Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Jorge J16
FIRMA DEL CLIENTE

Luis Jaramillo

CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Powered by CamScanner

Luis Albert James S Tuborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE — Nº 34270 — FECHA DD 22 MM 12 AA 25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla Vial 2025	PLANTA-PV	TRK 324
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-Cr43		7 mts

SUBBASE		ESCOMBROS	X	Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		✓
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		✓
OTRO: F		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		[illegible]

Luis Albert James S Tuborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE — Nº 34271 — FECHA DD 22 MM 12 AA 25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla Vial 2025	SIF 30	SRM029
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-Cr43		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		✓
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		✓
OTRO: Fresado		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		[illegible]

Luis Albert James S Tuborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE — Nº 34272 — FECHA DD 22 MM 12 AA 25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla Vial 2025	SIF 30	TRK 257
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-Cr43		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		✓
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		✓
OTRO: Fresado		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		[illegible]

Luis Albert James S Tuborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE — Nº 34273 — FECHA DD 22 MM 12 AA 25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla Vial 2025		TRF 307
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-Cr 43	Planta Pavimentar	14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE	X	ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		✓
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		✓
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		[illegible]

DESPA

Powered by CamScanner

Luis Hdez — James S Taborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE — Nº 34274 — FECHA DD 22 MM 12 AA 25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	planta Pavimentar	TRF-426
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-Cra 43		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		Carlos Torres

James S Taborda — Luis Hdez

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE — Nº 34275 — FECHA DD 22 MM 12 AA 25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	planta Pavimentar	SRM 029
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-Cra 43		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS	X	Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		

Luis Hdez — James S Taborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE — Nº 34276 — FECHA DD 22 MM 12 AA 25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	planta P-V	TRK 257
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-Cra 43		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS	X	Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		

Luis Hdez — James S Taborda

pavimentar — REGISTRO TRANSPORTE — Nº 34277 — FECHA DD 22 MM 12 AA 25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	planta P-V	TRF 307
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-Cra 43		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS	X	Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		Carlos Torres

Powered by CamScanner

Lucy Diaz James S Taborda

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	34278	12	12	25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	planta-P-V	TRF426
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-cr 43		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS	X	Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		Conductor

Lucy Diaz James S Taborda

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	34279	12	12	25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	planta-P-V	TRK252
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-cr 43		14 mts

SUBBASE		ESCOMBROS	X	Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		

Lucy Diaz James S Taborda

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	34280	12	12	25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla Vial 2025	planta	TRK252
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-cr 43		70 mts

SUBBASE		ESCOMBROS	X	Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		

Powered by CamScanner
