Puerto Gaitán, 17 de abril del 2026 1090-0625

Doctora:
**ALEJANDRA CASTILLO BLANDON**
Secretaría de contratación
Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No 0821 DE 2025**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META."

Asunto: Remisión del trámite de parcial N° 1 del contrato de la referencia

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su despacho la documentación entregada por el contratista de obra del contrato No. 0821 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.", la cual fue aprobada por la interventoría.

Por lo anterior, en calidad de secretario de infraestructura, me permito remitir nueve (09) carpetas, para la continuidad del trámite pertinente así:

1. Ocho (08) carpetas con información para la secretaría de contratación
2. Una (01) carpeta con información para la secretaría de hacienda

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por:
Fecha: 20 ABR 2026
Hora: 9:43 am

**CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES**
Secretario de Infraestructura

Elaboró: Hanlly Lorena Vergara Camargo – Profesional de Apoyo CPS 1106 de 2025
Revisó: Christian Julián Fernández Reyes – Secretario de Infraestructura



NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

# CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

C-016.26
Villavicencio (Meta), 27 febrero de 2026

Puerto Gaitan 2261.11.0001889
Tipo: Radicado Entrada Fecha Rad:27/02/2026 16:26 Folios: 9
Asunto: entrega d eacta d ecorte n° 1 del contrato 0821 de
Radicador: MAIRELY.BETANCURT
Procedencia: JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO/CONSORCIO INTERVENT(
Destinatario: CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
La recepción del documento no implica aceptación

Ingeniero:
**Ing CRISTIAN JULIAN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**
Calle 10No. 10-90 Barrio Centro – Palacio Municipal
e-mail: infraestructura@puertogaitan-meta.gov.co
Puerto Gaitán – Meta.

**Ref.:** Contrato de Interventoría No. 1004 de 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEIMPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META.

**Asunto:** Entrega de acta de corte N°1 contrato de obra 0821 de 2025

Cordial Saludo:

A continuación, hacemos entrega de Entrega de acta de corte N°1 contrato de obra 0821 de 2025, correspondiente al periodo de corte ENTRE EL 29 DE AGOSTO 2025 Y 20 ENERO DE 2026 fue revisado de acuerdo a lista de chequeo INF-FR-22 V05, y a requerimientos contractuales. Se hace entrega de 9 carpetas doble aleta con la información respectiva.

Cordialmente,

***JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO***
*R.L. CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDIGENAS 2025*

Anexo. lo enunciado en 1 carpeta

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | **COMUNICACIONES EXTERNAS** | Código: ADM-F-002 |
| | | Versión:01 |
| | | Fecha: junio 2025 |

CE-006-2026

Villavicencio, 19 de febrero de 2026

Ingeniero:
**JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO**
**CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025**
Calle 41B #30 – 11
e-mail: interventoria.acindigenas@gmail.com
Ciudad

**Ref.:** Contrato de Obra No. 0821 de 2025 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"

**Asunto:** Entrega corrección Acta Parcial No. 1

Cordial saludo:

Por medio de la presente remito a ustedes el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N°1 con la corrección de las observaciones realizadas, junto con la documentación soporte requerida según la lista de chequeo para pagos parciales de contratos de obra (INF-FR-22-V05), para su respectiva revisión, aprobación y tramite.

Agradeciendo la atención prestada y a la espera de sus indicaciones.

Atentamente,

Milton Arias
20-02-26

**LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA**
R.L. CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
Contratista

Anexo: 8 carpetas y 1 CD

| ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META | LISTA DE CHEQUEO PAGOS PARCIALES DE CONTRATOS OBRA PÚBLICA E INTERVENTORIA | | Puerto Gaitán |
|---|---|---|---|
| | Infraestructura | | |
| | Codigo:INF-FR-22 | Version:05 | Fecha:10-01-2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 821 | | DIA | 17 | MES | JULIO | AÑO 2025 |
| OBJETO: | | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META | | | | | |
| CONTRATISTA : | | CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | | | | | |
| PERIODO DEL INFORME | DESDE | DIA | 29 | MES | 8 | AÑO: 2025 | |
| | HASTA | DIA | 20 | MES | 1 | AÑO: 2026 | |
| GFI | | | DAC | | | | |

| No | FORMATO | DOCUMENTO/TRAMITE | DOCUMENTOS | | | | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GFI | DAC | SI | NO | N/A | |
| 1 | INF-FR-22 | Verificación de la lista de Chequeo | X | X | | | | Interventor Supervisor designado |
| 2 | - | Copia Minuta de contrato, adicionales, modificatorias, prorrogas, etc. | X | N/A | | | | Interventor Supervisor designado |
| 3 | - | Copia del certificado de registro presupuestal | X | N/A | | | | Interventor Supervisor designado |
| 4 | - | Factura | X | N/A | | | | Contratista |
| 5 | - | Certificación bancaria | X | X | | | | Contratista |
| 6 | - | Rut Primera Cuenta | X | N/A | | | | Contratista |
| 7 | INF-FR-74 INF-FR-80 | Informe de parcial de obra / informe de parcial de interventoría | N/A | X | | | | Contratista |
| 8 | DAC-FR-59 | Certificación de cumplimiento | X | X | | | | Interventoría |
| 9 | DAC-FR-100 | Certificado Pago Seguridad Social (Supervision a interventoria) | X | X | | | | Supervisor designado |
| 10 | INF-FR-55 | Certificado Pago Seguridad Social (Interventoria a obra) | X | X | | | | Interventoría |
| 11 | | certificado del revisor fiscal (incluir soportes del revisor) en caso de no tener revisor fiscal debe estar firmado solo por el R/L | X | X | | | | Interventoría |
| 12 | | Verificación pago seguridad social integral Salud, pensión y riesgos Anexando dos fotocopia de las planillas legibles y comprobante de pago | X | X | | | | Interventoría |
| 13 | | Informe de interventoría / informe de supervisión | N/A | X | | | | Supervisor designado |
| 14 | INF-FR-28 | formato de pago parcial | X | X | | | | |
| 15 | INF-FR-11/23 | Formato de acta de Pago Parcial o final | N/A | X | | | | Supervisor designado |
| 16 | INF-FR-20 | Memorias de calculo | N/A | X | | | | Contratista |
| 17 | INF-FR-83 | Planos rotulados y firmados | N/A | X | | | | |
| 18 | DAC-FR-50 | Informe de inversion y buen manejo del anticipo (si aplica) | N/A | X | | | | Contratista |
| 19 | | CD (con toda la información en formato Word, PDF, dwg, mpp, en otros.) | N/A | x | | | | Contratista |

**NOTA:** Se advierte que la omisión de verificación real de la presente información constituye falsedad ideológica en documento que puede servir de prueba, tipificada en la Ley Penal como delito; además de las sanciones administrativas y disciplinarias que conlleva

**ING. JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO**
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

# CERTIFICACIÓN BANCARIA

DAVIVIENDA

# CERTIFICADO

**VILLAVICENCIO,**
**META,**
COLOMBIA
**A quién interese**

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025** identificada con NIT **901965630-1** posee en el Banco Davivienda una **CUENTA AHORROS**

Número de Cuenta: **098400047852**

Estado: VIGENTE

Fecha de Apertura: 18/02/2026

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0984 - OFICINA PRIMAVERA URBANA

**BANCO DAVIVIENDA SA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

| | FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES DE PARCIAL DE OBRA | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META | Infraestructura | | |
| | Codigo:INF-FR-74 | Version:05 | Vigencia:10-01-2025 |

Ciudad y Fecha: 20/01/2026

Contrato de obra No.: 821 DE 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

Radicado No: Fecha: _____ / _____ / _____

Periodo del informe: Desde: 29 / 08 / 2025 Hasta: 20 / 01 / 2026

| No. | DOCUMENTO / TRAMITE | ENTREGADO | CUMPLE | | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | N/A | |
| *1* | ***INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO*** | | | | | |
| 1,01 | Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir). | X | X | | | |
| *2* | ***INFORMACION DEL CONTRATO*** | | | | | |
| 2,01 | **Cuadro de trazabilidad:** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas juridicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas juridicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, juridica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación | X | X | | | |
| *3* | ***INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO*** | | | | | |
| 3,01 | Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique) | X | X | | | |
| *4* | ***INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO*** | | | | | |
| 4,01 | Información de avance financiero de la obra | X | X | | | |
| 4,02 | Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de obra | X | X | | | |
| 4,03 | Balance de ejecucion del anticipo, relacionar Ordenes de pago efectuadas y desembolso. | X | X | | | |
| 4,04 | Relación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra | X | X | | | |
| 4,05 | Relación de Registros Presupuestales de cada contrato de obra | X | X | | | |
| 4,06 | Relación de BPIN y rubros presupuestales de cada contrato de obra | X | X | | | |
| *5* | ***INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO*** | | | | | |
| 5,01 | Grafico de avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas (financiera, porcentajes) | X | X | | | |
| 5,02 | Descripción de cada capitulo ejecutado a cobrar mes a mes, incluir porcentaje de avance | X | X | | | |
| 5,03 | Cuadro de cantidades de obra ejecutadas en el periodo a cobrar (financiera y por porcentaje) | X | X | | | |
| 5,04 | Certificados de calidad de los materiales , ensayos de laboratorio y calidad de materiales (anexar de acuerdo al tipo de obra y obligaciones legales, calibración de equipos utilizados en los ensayos o levantamientos topográficos) | X | X | | | |
| *6* | ***INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO*** | | | | | |
| 6,01 | Cuadro de relación de personal de obra (profesional - operativo), tipo de vinculación; personal propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal ) y organigrama de personal | X | X | | | |
| 6,02 | Pagos de seguridad social y aportes parafiscales según naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para profesionales contratados por prestación de servicios, mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V. | X | X | | | |
| 6,03 | Paz y salvo de los trabajadores retirados al corte | X | X | | | |
| *7* | ***CUADRO DE LABORATORIOS TOMADO EN EL PERIODO A COBRAR*** | X | X | | | |
| *8* | ***CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)*** | X | X | | | |
| *9* | ***ANEXOS*** | | | | | |
| 9,01 | Registro fotográfico ítem por ítem a cobrar | X | X | | | |
| 9,02 | Copia de bitácora de obra (debidamente firmada por los residentes de todo el tiempo de ejecución mediante libro, con copia del corte de cobro) | X | X | | | |
| 9,03 | resultados de laboratorios tomados en el periodo a cobrar | X | X | | | |
| *10* | ***CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)*** | X | X | | | |

NOTA: Se aclara así alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaria de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoría, deben allegarse por la interventoría conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) días del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.

Revisó y aprobó:

**R/L JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO**
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

Nota: Se debe paginar los informes

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

# INFORME PARCIAL DE OBRA

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 821 DE 2025

"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"

## INFORME PARCIAL 1

PERIODO DEL INFORME
DEL 29 DE AGOSTO DE 2025
AL 20 ENERO DE 2026

**CONTRATISTA:**
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1
R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

**INTERVENTOR:**
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
NIT. 901.972.868 – 4
R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO

# TABLA DE CONTENIDO

**1. INTRODUCCIÓN ..... 4**
**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 5**
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 5
2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo ..... 5
2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba ..... 6
2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas ..... 6
2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome ..... 7
2.1.5 Comunidad beneficiada ..... 8
**3. ALCANCE DEL PROYECTO ..... 8**
**4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO ..... 9**
**5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO ..... 10**
5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS ..... 11
**6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ..... 12**
6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO ..... 12
6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ..... 13
6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ..... 16
6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ..... 17
6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP. ..... 17
6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP. ..... 18
6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS ..... 18
**7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO ..... 18**
7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES ..... 18
7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO ..... 20
7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ..... 19
7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES. ..... 45
7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ..... 24
**8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO ..... 45**
8.1 RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO) ..... 45

8.2 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ..... 50
8.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ..... 51
8.4 PAZ Y SALVO PERSONAL ..... 51
**9 CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 52**
**10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ..... 52**
**12 CONCLUSIONES ..... 53**
**13 ANEXOS ..... 53**

# 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las leyes y normas, principalmente del artículo 366 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las actividades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento básico y de agua potable"*, el municipio de Puerto Gaitán en enmarcado en el cumplimiento de las metas de su Plan de Desarrollo **"JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027"** PDM 0344- Construcción, ampliación, optimización, y adecuación de redes de acueducto y plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Atendiendo a la política pública de VIVIENDA, establece como uno de los fines principales de la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está el acceso al servicio de agua potable, que es fundamental para la vida humana. El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea.

Algunas comunidades Indígenas del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, presentan vulneración en el servicio de agua potable ya que no cuentan con sistemas de acueductos, se han visto afectadas por la carencia de agua potable, llevando a realizar malas prácticas de la captación del agua, tomando como forma de abastecimiento los pozos profundos rudimentarios en algunas de sus viviendas, que con el tiempo por el desconocimiento sobre las consecuencias que se podrían presentar, algunas familias construyeron pozos sépticos o letrinas a corta distancia de la fuente, lo cual ocasiona la contaminación inmediata de los mismos; evidenciándose condiciones incorrectas para el acceso al agua potable.

Surtidos los tramites de planeación del proyecto, mediante resolución No. 0014 del 10 de junio de 2025 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIP-005-2025"* se inició el proceso de contratación el cual culmino con la adjudicación y suscripción del Contrato de Obra Pública No. 821 del 17 de julio de 2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"**.

Así las cosas, con la presentación del presente informe damos cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 821 – 2025 en su cláusula *OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:* numeral *6. Cumplir con la entrega de informes mensuales de ejecución, según el avance de la obra (secuencias de actividades, etc.) de acuerdo al plazo pactado.*

Así mismo, el presente informe cumple con los requerimientos exigidos en el *FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA (INF-FR-72 V05 vigente desde el 10/01/2025)* establecido por la entidad para tal fin.

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

### 2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza y beneficia a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas de la zona rural del municipio de Puerto Gaitán – Meta, así:

#### 2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo

| RESGUARDO WACOYO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | COMUNIDAD/VDA | COMUNIDADES BENEFICIADAS | No. DE FAMILIAS | ESTE | NORTE | COTA | LONGITUD | LATITUD | D CATAM |
| WAC01 | POZO KALIWIRNAE | ACACIOS | 2 | 898322.2694m | 973031.6969m | 204.700m | W71° 59' 36.52" | N4° 21' 06.35" | 14,00 KM |
| WAC02 | POZO ESMERALDA WALABO | LAS BRISAS, MANANTIAL Y WALABO | 4 | 900418.0667m | 972896.7131m | 226.400m | W71° 58' 28.56" | N4° 21' 02.04" | 16,00 KM |
| WAC03 | POZO PALOGRANDE WALABO | PALOMEKO, PARAISO Y CAIMANA 2 | 4 | 900588.5666m | 972854.4974m | 226.400m | W71° 58' 23.03" | N4° 21' 00.67" | 16,00 KM |
| WAC04 | POZO LA UNION | | 1 | 902309.6873m | 973188.3818m | 218.100m | W71° 57' 27.23" | N4° 21' 11.61" | 16,00 KM |
| WAC05 | POZO PUNTO GRILLO | CARDCARO, LA BALSA, LLANO ALTO, ACEITICO | 5 | 903640.5670m | 974478.3613m | 221.500m | W71° 56' 44.12" | N4° 21' 53.65" | 18,00 KM |
| WAC06 | POZO ALGARROBO | SANTA INES, VILLANUEVA | 3 | 904014.1047m | 975025.1358m | 221.100m | W71° 56' 32.02" | N4° 22' 11.46" | 19,00 KM |
| WAC07 | POZO MATAPAUTO | LAS PIEDRAS | 2 | 906626.4761m | 979804.6633m | 209.800m | W71° 55' 07.48" | N4° 24' 47.14" | 27,00 KM |
| WAC08 | POZO LA PORFIA | LA HERMOSA | 2 | 907524.2409m | 981153.8279m | 191.200m | W71° 54' 38.41" | N4° 25' 31.09" | 29,00 KM |
| WAC09 | POZO LA CAIMANA | VERGEL | 2 | 900487.5918m | 971329.8396m | 202.200m | W71° 58' 26.24" | N4° 20' 11.04" | 18,00 KM |

Tabla 1. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

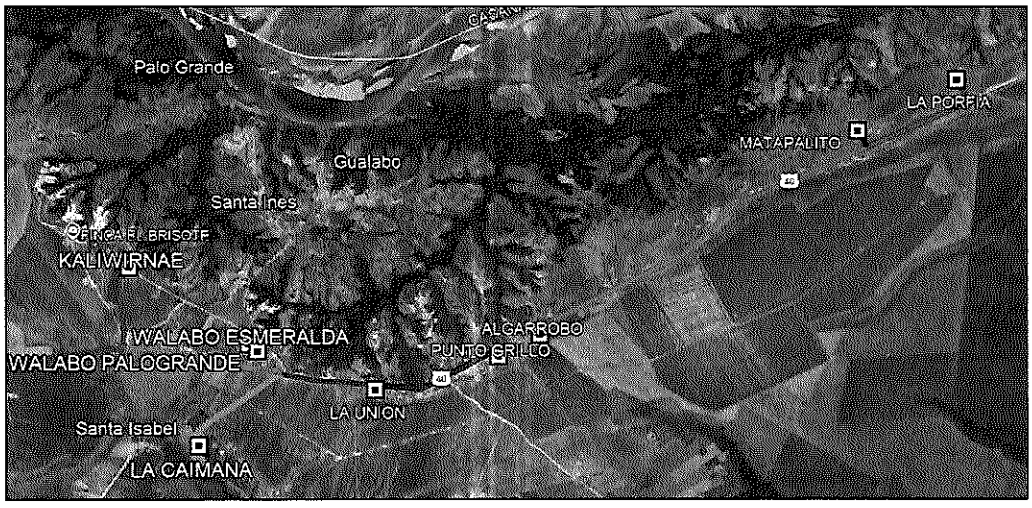



Figura 1. Localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

## 2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba

| RESGUARDO AWALIBA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA01 | POZO MAKAPAY | LA VEREMOS | 2 | 927966.5314m | 948604.7669m | 234.100m | W71° 43' 34.52" | N4° 07' 52.17" | 81,00 KM |
| AWA02 | POZO COMUNITARIO AWALIVA CENTRAL | CEREQUITO, LA BRISA, LA PISTA, CHAVALIVAU, LA ENVIDIA, DESEO | 7 | 932219.8422m | 949522.6407m | 240.200m | W71° 41' 16.65" | N4° 08' 22.16" | 85,00 KM |
| AWA03 | POZO PUERTO LOPEZ | | 1 | 933332.3182m | 944145.5908m | 206.500m | W71° 40' 40.45" | N4° 05' 27.15" | 90,00 KM |
| AWA04 | POZO PUNTO GRILLO | | 1 | 932907.1761m | 942400.7501m | 187.200m | W71° 40' 54.19" | N4° 04' 30.33" | 93,00 KM |
| AWA05 | POZO SAN GIL | TAPIVA, BELLAVISTA | 3 | 942563.2402m | 947574.8922m | 203.600m | W71° 35' 41.26" | N4° 07' 18.99" | 96,00 KM |
| AWA06 | POZO FACUNAE | | 1 | 935428.3607m | 942265.4095m | 194.400m | W71° 39' 32.61" | N4° 04' 25.99" | 93,00 KM |

Tabla 2. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

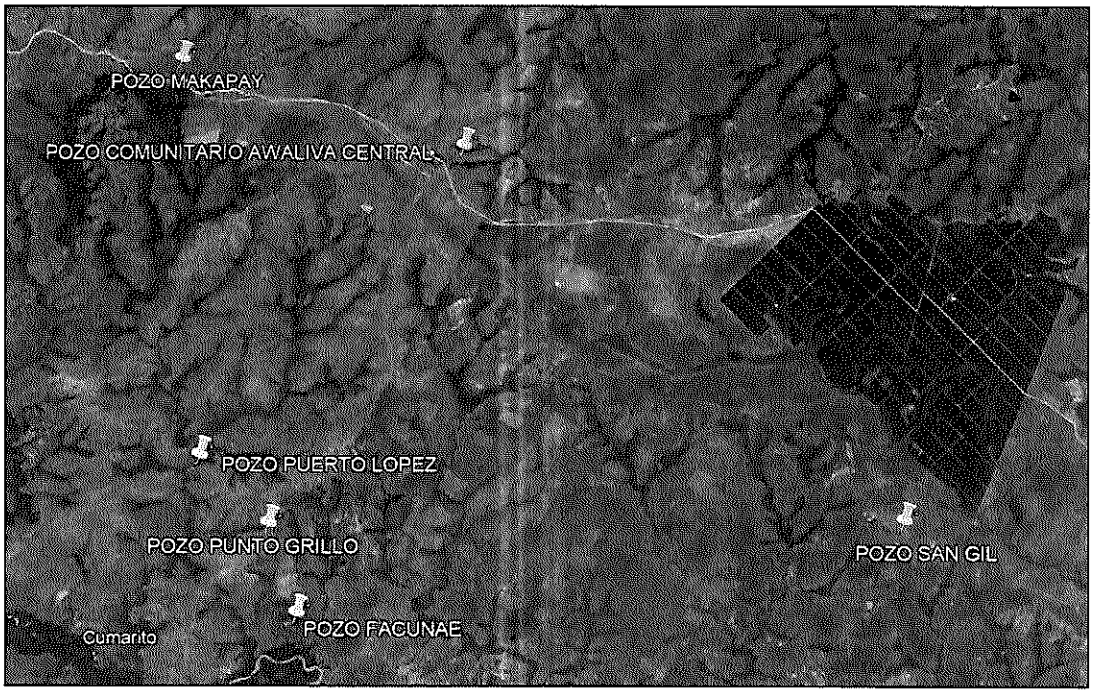



Figura 2. Localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

## 2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas

| RESGUARDO DOMOPLANAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM01 | POZO OLIVOS | WARROJO | 2 | 979779.5881m | 963044.8119m | 185.800m | W71° 15' 34.74" | N4° 15' 43.15" | 132,00 KM |
| DOM02 | POZO PARAISO | VISTA HERMOSA | 2 | 970139.3986m | 962795.7268m | 201.100m | W71° 20' 47.95" | N4° 15' 34.95" | 125,00 KM |
| DOM03 | POZO BUENAVISTA | | 1 | 968668.4144m | 953173.8691m | 232.350m | W71° 21' 34.94" | N4° 10' 21.70" | 112,00 KM |
| DOM04 | POZO VILLAMARCIA | DILUVIO | 2 | 976124.0172m | 945937.1103m | 194.500m | W71° 17' 33.14" | N4° 06' 26.18" | 124,00 KM |
| DOM05 | POZO LAS BRISAS | | 1 | 977507.6932m | 947082.3612m | 200.550m | W71° 16' 48.28" | N4° 07' 03.47" | 124,00 KM |
| DOM06 | POZO CUMARALITO | | 1 | 977551.1217m | 944929.5396m | 197.550m | W71° 16' 46.86" | N4° 05' 53.40" | 126,00 KM |
| DOM07 | POZO YATORROBO | | 1 | 976876.8066m | 943115.3330m | 194.300m | W71° 17' 08.70" | N4° 04' 54.32" | 129,00 KM |
| DOM08 | POZO CERRITO | | 1 | 980241.7249m | 947463.0325m | 183.500m | W71° 15' 19.64" | N4° 07' 15.89" | 126,00 KM |
| DOM09 | POZO PUERTO GAVILAN | SOLEDAD | 2 | 983468.1415m | 944328.3256m | 203.100m | W71° 13' 35.02" | N4° 05' 33.86" | 132,00 KM |
| DOM10 | POZO LAS DELICIAS | | 1 | 985468.1246m | 941561.4449m | 180.200m | W71° 12' 30.16" | N4° 04' 03.79" | 137,00 KM |
| DOM11 | POZO CACHAMITAS | | 1 | 979870.7300m | 939807.9630m | 186.933m | W71° 15' 31.62" | N4° 03' 06.67" | 134,00 KM |

Tabla 3. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

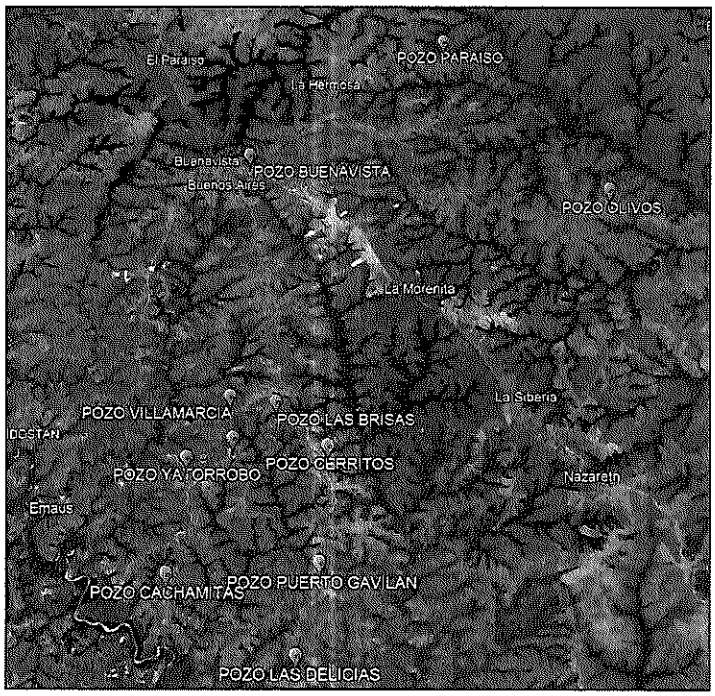



Figura 3. Localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

## 2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome

| RESGUARDO INDIGENA ASEINPOME | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| UNU01 | KEKO | | 1 | 960832.4770m | 1009357.8925m | 154.500m | W71° 25' 49.88" | N4° 40' 50.65" | 92,00 KM |
| UNU01 | SIETE RODRIGUEZ | SAN FERNANDO | 2 | 960832.4770m | 1009357.8925m | 154.500m | W71° 25' 49.88" | N4° 40' 50.65" | 92,00 KM |

Tabla 4. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome




Figura 4. Localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome

### 2.1.5 COMUNIDAD BENEFICIADA

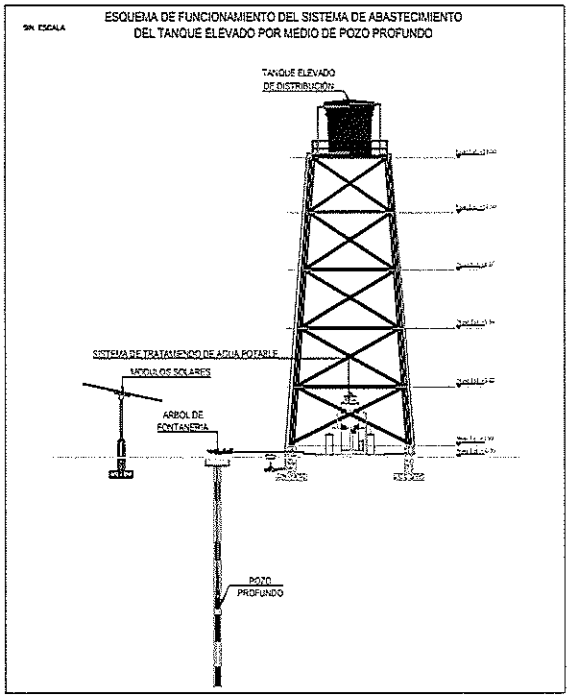
El número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto es de 3.246 habitantes como se muestra a continuación:

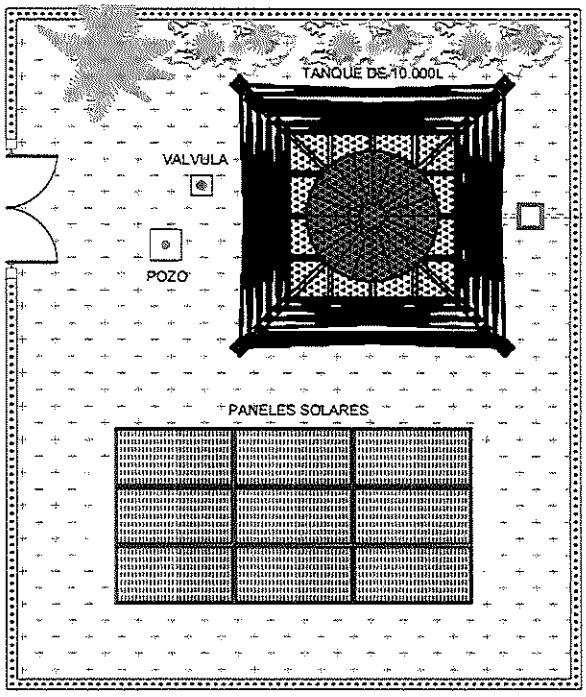
| | | | |
|---|---|---|---|
| **GRUPOS ÉTNICOS:** | Población Indígena | | |
| **ETARIA:** | **Edad:** | 0 a 14 años | 1.087 |
| | | 15 a 19 años | 390 |
| | | 20 a 59 años | 1.617 |
| | | Mayor de 60 años | 152 |
| **GÉNERO:** | **Masculino:** | 1.737 | |
| | **Femenino:** | 1.509 | |

## 3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto como se mencionó anteriormente beneficiara a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas distribuidos en toda la zona rural del municipio de Puerto Gaitán, cada sistema está concebido que sea igual para todas las comunidades, que requieran de la menor operación y que brinde agua potable para el beneficio de las comunidades.

El sistema consta de manera general de los siguientes componentes:



- **Pozo profundo:** Se contemplan profundidades de perforación desde 90 metros hasta los 153 metros, en tubería PVC de 6" al igual que los filtros.

- **Equipo de bombeo y sistema de energía solar:** bombas sumergibles solares de potencias entre 1.500, 3.000 y 16.000 wattios. Controladores de carga, sensores de nivel para tanque y pozo, y sistema de protección de malla a tierra.
  Paneles solares monocristalinos de 570 wattios, distribuidos en módulos de 5, 9 y 22 paneles según las características de cada sistema.

- **Sistema de tratamiento de agua:** compuestos por una unidad presurizada en acero inoxidable que filtra, clarifica y purifica; diseñados para tratar caudales de 0.5 lts/seg, 1 lts/seg y 2 lts/seg según el requerimiento de cada sistema.

- **Redes de acueducto:** 56.682.22 metros de tubería de pvc 2" RDE 21 – 941 acometidas domiciliarias y sus respectivos accesorios (válvulas, uniones, tapones, codos, tees).

- **Tanque elevado de distribución:** tanques plásticos de 6.000 lts, 10.000 lts, y 20.000 lts, soportados en estructuras de acero estructural ASTM de 13.7 metros de altura cimentados en zapatas y pedestales en concreto de 3.000 psi.

- **Cerramiento perimetral:** en tubo galvanizado de 2" soportados en viga de cimentación y concreto ciclópeo con portón de acceso.

## 4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **NÚMERO DEL PROCESO** | | LP-SIP-005-2025 |
| **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** | **NÚMERO:** | 821 DE 2025 |
| | **FECHA:** | 17 DE JULIO DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META". |
| **CONTRATISTA** | | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025<br>NIT. 901.965.630 – 1<br>R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA<br>C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO<br>consorcioaguasgaitan2025@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | **EN LETRAS** | CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. |
| | **EN NUMEROS** | $42.408.897.278,00 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | | QUINCE (15) MESES |
| **INTERVENTOR DEL CONTRATO:** | | CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025<br>NIT. 901.972.868 – 4<br>R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO<br>C.C. 79.134.525 DE FONTIBÓN<br>interventoria.acindigenas@gmail.com |
| **SUPERVISOR** | | CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | | 29 DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | | 28 DE NOVIEMBRE DE 2026 |
| **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A ACTA PARCIAL N°1** | | 35,37% |
| **COSTO EJECUTADO ACUMULADO ACTA PARCIAL N°1** | | $ 15.000.043.212,21 |
| **PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE** | | 25,09% |
| **COSTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE** | | $ 10.638.992.894,00 |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL ACTA DE INICIO** | | 145 días |
| **DIAS PENDIENTES DE EJECUCION** | | 311 días |
| **PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO** | | 31,80% |

## 5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

A continuación, se describen las pólizas expedidas por la compañía BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. que amparan la ejecución del contrato desde su suscripción y las correspondientes modificaciones que se han realizado a la fecha del presente informe y que aplican para actualización de pólizas.

- Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 93833.
- Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 27002.

## 5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS

PÓLIZAS INICIALES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 17 DE JULIO DE 2025.

| Póliza No. 93833 | | | | Endoso 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | DÍA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17 | 07 | 2025 | 17 | 02 | 2027 | $4.240.889.727,80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 17 | 07 | 2025 | 17 | 10 | 2029 | $2.120.444.863,90 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 17 | 07 | 2025 | 17 | 02 | 2027 | $21.204.448.639,00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS | 17 | 10 | 2026 | 17 | 10 | 2031 | $4.240.889.727,80 |
| **Póliza No. 27002** | | | | **Endoso 0** | | | |
| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 17 | 07 | 2025 | 17 | 10 | 2026 | $2.120.444.864,00 |

PÓLIZAS INICIALES CORRECIÓN NIT. DEL CONTRATISTA.

| Póliza No. 93833 | | | | Endoso 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | DÍA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17 | 07 | 2025 | 17 | 02 | 2027 | $4.240.889.727,80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 17 | 07 | 2025 | 17 | 10 | 2029 | $2.120.444.863,90 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 17 | 07 | 2025 | 17 | 02 | 2027 | $21.204.448.639,00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS | 17 | 10 | 2026 | 17 | 10 | 2031 | $4.240.889.727,80 |
| **Póliza No. 27002** | | | | **Endoso 1** | | | |
| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 17 | 07 | 2025 | 17 | 10 | 2026 | $2.120.444.864,00 |

PÓLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025.

| Póliza No. 93833 | | | | Endoso 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | DÍA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 29 | 08 | 2025 | 01 | 04 | 2027 | $4.240.889.727,80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 29 | 08 | 2025 | 01 | 12 | 2029 | $2.120.444.863,90 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 29 | 08 | 2025 | 01 | 04 | 2027 | $21.204.448.639,00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS | 29 | 08 | 2025 | 28 | 11 | 2031 | $4.240.889.727,80 |
| **Póliza No. 27002** | | | | **Endoso 2** | | | |
| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 29 | 08 | 2025 | 01 | 12 | 2026 | $2.120.444.864,00 |

# 6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

## 6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

El contrato de obra No. 821 de 2025 cuenta con un anticipo del 50% del valor del contrato correspondiente a la suma de $21.204.448.639,00; por concepto de FONSET la entidad retiene el 5% de este valor que son $1.060.222.431,95 es decir que el valor neto entregado del anticipo corresponde a $20.144.226.207,05.

En cumplimento de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR DEL CONTRATO, ANTICIPO Y FORMA DE PAGO del contrato, el contratista suscribió con la FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS denominado **PATRIMONIO AUTONOMO ANTICIPO CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, con el fin de manejar y girar los recursos del anticipo del contrato.

De igual manera se registra la cuenta de ahorros No. 500807651648 del Banco Popular correspondiente al fideicomiso donde se deben abonar los recursos objeto del contrato fiduciario.

A continuación, se presenta el plan de inversión del anticipo aprobado inicialmente y que se encuentra vigente a la fecha.

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | % | % PORCENTAJE PROGRAMADO DE INVERSION EN EL TIEMPO EN MESES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MANO DE OBRA, PRESTACION DE SERVICIOS Y PAGOS DEL PERSONAL OFERTADO Y OPERATIVO (SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, DOTACIONES) | $2.417.307.144,85 | 12% | 2% | 3% | 3% | 3% | 1% |
| 2 | COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS | $13.496.631.558,72 | 67% | 15% | 20% | 20% | 5% | 7% |
| 3 | TRANSPORTE DE MATERIALES | $4.230.287.503,48 | 21% | 3% | 5% | 5% | 5% | 3% |
| **TOTALES** | | **$20.144.226.207,05** | **100%** | | | | | |

## 6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

A continuación, se mencionan y describen cada uno de las ordenes de giro a la fiducia durante el periodo del informe

| CONSECUTIVO | ITEM | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | SALDO ANTICIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN GIRO No. 1 | 1 | 25/09/2025 | LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S | $ 462.554.100.00 | $ 19.681.672.107.05 |
| | 2 | | M&G INGENIERIA S.A.S | $ 145.631.457.22 | $ 19.536.040.649.83 |
| | 3 | | CONSTRUCIVIL M&A S.A.S | $ 3.954.010.079.94 | $ 15.582.030.569.89 |
| ORDEN GIRO No. 2 | 1 | 30/09/2025 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO | $ 14.722.394.00 | $ 15.567.308.175.89 |
| | 2 | | ARCOE SAS | $ 43.072.283.00 | $ 15.524.235.892.89 |
| | 3 | | JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ | $ 6.865.773.00 | $ 15.517.370.119.89 |
| ORDEN GIRO No. 3 | 1 | 2/10/2025 | AGOFER S.A.S | $ 319.855.900,00 | $ 15.197.514.219,89 |
| ORDEN GIRO No. 4 | 1 | 6/10/2025 | LUIS BELTRAN SUA VELANDIA | $ 32.717.860,00 | $ 15.164.796.359,89 |
| ORDEN GIRO No. 5 | 1 | 6/10/2025 | CONSORCIO AGUAS GAITAN | $ 25.131.613,00 | $ 15.139.664.746,89 |
| ORDEN GIRO No. 6 | 1 | 6/10/2025 | EMER YOHAN HENAO GONZALEZ | $ 4.588.112,00 | $ 15.135.076.634,89 |
| ORDEN GIRO No. 7 | 1 | 9/10/2025 | ORLANDO BONILLA CASTELLANOS | $ 34.630.723,00 | $ 15.100.445.911,89 |
| ORDEN GIRO No. 8 | 1 | 10/10/2025 | JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ | $ 53.240.000,00 | $ 15.047.205.911,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN GIRO No. 9 | 1 | 10/10/2025 | AGOFER S.A.S | $ 9.973.240,00 | $ 15.037.232.671,89 |
| ORDEN GIRO No. 10 | 1 | 14/10/2025 | ARCOE S.A.S | $ 164.934.000,00 | $ 14.872.298.671,89 |
| ORDEN GIRO No. 11 | 1 | 14/10/2025 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | $ 125.285.927,68 | $ 14.747.012.744,21 |
| | 2 | | SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S | $ 30.000.000,00 | $ 14.717.012.744,21 |
| ORDEN GIRO No. 12 | 1 | 21/10/2025 | GEODELTA S.A.S | $ 47.950.000,00 | $ 14.669.062.744,21 |
| ORDEN GIRO No. 13 | 1 | 22/10/2025 | OVITA S.A.S. | $ 115.463.356,00 | $ 14.553.599.388,21 |
| ORDEN GIRO No. 14 | 1 | 28/10/2025 | M&G INGENIERIA S.A.S | $ 19.006.188,30 | $ 14.534.593.199,91 |
| | 2 | | GEODELTA S.A.S | $ 39.900.000,00 | $ 14.494.693.199,91 |
| ORDEN GIRO No. 15 | 1 | 7/11/2025 | GILBERTO PIÑEROS CASTRO | $ 16.500.000,00 | $ 14.478.193.199,91 |
| ORDEN GIRO No. 16 | 1 | 7/11/2025 | CONSORCIO AGUAS GAITAN | $ 30.192.533,00 | $ 14.448.000.666,91 |
| ORDEN GIRO No. 17 | 1 | 11/11/2025 | EDUAR BENJAMIN PEREZ | $ 49.700.000,00 | $ 14.398.300.666,91 |
| ORDEN GIRO No. 18 | 1 | 13/11/2025 | EDUAR BENJAMIN PEREZ | $ 53.550.000,00 | $ 14.344.750.666,91 |
| ORDEN GIRO No. 19 | 1 | 13/11/2025 | EMER YOHAN HENAO GONZALEZ | $ 4.403.688,00 | $ 14.340.346.978,91 |
| ORDEN GIRO No. 20 | 1 | 13/11/2025 | LUIS BELTRAN SUA VELANDIA | $ 29.782.060,00 | $ 14.310.564.918,91 |
| ORDEN GIRO No. 21 | 1 | 14/11/2025 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO | $ 2.266.144,00 | $ 14.308.298.774,91 |
| ORDEN GIRO No. 22 | 1 | 18/11/2025 | JULIAN ANDRES GUALTEROS ROJAS | $ 50.258.560,00 | $ 14.258.040.214,91 |
| ORDEN GIRO No. 23 | 1 | 19/11/2025 | JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ | $ 14.471.294,00 | $ 14.243.568.920,91 |
| ORDEN GIRO No. 24 | 1 | 19/11/2025 | GEODELTA SAS | $ 31.850.000,00 | $ 14.211.718.920,91 |
| ORDEN GIRO No. 25 | 1 | 24/11/2025 | M&G INGENIERIA S.A.S | $ 80.199.244,20 | $ 14.131.519.676,71 |
| ORDEN GIRO No. 26 | 1 | 27/11/2025 | GEODELTA SAS | $ 41.300.000,00 | $ 14.090.219.676,71 |
| ORDEN GIRO No. 27 | 1 | 27/11/2025 | GILBERTO PIÑEROS CASTRO | $ 19.800.000,00 | $ 14.070.419.676,71 |
| ORDEN GIRO No. 28 | 1 | 27/11/2025 | SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | $ 100.884.695,10 | $ 13.969.534.981,61 |
| ORDEN GIRO No. 29 | 1 | 28/11/2025 | CONSTRUCIVIL M&A S.A.S | $ 252.095.969,47 | $ 13.717.439.012,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN GIRO No. 30 | 1 | 28/11/2025 | SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | $ 52.860.171,00 | $ 13.664.578.841,14 |
| ORDEN GIRO No. 31 | 1 | 28/11/2025 | ANGY XIMENA CASTILLO | $ 885.000,00 | $ 13.663.693.841,14 |
| ORDEN GIRO No. 32 | 1 | 1/12/2025 | CONSORCIO AGUAS GAITAN | $ 31.788.377,00 | $ 13.631.905.464,14 |
| ORDEN GIRO No. 33 | 1 | 1/12/2025 | NELSON MORALES ROJAS | $ 26.823.312,00 | $ 13.605.082.152,14 |
| ORDEN GIRO No. 34 | 1 | 2/12/2025 | TERRACQUA SAS | $ 35.700.000,00 | $ 13.569.382.152,14 |
| ORDEN GIRO No. 35 | 1 | 4/12/2025 | BRAYAM GOMEZ ARIAS | $ 27.670.566,00 | $ 13.541.711.586,14 |
| ORDEN GIRO No. 36 | 1 | 4/12/2025 | MARLON MURCIA TOBON | $ 23.968.693,00 | $ 13.517.742.893,14 |
| ORDEN GIRO No. 37 | 1 | 4/12/2025 | ELIZABETH ARIAS PARRA | $ 31.895.936,00 | $ 13.485.846.957,14 |
| ORDEN GIRO No. 38 | 1 | 4/12/2025 | BRAYAN MURCIA TOBON | $ 30.848.941,00 | $ 13.454.998.016,14 |
| ORDEN GIRO No. 39 | 1 | 4/12/2025 | GILBERTO PIÑEROS CASTRO | $ 27.499.999,68 | $ 13.427.498.016,46 |
| ORDEN GIRO No. 40 | 1 | 5/12/2025 | EDUAR BENJAMIN PEREZ | $ 29.746.367,00 | $ 13.397.751.649,46 |
| ORDEN GIRO No. 41 | 1 | 9/12/2025 | LUIS BELTRAN SUA VELANDIA | $ 30.597.560,00 | $ 13.367.154.089,46 |
| ORDEN GIRO No. 42 | 1 | 9/12/2025 | LUZ DARY CASTELLANOS PAEZ | $ 1.409.730,00 | $ 13.365.744.359,46 |
| ORDEN GIRO No. 43 | 1 | 11/12/2025 | CONSORCIO AGUAS GAITAN | $ 11.199.620,00 | $ 13.354.544.739,46 |
| ORDEN GIRO No. 44 | 1 | 11/12/2025 | TERRACQUA SAS | $ 19.829.869,01 | $ 13.334.714.870,45 |
| ORDEN GIRO No. 45 | 1 | 11/12/2025 | GEODELTA SAS | $ 28.350.000,01 | $ 13.306.364.870,44 |
| ORDEN GIRO No. 46 | 1 | 12/12/2025 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS | $ 59.848.167,79 | $ 13.246.516.702,65 |
| ORDEN GIRO No. 47 | 1 | 12/12/2025 | CONSTRUCIVIL M&A S.A.S | $ 230.474.307,87 | $ 13.016.042.394,78 |
| ORDEN GIRO No. 48 | 1 | 12/12/2025 | EDUAR BENJAMIN PEREZ | $ 49.350.000,00 | $ 12.966.692.394,78 |
| ORDEN GIRO No. 49 | 1 | 12/12/2025 | ANCIZAR GUILLERMO ARREDONDO ARBOLEDA | $ 15.510.000,00 | $ 12.951.182.394,78 |
| ORDEN GIRO No. 50 | 1 | 12/12/2025 | LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S | $ 886.147,00 | $ 12.950.296.247,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN GIRO No. 51 | 1 | 15/12/2025 | NELSON MORALES ROJAS | $ 23.328.000,00 | $ 12.926.968.247,78 |
| ORDEN GIRO No. 52 | 1 | 15/12/2025 | ANGY XIMENA CASTILLO | $ 885.000,00 | $ 12.926.083.247,78 |
| ORDEN GIRO No. 53 | 1 | 15/12/2025 | AGOFER S.A.S | $ 17.732.659,00 | $ 12.908.350.588,78 |
| ORDEN GIRO No. 54 | 1 | 15/12/2025 | SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | $ 92.600.775,00 | $ 12.815.749.813,78 |
| ORDEN GIRO No. 55 | 1 | 15/12/2025 | SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | $ 101.487.194,70 | $ 12.714.262.619,08 |
| ORDEN GIRO No. 56 | 1 | 15/12/2025 | TERRACQUA SAS | $ 34.300.000,00 | $ 12.679.962.619,08 |
| ORDEN GIRO No. 57 | 1 | 15/12/2025 | GEODELTA SAS | $ 24.500.000,34 | $ 12.655.462.618,74 |
| ORDEN GIRO No. 58 | 1 | 15/12/2025 | ORLANDO BONILLA CASTELLANOS | $ 2.202.365,00 | $ 12.653.260.253,74 |
| ORDEN GIRO No. 59 | 1 | 15/12/2025 | ARCOE SAS | $ 49.764.361,29 | $ 12.603.495.892,45 |

## 6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| MES | | VALOR PROGRAMADO | | VALOR EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO |
| 1 | 29-08-2025 a 30-09-25 | $ 1.132.883.754,00 | $ 1.132.883.754,00 | $ 1.165.283.191,00 | $ 1.165.283.191,00 |
| 2 | 01-10-25 a 31-10-25 | $ 1.533.938.149,00 | $ 2.666.821.903,00 | $ 1.615.778.986,00 | $ 2.781.062.177,00 |
| 3 | 01-11-25 a 30-11-25 | $ 2.752.982.664,00 | $ 5.419.804.567,00 | $ 4.469.897.773,00 | $ 7.250.959.950,00 |
| 4 | 01-12-25 a 31-12-25 | $ 3.182.797.359,00 | $ 8.602.601.926,00 | $ 3.384.230.051,00 | $ 10.635.190.003,00 |
| 5 | 01-01-26 a 20-01-26 | $ 2.036.390.968,00 | $ 10.638.992.894,00 | $ 4.364.853.209,21 | $ 15.000.043.212,21 |
| 6 | 21-01-26 a 28-02-26 | $ 2.379.670.858,00 | $ 13.018.663.752,00 | | |
| 7 | 01-03-26 a 31-03-06 | $ 1.707.014.984,00 | $ 14.725.678.736,00 | | |
| 8 | 01-04-26 a 30-04-26 | $ 2.122.894.222,00 | $ 16.848.572.958,00 | | |
| 9 | 01-05-26 a 31-05-26 | $ 3.538.600.653,00 | $ 20.387.173.611,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01-06-26 a 30-06-26 | $ 5.196.889.486,00 | $ 25.584.063.097,00 | | |
| 11 | 01-07-26 a 31-07-26 | $ 6.886.687.533,00 | $ 32.470.750.630,00 | | |
| 12 | 01-08-26 a 31-08-26 | $ 4.957.368.139,00 | $ 37.428.118.769,00 | | |
| 13 | 01-09-26 a 30-09-26 | $ 3.283.638.775,00 | $ 40.711.757.544,00 | | |
| 14 | 01-10-26 a 31-10-26 | $ 1.494.587.472,00 | $ 42.206.345.016,00 | | |
| 15 | 01-11-26 a 28-11-26 | $ 202.576.537,00 | $ 42.408.921.553,00 | | |

## 6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $42.408.897.278,00 |
| **VALOR ADICIONES** | $0,00 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES** | $42.408.897.278,00 |
| **VALOR ANTICIPO** | $21.204.448.639,00 |
| **ACTAS PARCIALES** | $0,00 |
| **VALOR ANTICIPO AMORTIZADO** | $0,00 |
| **VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR** | $21.204.448.639,00 |

## 6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | |
|---|---|
| **NÚMERO** | DIS.2025000172 |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 16-05-2025 |
| **DEPENDENCIA** | SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR |
| **CONCEPTO** | SPGR CDP 13325 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META". |
| **RECURSO** | 1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C. |
| **VALOR INICIAL** | $42.408.921.552,00 |
| **VALOR ACTUAL** | $42.408.921.552,00 |

## 6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP.

| REGISTRO PRESUPUESTAL | |
|---|---|
| **NÚMERO** | RS1.2025000156 |
| **FECHA DEL REGISTRO** | 23-07-2025 |
| **DEPENDENCIA** | SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR |
| **DESCRIPCIÓN** | CTO-821 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META". |
| **FUENTE O RECURSO** | 1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C. |
| **VALOR INICIAL** | $42.408.897.278,00 |
| **VALOR ACTUAL** | $42.408.897.278,00 |

## 6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS

| CONCEPTO | ORDEN DE PAGO No. | VALOR NETO | FECHA |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO 50,00% | 2025090008 | $ 20.144.266.208,00 | 17/09/2025 |

# 7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

## 7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES

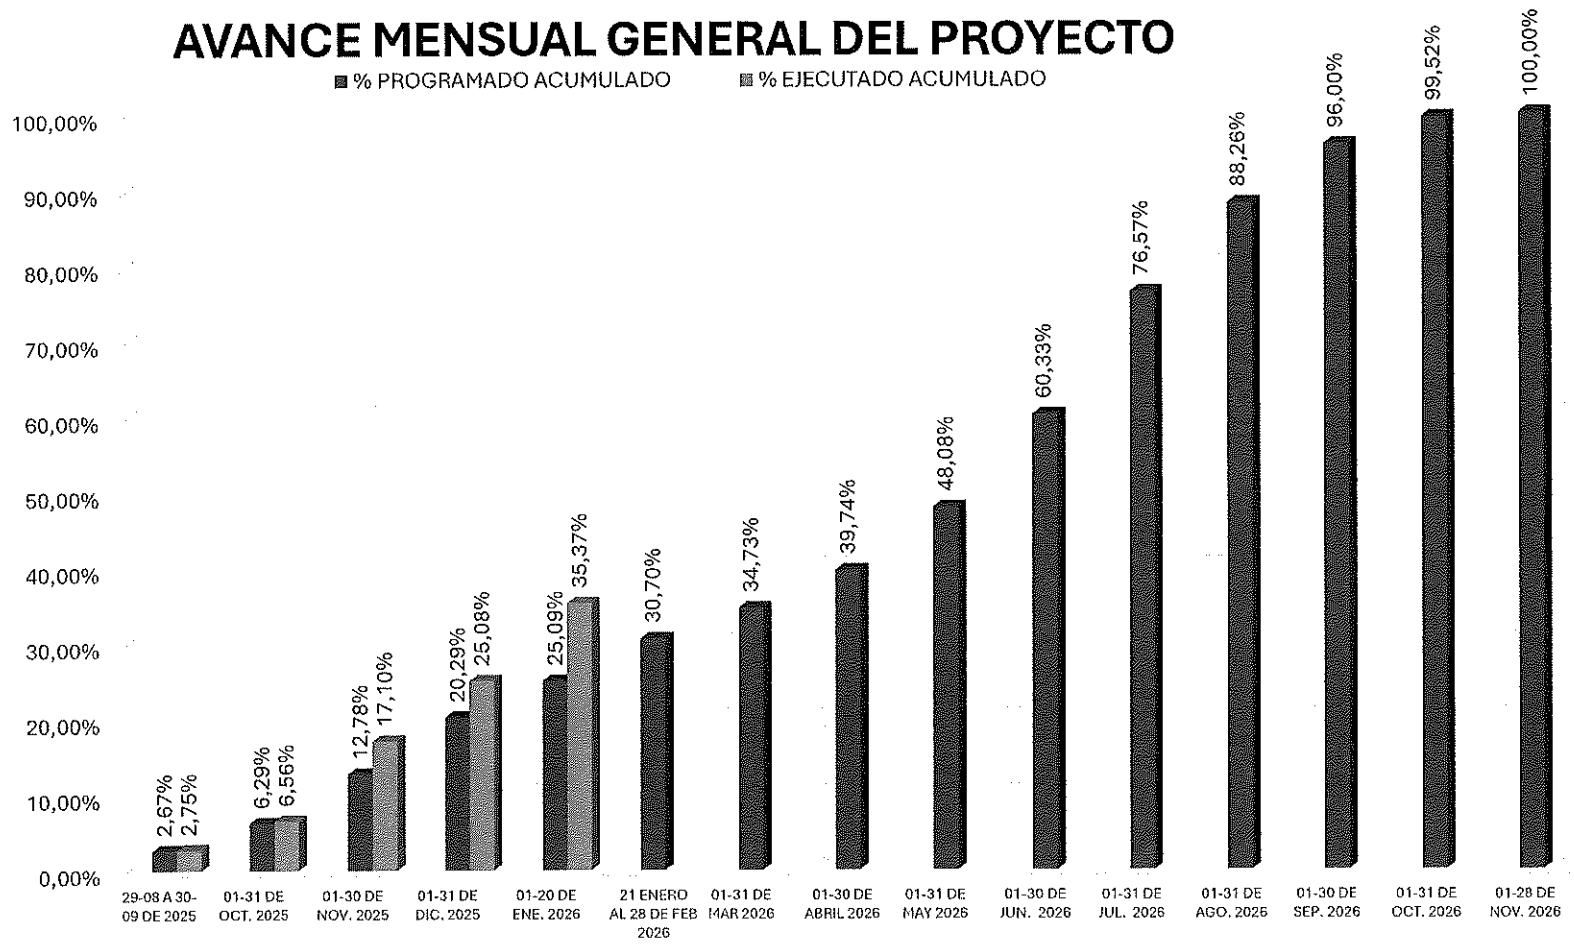
| MES | | % PROGRAMADO | | % EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO |
| 1 | 29-08-2025 a 30-09-25 | 2,67% | 2,67% | 2,75% | 2,75% |
| 2 | 01-10-25 a 31-10-25 | 3,62% | 6,29% | 3,81% | 6,56% |
| 3 | 01-11-25 a 30-11-25 | 6,49% | 12,78% | 10,54% | 17,10% |
| 4 | 01-12-25 a 31-12-25 | 7,51% | 20,29% | 7,98% | 25,08% |
| 5 | 01-01-26 a 20-01-26 | 4,80% | 25,09% | 10,29% | 35,37% |
| 6 | 21-01-26 a 28-02-26 | 5,61% | 30,70% | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01-03-26 a 31-03-06 | 4,03% | 34,73% | | |
| 8 | 01-04-26 a 30-04-26 | 5,01% | 39,74% | | |
| 9 | 01-05-26 a 31-05-26 | 8,34% | 48,08% | | |
| 10 | 01-06-26 a 30-06-26 | 12,25% | 60,33% | | |
| 11 | 01-07-26 a 31-07-26 | 16,24% | 76,57% | | |
| 12 | 01-08-26 a 31-08-26 | 11,69% | 88,26% | | |
| 13 | 01-09-26 a 30-09-26 | 7,74% | 96,00% | | |
| 14 | 01-10-26 a 31-10-26 | 3,52% | 99,52% | | |
| 15 | 01-11-26 a 28-11-26 | 0,48% | 100,00% | | |

**Ver anexo No. 1** Cuadro de avance actividades ejecutadas.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

## 7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO



## 7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

### RESGUARDO AWALIBA.

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realizaron actividades de localización y replanteo, de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro con la ejecución de registro eléctrico, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", después se procede a instalar la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario. A continuación, se describen las actividades ejecutadas de este capítulo, por cada comunidad que pertenece a este resguardo:

| COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL | | | |
|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 139.220,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.882.980,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 35.600.448,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 13.681.362,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 3.993.053,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 51.290.190,00 | 100,00% |
| 1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | $ 21.149.898,00 | 100,00% |
| 1.8 | AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) | $ 3.765.969,00 | 100,00% |
| 1.9 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | $ 1.668.279,00 | 100,00% |
| 1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION | $ 8.620.632,00 | 100,00% |
| 1.11 | SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | $ 3.136.937,00 | 93,94% |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | $ 866.572,00 | 100,00% |
| 1.13 | LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | $ 4.282.909,00 | 100,00% |
| 1.14 | DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) | $ 442.648,00 | 100,00% |

| COMUNIDAD PUERTO LOPEZ | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 139.220,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.882.980,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 33.506.304,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 12.876.576,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 3.993.053,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 48.273.120,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD PUNTO GRILLO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 139.220,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.882.980,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 34.204.352,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 13.144.838,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 3.993.053,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 49.278.810,00 | 100,00% |
| 1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | $ 19.868.086,00 | 100,00% |
| 1.8 | AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) | $ 3.765.969,00 | 100,00% |
| 1.9 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | $ 1.668.279,00 | 100,00% |
| 1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION | $ 8.381.170,00 | 97,22% |
| 1.11 | SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | $ 3.013.258,00 | 94,04% |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | $ 832.588,00 | 100,00% |
| 1.13 | LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | $ 4.282.909,00 | 100,00% |
| 1.14 | DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) | $ 442.648,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD FACUNAE** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 139.220,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.882.980,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ | 32.808.256,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ | 12.608.314,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ | 3.993.053,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ | 47.267.430,00 | 100,00% |

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se realizó las actividades de localización y replanteo, las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee, tapones y válvula. A continuación, se describen las actividades ejecutadas de este capítulo, por cada comunidad que pertenece a este resguardo:

| **COMUNIDAD MAKAPAY** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | | **% Avance** |
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ | 16.882.882,00 | 94,52% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ | 40.423.935,00 | 89,99% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ | 11.081.074,00 | 99,74% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ | 121.930.347,00 | 69,22% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ | 53.907.564,00 | 99,80% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ | 22.017.916,00 | 89,99% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ | 502.746.605,00 | 66,55% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ | 82.805.899,00 | 90,95% |
| 4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO) | $ | 1.148.570,00 | 100,00% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ | 512.172,00 | 100,00% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ | 737.364,00 | 60,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ | 280.336,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 474.650,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 4.065,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 111.147.047,00 | 90,95% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 6.629.575,00 | 100,00% |

**COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 16.164.558,00 | 100,00% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 36.801.504,00 | 90,53% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 21.034.389,00 | 66,67% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 111.064.948,00 | 69,67% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 45.632.237,00 | 100,00% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 20.044.939,00 | 90,52% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 468.729.378,00 | 71,47% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 71.074.911,00 | 100,00% |
| 4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO) | $ 1.148.570,00 | 100,00% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 640.215,00 | 100,00% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 860.258,00 | 70,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 1.401.680,00 | 100,00% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 949.300,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 20.325,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 95.401.281,00 | 100,00% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 18.827.993,00 | 100,00% |

**COMUNIDAD PUERTO LOPEZ**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 2.886.066,00 | 100,00% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 6.607.346,00 | 91,03% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 3.555.108,00 | 66,67% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 19.940.068,00 | 70,05% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 8.192.816,00 | 100,00% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 3.599.264,00 | 91,03% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 93.915.666,00 | 70,41% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 12.848.247,00 | 100,00% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 384.129,00 | 75,00% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 122.894,00 | 100,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 140.168,00 | 100,00% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 94.930,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 8.130,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 17.245.737,00 | 100,00% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 2.386.647,00 | 75,00% |

**COMUNIDAD PUNTO GRILLO**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 3.372.771,00 | 99,98% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 7.885.417,00 | 92,94% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 3.258.849,00 | 66,67% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 23.791.933,00 | 71,51% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 9.777.119,00 | 99,97% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 4.295.006,00 | 92,94% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 111.999.684,00 | 72,07% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 15.722.603,00 | 99,97% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 512.172,00 | 100,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 280.336,00 | 100,00% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 189.860,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 4.065,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 21.106.918,00 | 99,99% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 2.917.013,00 | 100,00% |

**COMUNIDAD SAN GIL**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 13.882.452,00 | 100,00% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 33.232.019,00 | 95,18% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 9.184.029,00 | 66,67% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 100.237.369,00 | 73,21% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 41.206.233,00 | 100,00% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 18.100.328,00 | 95,18% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 448.886.756,00 | 75,35% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 68.055.924,00 | 100,00% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 384.129,00 | 100,00% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 491.576,00 | 100,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 841.008,00 | 85,71% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 664.510,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 20.325,00 | 83,33% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 91.349.004,00 | 100,00% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 8.220.673,00 | 100,00% |

**COMUNIDAD FACUNAE**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 2.950.776,00 | 100,00% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 6.173.366,00 | 83,19% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 6.813.957,00 | 66,67% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 18.650.440,00 | 64,09% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 7.654.700,00 | 100,00% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 3.362.097,00 | 83,18% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 89.783.410,00 | 65,04% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 10.624.962,00 | 100,00% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 384.129,00 | 100,00% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 122.894,00 | 100,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 280.336,00 | 100,00% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 189.860,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 12.195,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 14.261.502,00 | 100,00% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 5.834.026,00 | 95,65% |

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas y pedestales de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa, e igualmente se realizó el vaciado del concreto para las columnas. A continuación, se describen las actividades ejecutadas de este capítulo, por cada comunidad que pertenece a este resguardo:

| **COMUNIDAD MAKAPAY** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 5.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE | $ 734.722,00 | 100,00% |
| 5.4 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | $ 191.928,00 | 87,35% |
| 5.5 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 3.231.364,00 | 100,00% |
| 5.6 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 1.733.743,00 | 100,00% |
| 5.7 | ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | $ 3.563.515,00 | 58,34% |
| 5.8 | SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | $ 747.846,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 5.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE | $ 734.722,00 | 100,00% |
| 5.4 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | $ 191.928,00 | 87,35% |
| 5.5 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 3.231.364,00 | 100,00% |
| 5.6 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 1.733.743,00 | 100,00% |
| 5.7 | ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | $ 4.782.142,00 | 78,30% |
| 5.8 | SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | $ 747.846,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD PUERTO LOPEZ** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 5.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE | $ 734.722,00 | 100,00% |
| 5.4 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | $ 191.928,00 | 87,35% |
| 5.5 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 3.231.364,00 | 100,00% |
| 5.6 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 1.733.743,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.7 | ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | $ 2.523.401,00 | 41,31% |
| 5.8 | SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | $ 747.846,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD PUNTO GRILLO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 5.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE | $ 734.722,00 | 100,00% |
| 5.4 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | $ 191.928,00 | 87,35% |
| 5.5 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 3.231.364,00 | 100,00% |
| 5.6 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 1.733.743,00 | 100,00% |
| 5.7 | ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | $ 2.523.401,00 | 41,31% |
| 5.8 | SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | $ 747.846,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD FACUNAE** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 5.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE | $ 734.722,00 | 100,00% |
| 5.4 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | $ 191.928,00 | 87,35% |
| 5.5 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 3.231.364,00 | 100,00% |
| 5.6 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 1.733.743,00 | 100,00% |
| 5.7 | ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | $ 2.523.401,00 | 41,31% |
| 5.8 | SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | $ 747.846,00 | 100,00% |

- **CERRAMIENTO PERIMETRAL**

Durante el periodo reportado se realizaron actividades localización, excavación manual, se realizó instalación del acero para zapatas, vigas, y columnas, fundición del concreto ciclópeo, fundición de concreto con grava ¾ para zapatas, se construyó la caja de inspección de 0.50x0.50x0.50 M en concreto de 3000 PSI elaborada en sitio con su respectiva tapa en concreto reforzado y marco en ángulo metálico, se instalo el tubo galvanizado de 2". A continuación, se describen las actividades ejecutadas de este capítulo, por cada comunidad que pertenece a este resguardo:

| COMUNIDAD MAKAPAY | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 6.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA | $ 241.150,00 | 94,40% |
| 6.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 487.840,00 | 98,80% |
| 6.3 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | $ 4.548.371,00 | 98,29% |
| 6.4 | VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 3.820.454,00 | 98,25% |
| 6.5 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 427.807,00 | 100,00% |
| 6.6 | RELLENO CON GRAVILLA | $ 222.616,00 | 100,00% |
| 6.7 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 604.886,00 | 100,00% |
| 6.8 | ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | $ 4.952.053,00 | 99,68% |
| 6.9 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | $ 815.572,00 | 100,00% |
| 6.10 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | $ 19.731,00 | 100,00% |
| 6.11 | SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | $ 65.986,00 | 100,00% |
| 6.12 | TUBO GALVANIZADO DE 2" (L= 2 M, E = 1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | $ 34.350.680,00 | 93,96% |
| **COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 6.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA | $ 241.150,00 | 94,40% |
| 6.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 487.840,00 | 98,80% |
| 6.3 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | $ 4.548.371,00 | 98,29% |
| 6.7 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 604.886,00 | 100,00% |
| 6.8 | ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | $ 2.646.600,00 | 53,28% |
| 6.9 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | $ 815.572,00 | 100,00% |
| 6.10 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | $ 19.731,00 | 100,00% |
| 6.11 | SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | $ 65.986,00 | 100,00% |

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se realizó la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en las comunidades pertenecientes a este resguardo:

| COMUNIDAD MAKAPAY | | | |
|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 278.245.293,00 | 91,06% |
| **COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL** | | | |
| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 238.550.276,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD PUERTO LOPEZ** | | | |
| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 43.122.852,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD PUNTO GRILLO** | | | |
| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 52.784.256,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD SAN GIL** | | | |
| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 116.804.803,00 | 51,14% |
| **COMUNIDAD FACUNAE** | | | |
| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 35.660.792,00 | 100,00% |

## RESGUARDO DOMOPLANAS.

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realizaron actividades de localización y replanteo, de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro con la ejecución de registro eléctrico, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", después se procede a instalar la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario. A continuación, se describen las actividades ejecutadas de este capítulo, por cada comunidad que pertenece a este resguardo:

| COMUNIDAD VILLAMARCIA | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 140.909,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.959.841,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 17.899.350,00 | 35,46% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 6.846.750,00 | 35,46% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 25.868.550,00 | 35,46% |
| **COMUNIDAD LAS DELICIAS** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 140.909,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.959.841,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 54.772.011,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 20.951.055,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 4.064.604,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 79.157.763,00 | 100,00% |
| 1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | $ 32.054.134,00 | 98,99% |
| 1.8 | AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) | $ 3.853.671,00 | 100,00% |
| 1.9 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | $ 1.685.429,00 | 100,00% |
| 1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION | $ 13.157.694,00 | 100,00% |
| 1.11 | SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | $ 4.827.649,00 | 93,00% |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | $ 1.332.079,00 | 100,00% |
| 1.13 | LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | $ 4.410.001,00 | 100,00% |
| 1.14 | DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) | $ 452.051,00 | 100,00% |
| 1.15 | ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA | $ 417.994,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD CACHAMITAS** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 140.909,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.959.841,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 50.834.154,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 19.444.770,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 4.064.604,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 73.466.682,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | $ 30.418.719,00 | 90,29% |
| 1.8 | AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) | $ 3.853.671,00 | 100,00% |
| 1.9 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | $ 1.685.429,00 | 100,00% |
| 1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION | $ 9.502.779,00 | 100,00% |
| 1.11 | SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | $ 4.481.581,00 | 93,17% |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | $ 1.236.309,00 | 100,00% |
| 1.13 | LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | $ 4.410.001,00 | 100,00% |
| 1.14 | DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) | $ 452.051,00 | 100,00% |

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se realizó las actividades de localización y replanteo, las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. A continuación, se describen las actividades ejecutadas de este capítulo, por cada comunidad que pertenece a este resguardo:

| **COMUNIDAD PUERTO GAVILAN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 9.346.050,00 | 62,96% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 24.043.988,00 | 62,96% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 9.817.493,00 | 56,58% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 71.982.657,00 | 48,40% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 43.719.471,00 | 100,00% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 12.910.481,00 | 62,96% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 384.345.934,00 | 51,99% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 71.290.097,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 97.839.839,00 | 100,00% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 9.566.970,00 | 89,74% |
| **COMUNIDAD LAS DELICIAS** | | | |

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 6.490.897,00 | 100,00% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 15.580.057,00 | 93,30% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 5.932.020,00 | 66,67% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 46.680.624,00 | 71,78% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 18.917.706,00 | 100,00% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 8.365.992,00 | 93,30% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 252.545.374,00 | 75,23% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 30.479.195,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 31.958.441,00 | 76,40% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 5.466.840,00 | 100,00% |

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se realizó la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en las comunidades pertenecientes a este resguardo:

| **COMUNIDAD LOS OLIVOS** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 153.995.430,00 | 66,95% |
| **COMUNIDAD PARAISO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 127.693.140,00 | 68,69% |
| **COMUNIDAD BUENAVISTA** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 32.527.687,00 | 60,28% |
| **COMUNIDAD VILLAMARCIA** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 109.178.064,00 | 68,95% |
| **COMUNIDAD LAS BRISAS** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 22.491.267,00 | 46,68% |
| **COMUNIDAD CUMARALITO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 111.262.913,00 | 72,60% |
| **COMUNIDAD YATARROBO** | | | |

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 88.605.667,00 | 64,87% |
| **COMUNIDAD CERRITO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 13.445.858,00 | 44,64% |
| **COMUNIDAD PUERTO GAVILAN** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 187.890.618,00 | 76,72% |
| **COMUNIDAD LAS DELICIAS** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 79.993.420,00 | 76,40% |
| **COMUNIDAD CACHAMITAS** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 52.859.620,00 | 66,69% |

## RESGUARDO WACOYO.

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realizaron actividades de localización y replanteo, de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro con la ejecución de registro eléctrico, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", después se procede a instalar la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo. A continuación, se describen las actividades ejecutadas de este capítulo, por cada comunidad que pertenece a este resguardo:

| COMUNIDAD ESMERALDA WALABO | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 135.845,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.729.257,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 39.731.880,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 15.422.400,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 3.849.951,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 56.854.920,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) | $ 3.590.564,00 | 100,00% |
| 1.9 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | $ 1.633.978,00 | 100,00% |
| 1.11 | SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | $ 3.501.587,00 | 93,59% |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | $ 968.928,00 | 100,00% |
| 1.13 | LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | $ 4.028.724,00 | 100,00% |
| 1.14 | DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) | $ 423.843,00 | 100,00% |

**COMUNIDAD LA UNION**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 135.845,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.729.257,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 46.353.860,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 17.992.800,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 3.849.951,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 66.330.740,00 | 100,00% |

**COMUNIDAD PUNTO GRILLO**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 135.845,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.729.257,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 47.347.157,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 18.378.360,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 3.849.951,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 67.752.113,00 | 100,00% |

**COMUNIDAD LA PORFIA**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 136.689,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.767.688,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 33.558.000,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 12.992.300,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 3.885.726,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 48.105.400,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | $ 21.424.914,00 | 95,83% |
| 1.8 | AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) | $ 3.634.415,00 | 100,00% |
| 1.9 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | $ 1.642.554,00 | 100,00% |
| 1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION | $ 6.528.508,00 | 100,00% |
| 1.11 | SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | $ 2.960.663,00 | 94,16% |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | $ 817.980,00 | 100,00% |
| 1.13 | LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | $ 4.092.271,00 | 100,00% |
| 1.14 | DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) | $ 428.545,00 | 100,00% |
| 1.15 | ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA | $ 386.800,00 | 100,00% |

**COMUNIDAD LA CAIMANA**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 135.845,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.729.257,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 45.360.563,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 17.607.240,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 3.849.951,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 64.909.367,00 | 100,00% |
| 1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | $ 31.640.570,00 | 98,10% |
| 1.8 | AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) | $ 3.590.564,00 | 100,00% |
| 1.9 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | $ 1.633.978,00 | 100,00% |
| 1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION | $ 7.393.920,00 | 100,00% |
| 1.11 | SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | $ 3.997.245,00 | 93,28% |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | $ 1.106.193,00 | 100,00% |
| 1.13 | LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | $ 4.028.724,00 | 100,00% |
| 1.14 | DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) | $ 423.843,00 | 100,00% |

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se realizó las actividades de localización y replanteo, las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. A continuación, se describen las actividades ejecutadas de este capítulo, por cada comunidad que pertenece a este resguardo:

| **COMUNIDAD KALIWIRNAE** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 21.127.685,00 | 99,93% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 48.441.916,00 | 95,64% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 12.621.053,00 | 66,20% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 148.338.698,00 | 73,56% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 62.731.662,00 | 99,84% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 27.208.288,00 | 95,64% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 404.980.359,00 | 74,27% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 104.835.155,00 | 99,99% |
| 4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO) | $ 2.155.778,00 | 100,00% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 240.328,00 | 66,67% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 691.992,00 | 100,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 657.710,00 | 100,00% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 454.180,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 19.070,00 | 83,33% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 159.551.083,00 | 99,99% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 10.701.109,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD ESMERALDA WALABO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 16.025.263,00 | 96,96% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 34.420.831,00 | 86,93% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 23.054.850,00 | 58,43% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 105.478.770,00 | 66,91% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 45.413.448,00 | 99,89% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 19.333.188,00 | 86,93% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 294.717.874,00 | 67,64% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 68.994.296,00 | 99,72% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 360.492,00 | 100,00% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 576.660,00 | 100,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 1.710.046,00 | 92,86% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 1.090.032,00 | 80,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 11.442,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 105.004.114,00 | 99,72% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 19.411.314,00 | 87,64% |

**COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 11.132.365,00 | 96,68% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 23.258.782,00 | 84,31% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 19.803.525,00 | 58,77% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 71.297.487,00 | 64,92% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 30.750.435,00 | 100,00% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 13.063.913,00 | 84,32% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 202.058.443,00 | 65,83% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 44.972.197,00 | 100,00% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 600.820,00 | 100,00% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 922.656,00 | 100,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 789.252,00 | 100,00% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 908.360,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 7.628,00 | 66,67% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 68.444.408,00 | 100,00% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 16.673.821,00 | 88,16% |

**COMUNIDAD LA UNIÓN**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 4.502.960,00 | 100,00% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 9.362.323,00 | 86,79% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 8.276.100,00 | 66,67% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 28.693.396,00 | 66,81% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 12.138.943,00 | 100,00% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 5.258.200,00 | 86,79% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 84.665.096,00 | 66,74% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 17.983.526,00 | 100,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 394.626,00 | 75,00% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 363.344,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 19.070,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 27.369.454,00 | 100,00% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 6.968.164,00 | 100,00% |

**COMUNIDAD PUNTO GRILLO**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 7.487.820,00 | 90,26% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 15.800.447,00 | 79,50% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 12.414.150,00 | 45,90% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 48.428.890,00 | 61,21% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 21.740.616,00 | 100,00% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 8.874.738,00 | 79,51% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 140.989.849,00 | 61,88% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 30.956.941,00 | 100,00% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 360.492,00 | 75,00% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 115.332,00 | 100,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 657.710,00 | 100,00% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 454.180,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 7.628,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 47.113.427,00 | 100,00% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 10.452.246,00 | 68,85% |

**COMUNIDAD ALGARROBO**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 6.077.500,00 | 60,52% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 13.694.454,00 | 56,92% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 5.024.775,00 | 45,33% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 41.944.679,00 | 43,79% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 20.714.883,00 | 70,12% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 7.692.100,00 | 56,93% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 123.974.643,00 | 44,98% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 29.068.200,00 | 59,64% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 44.239.608,00 | 59,64% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 4.230.671,00 | 68,00% |

**COMUNIDAD MATAPALITO**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 12.483.980,00 | 98,32% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 28.939.245,00 | 93,95% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 7.689.396,00 | 54,17% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 88.268.348,00 | 72,26% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 37.352.871,00 | 99,99% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 16.125.091,00 | 93,95% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 267.508.202,00 | 73,13% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 61.503.629,00 | 100,00% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 244.268,00 | 66,67% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 937.784,00 | 100,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 534.792,00 | 100,00% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 551.154,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 11.631,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 79.721.876,00 | 100,00% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 6.576.518,00 | 81,25% |

**COMUNIDAD LA PORFIA**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 10.705.783,00 | 94,72% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 24.625.472,00 | 89,81% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 7.689.396,00 | 43,33% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 75.117.380,00 | 69,08% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 32.491.542,00 | 100,00% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 13.721.666,00 | 89,81% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 232.178.008,00 | 69,98% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 52.084.063,00 | 100,00% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 488.536,00 | 80,00% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 234.446,00 | 50,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 401.094,00 | 75,00% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 551.154,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 11.631,00 | 100,00% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 67.513.995,00 | 100,00% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 6.576.518,00 | 65,00% |

**COMUNIDAD LA CAIMANA**

| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
|---|---|---|---|
| 4.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | $ 13.965.500,00 | 96,83% |
| 4.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | $ 31.879.059,00 | 92,26% |
| 4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 9.162.825,00 | 60,78% |
| 4.4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | $ 97.819.871,00 | 71,10% |
| 4.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | $ 42.552.748,00 | 99,99% |
| 4.6 | RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | $ 17.905.788,00 | 92,26% |
| 4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | $ 278.380.914,00 | 71,79% |
| 4.8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | $ 68.656.320,00 | 97,45% |
| 4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO) | $ 1.077.889,00 | 50,00% |
| 4.10 | CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 600.820,00 | 100,00% |
| 4.11 | CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | $ 230.664,00 | 100,00% |
| 4.12 | TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | $ 131.542,00 | 6,67% |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | $ 1.453.376,00 | 100,00% |
| 4.14 | TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | $ 7.628,00 | 12,50% |
| 4.15 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | $ 104.489.741,00 | 97,45% |
| 4.16 | ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | $ 7.714.753,00 | 91,18% |

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas y pedestales de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa, e igualmente se realizó el vaciado del concreto para las columnas. A continuación, se describen las actividades ejecutadas de este capítulo, por cada comunidad que pertenece a este resguardo:

| **COMUNIDAD KALIWIRNAE** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 5.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE | $ 733.026,00 | 100,00% |
| 5.4 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | $ 188.337,00 | 87,35% |
| 5.5 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 3.058.124,00 | 100,00% |
| 5.6 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 1.652.497,00 | 100,00% |
| 5.7 | ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | $ 4.547.606,00 | 78,30% |
| 5.8 | SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | $ 707.573,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 5.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE | $ 733.026,00 | 100,00% |
| 5.4 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | $ 188.337,00 | 87,35% |
| 5.5 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 3.058.124,00 | 100,00% |
| 5.6 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 1.652.497,00 | 100,00% |
| 5.7 | ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | $ 4.547.606,00 | 78,30% |
| 5.8 | SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | $ 707.573,00 | 100,00% |

- **CERRAMIENTO PERIMETRAL**

Durante el periodo reportado se realizaron actividades localización, excavación manual, se realizó instalación del acero para zapatas, vigas, y columnas, fundición del concreto ciclópeo, fundición de concreto con grava ¾ para zapatas, se construyó la caja de inspección de 0.50x0.50x0.50 M en concreto de 3000 PSI elaborada en sitio con su respectiva tapa en concreto reforzado y marco en ángulo metálico, se instaló el tubo galvanizado de 2". A continuación, se describen las actividades ejecutadas de este capítulo, en esta comunidad que pertenece a este resguardo:

| COMUNIDAD KALIWIRNAE | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 6.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA | $ 235.963,00 | 94,40% |
| 6.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | $ 486.714,00 | 98,80% |
| 6.3 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | $ 4.330.404,00 | 98,29% |
| 6.4 | VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 3.615.907,00 | 98,25% |
| 6.5 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 407.759,00 | 100,00% |
| 6.6 | RELLENO CON GRAVILLA | $ 210.930,00 | 100,00% |
| 6.7 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 572.457,00 | 100,00% |
| 6.8 | ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | $ 4.709.184,00 | 99,68% |
| 6.9 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | $ 780.751,00 | 100,00% |
| 6.10 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | $ 19.362,00 | 100,00% |
| 6.11 | SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | $ 60.273,00 | 100,00% |
| 6.12 | TUBO GALVANIZADO DE 2" (L= 2 M, E = 1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | $ 32.694.760,00 | 93,96% |

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se realizó la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en las comunidades pertenecientes a este resguardo:

| COMUNIDAD KALIWIRNAE | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 334.998.433,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD ESMERALDA WALABO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 221.066.812,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 143.696.597,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD LA UNIÓN** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 57.461.537,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD PUNTO GRILLO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 98.914.605,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD ALGARROBO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 92.879.640,00 | 59,64% |
| **COMUNIDAD MATAPALITO** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 199.025.457,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD LA PORFIA** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 168.543.784,00 | 100,00% |
| **COMUNIDAD LA CAIMANA** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 219.372.864,00 | 97,45% |

## RESGUARDO ASEINPOME

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realizaron actividades de localización y replanteo, de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro con la ejecución de registro eléctrico, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", después se procede a instalar la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo. A continuación, se describen las actividades ejecutadas de este capítulo, por cada comunidad que pertenece a este resguardo:

| COMUNIDAD KEKO ASEINPOME | | | |
|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Valor Ejecutado | % Avance |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 139.220,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.882.980,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 39.788.736,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 15.290.934,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 3.993.053,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 57.324.330,00 | 100,00% |
| 1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | $ 26.918.052,00 | 100,00% |
| 1.8 | AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) | $ 3.765.969,00 | 100,00% |
| 1.9 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | $ 1.668.279,00 | 100,00% |
| 1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION | $ 6.465.474,00 | 90,00% |
| 1.11 | SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | $ 3.507.972,00 | 93,69% |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | $ 968.521,00 | 100,00% |
| 1.13 | LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | $ 4.282.909,00 | 100,00% |
| 1.14 | DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) | $ 442.648,00 | 100,00% |
| 1.15 | ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA | $ 405.516,00 | 100,00% |

| COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | $ 139.220,00 | 100,00% |
| 1.2 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS | $ 2.882.980,00 | 100,00% |
| 1.3 | PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO | $ 41.184.832,00 | 100,00% |
| 1.4 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO | $ 15.827.458,00 | 100,00% |
| 1.5 | EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | $ 3.993.053,00 | 100,00% |
| 1.6 | AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | $ 59.335.710,00 | 100,00% |
| 1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | $ 26.597.599,00 | 100,00% |
| 1.8 | AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) | $ 3.765.969,00 | 100,00% |
| 1.9 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | $ 1.668.279,00 | 100,00% |
| 1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION | $ 7.423.322,00 | 88,57% |
| 1.11 | SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | $ 3.631.651,00 | 93,62% |
| 1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | $ 1.002.504,00 | 100,00% |
| 1.13 | LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | $ 4.282.909,00 | 100,00% |
| 1.14 | DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) | $ 442.648,00 | 100,00% |

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se realizó la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en las comunidades pertenecientes a este resguardo:

| COMUNIDAD KEKO ASEINPOME | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 84.831.840,00 | 23,85% |
| **COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ** | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Valor Ejecutado** | **% Avance** |
| 4.17 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO | $ 105.557.515,00 | 100,00% |

## 7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

En el **Anexo No. 1** se encontrarán los certificados de calidad de los materiales usados al corte del presente informe, junto con los certificados de calibración de los equipos usados si aplica.

## 7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se anexa el informe emitido por parte del profesional SISO, entrega de asistencia de charlas de seguridad, salud en el trabajo y las entregas de dotación.
**Ver Anexo No. 2 Informe seguridad y salud en el trabajo (SISO)**

# 8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

## 8.1 RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO)

De acuerdo con las necesidades del proyecto, las actividades ejecutadas durante el presente periodo y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en la siguiente tabla:

**PERIODO: AGOSTO 2025**

| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** |
| FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN | Director de Obra | 40.326.478 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 9491819049 |
| WENDY VANESA GARZON GARCIA | Residente de Obra 1 | 1.121.902.403 | PROTECCION | SANITAS | SURA | 9491818606 - 9491367542 |
| GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS | Residente de Obra 2 | 1.121.834.340 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 9491819049 |
| EDWIN GUZMAN PASTRANA | Profesional en Salud Ocupacional | 86.040.134 | COLPENSIONES | SALUD TOTAL | SURA | 9491367542 |
| DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO | Contadora | 40.395.435 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 9491787414 |
| LINA MARCELA GOMEZ LEAL | Auxiliar Contable | 40.328.285 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9491787414 |

| PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** |
| GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ | Secretaria | 1.092.394.700 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9491787414 |
| JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA | Conductor 1 | 80.013.513 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9491787414 |
| ROSEMBERG MURCIA JOJOA | Conductor 2 | 1.003.359.252 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9491819049 |
| OBER ASMED PEREZ PEREZ | Almacenista | 96.193.788 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 9491787414 |

## PERIODO: SEPTIEMBRE 2025

| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** |
| FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN | Director de Obra | 40.326.478 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 9492846565 |
| WENDY VANESA GARZON GARCIA | Residente de Obra 1 | 1.121.902.403 | PROTECCION | SANITAS | SURA | 9492295185<br>9492259892<br>9492846748 |
| GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS | Residente de Obra 2 | 1.121.834.340 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 9492846565 |
| EDWIN GUZMAN PASTRANA | Profesional en Salud Ocupacional | 86.040.134 | COLPENSIONES | SALUD TOTAL | SURA | 9492295185<br>08-10-2025 |
| DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO | Contadora | 40.395.435 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 9492794183 |
| LINA MARCELA GOMEZ LEAL | Auxiliar Contable | 40.328.285 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9492794183 |

| PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** |
| GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ | Secretaria | 1.092.394.700 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9492794183 |
| JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA | Conductor 1 | 80.013.513 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9492794183 |
| ROSEMBERG MURCIA JOJOA | Conductor 2 | 1.003.359.252 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9492846565 |
| OBER ASMED PEREZ PEREZ | Almacenista | 96.193.788 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 9492794183 |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

## PERIODO: OCTUBRE 2025

| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** | **FECHA INGRESO Y/O RETIRO** |
| LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA | R/L Consorcio | 86.051.533 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9494411431 | |
| FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN | Director de Obra | 40.326.478 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 9494411431 | |
| WENDY VANESA GARZON GARCIA | Residente de Obra 1 | 1.121.902.403 | PROTECCION | SANITAS | SURA | 9494411431 | |
| GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS | Residente de Obra 2 | 1.121.834.340 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 9494411431 | |
| EDWIN GUZMAN PASTRANA | Profesional en Salud Ocupacional | 86.040.134 | COLPENSIONES | SALUD TOTAL | SURA | 9492155718 9494246827 | RETIRO 28-10-2025 |
| GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO | Profesional en Salud Ocupacional | 1.121.869.998 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9494411431 | INGRESO 29-10-2025 |
| DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO | Contadora | 40.395.435 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 949441244 | |
| LINA MARCELA GOMEZ LEAL | Auxiliar Contable | 40.328.285 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 949441244 | |

Por medio del oficio 1090-1142 de la alcaldía de Puerto Gaitán con fecha del 29 de octubre de 2025, se aprobó el cambio del profesional de salud ocupacional.

| PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** |
| GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ | Secretaria | 1.092.394.700 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 949441244 |
| JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA | Conductor 1 | 80.013.513 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 949441244 |
| ROSEMBERG MURCIA JOJOA | Conductor 2 | 1.003.359.252 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9494411431 |
| OBER ASMED PEREZ PEREZ | Almacenista | 96.193.788 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 949441244 |
| MIGUEL DIOSID CORREA | Oficial de obra | 1.103.470.729 | PORVENIR | CAJACOPI | SURA | 9494411431 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEFERSON ENRIQUE GALVAN | Operador de maquinaria | 78.646.546 | COLFONDOS | NUEVA EPS | SURA | 9494411431 |
| JOSE JAVIER MONACO | Oficial de tubería | 1.093.921.945 | PORVENIR | NUEVA EPS | SURA | 9494411431 |
| BRISLEY RAMIREZ | Oficial de obra | 1.122.236.284 | PORVENIR | NUEVA EPS | SURA | 9494411431 |
| DUVAN ARLEY ROMERO | Oficial de tubería | 1.004.819.005 | PORVENIR | NUEVA EPS | SURA | 9494411431 |

## PERIODO: NOVIEMBRE 2025

| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** |
| LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA | R/L Consorcio | 86.051.533 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9496078479 |
| FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN | Director de Obra | 40.326.478 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 9496078479 |
| WENDY VANESA GARZON GARCIA | Residente de Obra 1 | 1.121.902.403 | PROTECCION | SANITAS | SURA | 9496078479 |
| GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS | Residente de Obra 2 | 1.121.834.340 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 9496078479 |
| GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO | Profesional en Salud Ocupacional | 1.121.869.998 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9496078479 |
| DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO | Contadora | 40.395.435 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 9496044520 |
| LINA MARCELA GOMEZ LEAL | Auxiliar Contable | 40.328.285 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9496044520 |

| PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** | **FECHA INGRESO Y/O RETIRO** |
| GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ | Secretaria | 1.092.394.700 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9496044520 | |
| JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA | Conductor 1 | 80.013.513 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9496044520 | |
| ROSEMBERG MURCIA JOJOA | Conductor 2 | 1.003.359.252 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9496078479 | |
| OBER ASMED PEREZ PEREZ | Almacenista | 96.193.788 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 9496044520 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL DIOSID CORREA | Oficial de obra | 1.103.470.729 | PORVENIR | CAJACOPI | SURA | 9496078479 | |
| YEFERSON ENRIQUE GALVAN | Operador de maquinaria | 78.646.546 | COLFONDOS | NUEVA EPS | SURA | 9496078479 | |
| JOSE JAVIER MONCADA | Oficial de tubería | 1.093.921.945 | PORVENIR | NUEVA EPS | SURA | 9496078479 | |
| BRISLEY RAMIREZ | Oficial de obra | 1.122.236.284 | PORVENIR | NUEVA EPS | SURA | 9496078479 | |
| DUVAN ARLEY ROMERO | Oficial de tubería | 1.004.819.005 | PORVENIR | NUEVA EPS | SURA | 9496078479 | |
| GAITAN LEONARDO | Ayudante de obra | 8.191.822 | PROTECCION | CAJACOPI | SURA | 9496078479 | 04/11/2025 05/11/2025 |
| GAITAN SALOMON | Ayudante de obra | 1.147.694.823 | PORVENIR | PIJAOSALUD | SURA | 9496078479 | 04/11/2025 05/11/2025 |

## PERIODO: DICIEMBRE 2025

| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** |
| LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA | R/L Consorcio | 86.051.533 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9497602330 |
| FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN | Director de Obra | 40.326.478 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 9497602330 |
| WENDY VANESA GARZON GARCIA | Residente de Obra 1 | 1.121.902.403 | PROTECCION | SANITAS | SURA | 9497602330 |
| GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS | Residente de Obra 2 | 1.121.834.340 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 9497602330 |
| GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO | Profesional en Salud Ocupacional | 1.121.869.998 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9497602330 |
| DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO | Contadora | 40.395.435 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 9497604877 |
| LINA MARCELA GOMEZ LEAL | Auxiliar Contable | 40.328.285 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9497604877 |

| PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** | **FECHA INGRESO Y/O RETIRO** |
| GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ | Secretaria | 1.092.394.700 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9497604877 | |
| JEIMMY ALEJANDRO | Conductor 1 | 80.013.513 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9497604877 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ MURCIA | | | | | | | |
| ROSEMBERG MURCIA JOJOA | Conductor 2 | 1.003.359.252 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9497602330 | |
| OBER ASMED PEREZ PEREZ | Almacenista | 96.193.788 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 9497604877 | |
| MIGUEL DIOSID CORREA | Oficial de obra | 1.103.470.729 | PORVENIR | CAJACOPI | SURA | 9497602330 | 24-10-25 21-12-25 |
| YEFERSON ENRIQUE GALVAN | Operador de maquinaria | 78.646.546 | COLFONDOS | NUEVA EPS | SURA | 9497602330 | 24-10-25 21-12-25 |
| JOSE JAVIER MONCADA | Oficial de tubería | 1.093.921.945 | PORVENIR | NUEVA EPS | SURA | 9497602330 | 24-10-25 21-12-25 |
| BRISLEY RAMIREZ | Oficial de obra | 1.122.236.284 | PORVENIR | NUEVA EPS | SURA | 9497602330 | 24-10-25 21-12-25 |
| DUVAN ARLEY ROMERO | Oficial de tubería | 1.004.819.005 | PORVENIR | NUEVA EPS | SURA | 9497602330 | 24-10-25 21-12-25 |

## PERIODO: ENERO 2026

| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** |
| LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA | R/L Consorcio | 86.051.533 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9499301789 9501110948 |
| FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN | Director de Obra | 40.326.478 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 9499301789 9501110948 |
| WENDY VANESA GARZON GARCIA | Residente de Obra 1 | 1.121.902.403 | PROTECCION | SANITAS | SURA | 9499301789 9501110948 |
| GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS | Residente de Obra 2 | 1.121.834.340 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 9499301789 9501110948 |
| GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO | Profesional en Salud Ocupacional | 1.121.869.998 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9499301789 9501110948 |
| DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO | Contadora | 40.395.435 | COLPENSIONES | SANITAS | SURA | 9499300676 9501110414 |
| LINA MARCELA GOMEZ LEAL | Auxiliar Contable | 40.328.285 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9499300676 9501110414 |

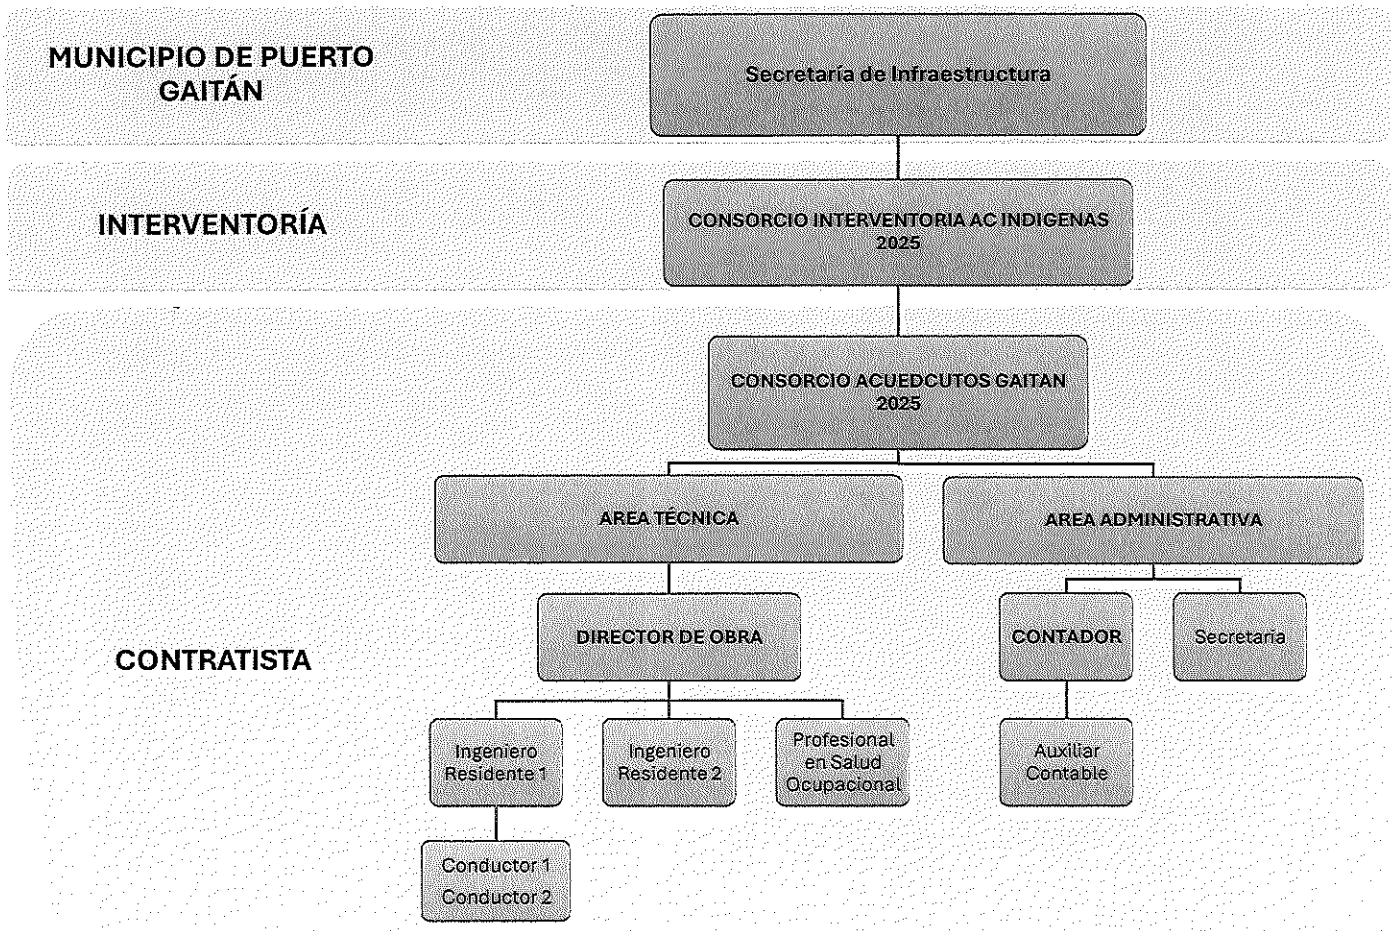
| PERSONAL TECNICO OPERATIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **C.C.** | **AFP** | **EPS** | **ARL** | **PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO** |
| GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ | Secretaria | 1.092.394.700 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9499300676 9501110414 |
| JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA | Conductor 1 | 80.013.513 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9499300676 9501110414 |
| ROSEMBERG MURCIA JOJOA | Conductor 2 | 1.003.359.252 | PORVENIR | SANITAS | SURA | 9499301789 9501110948 |
| OBER ASMED PEREZ PEREZ | Almacenista | 96.193.788 | COLPENSIONES | NUEVA EPS | SURA | 9499300676 9501110414 |
| MIGUEL DIOSID CORREA | Oficial de obra | 1.103.470.729 | PORVENIR | CAJACOPI | SURA | 9499301789 9501110948 |
| YEFERSON ENRIQUE GALVAN | Operador de maquinaria | 78.646.546 | COLFONDOS | NUEVA EPS | SURA | 9499301789 9501110948 |
| JOSE JAVIER MONCADA | Oficial de tubería | 1.093.921.945 | PORVENIR | NUEVA EPS | SURA | 9499301789 9501110948 |
| EDWIN BARRIOS | Oficial de obra | 1.120.864.265 | PORVENIR | SALUDTOTAL | SURA | 9499301789 9501110948 |
| DUVAN ARLEY ROMERO | Oficial de tubería | 1.004.819.005 | PORVENIR | NUEVA EPS | SURA | 9499301789 9501110948 |

## 8.2 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se anexan las planillas de pago de seguridad social correspondientes al periodo del informe de cada uno de los empleados tanto profesionales, como operativos y técnicos junto con el certificado emitido por el contador público que avala dichos pagos.

**Ver Anexo No. 3. Planillas de pago seguridad social y Certificación contador.**

## 8.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO




## 8.4 PAZ Y SALVO PERSONAL.

Se anexa paz y salvo de los trabajadores retirados durante el periodo comprendido a la fecha de corte del presente informe.

**Ver Anexo No. 4. Paz y salvo personal retirado**

## 9 CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Se anexa el diseño de mezcla para concretos de 3.000 PSI a utilizar en la construcción de estructuras que lo requieren.

## 10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

| TIPO | REFERENCIA | CANTIDAD |
|---|---|---|
| NIVEL DE PRECISIÓN | NIVEL DE PRECISIÓN TOPCOM | 1 |
| ESTACIÓN TOTAL | ESTACIÓN TOPOGRÁFICA TOPCOM | 1 |
| CAMIONETA | TOYOTA HILUX | 1 |
| CAMION ESTACAS | CHEVROLET | 1 |
| EQUIPO DE PERFORACION | PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8 | 1 |
| EQUIPO DE PERFORACION | DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6 | 1 |
| EQUIPO DE PERFORACION | REO, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6 | 1 |
| RETROEXCAVADORA | HITACHI | 1 |
| RETROEXCAVADORA | CARTERPILLA | 1 |

## 11 INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO.

En lo corrido del presente mes las actividades ejecutadas no causaron afectación ambiental en la zona de trabajo.

A la fecha el contrato cuenta con los permisos de prospección y exploración en de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA, los cuales a continuación se relacionan:

| EXPEDIENTE | RESOLUCIÓN | FECHA | RESGUARDO INDÍGENA | POZO COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 3.37.2.6.025.001 | PS-GJ. 1.2.6.25.0361 | 30/04/2025 | WACOYO | KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA |
| 3.37.2.6.025.004 | PS-GJ. 1.2.6.25.0359 | 30/04/2025 | AWALIBA | MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE |
| 3.37.2.6.025.002 | PS-GJ. 1.2.6.25.0416 | 19/05/2025 | DOMOPLANAS | OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| EXPEDIENTE | RESOLUCIÓN | FECHA | RESGUARDO INDÍGENA | POZO COMUNIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS |
| 3.37.2.6.025.005 | PS-GJ. 1.2.6.25.0369 | 06/05/2025 | ASEINPOME | KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ |

## 12 CONCLUSIONES

Para la presente Acta parcial de obra No. 1 se realizan las actividades descritas en el informe adjunto:

Por tal motivo solicito el pago del Acta Parcial de obra Nº 1 que comprende el periodo del 29 de agosto de 2025 al 20 de enero de 2026, por un valor de **QUINCE MIL MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE ($ 15.000.043.212,21),** del cual se realizara la respectiva amortización del anticipo.

## 13 ANEXOS

- **ANEXO No. 1.** CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.
- **ANEXO No. 2.** INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISO).
- **ANEXO No. 3.** PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.
- **ANEXO No. 4.** PAZ Y SALVO TRABAJADORES RETIRADOS
- **ANEXO No. 5.** REGISTRO FOTOGRAFICO.
- **ANEXO No. 6.** COPIA DE LA BITACORA.

Atentamente,

**LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA**
R.L. CONSORCIO ACUEDUCTOS AGUAS 2025
Contratista

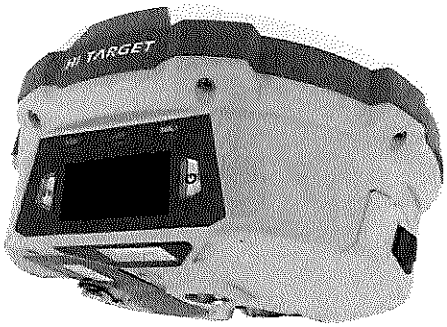
# ANEXO 1. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERTEX | EQUIPOS GNSS RESEIVER HI-TARGET V60 | | Código: | HTV60-GPS-146 |
| | FORMATO DE CALIBRACION | | Versión: | 2.0 |
| Fecha Inspección: | 4/2/2025 | Persona que Inspecciona: ANDRES HERNANDEZ | Sede: | VILLAVICENCIO-META |
| LUGAR: VILLAVICENCIO-META | | Persona responsable del área: TECNICO OPERADOR | | |

| | | CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR | OBSERVACIONES | OPCIONES | | | VALORACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | N/A | A | B | C | D |
| CONDICIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | RECEIVER SATELLITE (GPS) (L1 C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | | X | | | X | | | |
| | 2 | RECEIVER SATELLITE (GLONASS) (L1 C/A,L1C,L2C,L2P,L3,L5 | | X | | | X | | | |
| | 3 | RECEIVER SATELLITE (BEIDOU)B1,B2,B3 | | X | | | X | | | |
| | 4 | RECEIVER SATELLITE (GALILEO)E1,E5 AltBOC,E5a,E5b,E6 | | X | | | X | | | |
| | 5 | RECEIVER SATELLITE (QZSS)L1 C/A,L1C,L2C,L5,L6 | | X | | | X | | | |
| | 6 | RECEIVER SATELLITE (SBAS)L1,L5 | | X | | | X | | | |
| | 7 | CHANNELS 220 | | X | | | X | | | |
| | 8 | HIGH PRECISION STATIC SURVEYING | Horizontal 2.5 mm + 1 ppm RMS<br>Vertical 5.0 mm + 1 ppm RMS | X | | | X | | | |
| | 9 | REAL TIME KINEMATIC(<30Km) -NETWORK SURVEYING | Fixed RTK horizontal 8mm +1 ppm RMS<br>Fixed RTK vertical 15mm +1 ppm RMS | X | | | X | | | |
| | 10 | INTERNAL RADIO frequency range 457-467 MHz | | X | | | X | | | |
| | 11 | INTERNAL RADIO maximum range 2- Km in urban enbironmert | | X | | | X | | | |
| | 12 | INTERNAL RADIO maximum range up to 10 Km with optimal | | X | | | X | | | |
| | 13 | POWER SUPPLY WORKING TIME 5 hours | WORKING 5 hours | X | | | | X | | |

REGISTRO FOTOGRAFICO




| OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR | OBSERVACIONES | OPCIONES | | | VALORACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | A | B | C | D |
| CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO (PINTURA - TAPAS) | - | X | | | X | | | |
| CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO ( HARDWARE) | - | X | | | X | | | |
| CONFIGURACION DE SISTEMA DE COORDENADAS (WGS84) | - | X | | | X | | | |
| | | | | | | | | |

**Observaciones:**

EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS.

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: ANDRES HERNANDEZ MORENO | Cago: TECNICO OPERADOR | Firma del responsable: |

**SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES**

| HALLAZGO | RECOMENDACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | NOMBRE(*) |
|---|---|---|---|---|
| NINGUNA | NINGUNO | 5/12/2021 | - | ANDRES HERNANDEZ |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| CRITERIOS PARA VALORAR LAS CONDICIONES INSEGURAS | |
|---|---|
| A | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES. |
| B | LIGERA VARIACION CON LAS ESPECIFICACIONES |
| C | VALORES FUERA DE RANGO CON ESPECIFICACIONES |
| D | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES |

| VERTEX | INSPECCION DE EQUIPOS GNSS RESEIVER STONEX-S800 | | Código: | STS800-GPS-132 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO PARA INSPECCIONES DE CALIDAD | | Versión: | 2.0 |
| Fecha Inspección: | 8/4/2025 | Persona que Inspecciona: ANDRES HERNANDEZ | Sede: | VILLAVICENCIO |
| LUGAR: VILLAVICENCIO-META | | Persona responsable del área: TECNICO OPERADOR | | |

| | | CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR | OBSERVACIONES | OPCIONES | | | VALORACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | N/A | A | B | C | D |
| CONDICIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | RECEIVER SATELLITE (GPS) (L1 C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | | X | | | X | | | |
| | 2 | RECEIVER SATELLITE (GLONASS) (L1 C/A,L1C,L2C,L2P,L3,L5 | | X | | | X | | | |
| | 3 | RECEIVER SATELLITE (BEIDOU)B1,B2,B3 | | X | | | X | | | |
| | 4 | RECEIVER SATELLITE (GALILEO)E1,E5 AltBOC,E5a,E5b,E6 | | X | | | X | | | |
| | 5 | RECEIVER SATELLITE (QZSS)L1 C/A,L1C,L2C,L5,L6 | | X | | | X | | | |
| | 6 | RECEIVER SATELLITE (SBAS)L1,L5 | | X | | | X | | | |
| | 7 | CHANNELS 555 | | X | | | X | | | |
| | 8 | HIGH PRECISION STATIC SURVEYING | Horizontal 2.5 mm + 1 ppm RMS<br>Vertical 5.0 mm + 1 ppm RMS | X | | | X | | | |
| | 9 | REAL TIME KINEMATIC(<30Km) -NETWORK SURVEYING | Fixed RTK horizontal 8mm +1 ppm RMS<br>Fixed RTK vertical 15mm +1 ppm RMS | X | | | X | | | |
| | 10 | INTERNAL RADIO frequency range 457-467 MHz | | X | | | X | | | |
| | 11 | INTERNAL RADIO maximum range 2- Km in urban enbironmert | | X | | | X | | | |
| | 12 | INTERNAL RADIO maximum range up to 10 Km with optimal | | X | | | X | | | |
| | 13 | POWER SUPPLY WORKING TIME 8-10 hours | WORKING 8.5 hours | X | | | | X | | |

REGISTRO FOTOGRAFICO







| OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR | OBSERVACIONES | OPCIONES | | | VALORACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | A | B | C | D |
| CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO (PINTURA - TAPAS) | - | X | | | X | | | |
| CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO ( HARDWARE) | - | X | | | X | | | |
| CONFIGURACION DE SISTEMA DE COORDENADAS (WGS84) | - | X | | | X | | | |
| | | | | | | | | |

**Observaciones:**

EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS.

| Nombre: ANDRES HERNANDEZ MORENO | Cago: TECNICO OPERADOR | Firma del responsable: |
|---|---|---|

**SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES**

| HALLAZGO | RECOMENDACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | NOMBRE(*) |
|---|---|---|---|---|
| NINGUNA | NINGUNO | 9/12/2019 | - | ANDRES HERNANDEZ |
| NINGUNA | NINGUNO | 5/12/2020 | - | ANDRES HERNANDEZ |
| NINGUNA | NINGUNO | 5/12/2021 | - | ANDRES HERNANDEZ |
| | | | | |
| | | | | |

| CRITERIOS PARA VALORAR LAS CONDICIONES INSEGURAS | |
|---|---|
| A | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES. |
| B | LIGERA VARIACION CON LAS ESPECIFICACIONES |
| C | VALORES FUERA DE RANGO CON ESPECIFICACIONES |
| D | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES |

# CERTIFICADO DE CALIDAD

## Laboratorio de ensayos PVC Gerfor S.A.

**Consecutivo:** 1535
**Fecha:** 05-sept-25 **Referencia:** TUBO U.M. 2"
**Norma:** NTC-382 **Lote de fabricación:** 30000052516

| REQUISITO | UN. MEDIDA | METODO DE ENSAYO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| DIAMETRO EXTERIOR | mm | NTC-3578 | 60 - 60 | 60 |
| OVALAMIENTO | mm | NTC-3578 | <- 1,60 | 0,75 |
| ESPESOR DE PARED MINIMO | mm | NTC-3578 | 1,78 - 2,45 | 1,97 |
| PORCENTAJE DE VARIACION DE PARED | % | NTC-3578 | <- 12,00 | 8,62 |
| LONGITUD DEL TUBO | mm | NTC-3578 | 6000 - 6012 | 6009,77 |

| REQUISITO | UN. MEDIDA | METODO DE ENSAYO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DE EXTRUSION | MINUTOS | NTC-3578 | NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO. | CUMPLE |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | JULIOS | NTC-1125 | 68 | CUMPLE |
| APLASTAMIENTO TRANSVERSAL | % | NTC-3254 | 70% DEL DIAMETRO EXTERNO | CUMPLE |
| ROTULADO | | NTC-382 | LOGO IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE DIAMETRO PULG. - MM RDE PRESIÓN DE TRABAJO | CUMPLE |

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1 Vigente.

Lina. Yeinni Milena Franco
Directora Conformidad

Nit: 860 502 509 - 1
Autopista Medellin Km 2
600 m. via parcelas, Cota
Cundinamarca, Colombia.
pbx: (1) 877 68 00 /20
fax: (1) 877 68 49
www.gerfor.com

Gerfor

# LABORATORIO DE ENSAYOS
# CERTIFICADO DE CALIDAD

**Fecha :** Octubre 02 de 2025
**Referencia :** TEE PRESION ACAMP 2X2X2"
**Norma :** NTC 382 / 2295
**Lote de Fabricación:** 30000080360

| REQUISITO | NORMA | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| DIAMETRO INTERNO DE PESTAÑA (A) | NTC 3358 | mm | 60,50 - 62,50 | 61,51 |
| DIAMETRO INTERNO DEL ANILLO (A) | NTC 3358 | mm | 77,00 - 78,50 | 77,95 |
| DIAMETRO INTERNO DE LA CAMPANA (A) | NTC 3358 | mm | 60,50 - 62,50 | 61,53 |
| LONGITUD DE PESTAÑA MÍNIMO (A) | NTC 3358 | mm | 15,00 | 28,48 |
| LONGITUD DE CAMPANA (A) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 95,00 | 128,68 |
| ESPESOR DE PESTAÑA (A) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 2,87 | 3,60 |
| ESPESOR DEL ANILLO (A) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 2,87 | 2,95 |
| ESPESOR DE LA CAMPANA (A) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 2,87 | 3,71 |
| DIAMETRO INTERNO DE PESTAÑA (B) | NTC 3358 | mm | 60,50 - 62,50 | 62,23 |
| DIAMETRO INTERNO DEL ANILLO (B) | NTC 3358 | mm | 77,00 - 78,50 | 77,91 |
| DIAMETRO INTERNO DE LA CAMPANA (B) | NTC 3358 | mm | 60,50 - 62,50 | 62,13 |
| LONGITUD DE PESTAÑA (B) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 15,00 | 15,20 |
| LONGITUD DE CAMPANA (B) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 95,00 | 101,08 |
| ESPESOR DE PESTAÑA (B) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 2,87 | 3,25 |
| ESPESOR DEL ANILLO (B) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 2,87 | 3,01 |
| ESPESOR DE LA CAMPANA (B) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 2,87 | 3,20 |
| DIAMETRO INTERNO DE PESTAÑA (C) | NTC 3358 | mm | 60,50 - 62,50 | 62,35 |
| DIAMETRO INTERNO DEL ANILLO (C) | NTC 3358 | mm | 77,00 - 78,50 | 78,15 |
| DIAMETRO INTERNO DE LA CAMPANA (C) | NTC 3358 | mm | 60,50 - 62,50 | 62,15 |
| LONGITUD DE PESTAÑA (C) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 15,00 | 17,10 |
| LONGITUD DE CAMPANA (C) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 95,00 | 98,18 |
| ESPESOR DE PESTAÑA (C) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 2,87 | 3,25 |
| ESPESOR DEL ANILLO (C) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 2,87 | 3,15 |
| ESPESOR DE LA CAMPANA (C) MÍNIMO | NTC 3358 | mm | 2,87 | 3,28 |
| HERMETICIDAD VACIO | NTC 2295 | InHg | 22 | CUMPLE |
| HERMETICIDAD PRESIÓN INTERNA | NTC 2295 | Psi | 100 Psi X 1h | CUMPLE |
| | | | 500 Psi X 1h | |
| | | | Rotura 630 Psi | |

* Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Juan Ramos

Juan Manuel Ramos.
Coordinador laboratorio PVC Gerfor.

Reviso y Aprobó:

Jenny Rodriguez.
Jefe de Laboratorio.

## CERTIFICADO DE CALIDAD

### Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

**Fecha:** 15-oct-25
**Norma:** NTC-382/2295

**Consecutivo** 7.957
**Referencia:** CODO G.RADIO ACAMP 90°X2"
**Lote de Fabricación:** 30000079873

| REQUISITO | UN. MEDIDA | METODO DE ENSAYO | ESPECIFICACION | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| DIAMETRO INT DE LA PESTAÑA | mm | NTC-3358 | 60,50 - 62,50 | 61,19 |
| DIAMETRO INT DEL ANILLO | mm | NTC-3358 | 72,20 - 74,20 | 72,11 |
| DIAMETRO INT DE LA CAMPANA | mm | NTC-3358 | 60,50 - 62,50 | 61,50 |
| ESPESOR DE LA PESTAÑA | mm | NTC-3358 | >= 2,87 | 3,50 |
| ESPESOR DEL ANILLO | mm | NTC-3358 | >= 2,87 | 2,99 |
| ESPESOR DE LA CAMPANA | mm | NTC-3358 | >= 3,15 | 3,47 |
| LONGITUD DE LA PESTAÑA | mm | NTC-3358 | >= 15,00 | 26,70 |
| LONGITUD DE LA CAMPANA | mm | NTC-3358 | >= 95,00 | 124,30 |
| ANGULO DE LA CURVA | ° | NTC-3358 | 89,00 - 91,00 | 90,00 |

| REQUISITO | UN. MEDIDA | METODO DE ENSAYO | ESPECIFICACION | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| HERMETICIDAD DE LA JUNTA | Psi | NTC-2295 | 100 PSI X 1 HORA / 500 PSI X 1 HORA / 630 PSI X 1 MINUTO | CUMPLE |
| HERMETICIDAD DE LA JUNTA | InHg | NTC-2295 | 22 InHg X 1 HORA | CUMPLE |

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com



Colombia corre por nuestras venas

## CERTIFICADO DE CALIDAD

### Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

**Fecha:** 03-sep-25
**Norma:** NTC-382/2295

**Consecutivo** 7.261
**Referencia:** TUBO PRESION ACAMP RDE 21 2"
**Lote de Fabricación:** 30000077123

| REQUISITO | UN. MEDIDA | METODO DE ENSAYO | ESPECIFICACION | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| DIAMETRO EXTERIOR | mm | NTC-3358 | 60,17 - 60,47 | 60,40 |
| OVALAMIENTO | mm | NTC-3358 | <= 1,52 | 0,24 |
| ESPESOR DE PARED MINIMO | mm | NTC-3358 | 2,87 - 3,38 | 3,14 |
| LONGITUD DEL TUBO | mm | NTC-3358 | 6000 - 6012 | 6008,30 |
| ESPESOR DE LA PESTAÑA | mm | NTC-3358 | >= 2,87 | 3,31 |
| ESPESOR DE LA CAMPANA | mm | NTC-3358 | >= 3,15 | 3,34 |
| DIAMETRO INT DE LA PESTAÑA | mm | NTC-3358 | 60,50 - 62,50 | 62,21 |
| DIAMETRO INT DEL ANILLO | mm | NTC-3358 | 72,20 - 74,20 | 72,63 |
| DIAMETRO INT DE LA CAMPANA | mm | NTC-3358 | 60,50 - 62,50 | 62,12 |
| LONGITUD DE LA CAMPANA | mm | NTC-3358 | >= 95,00 | 116,02 |
| LONGITUD DE LA PESTAÑA | mm | NTC-3358 | >= 15,00 | 25,03 |
| REGRESIÓN ACELERADA (1 h) | psi | NTC-5494 | 0 - 2000 | 628,35 |
| PRESION DE ROTURA | psi | NTC-3579 | >= 630 | 648,50 |

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Ramos

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Rodriguez

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com



Colombia corre por nuestras venas

## CERTIFICADO DE CALIDAD

### Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

**Fecha:** 03-sep-25
**Norma:** NTC-382/2295

**Consecutivo** 7.261
**Referencia:** TUBO PRESION ACAMP RDE 21 2"
**Lote de Fabricación:** 30000077123

| REQUISITO | UN. MEDIDA | METODO DE ENSAYO | ESPECIFICACION | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DE EXTRUSION | MINUTOS | NTC-2983 | NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO | CUMPLE |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | JULIOS | NTC-1125 | 40,7 | CUMPLE |
| APLASTAMIENTO TRANSVERSAL | % | NTC-3254 | 60% DEL DIAMETRO EXTERNO | CUMPLE |
| ATOXICIDAD | % | NTC-539 | APTO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE | CUMPLE |
| HERMETICIDAD DE LA JUNTA | Psi | NTC-2295 | 100 PSI X 1 HORA / 500 PSI X 1 HORA / 630 PSI X 1 MINUTO | CUMPLE |
| HERMETICIDAD DE LA JUNTA | InHg | NTC-2295 | 22 InHg X 1 HORA | CUMPLE |
| ROTULADO | N/A | NTC-382 | GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 2" - 60mm RDE21 PT 1,38MPa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 382/2295 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE | CUMPLE |

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Ramos

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Rodriguez

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com



Colombia corre por nuestras venas

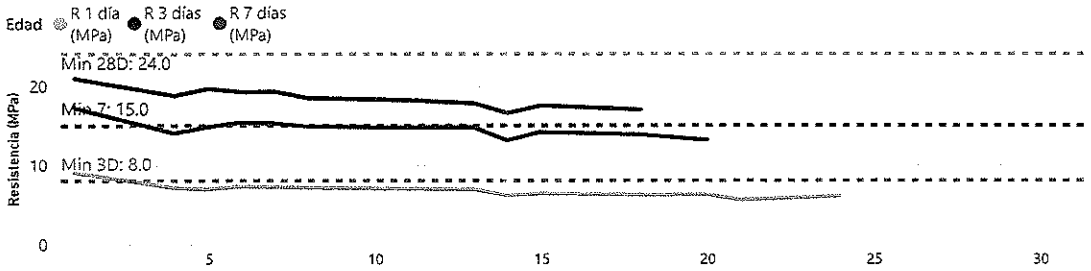
# Reporte de calidad

1/11/2025 | 30/11/2025 | Planta Sogamoso | Cemento Uso General

## PARÁMETROS FÍSICOS

| Blaine | Retenido 325 | Fraguado inicial | Fraguado final |
|---|---|---|---|
| 5260 cm2/g | 5.1 % | 162 min | 265 min |

| Resistencia 1 día | Resistencia 3 días | Resistencia 7 días | Resistencia 28 días |
|---|---|---|---|
| 6.7 MPa | 14.7 MPa | 18.5 MPa | (Blank) MPa |





* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG.

## OTROS PARÁMETROS FÍSICO

| Densidad NTC 221 | Contenido de Aire NTC 224 | Expansión en autoclave NTC 107 | Expansión barras de mortero NTC 4927 |
|---|---|---|---|
| NO HAY INFORMACIÓN | NO HAY INFORMACIÓN | NO HAY INFORMACIÓN | NO HAY INFORMACIÓN |

## PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos




- Fe2O3(%)
- Al2O3(%)
- SiO2(%)
- CaO(%)

| Perdidas por ignición | SO3 |
|---|---|
| 11.04 % | 2.17 % |

| Equivalente alcalino |
|---|
| 0.60 % |

## RESUMEN

| Fecha | Blaine (cm2/g) NTC 33 | Retenido 325 (%) NTC 294 | FI (Min) NTC 118 | FF (Min) NTC 118 | R1 día (MPa) NTC 220 | R3 días (MPa) NTC 220 | R7 días (MPa) NTC 220 | R28 días (MPa) NTC 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2025 | 5238 | 5.0 | 161 | 285 | 9.0 | 17.3 | 20.9 | |
| 4/11/2025 | 5100 | 4.7 | 150 | 255 | 7.1 | 14.1 | 18.8 | |
| 5/11/2025 | 5295 | 4.9 | 151 | 255 | 7.0 | 14.8 | 19.6 | |
| 6/11/2025 | 5270 | 4.0 | 152 | 255 | 7.3 | 15.5 | 19.2 | |
| 7/11/2025 | 5160 | 6.0 | 154 | 255 | 7.2 | 15.3 | 19.3 | |
| 8/11/2025 | 4883 | 4.9 | 155 | 255 | 7.2 | 14.9 | 18.5 | |
| 11/11/2025 | 5305 | 4.1 | 169 | 270 | 7.0 | 14.8 | 18.2 | |
| 13/11/2025 | 5223 | 4.9 | 175 | 270 | 6.9 | 14.8 | 17.8 | |
| 14/11/2025 | 5535 | 5.9 | 172 | 270 | 6.1 | 13.1 | 16.6 | |
| 15/11/2025 | 5260 | 5.1 | 172 | 270 | 6.4 | 14.2 | 17.5 | |
| 18/11/2025 | 5740 | 5.9 | 165 | 270 | 6.2 | 13.9 | 17.0 | |
| 20/11/2025 | 5153 | 5.5 | 166 | 270 | 6.2 | 13.2 | | |
| 21/11/2025 | 5180 | 5.7 | 166 | 270 | 5.6 | | | |
| 22/11/2025 | 4973 | 5.3 | 171 | 270 | 5.7 | | | |
| 24/11/2025 | 5580 | 4.6 | 153 | 255 | 6.1 | | | |

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Tecnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

## BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

*NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289*

NTC 2289 2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

Res. 2003 2022 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

SC-2002456 CO SC-2002435

**No. TOC-85178**

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 21/11/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | ARCOE S.A.S. | DESTINO | VILLAVICENCIO |
| | | PLACA | TVA 311 |
| NORMA | NTC 2289 | PEDIDO No. | 36928 |
| GRADO | 420 | REMISIÓN No. | 37099 |
| | | FACTURA No. | 122913 |

| | | | | | ENSAYOS FÍSICOS | | | | ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max. | | | | | | | | | | | | RESULTADOS DIMENSIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESULTADOS DE TRACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO | LONGITUD (metros) | COLADA | PAQUETES | UNIDADES | DOBLADO | FLUENCIA (Mpa) | RESISTENCIA (Mpa) | ELONGACIÓN (%) | R/F | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Cu (%) | Ni (%) | Cr (%) | Mo (%) | Nb (%) | V (%) | CE (%) | PESO NOMINAL(kg/m) | ALTURA RESALTE (mm) | ESPACIAMIENTO RESALTES (mm) | ANGULO RESALTE (°) | SEPARACION RESALTES (mm) |
| R - No. 4 | 6 | 20253401 | 2 | 3360 | ✓ | 479.5 | 629.1 | 15.7 | 1.31 | 0.27 | 1.12 | 0.0121 | 0.025 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.015 | 0.00037 | 0.0019 | 0.47 | 0.976 | 0.840 | 8.410 | 69.9 | 1.920 |
| | | 20253400 | 4 | | ✓ | 471.7 | 616.3 | 15.6 | 1.31 | 0.27 | 1.11 | 0.0118 | 0.031 | 0.20 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 0.012 | 0.00025 | 0.0020 | 0.47 | 0.967 | 0.910 | 8.410 | 69.9 | 1.780 |
| | | 20253404 | 1 | | ✓ | 470.0 | 612.6 | 16.8 | 1.30 | 0.27 | 1.11 | 0.0125 | 0.029 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.013 | 0.00026 | 0.0019 | 0.47 | 0.976 | 0.830 | 8.410 | 69.9 | 1.660 |
| | | 20253403 | 3 | | ✓ | 477.2 | 624.3 | 17.6 | 1.31 | 0.27 | 1.15 | 0.012 | 0.025 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.012 | 0.00038 | 0.0020 | 0.47 | 0.977 | 0.830 | 8.410 | 69.9 | 1.670 |
| ESPECIFICACIONES DE NORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R - No. 4 | | | | | | (420 - 540) | Min: 550 | Min: 14 | Min: 1.25 | Max: 0.30 | Max: 1.50 | Max: 0.035 | Max: 0.045 | Max: 0.50 | | | | | | | Max: 0.55 | (0.934 - 0.994) | Min: 0.51 | Max: 8.9 | Min: 45 | Max: 4.9 |

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

Ing. Sandra Cabrera

DIRECTOR CONTROL CALIDAD



*Enviado: tesoreria@ferremetalicascolombia.com;info@ferremetalicascolombia.com;Felipe.Gonzalez@ferremetalicascolombia.org*

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

## BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

*NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289*

Icontec Sello de Calidad NTC 2289 2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

Icontec Sello con Reglamento Técnico Resolución 2003.2022 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

**No.** TOC-79949

**FECHA DESPACHO** DD/MM/AAAA 1/07/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | ARCOE S.A.S. | | |
| **DESTINO** | VILLAVICENCIO | **NORMA** | NTC 2289 |
| **PLACA** | NWN 812 | **GRADO** | 420 |

| | |
|---|---|
| **PEDIDO No.** | 34311 |
| **REMISIÓN No.** | 34367 |
| **FACTURA No.** | 114311 |

| | | | | | | ENSAYOS FÍSICOS | | | | ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max. | | | | | | | | | | | | RESULTADOS DIMENSIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESULTADOS DE TRACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRODUCTO** | **LONGITUD (metros)** | **COLADA** | **PAQUETES** | **UNIDADES** | **DOBLADO** | **FLUENCIA (Mpa)** | **RESISTENCIA (Mpa)** | **ELONGACIÓN (%)** | **R/F** | **C (%)** | **Mn (%)** | **P (%)** | **S (%)** | **Si (%)** | **Cu (%)** | **Ni (%)** | **Cr (%)** | **Mo (%)** | **Nb (%)** | **V (%)** | **CE (%)** | **PESO NOMINAL(kg/m)** | **ALTURA RESALTE (mm)** | **ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)** | **ANGULO RESALTE (°)** | **SEPARACION RESALTES (mm)** |
| R - No. 6 | 6 | 20250783 | 2 | 1050 | ✓ | 465.3 | 629.9 | 15.4 | 1.35 | 0.28 | 0.95 | 0.0117 | 0.019 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.021 | 0.00070 | 0.0018 | 0.45 | 2.157 | 1.520 | 13.060 | 68.8 | 2.490 |
| | | 20251173 | 5 | | ✓ | 469.1 | 634.3 | 14.2 | 1.35 | 0.26 | 0.99 | 0.0165 | 0.024 | 0.19 | 0.21 | 0.07 | 0.10 | 0.016 | 0.00094 | 0.0020 | 0.45 | 2.167 | 1.300 | 12.800 | 68.5 | 2.450 |
| R - 12M | 6 | 20251061 | 4 | 3760 | ✓ | 464.3 | 629.2 | 16.1 | 1.36 | 0.28 | 1.22 | 0.0154 | 0.038 | 0.20 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.016 | 0.00055 | 0.0019 | 0.50 | 0.869 | 0.790 | 7.910 | 70.8 | 2.390 |
| | | 20250701 | 2 | | ✓ | 467.2 | 628.9 | 17.1 | 1.35 | 0.29 | 0.96 | 0.012 | 0.027 | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.14 | 0.019 | 0.00082 | 0.0022 | 0.48 | 0.884 | 0.840 | 7.910 | 70.8 | 2.260 |
| | | 20251092 | 2 | | ✓ | 478.4 | 631.6 | 15.5 | 1.32 | 0.26 | 1.17 | 0.014 | 0.025 | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.018 | 0.00054 | 0.0018 | 0.47 | 0.861 | 0.950 | 7.810 | 72.5 | 2.130 |
| | | 20251094 | 2 | | ✓ | 491.4 | 646.0 | 15.7 | 1.31 | 0.26 | 1.17 | 0.0129 | 0.030 | 0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.019 | 0.00059 | 0.0018 | 0.47 | 0.877 | 0.840 | 7.810 | 72.5 | 2.150 |
| **ESPECIFICACIONES DE NORMA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R - No. 6 | | | | | | (420 - 540) | Min: 550 | Min: 14 | Min: 1.25 | Max: 0.30 | Max: 1.50 | Max: 0.035 | Max: 0.045 | Max: 0.50 | | | | | | | Max: 0.55 | (2.101 - 2.235) | Min: 0.97 | Max: 13.3 | Min: 45 | Max: 7.3 |
| R - 12M | | | | | | (420 - 540) | Min: 550 | Min: 14 | Min: 1.25 | Max: 0.30 | Max: 1.50 | Max: 0.035 | Max: 0.045 | Max: 0.50 | | | | | | | Max: 0.55 | (0.835 - 0.888) | Min: 0.48 | Max: 8.4 | Min: 45 | Max: 4.71 |

**OBSERVACIONES**

**ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA**

CE: CARBONO EQUIVALENTE

**"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"**

**Ing. Sandra Cabrera**

**DIRECTOR CONTROL CALIDAD**



*Enviado: tesoreria@ferremetalicascolombia.com;info@ferremetalicascolombia.com;Felipe.Gonzalez@ferremetalicascolombia.org*

ACESCO

# CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

**N. ENTREGA:** 8000381347
**CLIENTE:** ARCOE S.A.S

**FECHA** 30.01.2023



**MATERIAL:** 111205 - Metaltub N 1_1/2"-1.50 6000 CERRAMIENTO
**NORMA DE CALIDAD:** NORMA NTC 1560

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTE No | 0009024982 | 0009024984 | 0009026392 | 0009026394 | 0009026737 |
| COLADA No | 445249 | 445249 | 445249 | 445249 | 445249 |
| PESO | 650,748 kg | 650,748 kg | 650,748 kg | 650,748 kg | 650,748 kg |
| PORCENTAJE DE CARBONO | 0,060 % | 0,060 % | 0,060 % | 0,060 % | 0,060 % |
| PORCENTAJE DE MANGANESO | 0,230 % | 0,230 % | 0,230 % | 0,230 % | 0,230 % |
| PORCENTAJE DE FÓSFORO | 0,017 % | 0,017 % | 0,017 % | 0,017 % | 0,017 % |
| PORCENTAJE DE AZUFRE | 0,004 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,004 % |
| PORCENTAJE DE SILICIO | % | % | % | % | % |

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

ACESCO

# CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

**N. ENTREGA:** 8000381347
**CLIENTE:** ARCOE S.A.S

**FECHA** 30.01.2023



**MATERIAL:** 111205 - Metaltub N 1_1/2"-1.50 6000 CERRAMIENTO
**NORMA DE CALIDAD:** NORMA NTC 1560

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTE No | 0009026739 | 0009026894 | 0009027013 | 0009027014 | 0009027015 |
| COLADA No | 445249 | 445249 | 445249 | 445249 | 445249 |
| PESO | 650,748 kg | 650,748 kg | 650,748 kg | 650,748 kg | 650,748 kg |
| PORCENTAJE DE CARBONO | 0,060 % | 0,060 % | 0,060 % | 0,060 % | 0,060 % |
| PORCENTAJE DE MANGANESO | 0,230 % | 0,230 % | 0,230 % | 0,230 % | 0,230 % |
| PORCENTAJE DE FÓSFORO | 0,017 % | 0,017 % | 0,017 % | 0,017 % | 0,017 % |
| PORCENTAJE DE AZUFRE | 0,004 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,004 % |
| PORCENTAJE DE SILICIO | % | % | % | % | % |

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

# ANEXO 2. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | INFORME MENSUAL<br>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Código: SST-F-077<br>Versión: 01<br>Fecha: Agosto 2025 |
|---|---|---|

| FECHA DE INFORME | | |
|---|---|---|
| MM | DD | AAAA |
| SEPTIEMBRE | 31 | 2025 |

| MES AL QUE PERTENECE EL INFORME |
|---|
| SEPTIEMBRE |

| CONTRATO Nº | CONTRATANTE | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|
| 821 | ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN | CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 (CAG) | CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 |

| OBJETO DEL CONTRATO | SEDE / PROYECTO |
|---|---|
| CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEIPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. | MUNICIPIO DE PUERTO GATAN |

## 1. Registro Semanal de Charlas / Capacitaciones SST

| Ítem | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | No. HORAS | Fecha Programada | Indicador cobertura | | | Indicador eficacia | | | Responsable O Líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total asistentes a la capacitación | Numero de trabajadores programados | % de Cumplimiento | Numero trabajadores evaluados | Numero de evaluaciones eficaces | % de Cumplimiento | |
| 1 | Inducción SG-SST | 2,00 | 29/08/2025 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | SST |
| 2 | Habitos Saludables | 0,15 | 4/09/2025 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | SST |
| 3 | Estres Térmico | 0,15 | 11/09/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | SST |
| 4 | Pausas Activas | 0,15 | 17/09/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | SST |
| 5 | Riesgo Público | 0,15 | 25/09/2025 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | SST |
| 6 | Peatón "Actor vial" | 0,15 | 30/09/2025 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | SST |

## 2. Programa de Inspecciones: (Relacione las inspecciones ejecutadas durante la semana)

| Ítem | Inspección Realizada | Fecha | Periodicidad | Descripción del hallazgo | Plan de acción | Fecha del Cierre | % de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTIQUÍN | 10/09/2025 | Mensual | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 2 | CAMILLA | 10/09/2025 | Mensual | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 3 | EXTINTOR | 10/09/2025 | Mensual | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |

## 3. Seguimiento Semanal a Actividades adelantadas relacionadas a la implementación y ejecución del SG-SST

| Ítem | Descripción de Gestión SST y demás Actividades | Fecha | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Se realizó inducción del SG-SST a todo el personal vinculado al contrato. | 29/08/2025 | |
| 2 | Se da cumplimiento a las inspecciones planeadas de los equipos de emergencias. | Mensual | |
| 3 | Se realizan charlas pre operacionales, socializando las actividades programadas para ejecutar. | Diaria | |

## 4. Inventario de Maquinaria y Equipos

| Ítem | Nombre del Equipo | Referencia | Propio o Alquilado | Nombre del Operador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |


## 5. Seguimiento a hallazgos y Condiciones de Seguridad, Salud y Ambiente

| Ítem | Descripción del hallazgo encontrado | Plan de Acción | Fecha | Se Notifico al Responsable | | Fecha propuesta para el cierre | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Si | No | | |
| 1 | NINGUNA | N/A | N/A | | | N/A | N/A |


## 6. Seguimiento Ausentismo Laboral

| Ítem | Fecha | Nombre del Trabajador | Cedula | Cargo | Periodo de ausentismo | | Total Dias de ausentismo | Descripción del ausentismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fecha Inicial | Fecha final | | |
| 1 | | | | | | | | No se presentaron ausentismos. |

## 7. Seguimiento a Indicadores de Accidentalidad




| |
|---|
| FATALIDAD |
| ACCIDENTE TRABAJO GRAVE |
| ACCIDENTE TRABAJO MODERADO |
| ACCIDENTE TRABAJO LEVE |
| INCIDENTES |




| Ítem | Obra / Proyecto (Empresa contratista) | Promedio Trabajadores en el Mes | Total dias trabajados en el Mes | HHT | INCIDENTE | AT LEVE | AT MODERADO | AT GRAVE | FATALIDAD | TOTAL AT | TOTAL DÍAS INCAPACIDAD | TOTAS DÍAS CARGADOS | INDICES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Mes | ÍNDICE DE FRECUENCIA | ÍNDICE DE SEVERIDAD | ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE | TASA DE AUSENTISMO | TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES |
| 1 | CAG | 3 | 10 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | INFORME MENSUAL<br>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Código: SST-F-077<br>Versión: 01<br>Fecha: Agosto 2025 |
|---|---|---|

| FECHA DE INFORME | | |
|---|---|---|
| MM | DD | AAAA |
| OCTUBRE | 31 | 2025 |

| CONTRATO Nº | CONTRATANTE | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|
| 821 | ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN | CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 (CAG) | CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 |

| MES AL QUE PERTENECE EL INFORME | OBJETO DEL CONTRATO | SEDE / PROYECTO |
|---|---|---|
| OCTUBRE | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEIPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. | MUNICIPIO DE PUERTO GATAN |

## 1. Registro Semanal de Charlas / Capacitaciones SST

| Ítem | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | No. HORAS | Fecha Programada | Indicador cobertura | | | Indicador eficacia | | | Responsable O Líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total asistentes a la capacitación | Numero de trabajadores programados | % de Cumplimiento | Numero trabajadores evaluados | Numero de evaluaciones eficaces | % de Cumplimiento | |
| 1 | Inducción SG-SST | 2,00 | 24/10/2025 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | SST |
| 2 | Uso adecuado de guantes de seguridad | 0,15 | 25/10/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | SST |
| 3 | Uso adecuado de gafas de seguridad | 0,15 | 27/10/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | SST |
| 4 | Importancia de Estiramiento Muscular | 0,15 | 28/10/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | SST |
| 5 | Pausas Activas - Hidratación | 0,15 | 29/10/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | SST |
| 6 | Golpes de Calor | 0,15 | 30/10/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | SST |
| 7 | Condiciones de Calor | 0,15 | 31/10/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | SST |

## 2. Programa de Inspecciones: (Relacione las inspecciones ejecutadas durante la semana)

| Ítem | Inspección Realizada | Fecha | Periodicidad | Descripción del hallazgo | Plan de acción | Fecha del Cierre | % de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTIQUÍN | 20/10/2025 | Mensual | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 2 | CAMILLA | 20/10/2025 | Mensual | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 3 | EXTINTOR | 20/10/2025 | Mensual | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |

## 3. Seguimiento Semanal a Actividades adelantadas relacionadas a la implementación y ejecución del SG-SST

| Ítem | Descripción de Gestión SST y demás Actividades | Fecha | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Se realizó inducción del SG-SST a todo el personal vinculado al contrato. | 24/10/2025 | |
| 2 | Se realizó inspección de maquinaria y equipos, se validó documentación del operador. | Diaria | |
| 3 | Se da cumplimiento a las inspecciones planeadas de los equipos de emergencias. | Mensual | |
| 4 | Se realizan charlas pre operacionales, socializando las actividades programadas para ejecutar. | Diaria | |
| 5 | Participación en simulacro nacional de refugio y evacuación. | Anual | |

## 4. Inventario de Maquinaria y Equipos

| Ítem | Nombre del Equipo | Referencia | Propio o Alquilado | Nombre del Operador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCAVADORA | 97165 | ALQUILADO | YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES | NINGUNA |


## 5. Seguimiento a hallazgos y Condiciones de Seguridad, Salud y Ambiente

| Ítem | Descripción del hallazgo encontrado | Plan de Acción | Fecha | Se Notifico al Responsable | | Fecha propuesta para el cierre | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Si | No | | |
| 1 | NINGUNA | N/A | N/A | | | N/A | N/A |


## 6. Seguimiento Ausentismo Laboral

| Ítem | Fecha | Nombre del Trabajador | Cedula | Cargo | Periodo de ausentismo | | Total Dias de ausentismo | Descripción del ausentismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fecha Inicial | Fecha final | | |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 7. Seguimiento a indicadores de Accidentalidad




| |
|---|
| FATALIDAD |
| ACCIDENTE TRABAJO GRAVE |
| ACCIDENTE TRABAJO MODERADO |
| ACCIDENTE TRABAJO LEVE |
| INCIDENTES |




| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | INFORME MENSUAL<br>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Código: SST-F-077<br>Versión: 01<br>Fecha: Agosto 2025 |
|---|---|---|

| Ítem | Obra / Proyecto (Empresa contratista) | Promedio Trabajadores en el Mes | Total días trabajados en el Mes | HHT | INCIDENTE | AT LEVE | AT MODERADO | AT GRAVE | FATALIDAD | TOTAL AT | TOTAL DÍAS INCAPACIDAD | TOTAS DÍAS CARGADOS | INDICES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Mes | ÍNDICE DE FRECUENCIA | ÍNDICE DE SEVERIDAD | ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE | TASA DE AUSENTISMO | TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES |
| 1 | CAG | 11 | 17 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


## 8. Descripción de los Accidentes e Incidentes presentados durante la Semana

| Fecha del AT | Nombre | # Cedula | Ubicación y tipo de lesión | Incapacidad | Avance incapacidad | At investigado | Descripción del accidente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |


## 9. Registro Fotográfico de Gestión SST



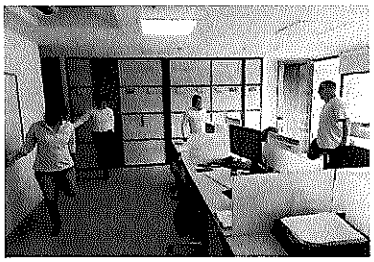
**Ubicación:**
OBRA
**Descripción:**
Inspección de botiquín y camilla.





**Ubicación:**
OBRA
**Descripción:**
Inspección de extintor



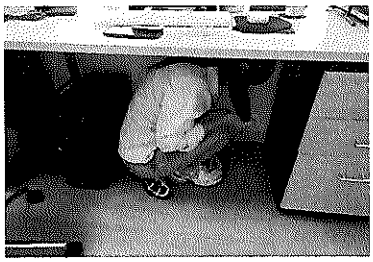
**Ubicación:**
OBRA
**Descripción:**
Inspección de camilla.




**Ubicación:**
OFICINA
**Descripción:**
Calistenia



**Ubicación:**
OFICINA
**Descripción:**
Calistenia



**Ubicación:**
OFICINA
**Descripción:**
Simulacro - Refugio





| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | INFORME MENSUAL<br>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Código: SST-F-077<br>Versión: 01<br>Fecha: Agosto 2025 |
|---|---|---|

| FECHA DE INFORME | | |
|---|---|---|
| MM | DD | AAAA |
| NOVIEMBRE | 30 | 2025 |

| CONTRATO Nº | CONTRATANTE | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|
| 821 | ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN | CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 (CAG) | CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 |

| MES AL QUE PERTENECE EL INFORME | OBJETO DEL CONTRATO | SEDE / PROYECTO |
|---|---|---|
| NOVIEMBRE | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEIPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. | MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN |

1. Registro Semanal de Charlas / Capacitaciones SST

| Ítem | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | No. HORAS | Fecha Programada | Indicador cobertura | | | Indicador eficacia | | | Responsable O Líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total asistentes a la capacitación | Numero de trabajadores programados | % de Cumplimiento | Numero trabajadores evaluados | Numero de evaluaciones eficaces | % de Cumplimiento | |
| 1 | RELACIONES INTERPESONALES | 0,15 | 3/11/2025 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | COORDINADOR SST |
| 2 | USO CORRECTO DE HERRAMIENTAS MANUALES | 0,15 | 5/11/2025 | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | COORDINADOR SST |
| 3 | USO ADECUADO DE PROTECCIÓN AUDITIVA | 0,15 | 7/11/2025 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | COORDINADOR SST |
| 4 | RIESGO LOCATIVO | 1,00 | 10/11/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | COORDINADOR SST |
| 5 | HIPOACUSIA | 0,15 | 12/11/2025 | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | COORDINADOR SST |
| 6 | ORDEN Y ASEO | 0,15 | 13/11/2025 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | COORDINADOR SST |
| 7 | FENOMENOS NATURALES | 0,15 | 14/11/2025 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | COORDINADOR SST |
| 8 | MANEJO MANUAL DE CARGAS | 1,00 | 15/11/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | COORDINADOR SST |
| 9 | CUIDADO DE MANOS | 0,15 | 22/11/2025 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | COORDINADOR SST |
| 10 | SOCIALIZACIÓN DE AT Y LECCIÓN APRENDIDA | 0,15 | 25/11/2025 | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | COORDINADOR SST |
| 11 | SOCIALIZACION DE USO ADECUADO DE GAFAS Y CARETA. | 0,15 | 26/11/2025 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | COORDINADOR SST |

2. Programa de Inspecciones (Relacione las inspecciones ejecutadas durante la semana)

| Ítem | Inspección Realizada | Fecha | Periodicidad | Descripción del hallazgo | Plan de acción | Fecha del Cierre | % de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTIQUÍN WACOYO | 19/11/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 2 | CAMILLA WACOYO | 19/11/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 3 | EXTINTOR WACOYO | 19/11/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 4 | HERRAMIENTAS MENORES | 19/11/2025 | QUINCENAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 5 | BOTIQUÍN AWALIBA | 20/11/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 6 | CAMILLA AWALIBA | 20/11/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 7 | EXTINTOR AWALIBA | 20/11/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 8 | LOCATIVA | 20/11/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 9 | BOTIQUÍN ASEIPOME | 21/11/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 10 | CAMILLA ASEIPOME | 21/11/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 11 | EXTINTOR ASEIPOME | 21/11/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 12 | HERRAMIENTAS MECÁNIZADAS | 21/11/2025 | QUINCENAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |

3. Seguimiento Semanal a Actividades adelantadas relacionadas a la implementación y ejecución del SG-SST

| Ítem | Descripción de Gestión SST y demás Actividades | Fecha | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SE VALIDÓ DOCUMENTACIÓN DEL OPERADOR. | SEMANAL | NINGUNA |
| 2 | SE DA CUMPLIMIENTO A LAS INSPECCIONES PLANEADAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS. | MENSUAL | NINGUNA |
| 3 | SE REALIZAN CHARLAS PRE OPERACIONALES, SOCIALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EJECUTAR. | DIARIA | NINGUNA |
| 4 | SE REALIZÓ INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO, LECCIÓN APRENDIDA Y SOCIALIZACIÓN. | OCASIONAL | NINGUNA |

4. Inventario de Maquinaria y Equipos

| Ítem | Nombre del Equipo | Referencia | Propio o Alquilado | Nombre del Operador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCAVADORA | 97165 | ALQUILADO | YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES | NINGUNA |

5. Seguimiento a Hallazgos y Condiciones de Seguridad, Salud y Ambiente

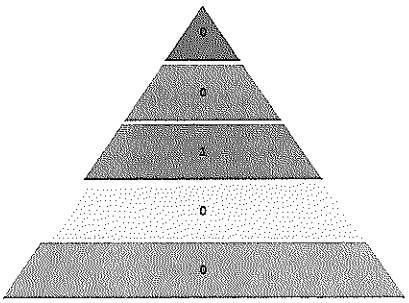
| Ítem | Descripción del hallazgo encontrado | Plan de Acción | Fecha | Se Notifico al Responsable | | Fecha propuesta para el cierre | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | No | | |
| 1 | NINGUNA | N/A | N/A | | | N/A | N/A |

6. Seguimiento Ausentismo Laboral

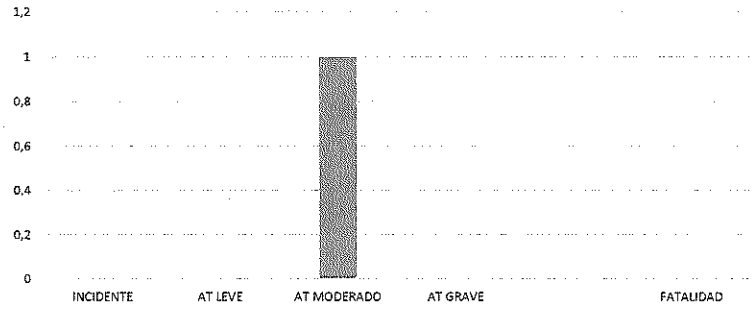
| Ítem | Fecha | Nombre del Trabajador | Cedula | Cargo | Periodo de ausentismo | | Total Dias de ausentismo | Descripción del ausentismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fecha Inicial | Fecha final | | |
| 1 | 17/11/2025 | BRISLEY RAMIREZ JIMENEZ | 1.122.236.284 | OFICIAL DE OBRA | 17/11/2025 | 21/11/2025 | 5 | TRANSTORNO EN EL OJO Y SUS ANEXOS NO ESPECIFICADO POR PROYECCIÓN DE PARTICULA DE ACERO. |

| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | INFORME MENSUAL<br>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Código: SST-F-077<br>Versión: 01<br>Fecha: Agosto 2025 |
|---|---|---|

## 7. Seguimiento a Indicadores de Accidentalidad




| |
|---|
| FATALIDAD |
| ACCIDENTE TRABAJO GRAVE |
| ACCIDENTE TRABAJO MODERADO |
| ACCIDENTE TRABAJO LEVE |
| INCIDENTES |




| Ítem | Obra / Proyecto (Empresa contratista) | Promedio Trabajadores en el Mes | Total días trabajados en el Mes | HHT | INCIDENTE | AT LEVE | AT MODERADO | AT GRAVE | FATALIDAD | TOTAL AT | TOTAL DÍAS INCAPACIDAD | TOTAS DÍAS CARGADOS | ÍNDICES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Mes | ÍNDICE DE FRECUENCIA | ÍNDICE DE SEVERIDAD | ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE | TASA DE AUSENTISMO | TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES |
| 1 | CAG | 13 | 30 | 1296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | NOVIEMBRE | 772 | 75 | 58 | 8,000 | 8 |

## 8. Descripción de los Accidentes e Incidentes presentados durante la Semana

| Fecha del AT | Nombre | # Cedula | Ubicación y tipo de lesión | Incapacidad | Avance incapacidad | At investigado | Descripción del accidente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | BRISLEY RAMIREZ JIMENEZ | 1122236284 | TRANSTORNO EN EL OJO | 5 DÍAS | FINALIZADA | SI | EL COLABORADOR SE ENCONTRABA EN LA OBRA ENCOFRANDO PARA FUNDIR EL PEDASTAL, SE REQUERÍA SOSTENER EL ENCOFRADO CON MADEROS 5x5 Y VARILLA DE ACERO, EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE DE ACERO CON LA PULIDORA, UNA VIRUTA DEL ACERO INGRESA EN EL OJO DERECHO, EL COLABORADOR CONTINUA SU ACTIVIDAD HASTA FINALIZAR LA JORNADA; EN LA NOCHE CONTINÚA CON LA MOLESTÍA EN EL OJO Y SE PRESENTA AL DÍA SIGUIENTE EN EL MÉDICO PARA VALORACIÓN. |

## 9. Registro Fotográfico de Gestión SST



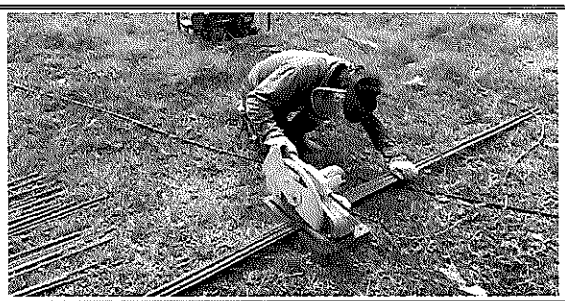
**Ubicación:**
OBRA
**Descripción:**
Inspección de botiquín.




**Ubicación:**
OFICINA
**Descripción:**
Inspección de extintor



**Ubicación:**
OBRA
**Descripción:**
Uso adecuado de EPP en alistamiento de acero.



**Ubicación:**
OBRA
**Descripción:**
Uso adecuado de EPP en la actividad de corte de acero.

| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | INFORME MENSUAL<br>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Código: SST-F-077<br>Versión: 01<br>Fecha: Agosto 2025 |
|---|---|---|

| FECHA DE INFORME | | |
|---|---|---|
| MM | DD | AAAA |
| DICIEMBRE | 31 | 2025 |

| CONTRATO Nº | CONTRATANTE | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|
| 821 | ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN | CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 (CAG) | CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 |

| MES AL QUE PERTENECE EL INFORME | OBJETO DEL CONTRATO | SEDE / PROYECTO |
|---|---|---|
| DICIEMBRE | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEIPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. | MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN |

**1. Registro Semanal de Charlas / Capacitaciones SST**

| Ítem | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | No. HORAS | Fecha Programada | Indicador cobertura | | | Indicador eficacia | | | Responsable O Líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total asistentes a la capacitación | Numero de trabajadores programados | % de Cumplimiento | Numero trabajadores evaluados | Numero de evaluaciones eficaces | % de Cumplimiento | |
| 1 | CALISTENIA - ESTIRAMIENTO MUSCULAR | 0,15 | 2/12/2025 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | COORDINADOR SST |
| 2 | ENFERMEDADES VIRALES | 0,15 | 5/12/2025 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | COORDINADOR SST |
| 3 | PELIGRO BIOMECÁNICO | 0,15 | 10/12/2025 | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | COORDINADOR SST |
| 4 | DISPOSICION CORRECTA DE RESIDUOS SOLIDOS | 1,00 | 12/12/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | COORDINADOR SST |
| 5 | PROYECCIÓN DE PARTICULAS | 0,15 | 15/12/2025 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | COORDINADOR SST |
| 6 | PROTECCIÓN DE LA PIEL | 0,15 | 16/12/2025 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | COORDINADOR SST |
| 7 | IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN | 0,15 | 17/12/2025 | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | COORDINADOR SST |
| 8 | USO DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS | 1,00 | 18/12/2025 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | COORDINADOR SST |
| 9 | DISTRACCIONES EN EL TRABAJO | 0,15 | 29/12/2025 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | COORDINADOR SST |

**2. Programa de inspecciones: (Relacione las inspecciones ejecutadas durante la semana)**

| Ítem | Inspección Realizada | Fecha | Periodicidad | Descripción del hallazgo | Plan de acción | Fecha del Cierre | % de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTIQUÍN WACOYO | 16/12/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 2 | CAMILLA WACOYO | 16/12/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 3 | EXTINTOR WACOYO | 16/12/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 4 | HERRAMIENTAS MENORES | 16/12/2025 | QUINCENAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 5 | BOTIQUÍN AWALIBA | 17/12/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 6 | CAMILLA AWALIBA | 17/12/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 7 | EXTINTOR AWALIBA | 17/12/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 8 | LOCATIVA | 17/12/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 9 | BOTIQUÍN ASEIPOME | 18/12/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 10 | CAMILLA ASEIPOME | 18/12/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 11 | EXTINTOR ASEIPOME | 18/12/2025 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 12 | HERRAMIENTAS MECÁNIZADAS | 18/12/2025 | QUINCENAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 13 | INSPECCIÓN DE EPP | 19/12/2025 | QUINCENAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |

**3. Seguimiento Semanal a Actividades adelantadas relacionadas a la implementación y ejecución del SG-SST**

| Ítem | Descripción de Gestión SST y demás Actividades | Fecha | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SE VALIDÓ DOCUMENTACIÓN DEL OPERADOR. | SEMANAL | NINGUNA |
| 2 | SE DA CUMPLIMIENTO A LAS INSPECCIONES PLANEADAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS. | MENSUAL | NINGUNA |
| 3 | SE REALIZAN CHARLAS PRE OPERACIONALES, SOCIALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EJECUTAR. | DIARIA | NINGUNA |
| 4 | SEGUIMIENTO AL USO DE EPP Y DOTACIÓN EN OBRA. | DIARIA | NINGUNA |

**4. Inventario de Maquinaria y Equipos**

| Ítem | Nombre del Equipo | Referencia | Propio o Alquilado | Nombre del Operador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCAVADORA | 97165 | PROPIO | YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES | NINGUNA |

**5. Seguimiento a hallazgos y Condiciones de Seguridad, Salud y Ambiente**

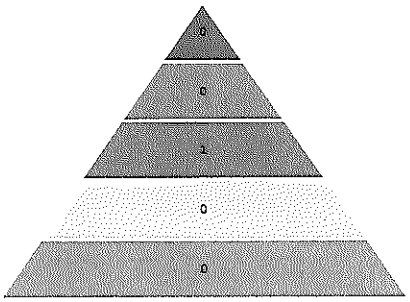
| Ítem | Descripción del hallazgo encontrado | Plan de Acción | Fecha | Se Notifico al Responsable | | Fecha propuesta para el cierre | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Si | No | | |
| 1 | NINGUNA | N/A | N/A | | | N/A | N/A |

**6. Seguimiento Ausentismo Laboral**

| Ítem | Fecha | Nombre del Trabajador | Cedula | Cargo | Periodo de ausentismo | | Total Dias de ausentismo | Descripción del ausentismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fecha Inicial | Fecha final | | |
| | | | | | | | | |

| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | INFORME MENSUAL<br>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Código: SST-F-077<br>Versión: 01<br>Fecha: Agosto 2025 |
|---|---|---|

## 7. Seguimiento a Indicadores de Accidentalidad




| |
|---|
| FATALIDAD |
| ACCIDENTE TRABAJO GRAVE |
| ACCIDENTE TRABAJO MODERADO |
| ACCIDENTE TRABAJO LEVE |
| INCIDENTES |




| Ítem | Obra / Proyecto (Empresa contratista) | Promedio Trabajadores en el Mes | Total días trabajados en el Mes | HHT | INCIDENTE | AT LEVE | AT MODERADO | AT GRAVE | FATALIDAD | TOTAL AT | TOTAL DÍAS INCAPACIDAD | TOTAS DIAS CARGADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAG | 11 | 31 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ÍNDICES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mes | ÍNDICE DE FRECUENCIA | ÍNDICE DE SEVERIDAD | ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE | TASA DE AUSENTISMO | TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES |
| DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 8. Descripción de los Accidentes e Incidentes presentados durante la Semana

| Fecha del AT | Nombre | # Cedula | Ubicación y tipo de lesión | Incapacidad | Avance incapacidad | At investigado | Descripción del accidente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

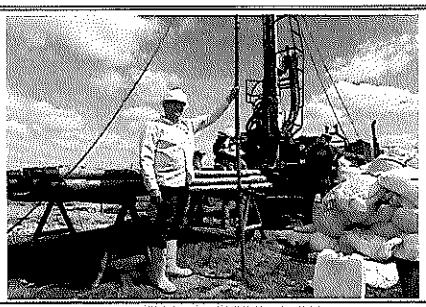
## 9. Registro Fotográfico de Gestión SST



| Ubicación: |
|---|
| OBRA |
| **Descripción:** |
| Inspección de botiquín, camilla y extintor. |



| Ubicación: |
|---|
| OBRA |
| **Descripción:** |
| Uso de botas de seguirdad |



| Ubicación: |
|---|
| OBRA |
| **Descripción:** |
| Uso adecuado de EPP en la actividad de registro |



| Ubicación: |
|---|
| OBRA |
| **Descripción:** |
| Uso adecuado de EPP en la actividad de registro |

| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | INFORME MENSUAL<br>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Código: SST-F-077<br>Versión: 01<br>Fecha: Agosto 2025 |
|---|---|---|

| FECHA DE INFORME | | |
|---|---|---|
| MM | DD | AAAA |
| ENERO | 21 | 2026 |

| CONTRATO Nº | CONTRATANTE | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|
| 821 | ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN | CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 (CAG) | CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 |

| MES AL QUE PERTENECE EL INFORME | OBJETO DEL CONTRATO | SEDE / PROYECTO |
|---|---|---|
| ENERO | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEIPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. | MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN |

## 1. Registro Semanal de Charlas / Capacitaciones SST

| Item | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | No. HORAS | Fecha Programada | Indicador cobertura | | | Indicador eficacia | | | Responsable O Líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total asistentes a la capacitación | Numero de trabajadores programados | % de Cumplimiento | Numero trabajadores evaluados | Numero de evaluaciones eficaces | % de Cumplimiento | |
| 1 | SOCIALIZACION DE AFICHE DE SIGNOS DE ALARMA DEL DENGUE. | 0,15 | 7/01/2026 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | COORDINADOR SST |
| 2 | COMUNICACIÓN ASERTIVA | 0,15 | 7/01/2026 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | COORDINADOR SST |
| 3 | DETENTE, PIENSA Y ACTUA - CLAVES PRINCIPALES | 0,15 | 10/01/2026 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | COORDINADOR SST |
| 4 | DETENTE, PIENSA Y ACTU - OBJETIVOS | 0,15 | 14/01/2026 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | COORDINADOR SST |
| 5 | EPP | 1,00 | 17/01/2026 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | COORDINADOR SST |
| 6 | ACCIDENTES OFIDICOS | 0,15 | 20/01/2026 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | COORDINADOR SST |

## 2. Programa de inspecciones: (Relacione las inspecciones ejecutadas durante la semana)

| Item | Inspección Realizada | Fecha | Periodicidad | Descripción del hallazgo | Plan de acción | Fecha del Cierre | % de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTIQUÍN WACOYO | 14/01/2026 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 2 | CAMILLA WACOYO | 14/01/2026 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 3 | EXTINTOR WACOYO | 14/01/2026 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 4 | HERRAMIENTAS MENORES | 8/01/2026 | QUINCENAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 5 | BOTIQUÍN AWALIBA | 9/01/2026 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 6 | CAMILLA AWALIBA | 9/01/2026 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 7 | EXTINTOR AWALIBA | 9/01/2026 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |
| 8 | LOCATIVA | 11/01/2026 | MENSUAL | NINGUNO | N/A | N/A | 100% |

## 3. Seguimiento Semanal a Actividades adelantadas relacionadas a la implementación y ejecución del SG-SST

| Item | Descripción de Gestión SST y demás Actividades | Fecha | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SE VALIDÓ DOCUMENTACIÓN DEL OPERADOR. | SEMANAL | NINGUNA |
| 2 | SE DA CUMPLIMIENTO A LAS INSPECCIONES PLANEADAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS. | MENSUAL | NINGUNA |
| 3 | SE REALIZAN CHARLAS PRE OPERACIONALES, SOCIALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EJECUTAR. | DIARIA | NINGUNA |
| 4 | SEGUIMIENTO AL USO DE EPP Y DOTACIÓN EN OBRA. | DIARIA | NINGUNA |

## 4. Inventario de Maquinaria y Equipos

| Item | Nombre del Equipo | Referencia | Propio o Alquilado | Nombre del Operador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCAVADORA | 97165 | PROPIO | YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES | NINGUNA |

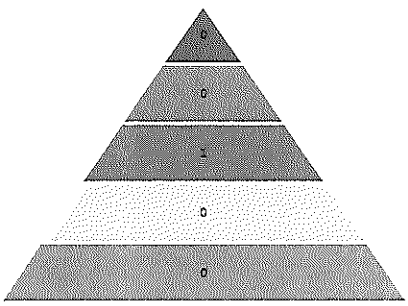
## 5. Seguimiento a hallazgos y Condiciones de Seguridad, Salud y Ambiente

| Item | Descripción del hallazgo encontrado | Plan de Acción | Fecha | Se Notifico al Responsable | | Fecha propuesta para el cierre | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | No | | |
| 1 | NINGUNA | N/A | N/A | | | N/A | N/A |


## 6. Seguimiento Ausentismo Laboral

| Item | Fecha | Nombre del Trabajador | Cedula | Cargo | Periodo de ausentismo | | Total Dias de ausentismo | Descripción del ausentismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fecha Inicial | Fecha final | | |
| | | | | | | | | |

## 7. Seguimiento a Indicadores de Accidentalidad




| |
|---|
| FATALIDAD |
| ACCIDENTE TRABAJO GRAVE |
| ACCIDENTE TRABAJO MODERADO |
| ACCIDENTE TRABAJO LEVE |
| INCIDENTES |



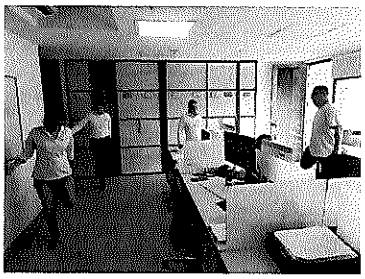
| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | INFORME MENSUAL<br>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Código: SST-F-077<br>Versión: 01<br>Fecha: Agosto 2025 |
|---|---|---|

| Ítem | Obra / Proyecto (Empresa contratista) | Promedio Trabajadores en el Mes | Total días trabajados en el Mes | HHT | INCIDENTE | AT LEVE | AT MODERADO | AT GRAVE | FATALIDAD | TOTAL AT | TOTAL DÍAS INCAPACIDAD | TOTAS DÍAS CARGADOS | INDICES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Mes | ÍNDICE DE FRECUENCIA | ÍNDICE DE SEVERIDAD | ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE | TASA DE AUSENTISMO | TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES |
| 1 | CAG | 18 | 15 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 8. Descripción de los Accidentes o Incidentes presentados durante la Semana

| Fecha del AT | Nombre | # Cedula | Ubicación y tipo de lesión | Incapacidad | Avance Incapacidad | At investigado | Descripción del accidente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## 9. Registro Fotográfico de Gestión SST



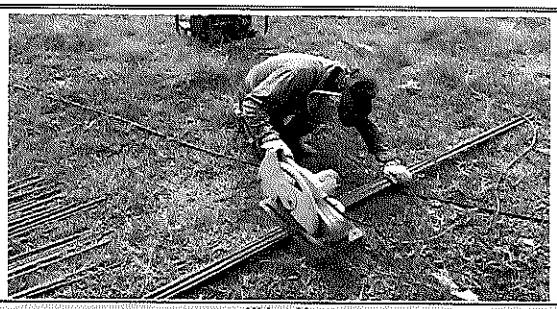
| Ubicación: |
|---|
| OFICINA |
| **Descripción:** |
| Estiramiento muscular |



| Ubicación: |
|---|
| OBRA |
| **Descripción:** |
| Ubicación de acero para asegurar la posición y realizar el corte de forma segura |



| Ubicación: |
|---|
| OBRA |
| **Descripción:** |
| Inspección de botiquín, camilla y extintor. |





| Ubicación: |
|---|
| OBRA |
| **Descripción:** |
| Uso de portección facial y de manos en actividad de corte de acero. |






| Ubicación: |
|---|
| OFICINA |
| **Descripción:** |
| Inspección de botiquín |






| Ubicación: |
|---|
| OFICINA |
| **Descripción:** |
| Inspección, ubicación, señalización de extintores y camilla |

## 10. Comentarios generales SST

| | |
|---|---|
| 1 | Es importante destacar que se ejecutaron actividades de suministros de equipos, estructura y materiales para el desarrollo del proyecto, por lo tanto no se conto con personal operativo en el proyecto. |
| 2 | De acuerdo a lo anterior se realiza el presente informe teniendo en cuenta el personal independiente, que debido al desarrollo de proyecto solo se realizaron actividades de inspección. |

| | |
|---|---|
| FIRMA | |
| NOMBRE | GUSTAVO MEDINA |
| CARGO | RESPONSABLE SST |

# ANEXO 3. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.365.630 – 1

# APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
# AGOSTO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 25151850 | 9491819049 | E | 2025/09/08 | 2025/09/16 | BANCO DE OCCIDENTE | 8 | $138,200 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: COFREM (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $442,367 | $70,800 | | | $442,367 | $17,700 | | | $442,367 | $17,700 | | | $442,367 | | $31,000 | | $0 | $0 | | $137,200 |
| Centro de Trabajo: OBRA PUERTO GAITAN (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $442,367 | $70,800 | | | $442,367 | $17,700 | | | $442,367 | $17,700 | | | $442,367 | | $31,000 | | $0 | $0 | | $137,200 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $442,367 | $70,800 | | | $442,367 | $17,700 | | | $442,367 | $17,700 | | | $442,367 | | $31,000 | | $0 | $0 | | $137,200 |
| 1 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPS005 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF34 | 2 | $94,900 | $3,800 | 14-11 | 2 | $94,900 | 6.960% | $6,700 | 2 | $0 | $0 | SI | $29,500 |
| 2 | CC | 17497322 | MURCIA JOJOA ROSEMBERG | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2 | $127,467 | $20,400 | EPS005 | 2 | $127,467 | $5,100 | CCF34 | 2 | $127,467 | $5,100 | 14-11 | 2 | $127,467 | 6.960% | $8,900 | 2 | $0 | $0 | SI | $39,500 |
| 3 | CC | 1121834340 | OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2 | $220,000 | $35,200 | EPS037 | 2 | $220,000 | $8,800 | CCF34 | 2 | $220,000 | $8,800 | 14-11 | 2 | $220,000 | 6.960% | $15,400 | 2 | $0 | $0 | SI | $68,200 |
| Total | | | Afiliados( 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $442,367 | $70,800 | | | $442,367 | $17,700 | | | $442,367 | $17,700 | | | $442,367 | | $31,000 | | $0 | $0 | | $137,200 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 25151850 | 9491819049 | E | 2025/09/08 | 2025/09/16 | BANCO DE OCCIDENTE | 8 | $138,200 |


RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $70,800 | $500 | $0 | $71,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $50,400 | $300 | $0 | $50,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $20,400 | $200 | $0 | $20,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $31,000 | $200 | $0 | $31,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $31,000 | $200 | $0 | $31,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $17,700 | $100 | $0 | $17,800 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 3 | $17,700 | $100 | $0 | $17,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $17,700 | $200 | $0 | $17,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $8,800 | $100 | $0 | $8,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $8,900 | $100 | $0 | $9,000 |
| TOTAL | | | | 3 | $137,200 | $1,000 | $0 | $138,200 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-08 | Periodo Salud | 2025-09 |
| Fecha límite de pago | 2025/09/08 | Fecha de pago | 2025/09/16 |
| Dias de mora | 8 | Tasa de mora | 26.16% |

## TOTALES

| | |
|---|---|
| Valor a pagar | $137,200 |
| Intereses de mora | $1,000 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $138,200 |

## DATOS DE LA TRANSACCIÓN

| | |
|---|---|
| Clave planilla | 9491819049 |
| Clave de pago | 25151850 |
| Banco | BANCO DE OCCIDENTE |



2025/09/17 08:12 AM

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1000000277 | 9491367542 | Y | 2025/09/08 | 2025/09/17 | BANCO DE BOGOTA | 7 | $13,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vcl | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $189,800 | | $13,400 | | $0 | $0 | | $13,400 |
| **Centro de Trabajo: OBRA PUERTO GAITAN (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $189,800 | | $13,400 | | $0 | $0 | | $13,400 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $189,800 | | $13,400 | | $0 | $0 | | $13,400 |
| 1 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY YANESA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 14-11 | 2 | $94,900 | 6.960% | $6,700 | 0 | $0 | $0 | No | $6,700 |
| 2 | CC | 86040134 | GUZMAN PASTRANA EDWIN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 14-11 | 2 | $94,900 | 6.960% | $6,700 | 0 | $0 | $0 | No | $6,700 |
| Total | Afiliados( 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $189,800 | | $13,400 | | $0 | $0 | | $13,400 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1000000277 | 9491367542 | Y | 2025/09/08 | 2025/09/17 | BANCO DE BOGOTA | 7 | $13,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $13,400 | $100 | $0 | $13,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 2 | $13,400 | $100 | $0 | $13,500 |
| TOTAL | | | | 2 | $13,400 | $100 | $0 | $13,500 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-08 | Periodo Salud | 2025-08 |
| Fecha límite de pago | 2025/09/08 | Fecha de pago | 2025/09/17 |
| Dias de mora | 7 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $13,400 |
| Intereses de mora | $100 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $13,500 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9491367542 |
| Clave de pago | 1000000277 |
| Banco | BANCO DE BOGOTA |



2025/09/17 08:02 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1121902403 | | GARZON GARCIA WENDY VANESA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 3 B ESTE 19 22 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1000000280 | 9491818606 | I | 2025/09/02 | 2025/09/17 | BANCO DE BOGOTA | 14 | $27,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1121902403 | GARZON WENDY | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 2 | EPS005 | 2 | | 0 | | 0 | 0.000% | 0 | No |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1121902403 | | GARZON GARCIA WENDY VANESA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 3 B ESTE 19 22 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1000000280 | 9491818606 | I | 2025/09/02 | 2025/09/17 | BANCO DE BOGOTA | 14 | $27,500 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $15,200 | $200 | $0 | $15,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $15,200 | $200 | $0 | $15,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $11,900 | $200 | $0 | $12,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $11,900 | $200 | $0 | $12,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $27,100 | $400 | $0 | $27,500 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86040134 | | GUZMAN PASTRANA EDWIN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 4 C N.° 24 - 77 | VILLAVICENCIO-META | 3204992242 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 49305921 | 9490726365 | I | 2025/09/08 | 2025/09/03 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $618,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META ( 1 Afiliados) | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 86040134 | GUZMAN EDWIN | Z5-14 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS002 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | $48,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |



2025/09/03 04:22 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86040134 | | GUZMAN PASTRANA EDWIN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 4 C N. 24 - 77 | VILLAVICENCIO-META | 3204992242 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 49305921 | 9490726365 | I | 2025/09/08 | 2025/09/03 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $618,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $48,800 | $0 | $0 | $48,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $48,800 | $0 | $0 | $48,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $618,800 | $0 | $0 | $618,800 |



2025/09/03 04:22 PM

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1777900502 | 9491787414 | E | 2025/09/15 | 2025/09/15 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,343,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: VILLAVO (6 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,719,100 | $2,035,400 | | | $12,719,100 | $509,000 | | | $12,719,100 | $509,000 | | | $12,719,100 | | $289,700 | | $0 | $0 | | $3,343,100 |
| Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,256,100 | $1,481,200 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | | $48,600 | | $0 | $0 | | $2,270,600 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,256,100 | $1,481,200 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | | $48,600 | | $0 | $0 | | $2,270,600 |
| 1 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,381,400 | $541,100 | EPS005 | 30 | $3,381,400 | $135,300 | CCF34 | 30 | $3,381,400 | $135,300 | 14-11 | 30 | $3,381,400 | 0.522% | $17,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $829,400 |
| 2 | CC | 40328285 | GOMEZ LEAL LINA MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,749,000 | $279,900 | EPS005 | 30 | $1,749,000 | $70,000 | CCF34 | 30 | $1,749,000 | $70,000 | 14-11 | 30 | $1,749,000 | 0.522% | $9,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $429,100 |
| 3 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,702,200 | $432,400 | EPS005 | 30 | $2,702,200 | $108,100 | CCF34 | 30 | $2,702,200 | $108,100 | 14-11 | 30 | $2,702,200 | 0.522% | $14,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $662,800 |
| 4 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $349,300 |
| Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,463,000 | $554,200 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | | $241,100 | | $0 | $0 | | $1,072,500 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,463,000 | $554,200 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | | $241,100 | | $0 | $0 | | $1,072,500 |
| 5 | CC | 80013513 | MUÑOZ MURCIA JEMMY ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | | | X | | | 230301 | 30 | $2,039,500 | $326,400 | EPS005 | 30 | $2,039,500 | $81,600 | CCF34 | 30 | $2,039,500 | $81,600 | 14-11 | 30 | $2,039,500 | 6.960% | $142,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $631,600 |
| 6 | CC | 96193788 | PEREZ PEREZ OBER ASMED | | | | | | | | | | | | | | | X | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $440,900 |
| Total | | | Afiliados( 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,719,100 | $2,035,400 | | | $12,719,100 | $509,000 | | | $12,719,100 | $509,000 | | | $12,719,100 | | $289,700 | | $0 | $0 | | $3,343,100 |


## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1777900502 | 9491787414 | E | 2025/09/15 | 2025/09/15 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,343,100 |


## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $2,035,400 | $0 | $0 | $2,035,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,201,300 | $0 | $0 | $1,201,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $834,100 | $0 | $0 | $834,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $289,700 | $0 | $0 | $289,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $289,700 | $0 | $0 | $289,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $509,000 | $0 | $0 | $509,000 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 6 | $509,000 | $0 | $0 | $509,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $509,000 | $0 | $0 | $509,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $509,000 | $0 | $0 | $509,000 |
| TOTAL | | | | 6 | $3,343,100 | $0 | $0 | $3,343,100 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-08 | Periodo Salud | 2025-09 |
| Fecha límite de pago | 2025/09/15 | Fecha de pago | 2025/09/15 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $3,343,100 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $3,343,100 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9491787414 |
| Clave de pago | 1777900502 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2025/09/16 02:53 PM

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.365.630 – 1

# APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
# SEPTIEMBRE 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1825304093 | 9492846565 | E | 2025/10/08 | 2025/10/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $4,862,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: COFREM (4 Afiliados)** | | | | | | | $17,635,500 | $2,931,800 | | | $17,635,500 | $705,500 | | | $17,635,500 | $705,500 | | | $17,635,500 | | $519,400 | | $0 | $0 | | $4,862,200 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)** | | | | | | | $11,000,000 | $1,870,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | | $57,500 | | $0 | $0 | | $2,807,500 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados) | | | | | | | $11,000,000 | $1,870,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | | $57,500 | | $0 | $0 | | $2,807,500 |
| 1 | CC | 86051533 | MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO | X | 230301 | 30 | $11,000,000 | $1,870,000 | EPS005 | 30 | $11,000,000 | $440,000 | CCF34 | 30 | $11,000,000 | $440,000 | 14-11 | 30 | $11,000,000 | 0.522% | $57,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $2,807,500 |
| **Centro de Trabajo: OBRA PUERTO GAITAN (3 Afiliados)** | | | | | | | $6,635,500 | $1,061,800 | | | $6,635,500 | $265,500 | | | $6,635,500 | $265,500 | | | $6,635,500 | | $461,900 | | $0 | $0 | | $2,054,700 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados) | | | | | | | $6,635,500 | $1,061,800 | | | $6,635,500 | $265,500 | | | $6,635,500 | $265,500 | | | $6,635,500 | | $461,900 | | $0 | $0 | | $2,054,700 |
| 2 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $440,900 |
| 3 | CC | 17497322 | MURCIA JOJOA ROSEMBERG | | 230301 | 30 | $1,912,000 | $306,000 | EPS005 | 30 | $1,912,000 | $76,500 | CCF34 | 30 | $1,912,000 | $76,500 | 14-11 | 30 | $1,912,000 | 6.960% | $133,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $592,100 |
| 4 | CC | 1121834340 | OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO | | 25-14 | 30 | $3,300,000 | $528,000 | EPS037 | 30 | $3,300,000 | $132,000 | CCF34 | 30 | $3,300,000 | $132,000 | 14-11 | 30 | $3,300,000 | 6.960% | $229,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,021,700 |
| Total | | | Afiliados( 4) | | | | $17,635,500 | $2,931,800 | | | $17,635,500 | $705,500 | | | $17,635,500 | $705,500 | | | $17,635,500 | | $519,400 | | $0 | $0 | | $4,862,200 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1825304093 | 9492846565 | E | 2025/10/08 | 2025/10/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $4,862,200 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $2,931,800 | $0 | $0 | $2,931,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $755,800 | $0 | $0 | $755,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $2,176,000 | $0 | $0 | $2,176,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $519,400 | $0 | $0 | $519,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 4 | $519,400 | $0 | $0 | $519,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $705,500 | $0 | $0 | $705,500 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 4 | $705,500 | $0 | $0 | $705,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $705,500 | $0 | $0 | $705,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $132,000 | $0 | $0 | $132,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $573,500 | $0 | $0 | $573,500 |
| TOTAL | | | | 4 | $4,862,200 | $0 | $0 | $4,862,200 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-09 | Periodo Salud | 2025-10 |
| Fecha límite de pago | 2025/10/08 | Fecha de pago | 2025/10/03 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $4,862,200 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $4,862,200 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9492846565 |
| Clave de pago | 1825304093 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2025/10/03 04:09 PM

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1825334048 | 9492846748 | E | 2025/10/08 | 2025/10/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $332,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: COFREM (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,073,334 | $171,800 | | | $1,073,334 | $43,000 | | | $1,073,334 | $43,000 | | | $1,073,334 | | $74,800 | | $0 | $0 | | $332,600 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,073,334 | $171,800 | | | $1,073,334 | $43,000 | | | $1,073,334 | $43,000 | | | $1,073,334 | | $74,800 | | $0 | $0 | | $332,600 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,073,334 | $171,800 | | | $1,073,334 | $43,000 | | | $1,073,334 | $43,000 | | | $1,073,334 | | $74,800 | | $0 | $0 | | $332,600 |
| 1 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY VANESA | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 14 | $1,073,334 | $171,800 | EPS005 | 14 | $1,073,334 | $43,000 | CCF34 | 14 | $1,073,334 | $43,000 | 14-11 | 14 | $1,073,334 | 6.960% | $74,800 | 14 | $0 | $0 | SI | $332,600 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,073,334 | $171,800 | | | $1,073,334 | $43,000 | | | $1,073,334 | $43,000 | | | $1,073,334 | | $74,800 | | $0 | $0 | | $332,600 |


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1825334048 | 9492846748 | E | 2025/10/08 | 2025/10/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $332,600 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $171,800 | $0 | $0 | $171,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $171,800 | $0 | $0 | $171,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $74,800 | $0 | $0 | $74,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $74,800 | $0 | $0 | $74,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $43,000 | $0 | $0 | $43,000 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 1 | $43,000 | $0 | $0 | $43,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $43,000 | $0 | $0 | $43,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $43,000 | $0 | $0 | $43,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $332,600 | $0 | $0 | $332,600 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-09 | Periodo Salud | 2025-10 |
| Fecha límite de pago | 2025/10/08 | Fecha de pago | 2025/10/03 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $332,600 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $332,600 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9492846748 |
| Clave de pago | 1825334048 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2025/10/03 04:08 PM

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1121902403 | | GARZON GARCIA WENDY VANESA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 3 B ESTE 19 22 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 25153626 | 9492259892 | I | 2025/10/02 | 2025/10/02 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $220,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | sln | ige | lma | vac | avp | vct | tit | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1121902403 | GARZON WENDY | X | X | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 16 | EPS005 | 16 | | 0 | 14-11 | 16 | 0.522% | 0 | No |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1121902403 | | GARZON GARCIA WENDY VANESA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 3 B ESTE 19 22 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 25153626 | 9492259892 | I | 2025/10/02 | 2025/10/02 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $220,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $121,500 | $0 | $0 | $121,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $121,500 | $0 | $0 | $121,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $4,000 | $0 | $0 | $4,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $4,000 | $0 | $0 | $4,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $94,900 | $0 | $0 | $94,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $94,900 | $0 | $0 | $94,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $220,400 | $0 | $0 | $220,400 |

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 25153822 | 9492295185 | Y | 2025/10/08 | 2025/10/02 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $152,000 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $2,182,700 | | $152,000 | | $0 | $0 | | $152,000 |
| Centro de Trabajo: OBRA PUERTO GAITAN (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $2,182,700 | | $152,000 | | $0 | $0 | | $152,000 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $2,182,700 | | $152,000 | | $0 | $0 | | $152,000 |
| 1 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY YANESA | | T | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 14-11 | 16 | $759,200 | 6.960% | $52,900 | 0 | $0 | $0 | No | $52,900 |
| 2 | CC | 86040134 | GUZMAN PASTRANA EDWIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 0 | $0 | $0 | No | $99,100 |
| Total | Afiliados( 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $2,182,700 | | $152,000 | | $0 | $0 | | $152,000 |


## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 25153822 | 9492295185 | Y | 2025/10/08 | 2025/10/02 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $152,000 |


## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $152,000 | $0 | $0 | $152,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 2 | $152,000 | $0 | $0 | $152,000 |
| TOTAL | | | | 2 | $152,000 | $0 | $0 | $152,000 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-09 | Periodo Salud | 2025-09 |
| Fecha límite de pago | 2025/10/08 | Fecha de pago | 2025/10/02 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $152,000 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $152,000 |

| DATOS DE LA TRANSACCION | |
|---|---|
| Clave planilla | 9492295185 |
| Clave de pago | 25153822 |
| Banco | BANCO DE OCCIDENTE |



2025/10/02 10:28 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86040134 | | GUZMAN PASTRANA EDWIN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 4 C N.° 24 - 77 | VILLAVICENCIO-META | 3204992242 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 29181081 | 9492155718 | 1 | 2025/10/08 | 2025/10/09 | BANCO DE OCCIDENTE | 1 | $619,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META ( 1 Afiliados) | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 86040134 | GUZMAN EDWIN | 25-14 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS002 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | $48,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | $48,800 | | $0 | $0 |



2025/10/09 01:08 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86040134 | | GUZMAN PASTRANA EDWIN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 4 C N. 24 - 77 | VILLAVICENCIO-META | 3204992242 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 29181081 | 9492155718 | I | 2025/10/08 | 2025/10/09 | BANCO DE OCCIDENTE | 1 | $619,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $200 | $0 | $320,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $320,000 | $200 | $0 | $320,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $48,800 | $100 | $0 | $48,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $48,800 | $100 | $0 | $48,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $200 | $0 | $250,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $250,000 | $200 | $0 | $250,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $618,800 | $500 | $0 | $619,300 |



2025/10/09 01:08 PM

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1818854244 | 9492794183 | E | 2025/10/16 | 2025/10/01 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,332,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VILLAVO (6 Afiliados)** | | | | | | | $12,719,100 | $2,035,400 | | | $12,719,100 | $509,000 | | | $12,624,200 | $505,200 | | | $12,719,100 | | $283,100 | | $0 | $0 | | $3,332,700 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)** | | | | | | | $9,256,100 | $1,481,200 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | | $48,600 | | $0 | $0 | | $2,270,600 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados) | | | | | | | $9,256,100 | $1,481,200 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | | $48,600 | | $0 | $0 | | $2,270,600 |
| 1 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | 25-14 | 30 | $3,381,400 | $541,100 | EPS005 | 30 | $3,381,400 | $135,300 | CCF34 | 30 | $3,381,400 | $135,300 | 14-11 | 30 | $3,381,400 | 0.522% | $17,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $829,400 |
| 2 | CC | 40328285 | GOMEZ LEAL LINA MARCELA | | 230301 | 30 | $1,749,000 | $279,900 | EPS005 | 30 | $1,749,000 | $70,000 | CCF34 | 30 | $1,749,000 | $70,000 | 14-11 | 30 | $1,749,000 | 0.522% | $9,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $429,100 |
| 3 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIYA YAMIRA | | 25-14 | 30 | $2,702,200 | $432,400 | EPS005 | 30 | $2,702,200 | $108,100 | CCF34 | 30 | $2,702,200 | $108,100 | 14-11 | 30 | $2,702,200 | 0.522% | $14,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $662,800 |
| 4 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $349,300 |
| **Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)** | | | | | | | $3,463,000 | $554,200 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,368,100 | $134,800 | | | $3,463,000 | | $234,500 | | $0 | $0 | | $1,062,100 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados) | | | | | | | $3,463,000 | $554,200 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,368,100 | $134,800 | | | $3,463,000 | | $234,500 | | $0 | $0 | | $1,062,100 |
| 5 | CC | 80013513 | MUÑOZ MURCIA JEIWAY ALEJANDRO | | 230301 | 30 | $2,039,500 | $326,400 | EPS005 | 30 | $2,039,500 | $81,600 | CCF34 | 30 | $2,039,500 | $81,600 | 14-11 | 30 | $2,039,500 | 6.960% | $142,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $631,600 |
| 6 | CC | 96193788 | PEREZ PEREZ OBER ASMED | | 25-14 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS005 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF34 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | 6.960% | $92,500 | 28 | $0 | $0 | SI | $411,500 |
| 7 | CC | 96193788 | PEREZ PEREZ OBER ASMED | X | 25-14 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPS005 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $19,000 |
| Total Afiliados( 6) | | | | | | | $12,719,100 | $2,035,400 | | | $12,719,100 | $509,000 | | | $12,624,200 | $505,200 | | | $12,719,100 | | $283,100 | | $0 | $0 | | $3,332,700 |


## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1818854244 | 9492794183 | E | 2025/10/16 | 2025/10/01 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,332,700 |


## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $2,035,400 | $0 | $0 | $2,035,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,201,300 | $0 | $0 | $1,201,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $834,100 | $0 | $0 | $834,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $283,100 | $0 | $0 | $283,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $283,100 | $0 | $0 | $283,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $505,200 | $0 | $0 | $505,200 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 6 | $505,200 | $0 | $0 | $505,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $509,000 | $0 | $0 | $509,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $509,000 | $0 | $0 | $509,000 |
| **TOTAL** | | | | 6 | $3,332,700 | $0 | $0 | $3,332,700 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-09 | Periodo Salud | 2025-10 |
| Fecha límite de pago | 2025/10/16 | Fecha de pago | 2025/10/01 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $3,332,700 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $3,332,700 |

| DATOS DE LA TRANSACCION | |
|---|---|
| Clave planilla | 9492794183 |
| Clave de pago | 1818854244 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2025/10/02 08:05 AM

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.365.630 – 1

# APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
# OCTUBRE 2025

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1905669423 | 9494411431 | E | 2025/11/11 | 2025/11/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $6,534,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VILLAVICENCIO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,000,000 | $1,870,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | | $57,500 | | $0 | $0 | | $2,807,500 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,000,000 | $1,870,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | | $57,500 | | $0 | $0 | | $2,807,500 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,000,000 | $1,870,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | | $57,500 | | $0 | $0 | | $2,807,500 |
| 1 | CC | 86051533 | MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $11,000,000 | $1,870,000 | EPS005 | 30 | $11,000,000 | $440,000 | CCF34 | 30 | $11,000,000 | $440,000 | 14-11 | 30 | $11,000,000 | 0.522% | $57,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $2,807,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,032,921 | $1,925,600 | | | $12,032,921 | $481,900 | | | $12,032,921 | $481,900 | | | $12,032,921 | | $838,000 | | $0 | $0 | | $3,727,400 |
| **Centro de Trabajo: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,032,921 | $1,925,600 | | | $12,032,921 | $481,900 | | | $12,032,921 | $481,900 | | | $12,032,921 | | $838,000 | | $0 | $0 | | $3,727,400 |
| Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (10 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,032,921 | $1,925,600 | | | $12,032,921 | $481,900 | | | $12,032,921 | $481,900 | | | $12,032,921 | | $838,000 | | $0 | $0 | | $3,727,400 |
| 2 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $440,900 |
| 3 | CC | 1103470729 | CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 7 | $355,484 | $56,900 | CCFC55 | 7 | $355,484 | $14,300 | CCF34 | 7 | $355,484 | $14,300 | 14-11 | 7 | $355,484 | 6.960% | $24,800 | 7 | $0 | $0 | SI | $110,300 |
| 4 | CC | 78646546 | GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 7 | $355,484 | $56,900 | EPS037 | 7 | $355,484 | $14,300 | CCF34 | 7 | $355,484 | $14,300 | 14-11 | 7 | $355,484 | 6.960% | $24,800 | 7 | $0 | $0 | SI | $110,300 |
| 5 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY VANESA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230205 | 30 | $2,300,000 | $368,000 | EPS005 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | CCF34 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | 14-11 | 30 | $2,300,000 | 6.960% | $160,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $712,100 |
| 6 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 16 | $1,386,667 | $221,900 | EPS005 | 16 | $1,386,667 | $55,500 | CCF34 | 16 | $1,386,667 | $55,500 | 14-11 | 16 | $1,386,667 | 6.960% | $96,600 | 16 | $0 | $0 | SI | $429,500 |
| 7 | CC | 1093921945 | MONCADA CANO JOSE JAVIER | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 7 | $355,484 | $56,900 | EPS041 | 7 | $355,484 | $14,300 | CCF34 | 7 | $355,484 | $14,300 | 14-11 | 7 | $355,484 | 6.960% | $24,800 | 7 | $0 | $0 | SI | $110,300 |
| 8 | CC | 17497322 | MURCIA JOJOA ROSEMBERG | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,912,000 | $306,000 | EPS005 | 30 | $1,912,000 | $76,500 | CCF34 | 30 | $1,912,000 | $76,500 | 14-11 | 30 | $1,912,000 | 6.960% | $133,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $592,100 |
| 9 | CC | 1121834340 | OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,233,334 | $517,400 | EPS037 | 30 | $3,233,334 | $129,400 | CCF34 | 30 | $3,233,334 | $129,400 | 14-11 | 30 | $3,233,334 | 6.960% | $225,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,001,300 |
| 10 | CC | 1122236284 | RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 7 | $355,484 | $56,900 | EPS041 | 7 | $355,484 | $14,300 | CCF34 | 7 | $355,484 | $14,300 | 14-11 | 7 | $355,484 | 6.960% | $24,800 | 7 | $0 | $0 | SI | $110,300 |
| 11 | CC | 1004819005 | ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 7 | $355,484 | $56,900 | EPS041 | 7 | $355,484 | $14,300 | CCF34 | 7 | $355,484 | $14,300 | 14-11 | 7 | $355,484 | 6.960% | $24,800 | 7 | $0 | $0 | SI | $110,300 |
| Total Afiliados( 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $23,032,921 | $3,795,600 | | | $23,032,921 | $921,900 | | | $23,032,921 | $921,900 | | | $23,032,921 | | $895,500 | | $0 | $0 | | $6,534,900 |

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1905669423 | 9494411431 | E | 2025/11/11 | 2025/11/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $6,534,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 11 | $3,795,600 | $0 | $0 | $3,795,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $56,900 | $0 | $0 | $56,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $745,200 | $0 | $0 | $745,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $2,625,500 | $0 | $0 | $2,625,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $368,000 | $0 | $0 | $368,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $895,500 | $0 | $0 | $895,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 11 | $895,500 | $0 | $0 | $895,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $921,900 | $0 | $0 | $921,900 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 11 | $921,900 | $0 | $0 | $921,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 11 | $921,900 | $0 | $0 | $921,900 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $14,300 | $0 | $0 | $14,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $143,700 | $0 | $0 | $143,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 3 | $42,900 | $0 | $0 | $42,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 5 | $721,000 | $0 | $0 | $721,000 |
| TOTAL | | | | 11 | $6,534,900 | $0 | $0 | $6,534,900 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-10 | Periodo Salud | 2025-11 |
| Fecha límite de pago | 2025/11/11 | Fecha de pago | 2025/11/05 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $6,534,900 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $6,534,900 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9494411431 |
| Clave de pago | 1905669423 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2025/11/05 01:33 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1905640261 | 9494246827 | Y | 2025/11/11 | 2025/11/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $99,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing rel tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (1 Afiliados) | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $99,100 |
| Centro de Trabajo: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (1 Afiliados) | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $99,100 |
| Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (1 Afiliados) | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $99,100 |
| 1 | CC 86040134 | GUZMAN PASTRANA EDWIN | T | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 0 | $0 | $0 | No | $99,100 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $99,100 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1905640261 | 9494246827 | Y | 2025/11/11 | 2025/11/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $99,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |



2025/11/05 01:36 PM

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-10 | Periodo Salud | 2025-10 |
| Fecha límite de pago | 2025/11/11 | Fecha de pago | 2025/11/05 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $99,100 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $99,100 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9494246827 |
| Clave de pago | 1905640261 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2025/11/05 01:34 PM

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1906308883 | 9494412444 | E | 2025/11/19 | 2025/11/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,263,000 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VILLAVO (6 Afiliados)** | | | | | | | $12,719,101 | $2,035,500 | | | $12,719,101 | $509,100 | | | $12,719,101 | $509,100 | | | $12,719,101 | | $709,300 | | $0 | $0 | | $3,263,000 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)** | | | | | | | $9,256,100 | $1,481,200 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | | $48,600 | | $0 | $0 | | $2,270,600 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados) | | | | | | | $9,256,100 | $1,481,200 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | $370,400 | | | $9,256,100 | | $48,600 | | $0 | $0 | | $2,270,600 |
| 1 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | 25-14 | 30 | $3,381,400 | $541,100 | EPS005 | 30 | $3,381,400 | $135,300 | CCF34 | 30 | $3,381,400 | $135,300 | 14-11 | 30 | $3,381,400 | 0.522% | $17,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $829,400 |
| 2 | CC | 40328285 | GOMEZ LEAL LINA MARCELA | | 230301 | 30 | $1,749,000 | $279,900 | EPS005 | 30 | $1,749,000 | $70,000 | CCF34 | 30 | $1,749,000 | $70,000 | 14-11 | 30 | $1,749,000 | 0.522% | $9,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $429,100 |
| 3 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO OIVA YANIRA | | 25-14 | 30 | $2,702,200 | $432,400 | EPS005 | 30 | $2,702,200 | $108,100 | CCF34 | 30 | $2,702,200 | $108,100 | 14-11 | 30 | $2,702,200 | 0.522% | $14,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $662,800 |
| 4 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $349,300 |
| **Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)** | | | | | | | $3,463,001 | $554,300 | | | $3,463,001 | $138,700 | | | $3,463,001 | $138,700 | | | $3,463,001 | | $160,700 | | $0 | $0 | | $992,400 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados) | | | | | | | $3,463,001 | $554,300 | | | $3,463,001 | $138,700 | | | $3,463,001 | $138,700 | | | $3,463,001 | | $160,700 | | $0 | $0 | | $992,400 |
| 5 | CC | 80013513 | MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO | | 230301 | 13 | $883,784 | $141,500 | EPS005 | 13 | $883,784 | $35,400 | CCF34 | 13 | $883,784 | $35,400 | 14-11 | 13 | $883,784 | 6.960% | $61,600 | 13 | $0 | $0 | SI | $273,900 |
| 6 | CC | 80013513 | MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO | X | 230301 | 17 | $1,155,717 | $185,000 | EPS005 | 17 | $1,155,717 | $46,300 | CCF34 | 17 | $1,155,717 | $46,300 | 14-11 | 17 | $1,155,717 | 0.000% | $0 | 17 | $0 | $0 | SI | $277,600 |
| 7 | CC | 96193788 | PEREZ PEREZ OBER ASMED | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $440,900 |
| Total | | | Afiliados( 6) | | | | $12,719,101 | $2,035,500 | | | $12,719,101 | $509,100 | | | $12,719,101 | $509,100 | | | $12,719,101 | | $209,300 | | $0 | $0 | | $3,263,000 |


## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1906308883 | 9494412444 | E | 2025/11/19 | 2025/11/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,263,000 |


## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $2,035,500 | $0 | $0 | $2,035,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,201,300 | $0 | $0 | $1,201,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $834,200 | $0 | $0 | $834,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $209,300 | $0 | $0 | $209,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $209,300 | $0 | $0 | $209,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $509,100 | $0 | $0 | $509,100 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 6 | $509,100 | $0 | $0 | $509,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $509,100 | $0 | $0 | $509,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $509,100 | $0 | $0 | $509,100 |
| TOTAL | | | | 6 | $3,263,000 | $0 | $0 | $3,263,000 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-10 | Periodo Salud | 2025-11 |
| Fecha límite de pago | 2025/11/19 | Fecha de pago | 2025/11/05 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $3,263,000 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $3,263,000 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9494412444 |
| Clave de pago | 1906308883 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2025/11/05 06:00 PM

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

# APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
# NOVIEMBRE 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1984605086 | 9496078479 | E | 2025/12/09 | 2025/12/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $8,460,800 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: VILLAVICENCIO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,000,000 | $1,870,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | | $57,500 | | $0 | $0 | | $2,807,500 |
| Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,000,000 | $1,870,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | | $57,500 | | $0 | $0 | | $2,807,500 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,000,000 | $1,870,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | | $57,500 | | $0 | $0 | | $2,807,500 |
| 1 | CC | 86051533 | MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $11,000,000 | $1,870,000 | EPS005 | 30 | $11,000,000 | $440,000 | CCF34 | 30 | $11,000,000 | $440,000 | 14-11 | 30 | $11,000,000 | 0.522% | $57,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $2,807,500 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (12 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,342,801 | $2,935,300 | | | $18,342,801 | $734,100 | | | $18,096,792 | $724,300 | | | $18,342,801 | | $1,259,600 | | $0 | $0 | | $5,653,300 |
| Centro de Trabajo: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (12 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,342,801 | $2,935,300 | | | $18,342,801 | $734,100 | | | $18,096,792 | $724,300 | | | $18,342,801 | | $1,259,600 | | $0 | $0 | | $5,653,300 |
| Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (12 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,342,801 | $2,935,300 | | | $18,342,801 | $734,100 | | | $18,096,792 | $724,300 | | | $18,342,801 | | $1,259,600 | | $0 | $0 | | $5,653,300 |
| 2 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $440,900 |
| 3 | CC | 1103470729 | CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,523,500 | $243,800 | CCFC5 5 | 30 | $1,523,500 | $61,000 | CCF34 | 30 | $1,523,500 | $61,000 | 14-11 | 30 | $1,523,500 | 6.960% | $106,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $471,900 |
| 4 | CC | 8191822 | GAITAN GAITAN LEONARDO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23020 1 | 2 | $94,900 | $15,200 | CCFC5 5 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF34 | 2 | $98,854 | $4,000 | 14-11 | 2 | $94,900 | 6.960% | $6,700 | 2 | $0 | $0 | SI | $29,700 |
| 5 | CC | 1147694823 | GAITAN LEON SALOMON | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPSIC6 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF34 | 2 | $98,854 | $4,000 | 14-11 | 2 | $94,900 | 6.960% | $6,700 | 2 | $0 | $0 | SI | $29,700 |
| 6 | CC | 78646546 | GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $1,523,500 | $243,800 | EPS037 | 30 | $1,523,500 | $61,000 | CCF34 | 30 | $1,523,500 | $61,000 | 14-11 | 30 | $1,523,500 | 6.960% | $106,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $471,900 |
| 7 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY VANESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $2,300,000 | $368,000 | EPS005 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | CCF34 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | 14-11 | 30 | $2,300,000 | 6.960% | $160,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $712,100 |
| 8 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,600,000 | $416,000 | EPS005 | 30 | $2,600,000 | $104,000 | CCF34 | 30 | $2,600,000 | $104,000 | 14-11 | 30 | $2,600,000 | 6.960% | $181,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $805,000 |
| 9 | CC | 1093921945 | MONCADA CANO JOSE JAVIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,523,500 | $243,800 | EPS041 | 30 | $1,523,500 | $61,000 | CCF34 | 30 | $1,523,500 | $61,000 | 14-11 | 30 | $1,523,500 | 6.960% | $106,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $471,900 |
| 10 | CC | 17497322 | MURCIA JOJOA ROSEMBERG | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,912,000 | $306,000 | EPS005 | 30 | $1,912,000 | $76,500 | CCF34 | 30 | $1,912,000 | $76,500 | 14-11 | 30 | $1,912,000 | 6.960% | $133,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $592,100 |
| 11 | CC | 1121834340 | OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,300,000 | $368,000 | EPS037 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | CCF34 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | 14-11 | 30 | $2,300,000 | 6.960% | $160,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $712,100 |
| 12 | CC | 1122236284 | RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 25 | $1,269,584 | $203,200 | EPS041 | 25 | $1,269,584 | $50,800 | CCF34 | 25 | $1,269,584 | $50,800 | 14-11 | 25 | $1,269,584 | 6.960% | $88,400 | 25 | $0 | $0 | SI | $393,200 |
| 13 | CC | 1122236284 | RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 5 | $253,917 | $40,700 | EPS041 | 5 | $253,917 | $10,200 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 5 | $253,917 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $50,900 |
| 14 | CC | 1004819005 | ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,523,500 | $243,800 | EPS041 | 30 | $1,523,500 | $61,000 | CCF34 | 30 | $1,523,500 | $61,000 | 14-11 | 30 | $1,523,500 | 6.960% | $106,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $471,900 |
| Total Afiliados( 13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $29,342,801 | $4,805,300 | | | $29,342,801 | $1,174,100 | | | $29,096,792 | $1,164,300 | | | $29,342,801 | | $1,317,100 | | $0 | $0 | | $8,460,800 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GALTAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1984605086 | 9496078479 | E | 2025/12/09 | 2025/12/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $8,460,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 13 | $4,805,300 | $0 | $0 | $4,805,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $243,800 | $0 | $0 | $243,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $595,800 | $0 | $0 | $595,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $3,582,500 | $0 | $0 | $3,582,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $383,200 | $0 | $0 | $383,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $1,317,100 | $0 | $0 | $1,317,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 13 | $1,317,100 | $0 | $0 | $1,317,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $1,164,300 | $0 | $0 | $1,164,300 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 13 | $1,164,300 | $0 | $0 | $1,164,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 13 | $1,174,100 | $0 | $0 | $1,174,100 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 2 | $64,800 | $0 | $0 | $64,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $153,000 | $0 | $0 | $153,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 3 | $183,000 | $0 | $0 | $183,000 |
| PIJAOSALUD | EPSIC6 | 809,008,362 | 2 | 1 | $3,800 | $0 | $0 | $3,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 5 | $769,500 | $0 | $0 | $769,500 |
| TOTAL | | | | 13 | $8,460,800 | $0 | $0 | $8,460,800 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-11 | Periodo Salud | 2025-12 |
| Fecha límite de pago | 2025/12/09 | Fecha de pago | 2025/12/05 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $8,460,800 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $8,460,800 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9496078479 |
| Clave de pago | 1984605086 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2025/12/05 02:17 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $9,100 | $100 | $0 | $9,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $9,100 | $100 | $0 | $9,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $4,000 | $100 | $0 | $4,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $4,000 | $100 | $0 | $4,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,300 | $100 | $0 | $2,400 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 1 | $2,300 | $100 | $0 | $2,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,300 | $100 | $0 | $2,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $2,300 | $100 | $0 | $2,400 |
| TOTAL | | | | 1 | $17,700 | $400 | $0 | $18,100 |

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 2012705645 | 9496491487 | N | 2025/12/09 | 2025/12/16 | BANCOLOMBIA | 7 | $18,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | ima | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $56,783 | $9,100 | | | $56,783 | $2,300 | | | $310,700 | $2,300 | | | $56,783 | | $4,000 | | | $0 | $0 | | $17,700 |
| Centro de Trabajo: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $56,783 | $9,100 | | | $56,783 | $2,300 | | | $310,700 | $2,300 | | | $56,783 | | $4,000 | | | $0 | $0 | | $17,700 |
| Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $56,783 | $9,100 | | | $56,783 | $2,300 | | | $310,700 | $2,300 | | | $56,783 | | $4,000 | | | $0 | $0 | | $17,700 |
| 1 | CC | 1122236284 | RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY | | | | | | | | A | | | o | o | | | | | | 23030 1 | 25 | ($1,269,584) | ($203,200) | EPS04 1 | 25 | ($1,269,584) | ($50,800) | CCF34 | 25 | ($1,269,584) | ($50,800) | 14-11 | 25 | ($1,269,584) | 6.960% | ($88,400) | 25 | $0 | $0 | SI | ($393,200) |
| 2 | CC | 1122236284 | RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY | | | | | | | | A | | | o | o | | | | X | | 23030 1 | 5 | ($253,917) | ($40,700) | EPS04 1 | 5 | ($253,917) | ($10,200) | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 5 | ($253,917) | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | ($50,900) |
| 3 | CC | 1122236284 | RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY | | | | | | | | C | X | | | | | | | | | 23030 1 | 25 | $1,326,367 | $212,300 | EPS04 1 | 25 | $1,326,367 | $53,100 | CCF34 | 25 | $1,326,367 | $53,100 | 14-11 | 25 | $1,326,367 | 6.960% | $92,400 | 25 | $0 | $0 | SI | $410,900 |
| 4 | CC | 1122236284 | RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY | | | | | | | | C | | | | | | | | X | | 23030 1 | 5 | $253,917 | $40,700 | EPS04 1 | 5 | $253,917 | $10,200 | CCF34 | 5 | $253,917 | $0 | 14-11 | 5 | $253,917 | 0.000% | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | $50,900 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $56,783 | $9,100 | | | $56,783 | $2,300 | | | $310,700 | $2,300 | | | $56,783 | | $4,000 | | | $0 | $0 | | $17,700 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-11 | Periodo Salud | 2025-12 |
| Fecha límite de pago | 2025/12/09 | Fecha de pago | 2025/12/16 |
| Dias de mora | 7 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $17,700 |
| Intereses de mora | $400 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $18,100 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9496491487 |
| Clave de pago | 2012705645 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2025/12/17 08:36 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1982567719 | 9496044520 | E | 2025/12/16 | 2025/12/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,336,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL VILLAVO (6 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,719,101 | $2,035,400 | | | $12,719,101 | $509,000 | | | $12,719,101 | $509,000 | | | $12,719,101 | | $283,200 | | $0 | $0 | | $3,336,600 |
| Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,256,101 | $1,481,200 | | | $9,256,101 | $370,400 | | | $9,256,101 | $370,400 | | | $9,256,101 | | $42,100 | | $0 | $0 | | $2,264,100 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,256,101 | $1,481,200 | | | $9,256,101 | $370,400 | | | $9,256,101 | $370,400 | | | $9,256,101 | | $42,100 | | $0 | $0 | | $2,264,100 |
| 1 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRAICY CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 19 | $2,141,554 | $342,700 | EPS005 | 19 | $2,141,554 | $85,700 | CCF34 | 19 | $2,141,554 | $85,700 | 14-11 | 19 | $2,141,554 | 0.522% | $11,200 | 19 | $0 | $0 | SI | $525,300 |
| 2 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRAICY CAROLINA | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 11 | $1,239,847 | $198,400 | EPS005 | 11 | $1,239,847 | $49,600 | CCF34 | 11 | $1,239,847 | $49,600 | 14-11 | 11 | $1,239,847 | 0.000% | $0 | 11 | $0 | $0 | SI | $297,600 |
| 3 | CC | 40328285 | GOMEZ LEAL LINA MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,749,000 | $279,900 | EPS005 | 30 | $1,749,000 | $70,000 | CCF34 | 30 | $1,749,000 | $70,000 | 14-11 | 30 | $1,749,000 | 0.522% | $9,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $429,100 |
| 4 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,702,200 | $432,400 | EPS005 | 30 | $2,702,200 | $108,100 | CCF34 | 30 | $2,702,200 | $108,100 | 14-11 | 30 | $2,702,200 | 0.522% | $14,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $662,800 |
| 5 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $349,300 |
| Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,463,000 | $554,200 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | | $241,100 | | $0 | $0 | | $1,072,500 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,463,000 | $554,200 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | | $241,100 | | $0 | $0 | | $1,072,500 |
| 6 | CC | 80013513 | MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,039,500 | $326,400 | EPS005 | 30 | $2,039,500 | $81,600 | CCF34 | 30 | $2,039,500 | $81,600 | 14-11 | 30 | $2,039,500 | 6.960% | $142,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $631,600 |
| 7 | CC | 96193788 | PEREZ PEREZ OBER ASMED | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $440,900 |
| Total | Afiliados( 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,719,101 | $2,035,400 | | | $12,719,101 | $509,000 | | | $12,719,101 | $509,000 | | | $12,719,101 | | $283,200 | | $0 | $0 | | $3,336,600 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1982567719 | 9496044520 | E | 2025/12/16 | 2025/12/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,336,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $2,035,400 | $0 | $0 | $2,035,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,201,300 | $0 | $0 | $1,201,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $834,100 | $0 | $0 | $834,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $283,200 | $0 | $0 | $283,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $283,200 | $0 | $0 | $283,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $509,000 | $0 | $0 | $509,000 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 6 | $509,000 | $0 | $0 | $509,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $509,000 | $0 | $0 | $509,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $509,000 | $0 | $0 | $509,000 |
| TOTAL | | | | 6 | $3,336,600 | $0 | $0 | $3,336,600 |



2025/12/05 06:57 AM

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

# APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
# DICIEMBRE 2025

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2026-01 | 2063091817 | 9497604877 | E | 2026/01/19 | 2026/01/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,332,200 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: VILLAVO (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,719,100 | $2,035,500 | | | $12,719,100 | $509,200 | | | $12,719,100 | $509,200 | | | $12,719,100 | | $278,300 | | $0 | $0 | | $3,332,200 |
| Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,256,100 | $1,481,300 | | | $9,256,100 | $370,600 | | | $9,256,100 | $370,600 | | | $9,256,100 | | $37,200 | | $0 | $0 | | $2,259,700 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,256,100 | $1,481,300 | | | $9,256,100 | $370,600 | | | $9,256,100 | $370,600 | | | $9,256,100 | | $37,200 | | $0 | $0 | | $2,259,700 |
| 1 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 23 | $2,592,407 | $414,800 | EPS005 | 23 | $2,592,407 | $103,700 | CCF34 | 23 | $2,592,407 | $103,700 | 14-11 | 23 | $2,592,407 | 0.522% | $13,600 | 23 | $0 | $0 | SI | $635,800 |
| 2 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 25-14 | 7 | $788,993 | $126,300 | EPS005 | 7 | $788,993 | $31,600 | CCF34 | 7 | $788,993 | $31,600 | 14-11 | 7 | $788,993 | 0.000% | $0 | 7 | $0 | $0 | SI | $189,500 |
| 3 | CC | 40328285 | GOMEZ LEAL LINA MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 23 | $1,340,900 | $214,600 | EPS005 | 23 | $1,340,900 | $53,700 | CCF34 | 23 | $1,340,900 | $53,700 | 14-11 | 23 | $1,340,900 | 0.522% | $7,000 | 23 | $0 | $0 | SI | $329,000 |
| 4 | CC | 40328285 | GOMEZ LEAL LINA MARCELA | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 23030 1 | 7 | $408,100 | $65,300 | EPS005 | 7 | $408,100 | $16,400 | CCF34 | 7 | $408,100 | $16,400 | 14-11 | 7 | $408,100 | 0.000% | $0 | 7 | $0 | $0 | SI | $98,100 |
| 5 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIVA YAHIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 23 | $2,071,687 | $331,500 | EPS005 | 23 | $2,071,687 | $82,900 | CCF34 | 23 | $2,071,687 | $82,900 | 14-11 | 23 | $2,071,687 | 0.522% | $10,900 | 23 | $0 | $0 | SI | $508,200 |
| 6 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIVA YAHIRA | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 25-14 | 7 | $630,513 | $100,900 | EPS005 | 7 | $630,513 | $25,300 | CCF34 | 7 | $630,513 | $25,300 | 14-11 | 7 | $630,513 | 0.000% | $0 | 7 | $0 | $0 | SI | $151,500 |
| 7 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 23 | $1,091,350 | $174,700 | EPS005 | 23 | $1,091,350 | $43,700 | CCF34 | 23 | $1,091,350 | $43,700 | 14-11 | 23 | $1,091,350 | 0.522% | $5,700 | 23 | $0 | $0 | SI | $267,800 |
| 8 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 23030 1 | 7 | $332,150 | $53,200 | EPS005 | 7 | $332,150 | $13,300 | CCF34 | 7 | $332,150 | $13,300 | 14-11 | 7 | $332,150 | 0.000% | $0 | 7 | $0 | $0 | SI | $79,800 |
| Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,463,000 | $554,200 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | | $241,100 | | $0 | $0 | | $1,072,500 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,463,000 | $554,200 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | $138,600 | | | $3,463,000 | | $241,100 | | $0 | $0 | | $1,072,500 |
| 9 | CC | 80013513 | MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,039,500 | $326,400 | EPS005 | 30 | $2,039,500 | $81,600 | CCF34 | 30 | $2,039,500 | $81,600 | 14-11 | 30 | $2,039,500 | 6.960% | $142,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $631,600 |
| 10 | CC | 96193788 | PEREZ PEREZ OBER ASMED | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $440,900 |
| Total Afiliados( 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,719,100 | $2,035,500 | | | $12,719,100 | $509,200 | | | $12,719,100 | $509,200 | | | $12,719,100 | | $278,300 | | $0 | $0 | | $3,332,200 |

en línea

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $2,035,500 | $0 | $0 | $2,035,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,201,300 | $0 | $0 | $1,201,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $834,200 | $0 | $0 | $834,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $278,300 | $0 | $0 | $278,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $278,300 | $0 | $0 | $278,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $509,200 | $0 | $0 | $509,200 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 6 | $509,200 | $0 | $0 | $509,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $509,200 | $0 | $0 | $509,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $509,200 | $0 | $0 | $509,200 |
| TOTAL | | | | 6 | $3,332,200 | $0 | $0 | $3,332,200 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-12 | Periodo Salud | 2026-01 |
| Fecha límite de pago | 2026/01/19 | Fecha de pago | 2026/01/06 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $3,332,200 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $3,332,200 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9497604877 |
| Clave de pago | 2063091817 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2026/01/06 11:49 AM

en línea

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-12 | 2026-01 | 2063008266 | 9497602330 | E | 2026/01/09 | 2026/01/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $7,646,400 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ins | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VILLAVICENCIO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,000,000 | $1,870,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | | $57,500 | | $0 | $0 | | $2,807,500 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,000,000 | $1,870,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | | $57,500 | | $0 | $0 | | $2,807,500 |
| **Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,000,000 | $1,870,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | $440,000 | | | $11,000,000 | | $57,500 | | $0 | $0 | | $2,807,500 |
| 1 | CC | 86051533 | MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $11,000,000 | $1,870,000 | EPS005 | 30 | $11,000,000 | $440,000 | CCF34 | 30 | $11,000,000 | $440,000 | 14-11 | 30 | $11,000,000 | 0.522% | $57,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $2,807,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ins | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $15,867,753 | $2,539,600 | | | $15,867,753 | $635,300 | | | $16,483,749 | $659,900 | | | $15,867,753 | | $1,004,100 | | $0 | $0 | | $4,838,900 |
| **Centro de Trabajo: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $15,867,753 | $2,539,600 | | | $15,867,753 | $635,300 | | | $16,483,749 | $659,900 | | | $15,867,753 | | $1,004,100 | | $0 | $0 | | $4,838,900 |
| **Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $15,867,753 | $2,539,600 | | | $15,867,753 | $635,300 | | | $16,483,749 | $659,900 | | | $15,867,753 | | $1,004,100 | | $0 | $0 | | $4,838,900 |
| 2 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $440,900 |
| 3 | CC | 1103470729 | CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 21 | $1,066,450 | $170,700 | CCFC55 | 21 | $1,066,450 | $42,700 | CCF34 | 21 | $1,189,176 | $47,600 | 14-11 | 21 | $1,066,450 | 6.960% | $74,300 | 21 | $0 | $0 | SI | $335,300 |
| 4 | CC | 78646546 | GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 231001 | 21 | $1,066,450 | $170,700 | EPS037 | 21 | $1,066,450 | $42,700 | CCF34 | 21 | $1,189,176 | $47,600 | 14-11 | 21 | $1,066,450 | 6.960% | $74,300 | 21 | $0 | $0 | SI | $335,300 |
| 5 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY VANESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $1,763,334 | $282,200 | EPS005 | 23 | $1,763,334 | $70,600 | CCF34 | 23 | $1,763,334 | $70,600 | 14-11 | 23 | $1,763,334 | 6.960% | $122,800 | 23 | $0 | $0 | SI | $546,200 |
| 6 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY VANESA | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230201 | 7 | $536,667 | $85,900 | EPS005 | 7 | $536,667 | $21,500 | CCF34 | 7 | $536,667 | $21,500 | 14-11 | 7 | $536,667 | 0.000% | $0 | 7 | $0 | $0 | SI | $128,900 |
| 7 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $1,993,334 | $319,000 | EPS005 | 23 | $1,993,334 | $79,800 | CCF34 | 23 | $1,993,334 | $79,800 | 14-11 | 23 | $1,993,334 | 6.960% | $138,800 | 23 | $0 | $0 | SI | $617,400 |
| 8 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 7 | $606,667 | $97,100 | EPS005 | 7 | $606,667 | $24,300 | CCF34 | 7 | $606,667 | $24,300 | 14-11 | 7 | $606,667 | 0.000% | $0 | 7 | $0 | $0 | SI | $145,700 |
| 9 | CC | 1093921945 | MONCADA CAIIO JOSE JAVIER | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 21 | $1,066,450 | $170,700 | EPS041 | 21 | $1,066,450 | $42,700 | CCF34 | 21 | $1,189,176 | $47,600 | 14-11 | 21 | $1,066,450 | 6.960% | $74,300 | 21 | $0 | $0 | SI | $335,300 |
| 10 | CC | 17497322 | MURCIA JOJOA ROSEMBERG | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,912,000 | $306,000 | EPS005 | 30 | $1,912,000 | $76,500 | CCF34 | 30 | $1,912,000 | $76,500 | 14-11 | 30 | $1,912,000 | 6.960% | $133,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $592,100 |
| 11 | CC | 1121834340 | OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 26 | $1,993,334 | $319,000 | EPS037 | 26 | $1,993,334 | $79,800 | CCF34 | 26 | $1,993,334 | $79,800 | 14-11 | 26 | $1,993,334 | 6.960% | $138,800 | 26 | $0 | $0 | SI | $617,400 |
| 12 | CC | 1121834340 | OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 4 | $306,667 | $49,100 | EPS037 | 4 | $306,667 | $12,300 | CCF34 | 4 | $306,667 | $12,300 | 14-11 | 4 | $306,667 | 0.000% | $0 | 4 | $0 | $0 | SI | $73,700 |
| 13 | CC | 1122236284 | RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 21 | $1,066,450 | $170,700 | EPS041 | 21 | $1,066,450 | $42,700 | CCF34 | 21 | $1,191,542 | $47,700 | 14-11 | 21 | $1,066,450 | 6.960% | $74,300 | 21 | $0 | $0 | SI | $335,400 |
| 14 | CC | 1004819005 | ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 21 | $1,066,450 | $170,700 | EPS041 | 21 | $1,066,450 | $42,700 | CCF34 | 21 | $1,189,176 | $47,600 | 14-11 | 21 | $1,066,450 | 6.960% | $74,300 | 21 | $0 | $0 | SI | $335,300 |
| Total Afiliados( 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $26,867,753 | $4,409,600 | | | $26,867,753 | $1,075,300 | | | $27,483,749 | $1,099,900 | | | $26,867,753 | | $1,061,600 | | $0 | $0 | | $7,646,400 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 11 | $4,409,600 | $0 | $0 | $4,409,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $170,700 | $0 | $0 | $170,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $595,900 | $0 | $0 | $595,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $3,274,900 | $0 | $0 | $3,274,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $368,100 | $0 | $0 | $368,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $1,061,600 | $0 | $0 | $1,061,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 11 | $1,061,600 | $0 | $0 | $1,061,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $1,099,900 | $0 | $0 | $1,099,900 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 11 | $1,099,900 | $0 | $0 | $1,099,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 11 | $1,075,300 | $0 | $0 | $1,075,300 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $134,800 | $0 | $0 | $134,800 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 3 | $128,100 | $0 | $0 | $128,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 5 | $769,700 | $0 | $0 | $769,700 |
| TOTAL | | | | 11 | $7,646,400 | $0 | $0 | $7,646,400 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2025-12 | Periodo Salud | 2026-01 |
| Fecha límite de pago | 2026/01/09 | Fecha de pago | 2026/01/06 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $7,646,400 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $7,646,400 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9497602330 |
| Clave de pago | 2063008266 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2026/01/06 11:22 AM

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

# APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
# ENERO DE 2026

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-01 | 2026-02 | 39957579 | 9499301789 | E | 2026/02/09 | 2026/02/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $8,050,200 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VILLAVICENCIO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,561,000 | $1,965,600 | | | $11,561,000 | $462,500 | | | $11,561,000 | $462,500 | | | $11,561,000 | | $60,400 | | $0 | $0 | | $2,951,000 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,561,000 | $1,965,600 | | | $11,561,000 | $462,500 | | | $11,561,000 | $462,500 | | | $11,561,000 | | $60,400 | | $0 | $0 | | $2,951,000 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,561,000 | $1,965,600 | | | $11,561,000 | $462,500 | | | $11,561,000 | $462,500 | | | $11,561,000 | | $60,400 | | $0 | $0 | | $2,951,000 |
| 1 | CC | 86051533 | MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $11,561,000 | $1,965,600 | EPS005 | 30 | $11,561,000 | $462,500 | CCF34 | 30 | $11,561,000 | $462,500 | 14-11 | 30 | $11,561,000 | 0.522% | $60,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $2,951,000 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $16,671,943 | $2,668,000 | | | $16,671,943 | $667,700 | | | $16,671,943 | $660,400 | | | $16,671,943 | | $1,103,100 | | $0 | $0 | | $5,099,200 |
| **Centro de Trabajo: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $16,671,943 | $2,668,000 | | | $16,671,943 | $667,700 | | | $16,671,943 | $660,400 | | | $16,671,943 | | $1,103,100 | | $0 | $0 | | $5,099,200 |
| Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (10 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $16,671,943 | $2,668,000 | | | $16,671,943 | $667,700 | | | $16,671,943 | $660,400 | | | $16,671,943 | | $1,103,100 | | $0 | $0 | | $5,099,200 |
| 2 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | | | | | X | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF34 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,300 |
| 3 | CC | 1120864265 | BARRIOS POLOCHE EDWIN ALEJANDRO | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 18 | $1,110,543 | $177,700 | EPS002 | 18 | $1,110,543 | $44,500 | CCF34 | 18 | $1,110,543 | $44,500 | 14-11 | 18 | $1,110,543 | 6.960% | $77,300 | 18 | $0 | $0 | SI | $344,000 |
| 4 | CC | 1103470729 | CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 18 | $1,110,543 | $177,700 | CCFC55 | 18 | $1,110,543 | $44,500 | CCF34 | 18 | $1,110,543 | $44,500 | 14-11 | 18 | $1,110,543 | 6.960% | $77,300 | 18 | $0 | $0 | SI | $344,000 |
| 5 | CC | 78646546 | GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 18 | $1,050,543 | $168,100 | EPS037 | 18 | $1,050,543 | $42,100 | CCF34 | 18 | $1,050,543 | $42,100 | 14-11 | 18 | $1,050,543 | 6.960% | $73,200 | 18 | $0 | $0 | SI | $325,500 |
| 6 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY VANESA | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230201 | 2 | $153,333 | $24,600 | EPS005 | 2 | $153,333 | $6,200 | CCF34 | 2 | $153,333 | $6,200 | 14-11 | 2 | $153,333 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $37,000 |
| 7 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY VANESA | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230201 | 28 | $2,256,147 | $361,000 | EPS005 | 28 | $2,256,147 | $90,300 | CCF34 | 28 | $2,256,147 | $90,300 | 14-11 | 28 | $2,256,147 | 6.960% | $157,100 | 28 | $0 | $0 | SI | $698,700 |
| 8 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 2 | $173,334 | $27,800 | EPS005 | 2 | $173,334 | $7,000 | CCF34 | 2 | $173,334 | $7,000 | 14-11 | 2 | $173,334 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $41,800 |
| 9 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 25 | $2,277,167 | $364,400 | EPS005 | 25 | $2,277,167 | $91,100 | CCF34 | 25 | $2,277,167 | $91,100 | 14-11 | 25 | $2,277,167 | 6.960% | $158,500 | 25 | $0 | $0 | SI | $705,100 |
| 10 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | | | | | | L | | | | | 230301 | 1 | $91,087 | $14,600 | EPS005 | 1 | $91,087 | $3,700 | CCF34 | 1 | $91,087 | $3,700 | 14-11 | 1 | $91,087 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $22,000 |
| 11 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 2 | $182,173 | $29,200 | EPS005 | 2 | $182,173 | $7,300 | CCF34 | 2 | $182,173 | $0 | 14-11 | 2 | $182,173 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $36,500 |
| 12 | CC | 1093921945 | MONCADA CANO JOSE JAVIER | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 18 | $1,050,543 | $168,100 | EPS041 | 18 | $1,050,543 | $42,100 | CCF34 | 18 | $1,050,543 | $42,100 | 14-11 | 18 | $1,050,543 | 6.960% | $73,200 | 18 | $0 | $0 | SI | $325,500 |
| 13 | CC | 17497322 | MURCIA JOJOA ROSEMBERG | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,009,512 | $321,600 | EPS005 | 30 | $2,009,512 | $80,400 | CCF34 | 30 | $2,009,512 | $80,400 | 14-11 | 30 | $2,009,512 | 6.960% | $139,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $622,300 |
| 14 | CC | 1121834340 | OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 3 | $230,000 | $36,800 | EPS037 | 3 | $230,000 | $9,200 | CCF34 | 3 | $230,000 | $9,200 | 14-11 | 3 | $230,000 | 0.000% | $0 | 3 | $0 | $0 | SI | $55,200 |
| 15 | CC | 1121834340 | OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO | | | | | | X | | | | | | | | | | | 25-14 | 27 | $2,175,570 | $348,100 | EPS037 | 27 | $2,175,570 | $87,100 | CCF34 | 27 | $2,175,570 | $87,100 | 14-11 | 27 | $2,175,570 | 6.960% | $151,500 | 27 | $0 | $0 | SI | $673,800 |
| 16 | CC | 1004819005 | ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 18 | $1,050,543 | $168,100 | EPS041 | 18 | $1,050,543 | $42,100 | CCF34 | 18 | $1,050,543 | $42,100 | 14-11 | 18 | $1,050,543 | 6.960% | $73,200 | 18 | $0 | $0 | SI | $325,500 |
| Total Afiliados( 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $28,232,943 | $4,633,600 | | | $28,232,943 | $1,130,200 | | | $28,232,943 | $1,122,900 | | | $28,232,943 | | $1,163,500 | | $0 | $0 | | $8,050,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 11 | $4,633,600 | $0 | $0 | $4,633,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $168,100 | $0 | $0 | $168,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $665,100 | $0 | $0 | $665,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $3,414,800 | $0 | $0 | $3,414,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $385,600 | $0 | $0 | $385,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $1,163,500 | $0 | $0 | $1,163,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 11 | $1,163,500 | $0 | $0 | $1,163,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $1,122,900 | $0 | $0 | $1,122,900 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 11 | $1,122,900 | $0 | $0 | $1,122,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 11 | $1,130,200 | $0 | $0 | $1,130,200 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $44,500 | $0 | $0 | $44,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $138,400 | $0 | $0 | $138,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $84,200 | $0 | $0 | $84,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $44,500 | $0 | $0 | $44,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 5 | $818,600 | $0 | $0 | $818,600 |
| TOTAL | | | | 11 | $8,050,200 | $0 | $0 | $8,050,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901965630 | 1 | CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVICENCIO | CL 15 40 01 | VILLAVICENCIO-META | 3142334798 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-01 | 2026-02 | 116323476 | 9501110948 | N | 2026/02/09 | 2026/03/05 | BANCOLOMBIA | 24 | $74,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tap | tpp | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $28,389 | $4,400 | | | $28,389 | $900 | | | $28,389 | $8,200 | | | $59,700 | | | $0 | $0 | | $73,200 |
| **Centro de Trabajo: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $28,389 | $4,400 | | | $28,389 | $900 | | | $28,389 | $8,200 | | | $59,700 | | | $0 | $0 | | $73,200 |
| Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $28,389 | $4,400 | | | $28,389 | $900 | | | $28,389 | $8,200 | | | $59,700 | | | $0 | $0 | | $73,200 |
| 1 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY VANESA | | | | | | | | A | | | | o | o | X | | | | 23020 1 | 2 | ($153,333) | ($24,600) | EPS005 | 2 | ($153,333) | ($6,200) | CCF34 | 2 | ($153,333) | ($6,200) | 14-11 | 2 | ($153,333) | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | ($37,000) |
| 2 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY VANESA | | | | | | | X | A | | | | o | o | | | | | 23020 1 | 28 | ($2,256,147) | ($361,000) | EPS005 | 28 | ($2,256,147) | ($90,300) | CCF34 | 28 | ($2,256,147) | ($90,300) | 14-11 | 28 | ($2,256,147) | 6.960% | ($157,100) | 28 | $0 | $0 | SI | ($698,700) |
| 3 | CC | 1121902403 | GARZON GARCIA WENDY VANESA | | | | | | | | C | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $2,417,300 | $386,800 | EPS005 | 30 | $2,417,300 | $96,700 | CCF34 | 30 | $2,417,300 | $96,700 | 14-11 | 30 | $2,417,300 | 6.960% | $168,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $748,500 |
| 4 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | | A | | | | o | o | X | | | | 23030 1 | 2 | ($173,334) | ($27,800) | EPS005 | 2 | ($173,334) | ($7,000) | CCF34 | 2 | ($173,334) | ($7,000) | 14-11 | 2 | ($173,334) | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | ($41,800) |
| 5 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | X | A | | | | o | o | | | | | 23030 1 | 25 | ($2,277,167) | ($364,400) | EPS005 | 25 | ($2,277,167) | ($91,100) | CCF34 | 25 | ($2,277,167) | ($91,100) | 14-11 | 25 | ($2,277,167) | 6.960% | ($158,500) | 25 | $0 | $0 | SI | ($705,100) |
| 6 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | | A | | | | o | o | L | | | | 23030 1 | 1 | ($91,087) | ($14,600) | EPS005 | 1 | ($91,087) | ($3,700) | CCF34 | 1 | ($91,087) | ($3,700) | 14-11 | 1 | ($91,087) | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | ($22,000) |
| 7 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | | A | | | | X | o | | | | | 23030 1 | 2 | ($182,173) | ($29,200) | EPS005 | 2 | ($182,173) | ($7,300) | CCF34 | 2 | ($182,173) | $0 | 14-11 | 2 | ($182,173) | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | ($36,500) |
| 8 | CC | 1121869998 | MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | | C | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,732,600 | $437,300 | EPS005 | 30 | $2,732,600 | $109,400 | CCF34 | 30 | $2,732,600 | $109,400 | 14-11 | 30 | $2,732,600 | 6.960% | $190,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $846,300 |
| 9 | CC | 1121834340 | OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO | | | | | | | | A | | | | o | o | X | | | | 25-14 | 3 | ($230,000) | ($36,800) | EPS037 | 3 | ($230,000) | ($9,200) | CCF34 | 3 | ($230,000) | ($9,200) | 14-11 | 3 | ($230,000) | 0.000% | $0 | 3 | $0 | $0 | SI | ($55,200) |
| 10 | CC | 1121834340 | OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO | | | | | | | X | A | | | | o | o | | | | | 25-14 | 27 | ($2,175,570) | ($348,100) | EPS037 | 27 | ($2,175,570) | ($87,100) | CCF34 | 27 | ($2,175,570) | ($87,100) | 14-11 | 27 | ($2,175,570) | 6.960% | ($151,500) | 27 | $0 | $0 | SI | ($673,800) |
| 11 | CC | 1121834340 | OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO | | | | | | | | C | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,417,300 | $386,800 | EPS037 | 30 | $2,417,300 | $96,700 | CCF34 | 30 | $2,417,300 | $96,700 | 14-11 | 30 | $2,417,300 | 6.960% | $168,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $748,500 |
| Total Afiliados( 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $28,389 | $4,400 | | | $28,389 | $900 | | | $28,389 | $8,200 | | | $59,700 | | | $0 | $0 | | $73,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $4,400 | $300 | $0 | $4,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $1,900 | $100 | $0 | $2,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $1,300 | $100 | $0 | $1,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $1,200 | $100 | $0 | $1,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $59,700 | $1,000 | $0 | $60,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $59,700 | $1,000 | $0 | $60,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $8,200 | $200 | $0 | $8,400 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 3 | $8,200 | $200 | $0 | $8,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $900 | $200 | $0 | $1,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $400 | $100 | $0 | $500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $500 | $100 | $0 | $600 |
| TOTAL | | | | 3 | $73,200 | $1,700 | $0 | $74,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-01 | 2026-02 | 39925250 | 9499300676 | E | 2026/02/16 | 2026/02/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,685,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tap | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VILLAVO (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $14,049,411 | $2,248,500 | | | $14,049,411 | $562,600 | | | $14,027,457 | $557,000 | | | $14,049,411 | | $317,600 | | $0 | $0 | | $3,685,700 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $10,154,991 | $1,625,300 | | | $10,154,991 | $406,700 | | | $10,133,037 | $401,100 | | | $10,154,991 | | $46,500 | | $0 | $0 | | $2,479,600 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $10,154,991 | $1,625,300 | | | $10,154,991 | $406,700 | | | $10,133,037 | $401,100 | | | $10,154,991 | | $46,500 | | $0 | $0 | | $2,479,600 |
| 1 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 2 | $225,427 | $36,100 | EPS005 | 2 | $225,427 | $9,100 | CCF34 | 2 | $225,427 | $9,100 | 14-11 | 2 | $225,427 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $54,300 |
| 2 | CC | 40326478 | AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 28 | $3,316,928 | $530,800 | EPS005 | 28 | $3,316,928 | $132,700 | CCF34 | 28 | $3,316,928 | $132,700 | 14-11 | 28 | $3,316,928 | 0.522% | $17,400 | 28 | $0 | $0 | SI | $813,600 |
| 3 | CC | 40328285 | GOMEZ LEAL LINA MARCELA | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 2 | $116,727 | $18,700 | EPS005 | 2 | $116,727 | $4,700 | CCF34 | 2 | $116,600 | $4,700 | 14-11 | 2 | $116,727 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $28,100 |
| 4 | CC | 40328285 | GOMEZ LEAL LINA MARCELA | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 28 | $1,914,178 | $306,300 | EPS005 | 28 | $1,914,178 | $76,600 | CCF34 | 28 | $1,914,178 | $76,600 | 14-11 | 28 | $1,914,178 | 0.522% | $10,000 | 28 | $0 | $0 | SI | $469,500 |
| 5 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 2 | $180,147 | $28,900 | EPS005 | 2 | $180,147 | $7,300 | CCF34 | 2 | $180,147 | $7,300 | 14-11 | 2 | $180,147 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $43,500 |
| 6 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 23 | $2,177,343 | $348,400 | EPS005 | 23 | $2,177,343 | $87,100 | CCF34 | 23 | $2,177,343 | $87,100 | 14-11 | 23 | $2,177,343 | 0.522% | $11,400 | 23 | $0 | $0 | SI | $534,000 |
| 7 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 5 | $473,335 | $75,800 | EPS005 | 5 | $473,335 | $19,000 | CCF34 | 5 | $473,335 | $19,000 | 14-11 | 5 | $473,335 | 0.000% | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | $113,800 |
| 8 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 2 | $116,727 | $18,700 | EPS005 | 2 | $116,727 | $4,700 | CCF34 | 2 | $94,900 | $3,800 | 14-11 | 2 | $116,727 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $27,200 |
| 9 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 25 | $1,459,088 | $233,500 | EPS005 | 25 | $1,459,088 | $58,400 | CCF34 | 25 | $1,459,088 | $58,400 | 14-11 | 25 | $1,459,088 | 0.522% | $7,700 | 25 | $0 | $0 | SI | $358,000 |
| 10 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | | | | | X | | | | | | 23030 1 | 2 | $116,727 | $18,700 | EPS005 | 2 | $116,727 | $4,700 | CCF34 | 2 | $116,727 | $0 | 14-11 | 2 | $116,727 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $23,400 |
| 11 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | | | | | | L | | | | | 23030 1 | 1 | $58,364 | $9,400 | EPS005 | 1 | $58,364 | $2,400 | CCF34 | 1 | $58,364 | $2,400 | 14-11 | 1 | $58,364 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $14,200 |
| **Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,894,420 | $623,200 | | | $3,894,420 | $155,900 | | | $3,894,420 | $155,900 | | | $3,894,420 | | $271,100 | | $0 | $0 | | $1,206,100 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,894,420 | $623,200 | | | $3,894,420 | $155,900 | | | $3,894,420 | $155,900 | | | $3,894,420 | | $271,100 | | $0 | $0 | | $1,206,100 |
| 12 | CC | 80013513 | MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,143,515 | $343,000 | EPS005 | 30 | $2,143,515 | $85,800 | CCF34 | 30 | $2,143,515 | $85,800 | 14-11 | 30 | $2,143,515 | 6.960% | $149,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $663,800 |
| 13 | CC | 96193788 | PEREZ PEREZ OBER ASMED | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF34 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,300 |
| **Total Afiliados( 6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $14,049,411 | $2,248,500 | | | $14,049,411 | $562,600 | | | $14,027,457 | $557,000 | | | $14,049,411 | | $317,600 | | $0 | $0 | | $3,685,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $2,248,500 | $0 | $0 | $2,248,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,300,200 | $0 | $0 | $1,300,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $948,300 | $0 | $0 | $948,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $317,600 | $0 | $0 | $317,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $317,600 | $0 | $0 | $317,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $557,000 | $0 | $0 | $557,000 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 6 | $557,000 | $0 | $0 | $557,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $562,600 | $0 | $0 | $562,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $562,600 | $0 | $0 | $562,600 |
| TOTAL | | | | 6 | $3,685,700 | $0 | $0 | $3,685,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900751966 | 6 | MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VILLAVO | primavera urbana ofc 826 | VILLAVICENCIO-META | 6849992 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-01 | 2026-02 | 116305043 | 9501110414 | N | 2026/02/16 | 2026/03/05 | BANCOLOMBIA | 17 | $18,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vcl | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VILLAVO (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $29,686 | $4,600 | | | $29,686 | $1,000 | | | $51,640 | $6,600 | | | $29,686 | | $5,800 | | $0 | $0 | | $18,000 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $29,686 | $4,600 | | | $29,686 | $1,000 | | | $51,640 | $6,600 | | | $29,686 | | $5,800 | | $0 | $0 | | $18,000 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $29,686 | $4,600 | | | $29,686 | $1,000 | | | $51,640 | $6,600 | | | $29,686 | | $5,800 | | $0 | $0 | | $18,000 |
| 1 | CC | 40328285 | GOMEZ LEAL LINA MARCELA | | | | | | | | A | | | | o | o | X | | | | 23030 1 | 2 | ($116,727) | ($18,700) | EPS005 | 2 | ($116,727) | ($4,700) | CCF34 | 2 | ($116,600) | ($4,700) | 14-11 | 2 | ($116,727) | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | ($28,100) |
| 2 | CC | 40328285 | GOMEZ LEAL LINA MARCELA | | | | | | X | A | | | | o | o | | | | | | 23030 1 | 28 | ($1,914,178) | ($306,300) | EPS005 | 28 | ($1,914,178) | ($76,600) | CCF34 | 28 | ($1,914,178) | ($76,600) | 14-11 | 28 | ($1,914,178) | 0.522% | ($10,000) | 28 | $0 | $0 | SI | ($469,500) |
| 3 | CC | 40328285 | GOMEZ LEAL LINA MARCELA | | | | | | | C | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,050,905 | $328,200 | EPS005 | 30 | $2,050,905 | $82,100 | CCF34 | 30 | $2,050,905 | $82,100 | 14-11 | 30 | $2,050,905 | 0.522% | $10,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $503,200 |
| 4 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIYA YANIRA | | | | | | | A | | | | o | o | X | | | | | 25-14 | 2 | ($180,147) | ($28,900) | EPS005 | 2 | ($180,147) | ($7,300) | CCF34 | 2 | ($180,147) | ($7,300) | 14-11 | 2 | ($180,147) | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | ($43,500) |
| 5 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIYA YANIRA | | | | | | X | A | | | | o | o | | | | | | 25-14 | 23 | ($2,177,343) | ($348,400) | EPS005 | 23 | ($2,177,343) | ($87,100) | CCF34 | 23 | ($2,177,343) | ($87,100) | 14-11 | 23 | ($2,177,343) | 0.522% | ($11,400) | 23 | $0 | $0 | SI | ($534,000) |
| 6 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIYA YANIRA | | | | | | | A | | | | o | o | X | | | | | 25-14 | 5 | ($473,335) | ($75,800) | EPS005 | 5 | ($473,335) | ($19,000) | CCF34 | 5 | ($473,335) | ($19,000) | 14-11 | 5 | ($473,335) | 0.000% | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | ($113,800) |
| 7 | CC | 40395435 | MACHADO TEJEIRO DIYA YANIRA | | | | | | | C | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,840,012 | $454,500 | EPS005 | 30 | $2,840,012 | $113,700 | CCF34 | 30 | $2,840,012 | $113,700 | 14-11 | 30 | $2,840,012 | 0.522% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $696,800 |
| 8 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | A | | | | o | o | X | | | | | 23030 1 | 2 | ($116,727) | ($18,700) | EPS005 | 2 | ($116,727) | ($4,700) | CCF34 | 2 | ($94,900) | ($3,800) | 14-11 | 2 | ($116,727) | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | ($27,200) |
| 9 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | X | A | | | | o | o | | | | | | 23030 1 | 25 | ($1,459,088) | ($233,500) | EPS005 | 25 | ($1,459,088) | ($58,400) | CCF34 | 25 | ($1,459,088) | ($58,400) | 14-11 | 25 | ($1,459,088) | 0.522% | ($7,700) | 25 | $0 | $0 | SI | ($358,000) |
| 10 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | A | | | | X | o | | | | | | 23030 1 | 2 | ($116,727) | ($18,700) | EPS005 | 2 | ($116,727) | ($4,700) | CCF34 | 2 | ($116,727) | $0 | 14-11 | 2 | ($116,727) | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | ($23,400) |
| 11 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | A | | | | o | o | L | | | | | 23030 1 | 1 | ($58,364) | ($9,400) | EPS005 | 1 | ($58,364) | ($2,400) | CCF34 | 1 | ($58,364) | ($2,400) | 14-11 | 1 | ($58,364) | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | ($14,200) |
| 12 | CC | 1092394700 | PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA | | | | | | | C | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,751,405 | $280,300 | EPS005 | 30 | $1,751,405 | $70,100 | CCF34 | 30 | $1,751,405 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,751,405 | 0.522% | $9,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $429,700 |
| **Total Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $29,686 | $4,600 | | | $29,686 | $1,000 | | | $51,640 | $6,600 | | | $29,686 | | $5,800 | | $0 | $0 | | $18,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $4,600 | $200 | $0 | $4,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $1,400 | $100 | $0 | $1,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $3,200 | $100 | $0 | $3,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $5,800 | $100 | $0 | $5,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $5,800 | $100 | $0 | $5,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $6,600 | $100 | $0 | $6,700 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 3 | $6,600 | $100 | $0 | $6,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $1,100 | $100 | $0 | $1,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $1,100 | $100 | $0 | $1,200 |
| TOTAL | | | | 3 | $18,100 | $500 | $0 | $18,600 |

Villavicencio, 22 de enero de 2026

**C E R T I F I C A C I Ó N:**

Yo, **DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO**, identificada con Cédula de ciudadanía. No. 40.395.435 de Villavicencio y TP 227117 -T, designada como Contadora de **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con **NIT. 901.965.630-1**, certifico que en la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025, CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META" la entidad cumplió del 29 de agosto de 2025 al 20 de enero de 2026 en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, y en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicios Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, por lo tanto la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide a los veintidós (22) días del mes de enero del año 2026.

Cordialmente,

**LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA**
C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO
R.L. CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

**DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO**
C.C. 40.395.435 DE VILLAVICENCIO
CONTADORA PUBLICA
**TP 227117-T**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.395.435
MACHADO TEJEIRO
APELLIDOS
DIVA YANIRA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1972
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-SEP-1990 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5200100-00126010-F-0040395435-20081108 0005570144 1 6720006039

PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
COMO CONTADOR DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

227117-T

DIVA YANIRA
MACHADO TEJEIRO
C.C. 40395435
RES. INSCRIPCION 207 DEL 31/03/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231370 244584

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

**ACTA No. 1**
**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE INTEGRANTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**

En el municipio de Villavicencio, siendo las 09:00 a.m. del día 4 de agosto de 2025 se reunieron los integrantes del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** para adelantar la presente reunión extraordinaria de integrantes y desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Designación del presidente y secretario de la reunión
3. Solicitud para que un consorciado aporte el personal presentado en el A.I.U. del contrato de obra N°0821 de 2025.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

**Desarrollo:**

1. Llamado a lista y verificación del quorum

Una vez llamado a lista, se verificó la asistencia del 100% de los integrantes del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**, así:

| Nombre del integrante | Porcentaje de Participación |
|---|---|
| MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S. | 99,5% |
| EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL | 0,5% |

La firma **MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS** está representada por **LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA**.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión

Se designó como presidente a **LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA** y como secretaria a **FRANCY CAROLINA AREVALO GARZON**, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron la designación y tomaron posesión de sus cargos.

3. Solicitud para que un consorciado aporte el personal presentado en el A.I.U. del contrato de obra N°0821 de 2025.

El integrante **MUÑOZ AREVALO INGENIERÍA S.A.S.** identificado con NIT. 900.751.966 – 6 a través de su representante legal **LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA**, manifiesta su intención de poner a disposición el personal relacionado a continuación: Conductor, contador, almacenista, secretaria y asistente contable, durante las actividades previas al inicio, ejecución, recibo y liquidación del contrato de obra N°0821 de 2025, el cual, se encuentra vinculado con la empresa mediante contratos a término indefinido y tendrían dedicación del 100% a las actividades requeridas en el contrato de Obra, por lo tanto, las planillas integradas de liquidación de aportes al sistema de seguridad social del personal serían presentadas bajo el nombre del consorciado **MUÑOZ ARÉVALO INGENIERÍA S.A.S.**

Así las cosas, y analizada la solicitud se pone a consideración de los integrantes del consorcio la propuesta de que el siguiente personal: Conductor, contador, almacenista, secretaria y asistente contable; sea dispuesto por el consorciado **MUÑOZ AREVALO INGENIERÍA S.A.S.**, obteniendo la siguiente votación:

| Nombre del integrante | Porcentaje de Participación | Aceptan | No Aceptan |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S. R/L LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA C.C. 86.051.533 | 99,5% | SI | |
| EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL C.C. 79.846.131 | 0,5% | SI | |

4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Sometida a consideración de los miembros integrantes del consorcio, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la reunión y en consecuencia se autoriza al representante a realizar los trámites necesarios.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 4 días del mes de agosto de 2025.

**LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA**
C.C. 86.051.533
R/L MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.



**EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL**
C.C. 79.846.131

**LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA**
C.C. 86.051.533
R/L CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

**FRANCY CAROLINA AREVALO GARZON**
C.C. 40.326.478
R/L SUPLENTE CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

## ASISTENCIA A REUNIÓN

**Fecha: 4 de agosto de 2025**

| Nombre del integrante | Porcentaje de Participación | Nombre Asistente | Firma |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S. R/L LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA C.C. 86.051.533 | 99,5% | LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA |  |
| EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL C.C. 79.846.131 | 0,5% | EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL |  |

# ANEXO 4. PAZ Y SALVO PERSONAL RETIRADO

# CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

## PAZ Y SALVO

Yo, **EDWIN GUZMAN PASTRANA** mayor de edad, identificado con C.C. No. 86.040.134 expedida en Villavicencio (Meta), hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificado con NIT. 901.965.630-1, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados que se establecieron en el desarrollo de las actividades como **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL** desempeñadas desde el 29 de agosto del 2025 al 28 de octubre del 2025; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821** de **2025 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".** Y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

El presente documento se firma en Puerto Gaitán - Meta, el día treinta (30) de octubre del año 2.025.

**FIRMA**
NOMBRE: Edwin Guzmán Pastrana
C.C. No. 86.040.134 de Villavicencio (Meta)

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

# CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
**NIT: 901.965.630-1**
**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**
**OBRA O LABOR**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | SALOMON GAITAN LEON |
| **C.C.:** | 1.147.694.823 de Puerto Gaitan (Meta) |
| **CARGO:** | AYUDANTE DE OBRA |
| **CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:** | FINALIZACION LABOR CONTRATADA |

Contrato No. CAG-COL-03.25

| PERIODO DE LIQUIDACIÓN | |
|---|---|
| FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO | 05-11-2025 |
| FECHA DE INICIO CONTRATO | 04-11-2025 |
| TIEMPO TOTAL LABORADO | 2 |
| VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO | $ - |
| DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR | 2 |

| SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN: | |
|---|---|
| SUELDO BÁSICO: | $ 1.423.500 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $ 200.000 |
| PROMEDIO SALARIO VARIABLE | $ - |
| TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN: | $ 1.623.500 |
| SANCIONES EN DÍAS | 0,00 |

| PRIMA | |
|---|---|
| FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA | 05-11-2025 |
| FECHA DE CORTE PRIMA | 04-11-2025 |
| DÍAS PRIMA | 2,00 |

| CESANTÍAS | |
|---|---|
| FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS | 05-11-2025 |
| FECHA DE CORTE CESANTÍAS | 04-11-2025 |
| DÍAS CESANTÍAS | 2,00 |

| VACACIONES | |
|---|---|
| FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES | 05-11-2025 |
| FECHA DE CORTE VACACIONES | 04-11-2025 |
| TOTAL DÍAS DE VACACIONES | 0,1 |
| DÍAS TOMADOS DE VACACIONES | 0,0 |
| DÍAS PENDIENTES | 0,1 |

| INTERESES A LAS CESANTÍAS | |
|---|---|
| FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES | 05-11-2025 |
| FECHA DE CORTE INTERESES | 04-11-2025 |
| DÍAS INTERESES | 2,00 |

| PERMISO NO REMUNERADO | 0 DIA |
|---|---|

**RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS**

| CONCEPTO | CALCULO | TOTAL |
|---|---|---|
| DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES: | | $ 3.954 |
| CESANTÍAS : | | $ 9.019 |
| INTERESES DE CESANTÍAS | | $ 6 |
| PRIMA SERVICIOS | | $ 9.019 |
| DOMINICAL | | $ - |
| SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR: | | $ 94.900 |
| HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR: | | $ - |
| PACTO NO SALARIAL (NO CONSTITUYEN SALARIO) | | $ - |
| AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR | | $ 13.333 |
| TOTAL DEVENGOS | | $ 130.232 |

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :**

| CONCEPTO | PORCENTAJE | BASE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALUD: | 4% | $ 94.900 | $ -3.800 |
| PENSIÓN: | 4% | $ 94.900 | $ -3.800 |
| PRESTAMOS O ANTICIPOS: | | | $ - |
| DEVOLUCION NOMINA | | | $ - |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | $ -7.600 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR LIQUIDACIÓN | | $ 122.632 |
| LA SUMA DE: | CIENTO VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C | |

***SE HACE CONSTAR:***

1. *Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.*
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Salomon gaitan

**SALOMON GAITAN LEON**
**C.C.: 1.147.694.823 de Puerto Gaitan (Meta)**

**Elaboró: D.M.**
**Fecha: 8/11/2025**

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

# CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

**NIT: 901.965.630-1**

**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

**OBRA O LABOR**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | **LEONARDO GAITAN GAITAN** |
| **C.C.:** | 8.191.822de Puerto Gaitan (Meta) |
| **CARGO:** | AYUDANTE DE OBRA |
| **CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:** | **FINALIZACION LABOR CONTRATADA** |

Contrato No. CAG-COL-02.25

| PERIODO DE LIQUIDACIÓN | |
|---|---|
| FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO | 05-11-2025 |
| FECHA DE INICIO CONTRATO | 04-11-2025 |
| TIEMPO TOTAL LABORADO | 2 |
| VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO | $ - |
| DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR | 2 |

| SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN: | |
|---|---|
| SUELDO BÁSICO: | $ 1.423.500 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE: | $ 200.000 |
| PROMEDIO SALARIO VARIABLE | $ - |
| TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN: | $ 1.623.500 |
| SANCIONES EN DÍAS | 0,00 |

| PRIMA | |
|---|---|
| FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA | 05-11-2025 |
| FECHA DE CORTE PRIMA | 04-11-2025 |
| DÍAS PRIMA | 2,00 |

| CESANTÍAS | |
|---|---|
| FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS | 05-11-2025 |
| FECHA DE CORTE CESANTÍAS | 04-11-2025 |
| DÍAS CESANTÍAS | 2,00 |

| VACACIONES | |
|---|---|
| FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES | 05-11-2025 |
| FECHA DE CORTE VACACIONES | 04-11-2025 |
| TOTAL DÍAS DE VACACIONES | 0,1 |
| DÍAS TOMADOS DE VACACIONES | 0,0 |
| DÍAS PENDIENTES | 0,1 |

| INTERESES A LAS CESANTÍAS | |
|---|---|
| FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES | 05-11-2025 |
| FECHA DE CORTE INTERESES | 04-11-2025 |
| DÍAS INTERESES | 2,00 |

| PERMISO NO REMUNERADO | 0 DIA |
|---|---|

**RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS**

| CONCEPTO | CALCULO | TOTAL |
|---|---|---|
| DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES: | | $ 3.954 |
| CESANTÍAS : | | $ 9.019 |
| INTERESES DE CESANTÍAS | | $ 6 |
| PRIMA SERVICIOS | | $ 9.019 |
| DOMINICAL | | $ - |
| SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR: | | $ 94.900 |
| HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR: | | $ - |
| PACTO NO SALARIAL (NO CONSTITUYEN SALARIO) | | $ - |
| AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR | | $ 13.333 |
| TOTAL DEVENGOS | | $ 130.232 |

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :**

| CONCEPTO | PORCENTAJE | BASE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALUD: | 4% | $ 94.900 | $ -3.800 |
| PENSIÓN: | 4% | $ 94.900 | $ -3.800 |
| PRESTAMOS O ANTICIPOS: | | | $ - |
| DEVOLUCION NOMINA | | | $ - |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | $ -7.600 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR LIQUIDACIÓN | | $ 122.632 |
| LA SUMA DE: | CIENTO VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C | |

**SE HACE CONSTAR:**

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

**LEONARDO GAITAN GAITAN**
**C.C.: 8.191.822de Puerto Gaitan (Meta)**

Elaboró: D.M.
Fecha: 8/11/2025

Scanned with CamScanner

| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | FORMATO PAZ Y SALVO DE OBRA | Código: HG-F-051 |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Fecha: marzo 2022 |

# CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

## PAZ Y SALVO

Yo, **JEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 78.646.546** expedida **Tierra Alta (Córdoba),** hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificada con **NIT 901.965.630-1**, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados se establecieron, en el desarrollo de las actividades como **OPERADOR DE MAQUINARIA** desempeñadas desde el **24 de octubre de 2025** al **21 de diciembre del 2025**; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821 de 2025** suscrito con el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN con objeto **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"**, y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

El presente documento se firma en Puerto Gaitán - Meta, el día 24 de diciembre del año 2.025.

Jeferson G

**FIRMA**
NOMBRE: **JEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES**
**C.C. No.** 78.646.546 de Tierra Alta (Córdoba)

| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | FORMATO PAZ Y SALVO DE OBRA | Código: HG-F-051 |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Fecha: marzo 2022 |

# CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

## PAZ Y SALVO

Yo. **JOSE JAVIER MONCADA CANO,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.093.921.945** de **Tibú (Nte de Sder),** hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificada con **NIT 901.965.630-1**, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados se establecieron, en el desarrollo de las actividades como **OFICIAL DE TUBERIA** desempeñadas desde el **24 de octubre de 2025** al **21** de **diciembre del 2025**; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821 de 2025** suscrito con el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN con objeto **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"**, y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

Para constancia de lo anterior se firma en Villavicencio a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del dos mil **veinticinco** (2.025).

Jose JsmC

**FIRMA**
NOMBRE: **JOSE JAVIER MONCADA CANO**
**C.C. No.** 1.093.921.945 de **Tibú** (Nte de Sder)

| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | FORMATO PAZ Y SALVO DE OBRA | Código: HG-F-051 |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Fecha: marzo 2022 |

# CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

## PAZ Y SALVO

Yo, **MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.103.470.729** expedida en **Santa Helena del Opón (Santander),** hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificada con **NIT 901.965.630-1**, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados se establecieron, en el desarrollo de las actividades como **OFICIAL DE OBRA** desempeñadas desde el **24 de octubre de 2025** al **21 de diciembre del 2025**; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821 de 2025** suscrito con el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN con objeto **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"**, y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

El presente documento se firma en Puerto Gaitán - Meta, el día 24 de diciembre del año 2.025.

Correa Miguel. 1103470729

**FIRMA**
NOMBRE: **MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA**
**C.C. No. 1.103.470.729 de Santa Helena del Opón (Santander)**

| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | FORMATO PAZ Y SALVO DE OBRA | Código: HG-F-051 |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Fecha: marzo 2022 |

# CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

## PAZ Y SALVO

Yo. **DUVAN ARLEY ROMERO AREVALO,** identificado con cédula de ciudadanía **No.** 1.004.819.005 de **Ocaña** (Nte de Sder), hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificada con **NIT 901.965.630-1**, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados se establecieron, en el desarrollo de las actividades como **OFICIAL DE TUBERIA** desempeñadas desde el **24 de octubre de 2025** al **21** de **diciembre del 2025**; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821 de 2025** suscrito con el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN con objeto **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"**, y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

Para constancia de lo anterior se firma en Villavicencio a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del dos mil **veinticinco** (2.025).

Duvan Romero

**FIRMA**
NOMBRE: **DUVAN ARLEY ROMERO AREVALO**
**C.C. No.** 1.004.819.005 de **Ocaña** (Nte de Sder)

| CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 | FORMATO PAZ Y SALVO DE OBRA | Código: HG-F-051 |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Fecha: marzo 2022 |

# CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

## PAZ Y SALVO

Yo **BRISLEY RAMIREZ JIMENEZ,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.122.236.284** de San José del Guaviare (Guaviare), hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificada con **NIT 901.965.630-1**, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados se establecieron, en el desarrollo de las actividades como **OFICIAL DE OBRA** desempeñadas desde el **24 de octubre de 2025** al **21 de diciembre del 2025**; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821 de 2025** suscrito con el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN con objeto **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"**, y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

El presente documento se firma en Puerto Gaitán - Meta, el día 24 de diciembre del año 2.025.

BRISLEY RAMIREZ

**FIRMA**
NOMBRE: **BRISLEY RAMIREZ JIMENEZ**
**C.C. No.** 1.122.236.284 de San José del Guaviare (Guaviare)

# ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

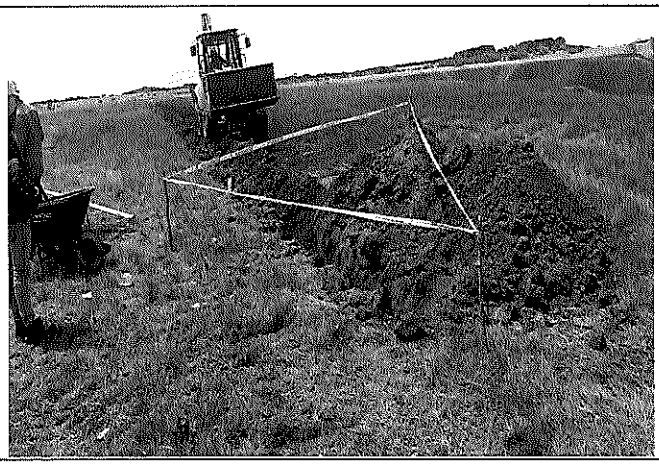
# RESGUARDO AWALIBA

## COMUNIDAD MAKAPAY

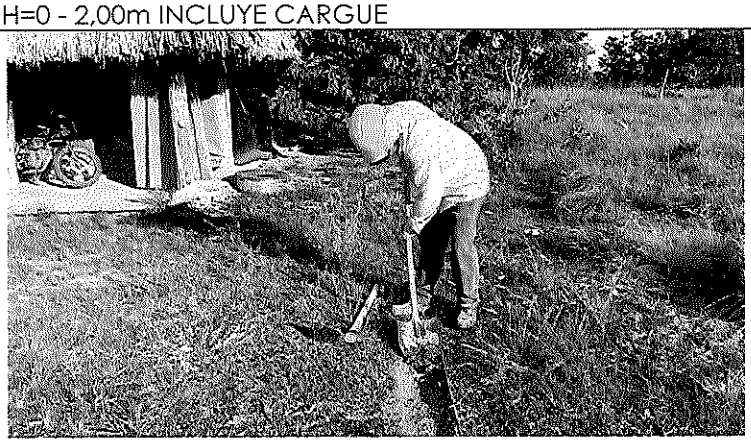
**Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS



**Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN



**Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE



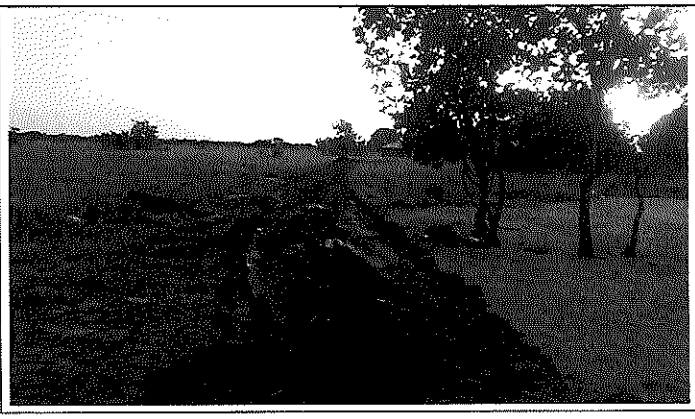
**Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS



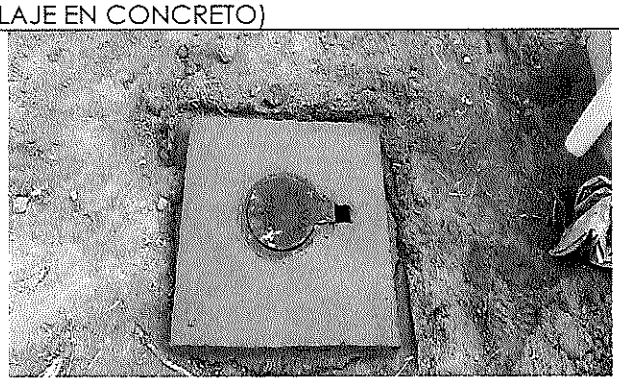
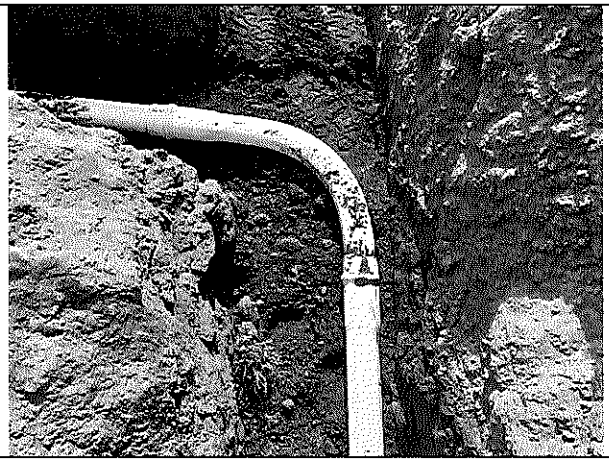
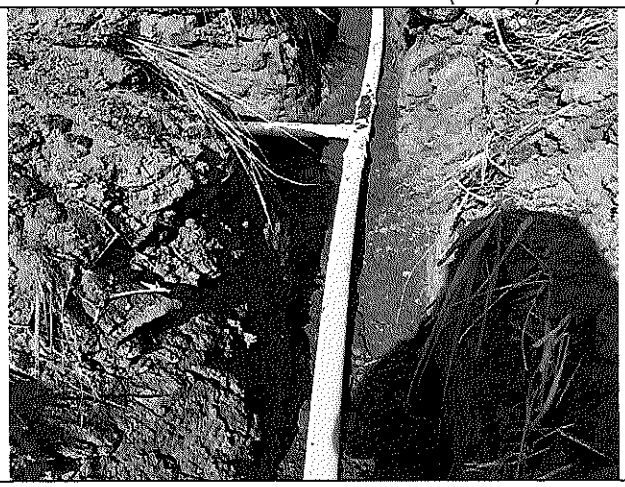
**Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL



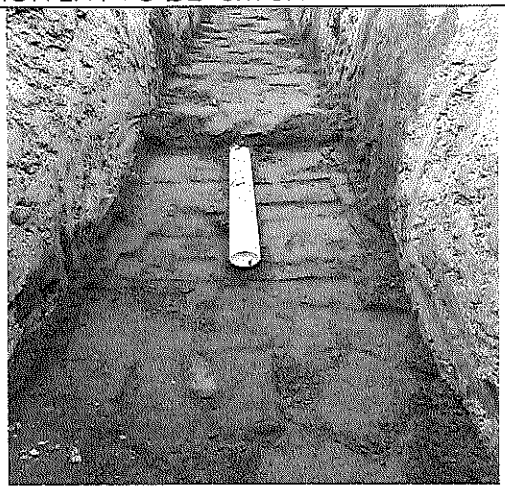
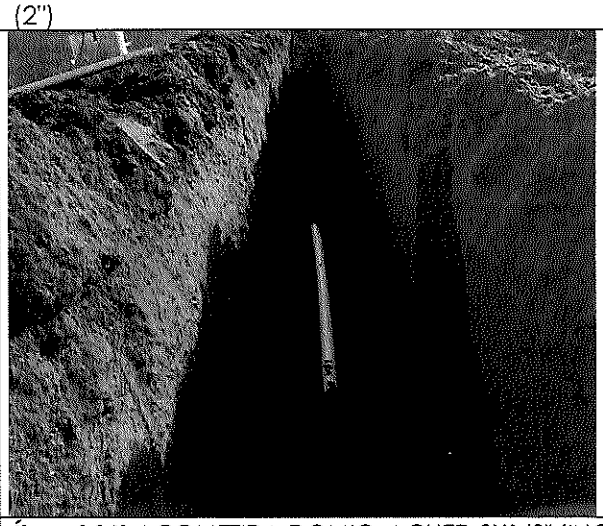
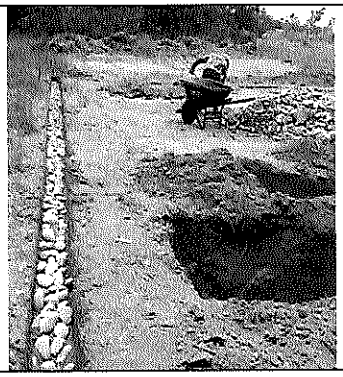
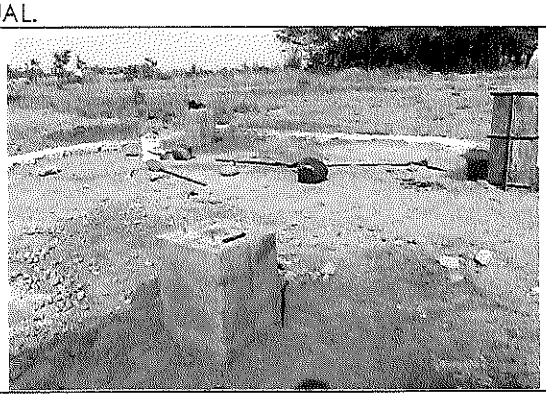
**Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"



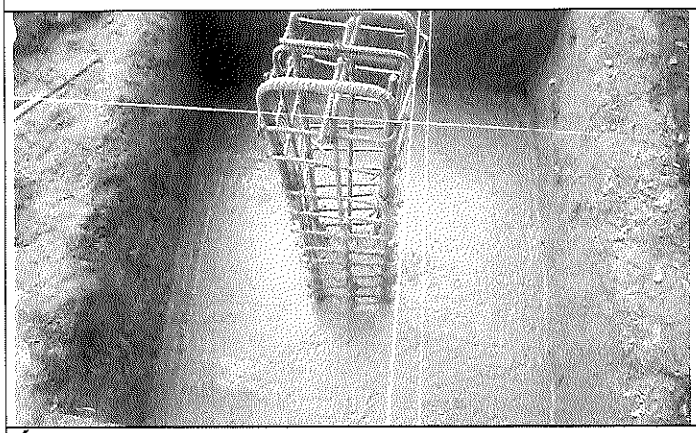
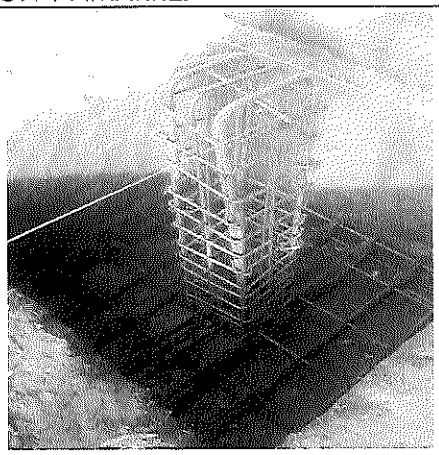
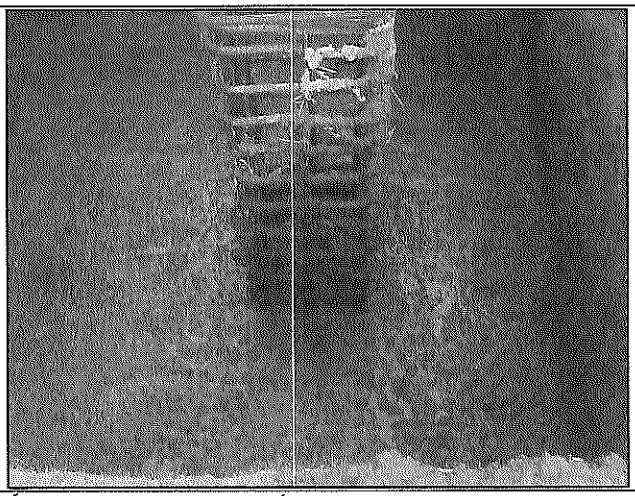
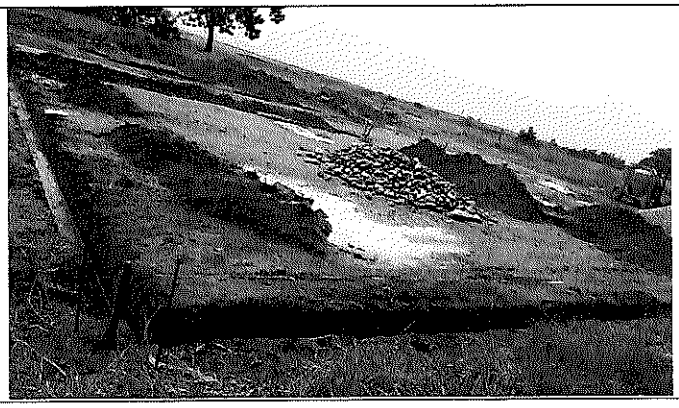
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|---|---|
|  |  |
| **Ítem 4,9)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO) | **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") |
|  |  |
| **Ítem 4,11)** CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) |
|  |  |

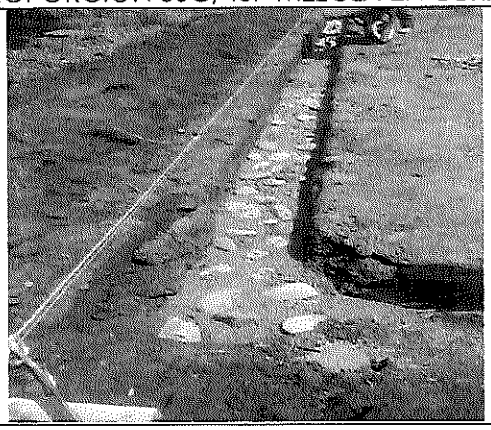
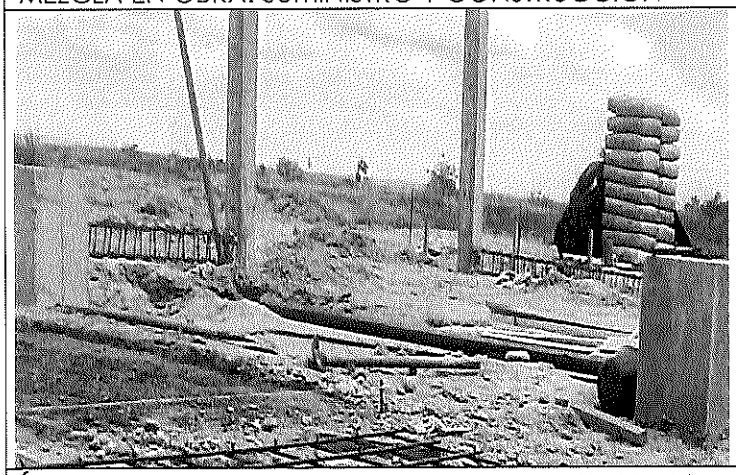
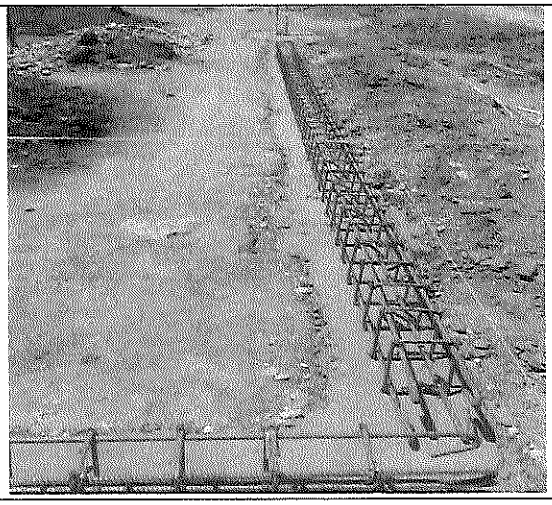
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1


| | |
|---|---|
| **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") |
|  |  |
| **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED.2X1/2" (INC.SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) |
|  |  |
| **Ítem 5,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE | **Ítem 5,4)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

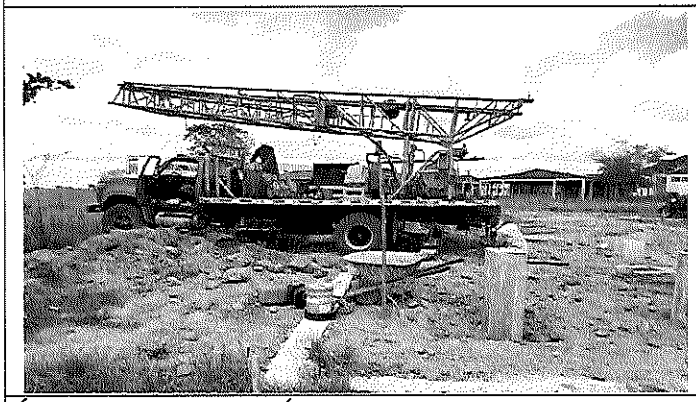

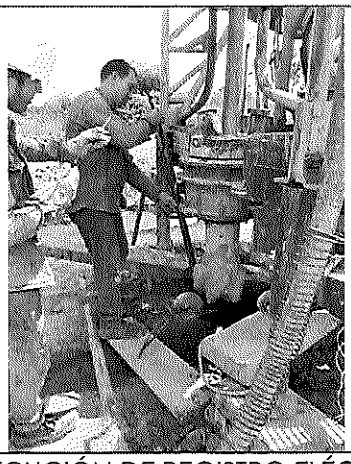
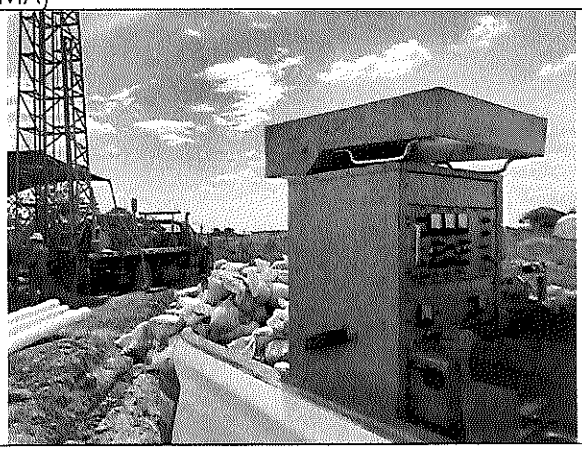
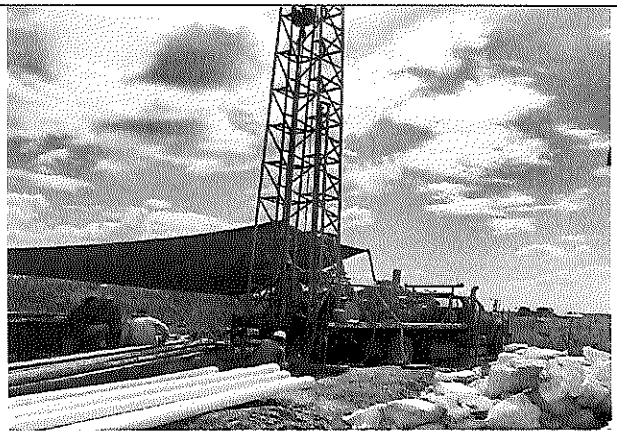
| | |
|---|---|
| **Ítem 5,5)** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | **Ítem 5,6)** COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN |
|  |  |
| **Ítem 5,7)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | **Ítem 5,8)** SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) |
|  |  |
| **Ítem 6,1)** LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA | **Ítem 6,2)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

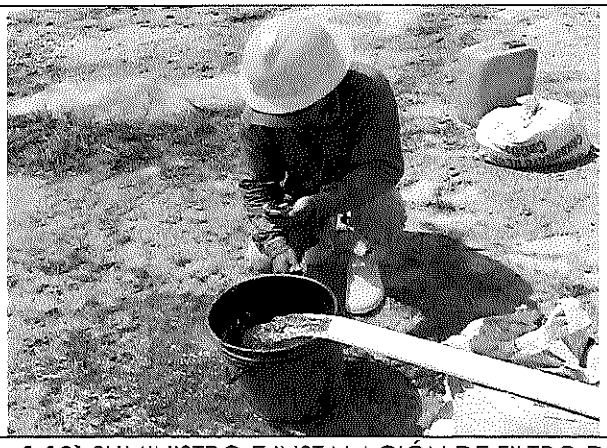
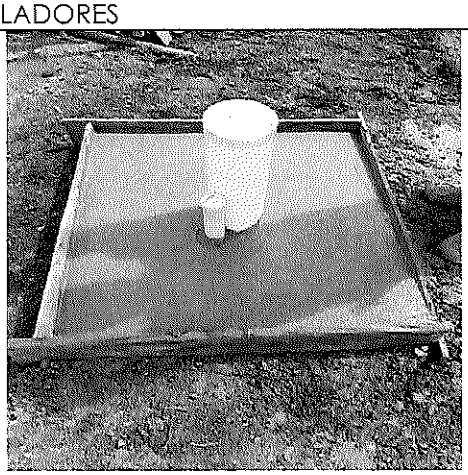
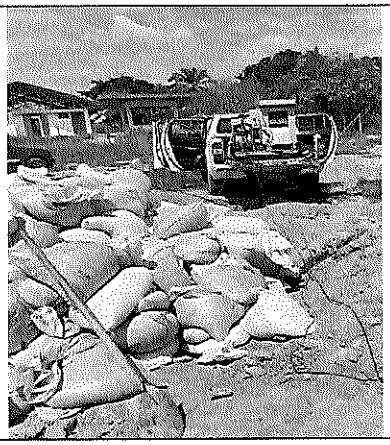
| | |
|---|---|
| **Ítem 6,3)** CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | **Ítem 6,4)** VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN |
|  |  |
| **Ítem 6,5)** COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | **Ítem 6,6)** RELLENO CON GRAVILLA |
|  |  |
| **Ítem 6,7)** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | **Ítem 6,8)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. |
|  |  |

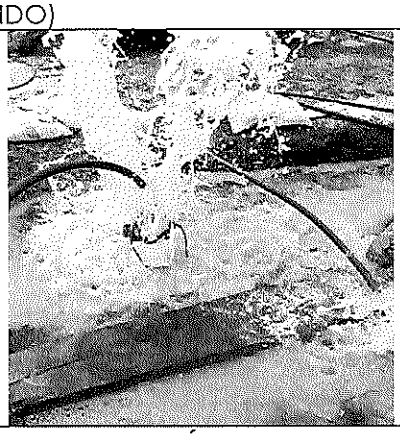
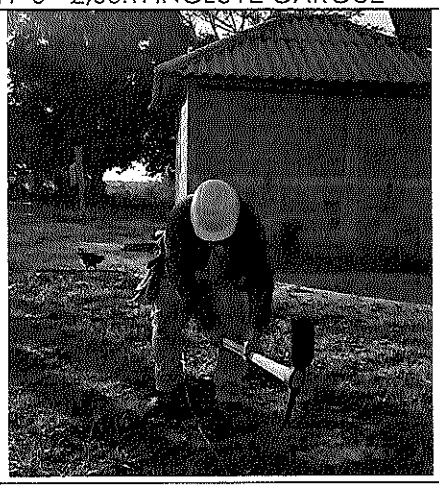
| | |
|---|---|
| **Ítem 6,9)** CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | **Ítem 6,10)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. |
|  |  |
| **Ítem 6,11)** SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | **Ítem 6,12)** TUBO GALVANIZADO DE 2" (L= 2 M, E = 1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

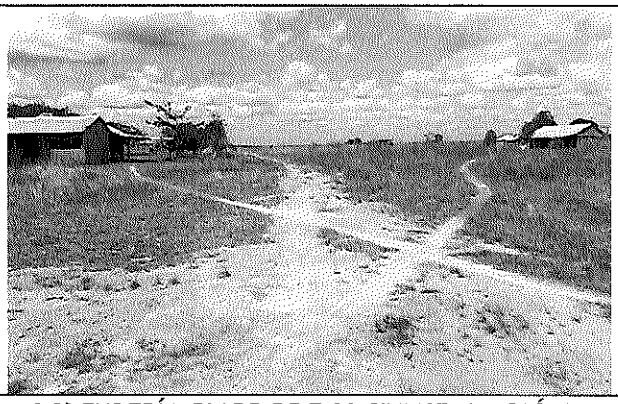
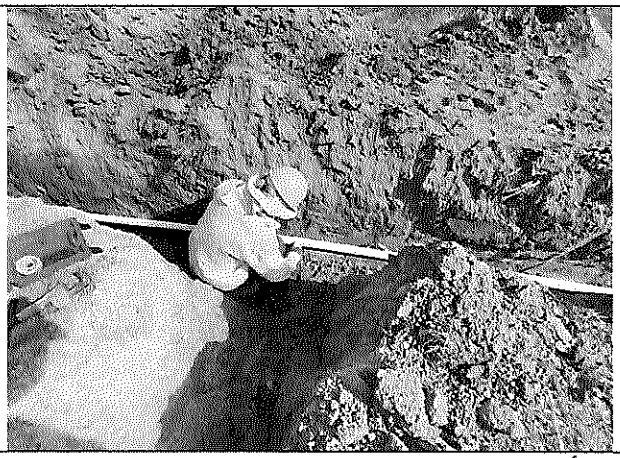
| COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

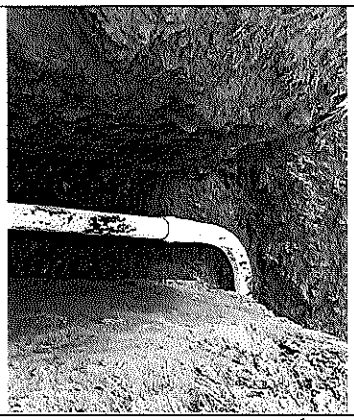
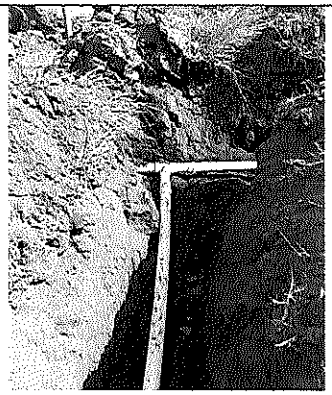
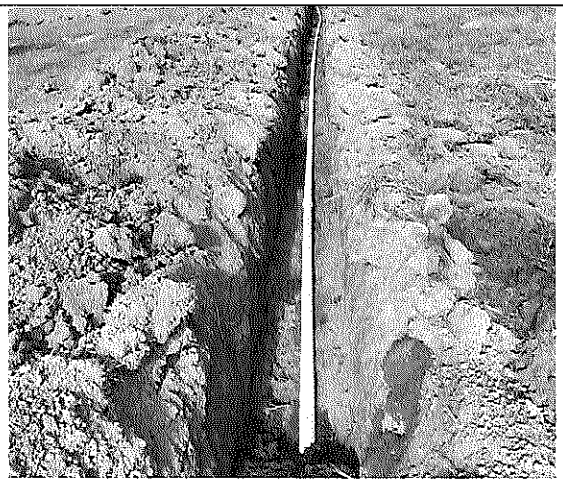
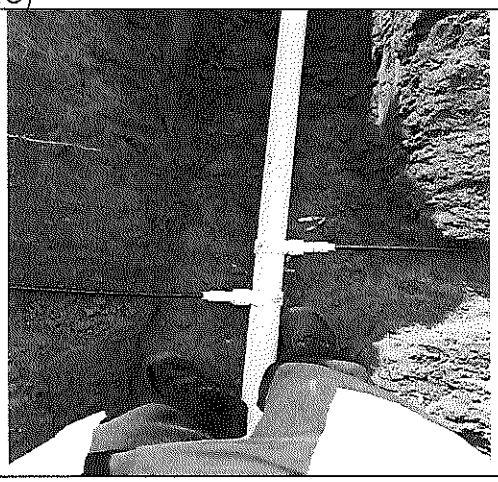
| | |
|---|---|
| **Ítem 1,7)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | **Ítem 1,8)** AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) |
|  |  |
| **Ítem 1,9)** CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | **Ítem 1,10)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION |
|  |  |
| **Ítem 1,11)** SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | **Ítem 1,12)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO |
|  |  |

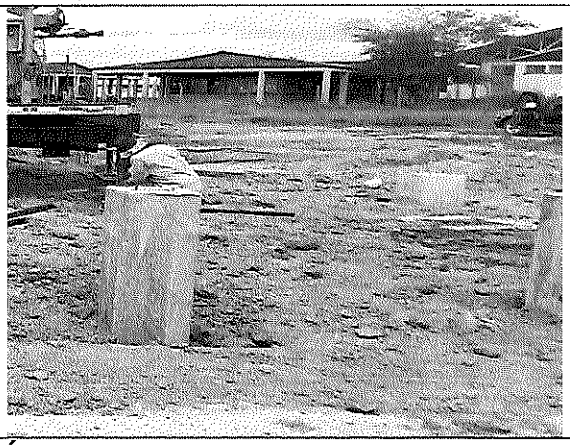
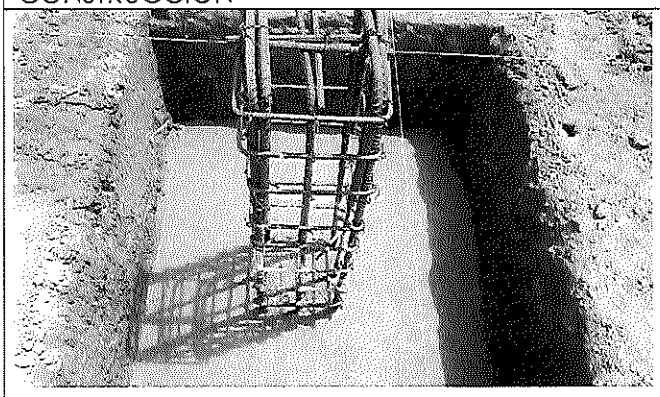
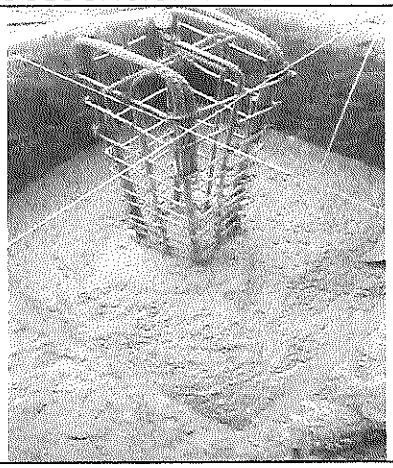
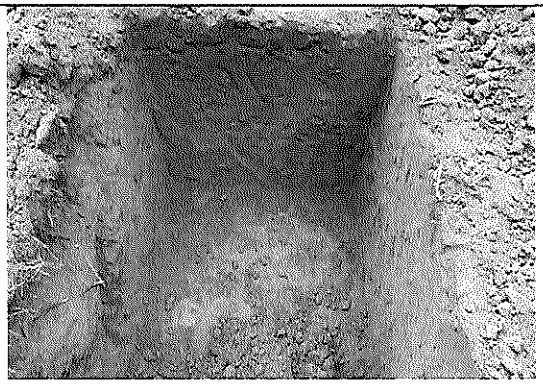
| | |
|---|---|
| **Ítem 1,13)** LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | **Ítem 1,14)** DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) |
|  |  |
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |

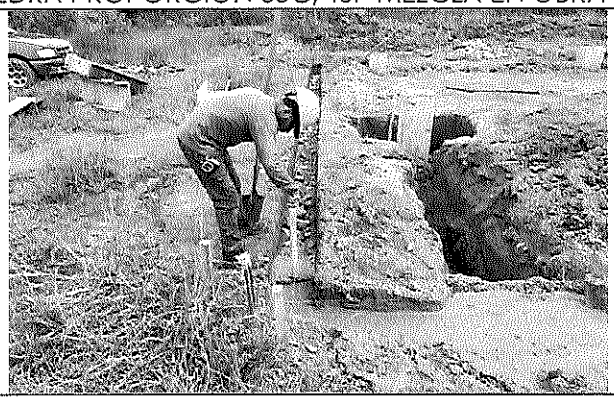
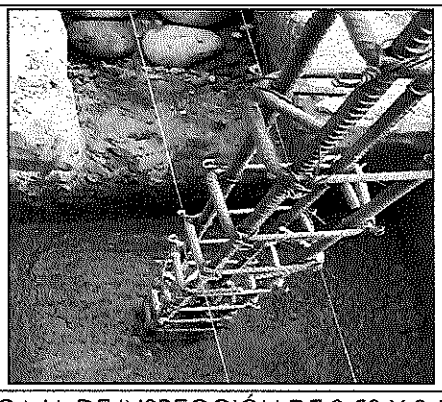
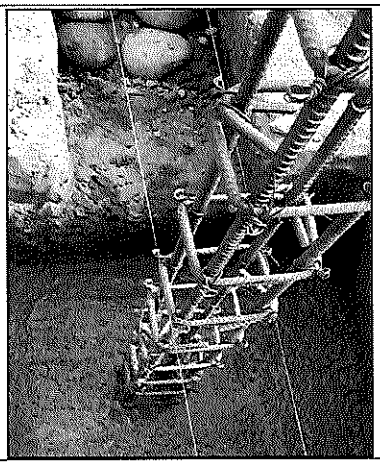
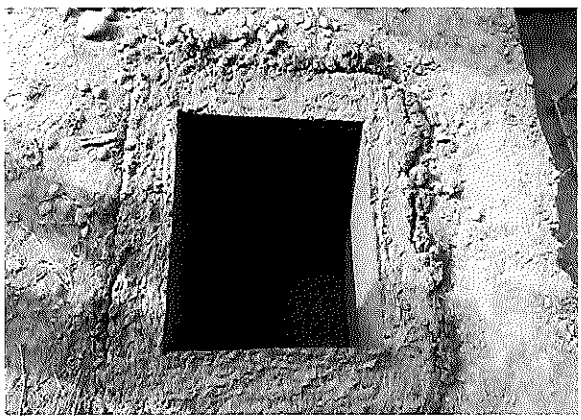
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

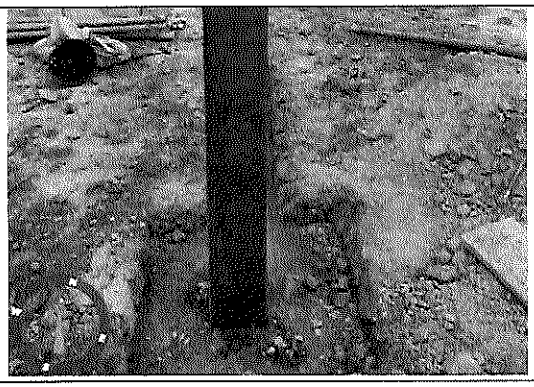
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|  |  |
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,9)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO) | **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") |
|  |  |

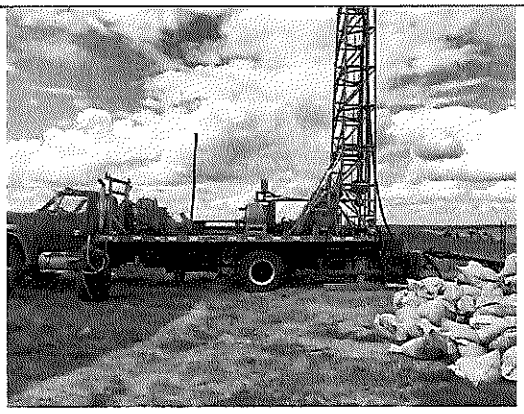
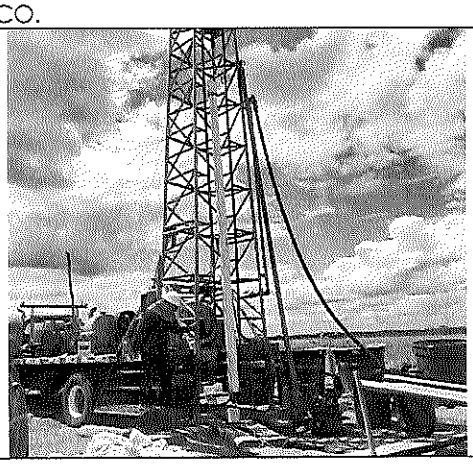
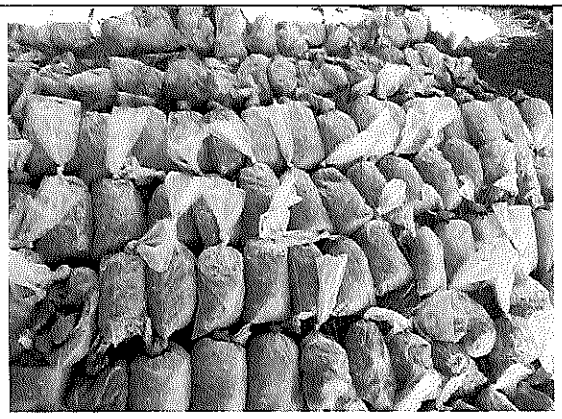
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,11)** CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) |
|  |  |
| **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") |
|  |  |
| **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) |
|  |  |

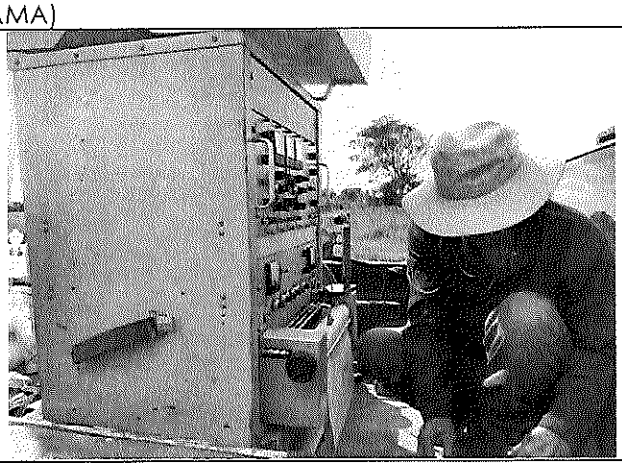
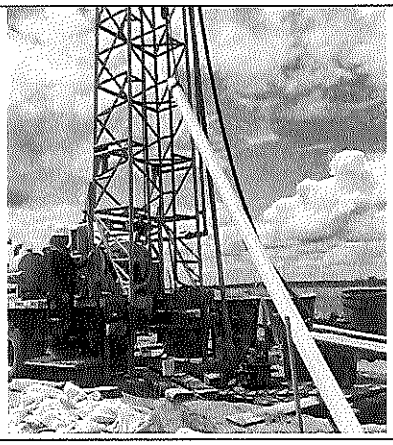
| | |
|---|---|
| **Ítem 5,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE | **Ítem 5,4)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. |
|  |  |
| **Ítem 5,5)** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | **Ítem 5,6)** COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN |
|  |  |
| **Ítem 5,7)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | **Ítem 5,8)** SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) |
|  |  |

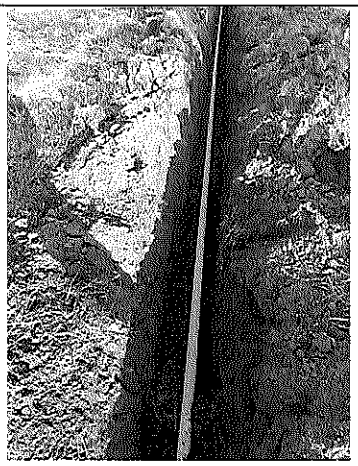
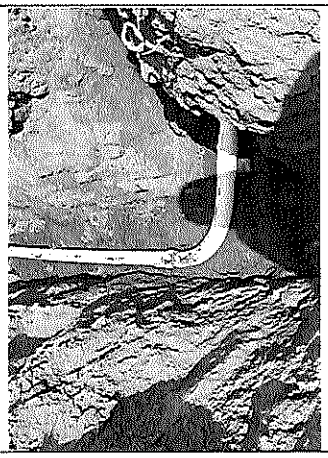
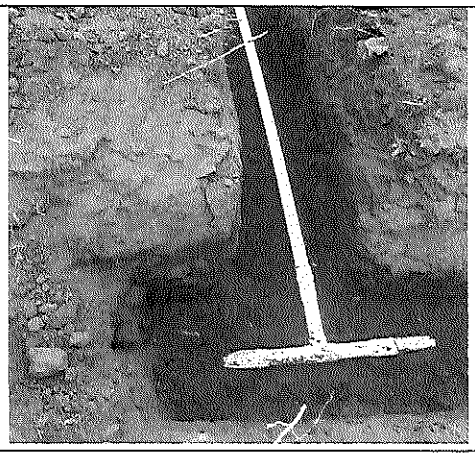
| | |
|---|---|
| **Ítem 6,1)** LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA | **Ítem 6,2)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE |
|  |  |
| **Ítem 6,3)** CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | **Ítem 6,7)** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN |
|  |  |
| **Ítem 6,8)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | **Ítem 6,9)** CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN |
|  |  |

| **Ítem 6,10)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | **Ítem 6,11)** SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) |
|---|---|
|  |  |

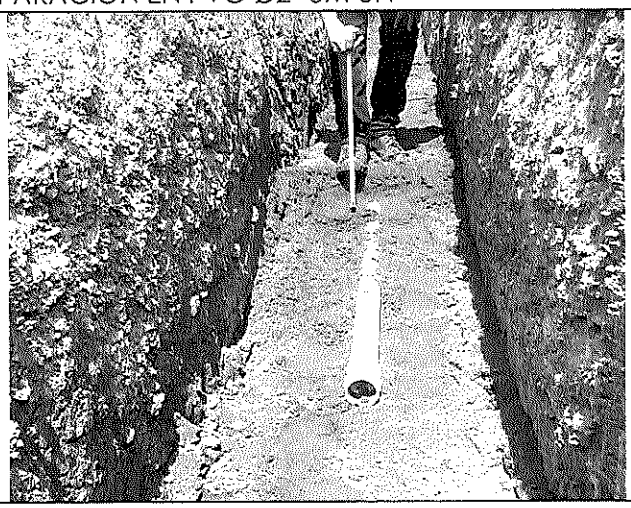
| **COMUNIDAD PUERTO LOPEZ** | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |
|  |  |
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|  |  |
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) |
|  |  |

**Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN



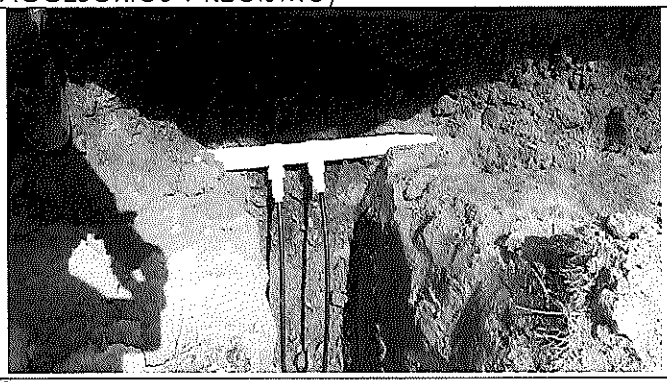
**Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")



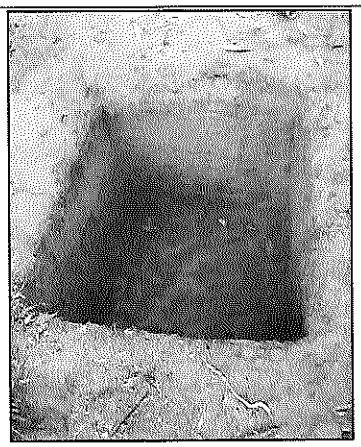
**Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE




**Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)

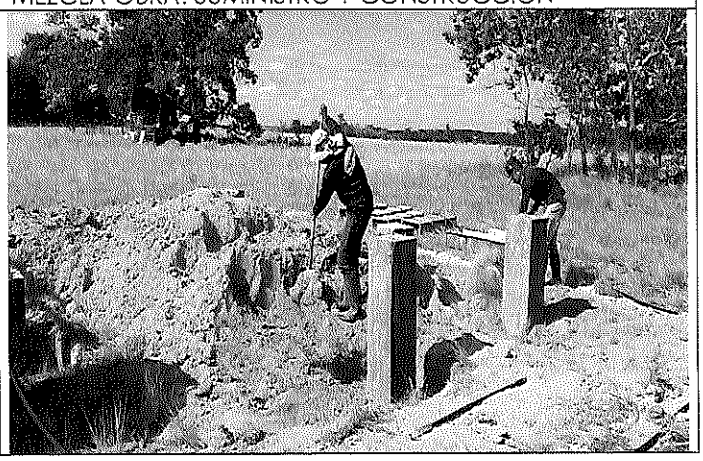


**Ítem 5,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE

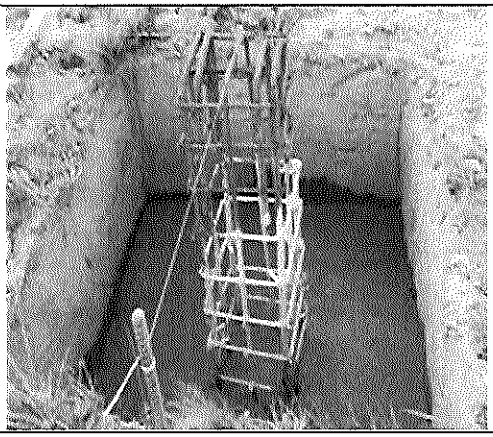


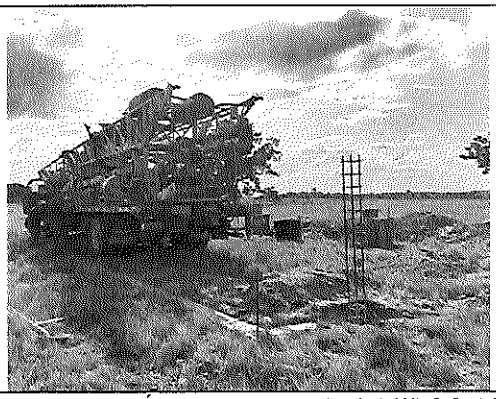
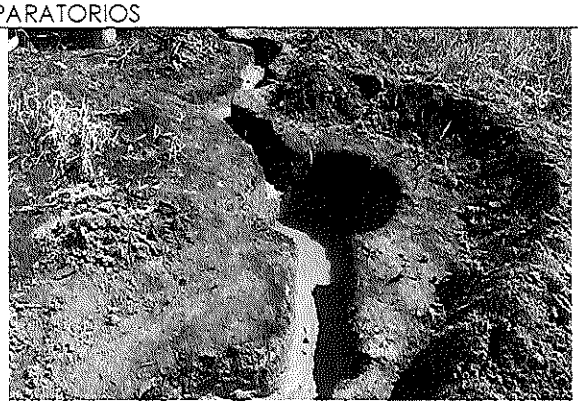
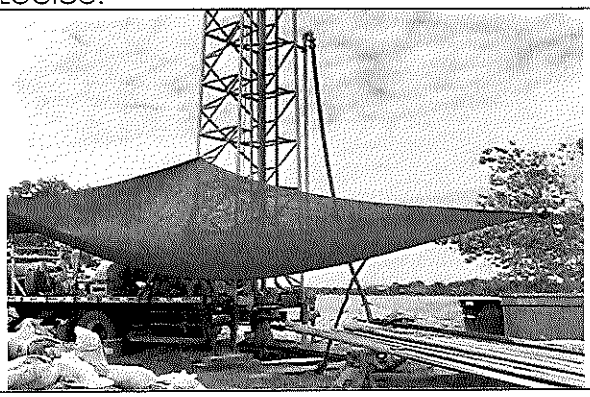
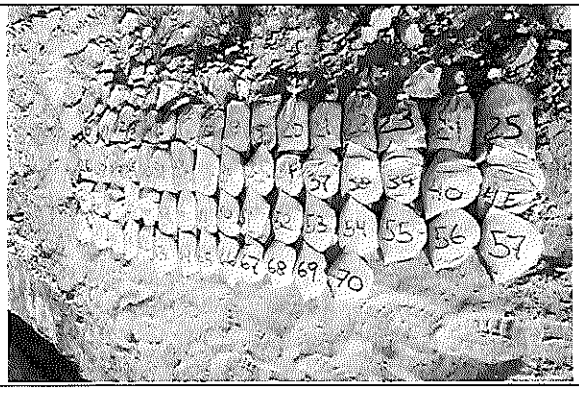
**Ítem 5,4)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.

**Ítem 5,6)** COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

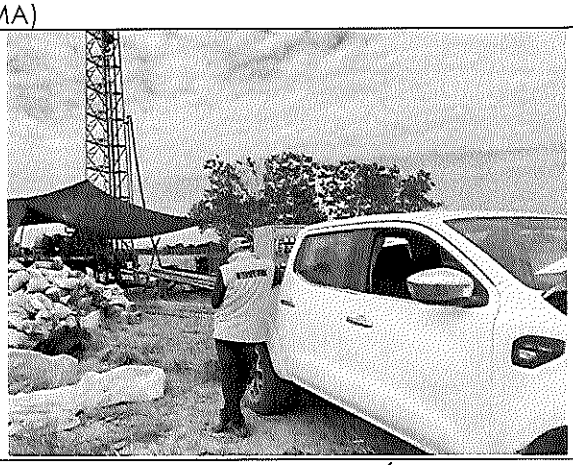
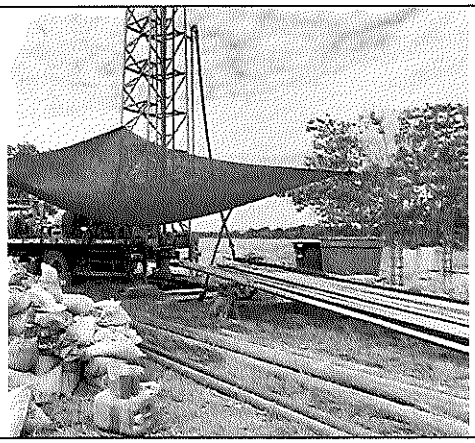
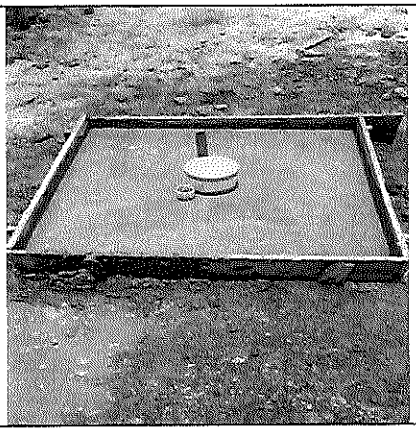
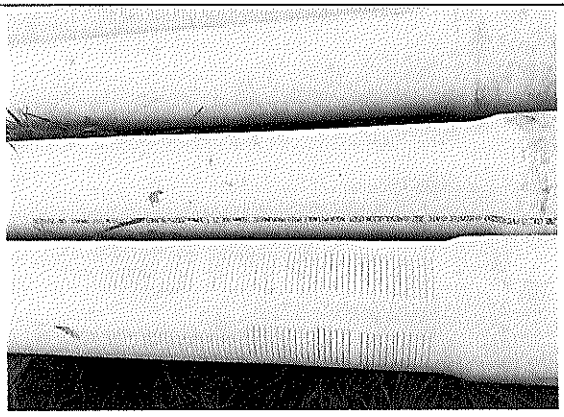


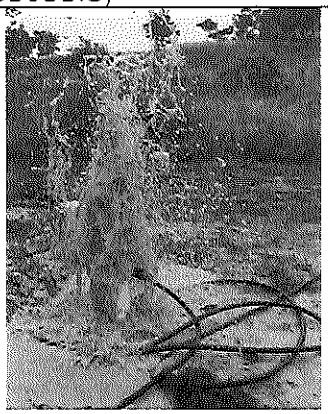
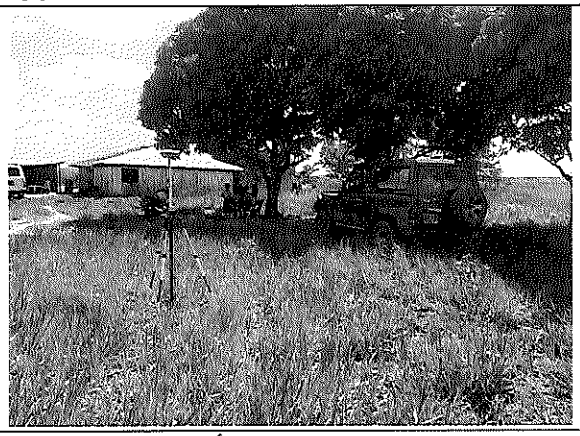
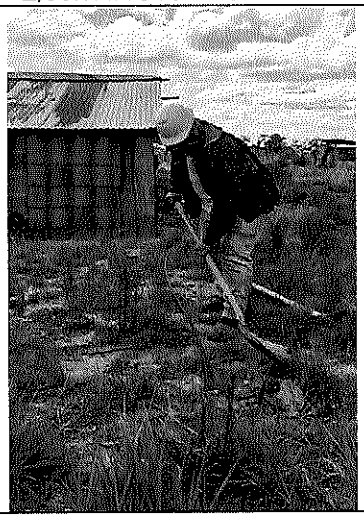
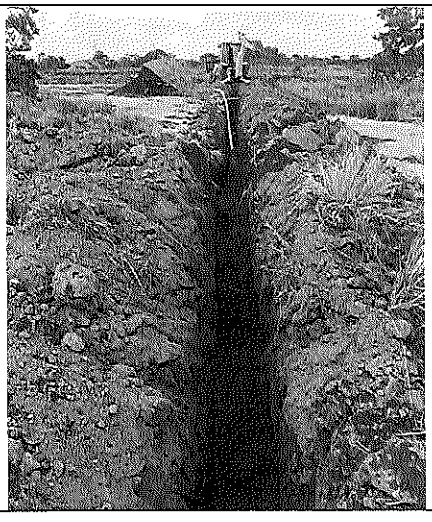
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

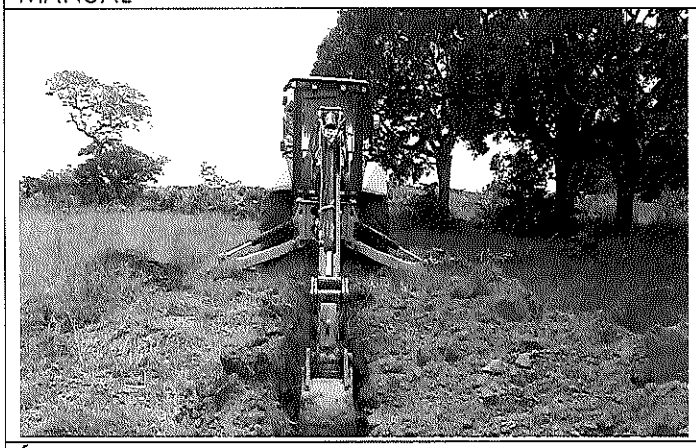
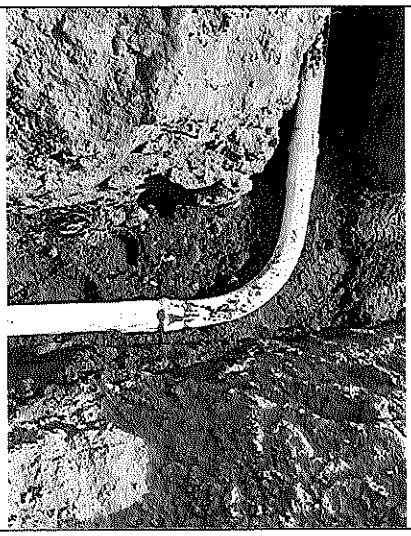
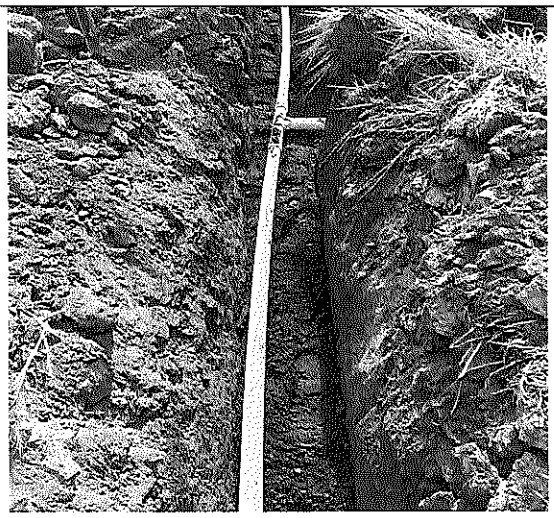
| | |
|---|---|
| **Ítem 5,5)** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN **Ítem 5,7)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | **Ítem 5,8)** SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) |
|  |  |

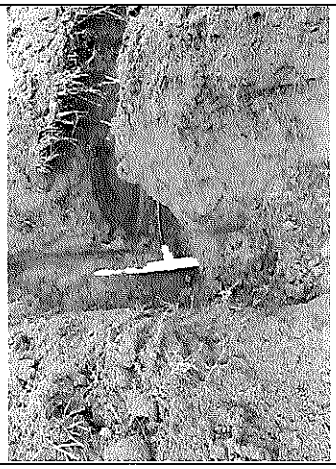
| **COMUNIDAD PUNTO GRILLO** | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |

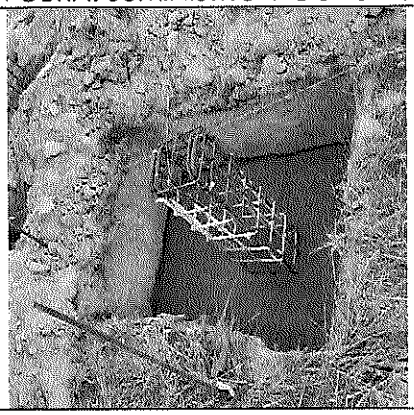
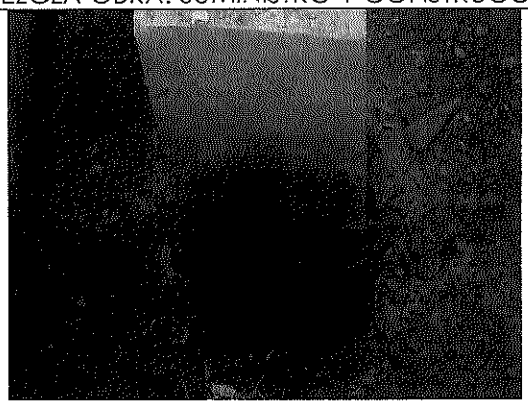
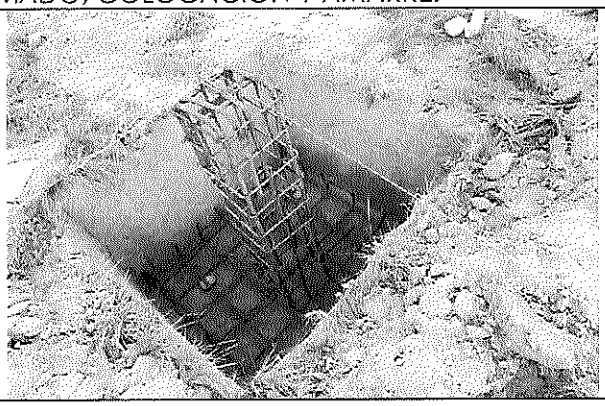
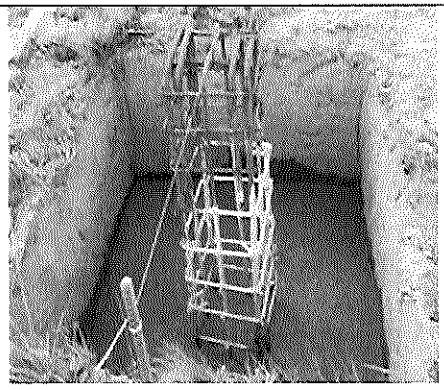
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

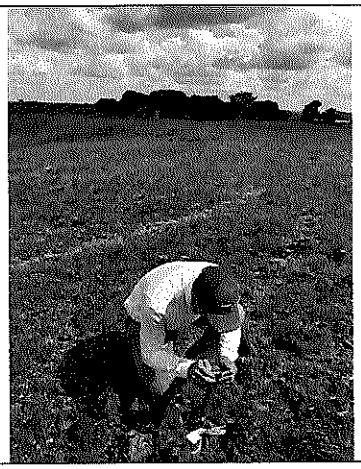
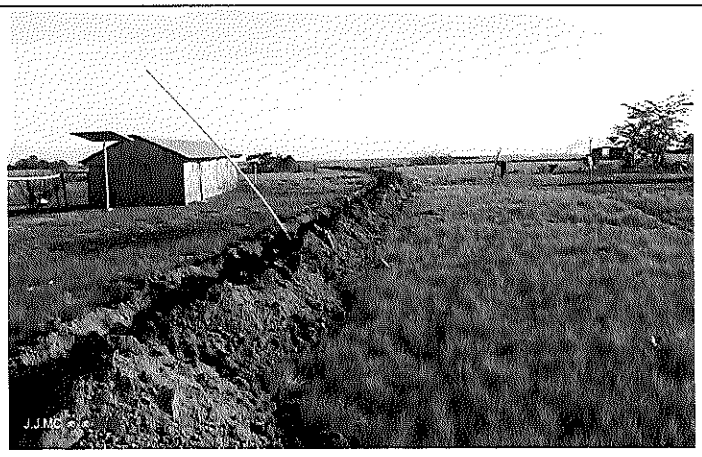
| | |
|---|---|
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |
|  |  |
| **Ítem 1,7)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | **Ítem 1,8)** AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) |
|  |  |
| **Ítem 1,9)** CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | **Ítem 1,10)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION |
|  |  |

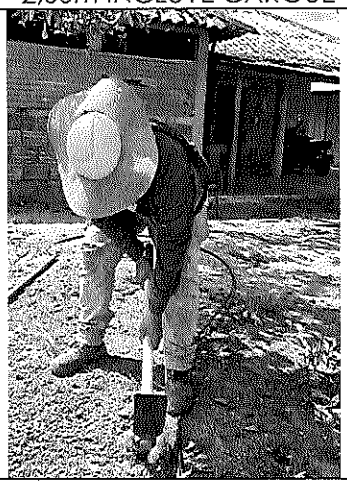
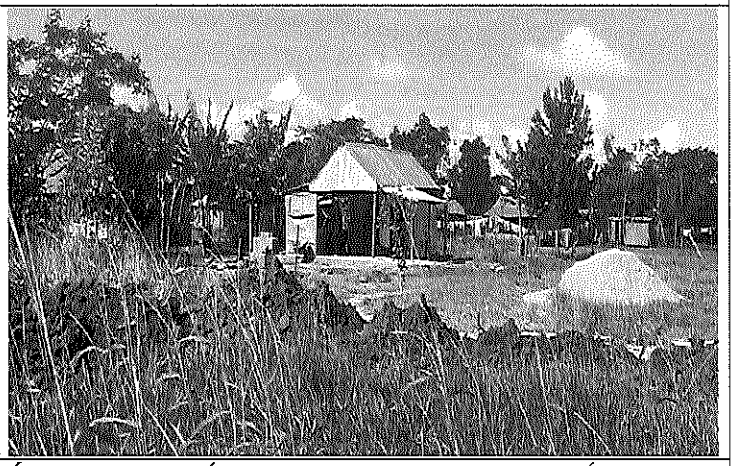
| | |
|---|---|
| **Ítem 1,11)** SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.<br>**Ítem 1,12)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | **Ítem 1,13)** LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)<br>**Ítem 1,14)** DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) |
|  |  |
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|  |  |
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) |
|  |  |

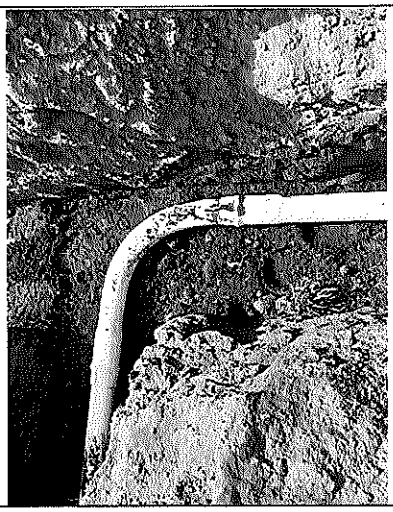
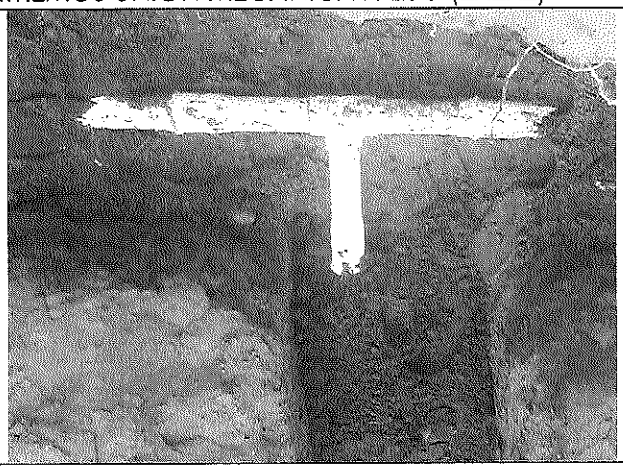
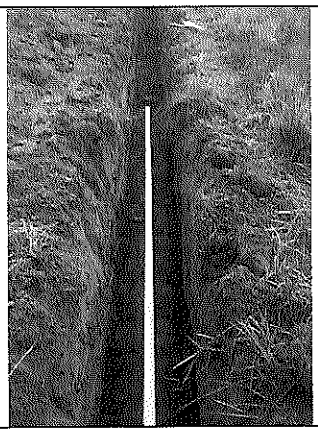
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") |
|  |  |
| **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) |
|  |  |
| **Ítem 5,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE | **Ítem 5,4)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. |
|  |  |

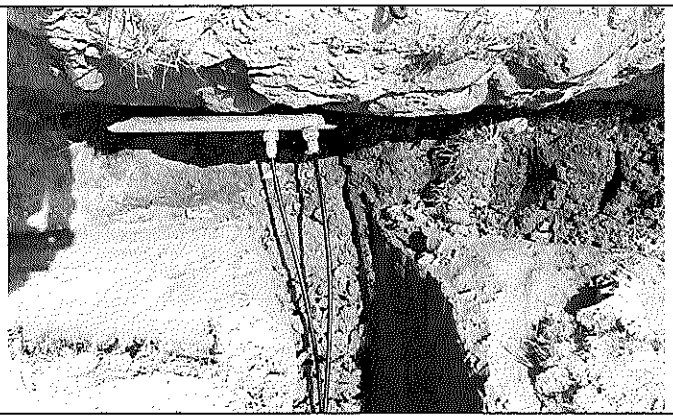
| **Ítem 5,5)** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | **Ítem 5,6)** COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN |
|---|---|
|  |  |
| **Ítem 5,7)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | **Ítem 5,8)** SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) |
|  |  |

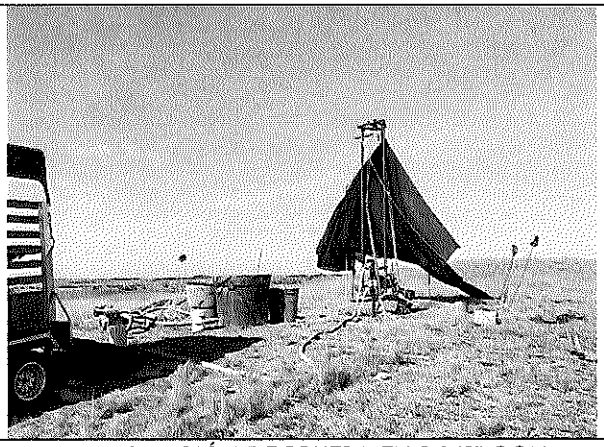
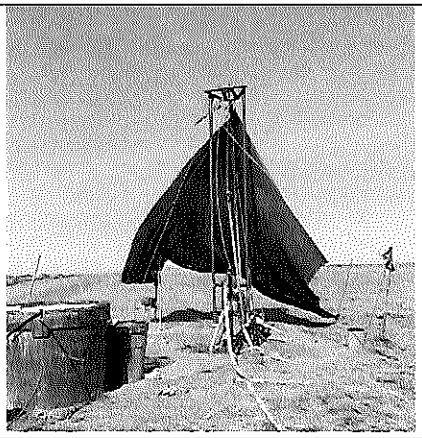
| **COMUNIDAD SAN GIL** | |
|---|---|
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|  |  |
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|  |  |

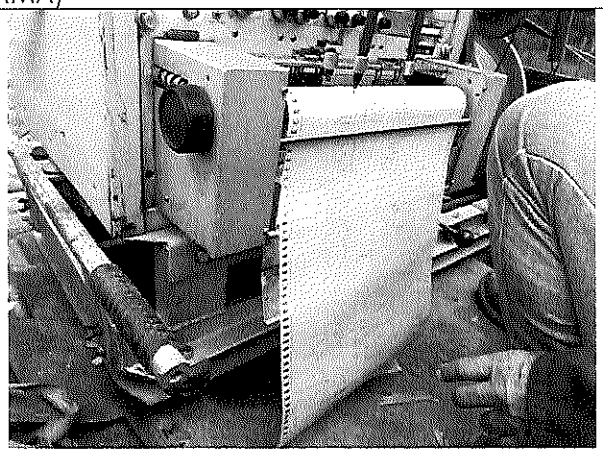
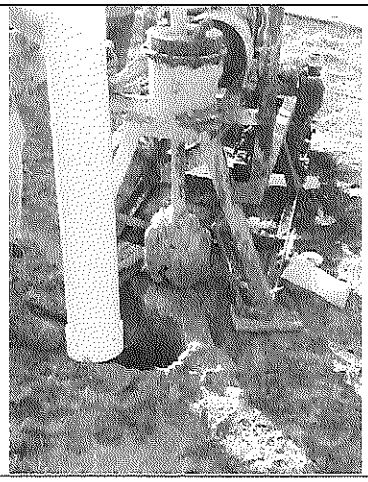
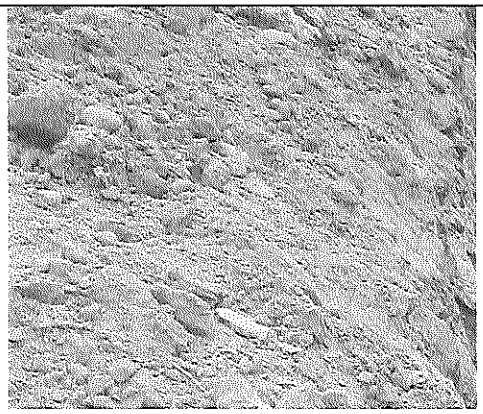
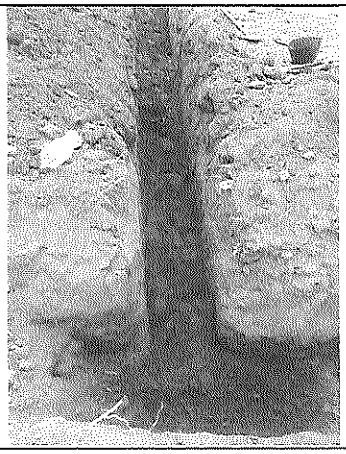
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

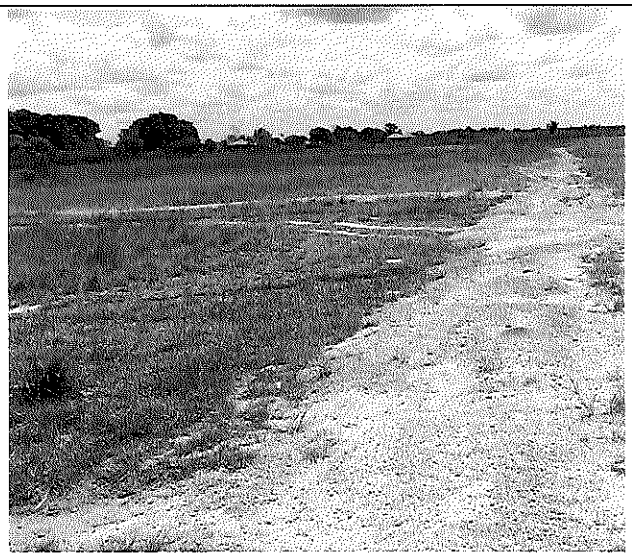
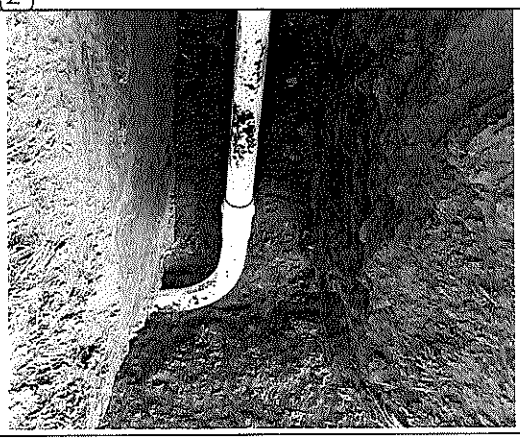
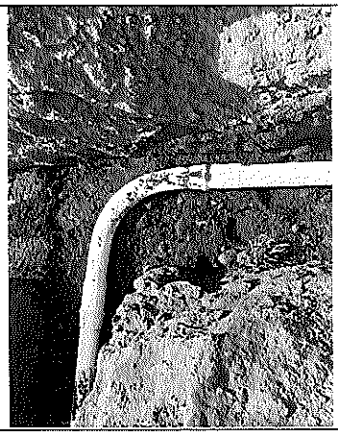
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,11)** CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") |
|  |  |
| **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN |
|  |  |
| **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE |
|  |  |

| **Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) |
|---|
|  |

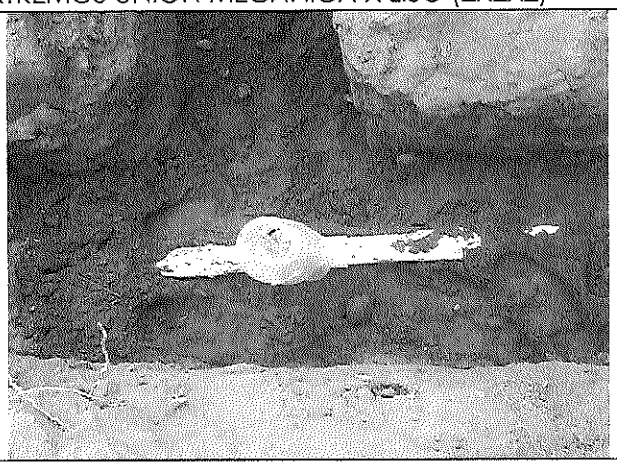
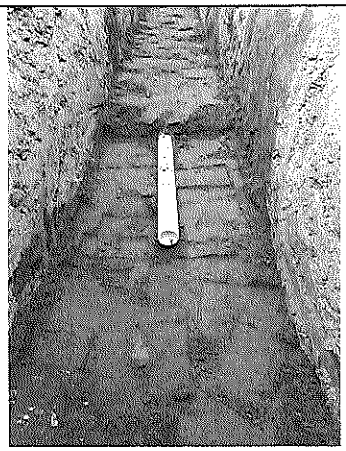
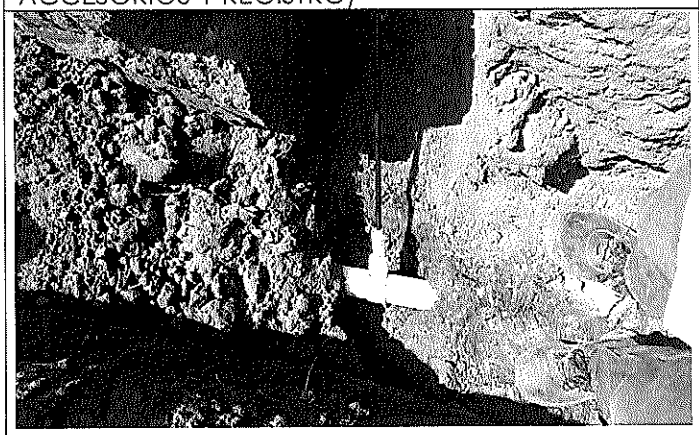
| **COMUNIDAD FACUNAE** | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

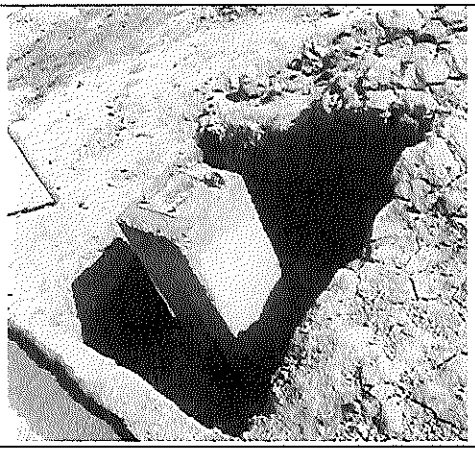
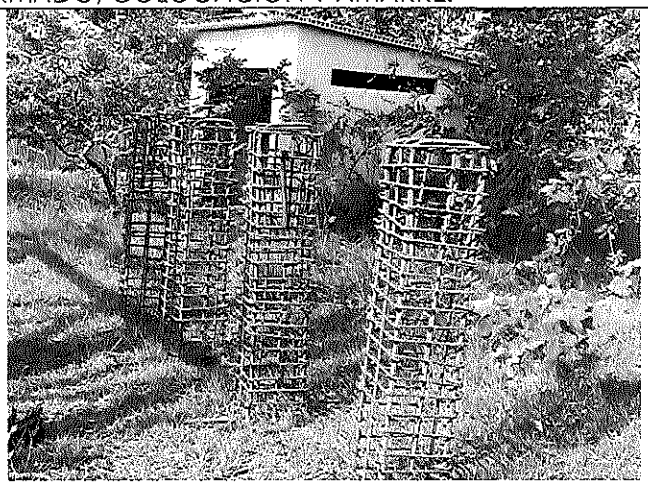
| | |
|---|---|
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |
|  |  |
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|  |  |
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,11)** CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") |
|  |  |

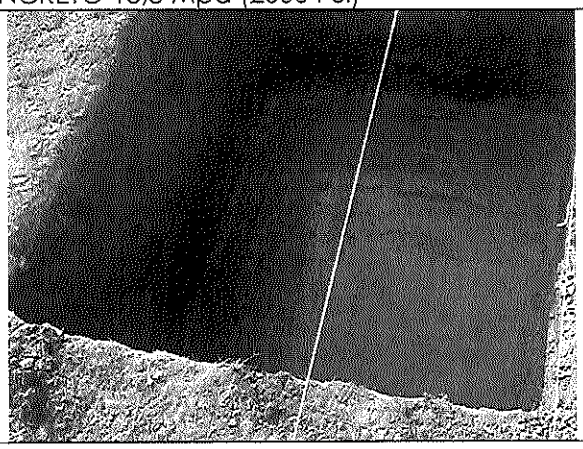
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN |
|  |  |
| **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE |
|  |  |
| **Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | **Ítem 5,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.680 – 1

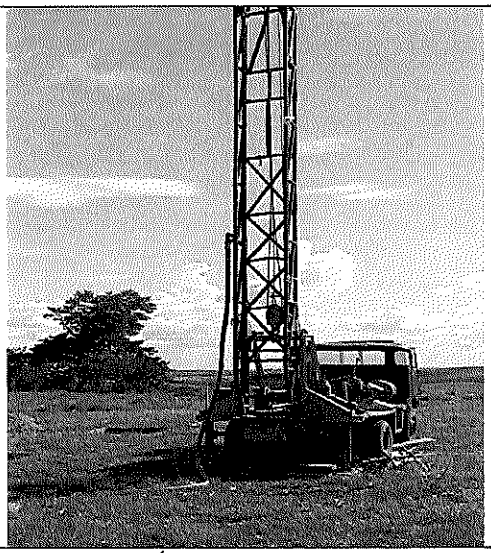
| | |
|---|---|
| **Ítem 5,4)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | **Ítem 5,5)** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN |
|  |  |
| **Ítem 5,6)** COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | **Ítem 5,7)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. |
|  |  |

**Ítem 5,8)** SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)

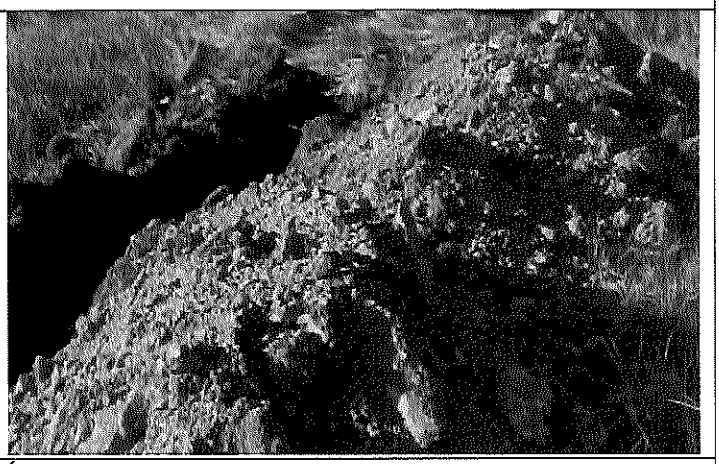
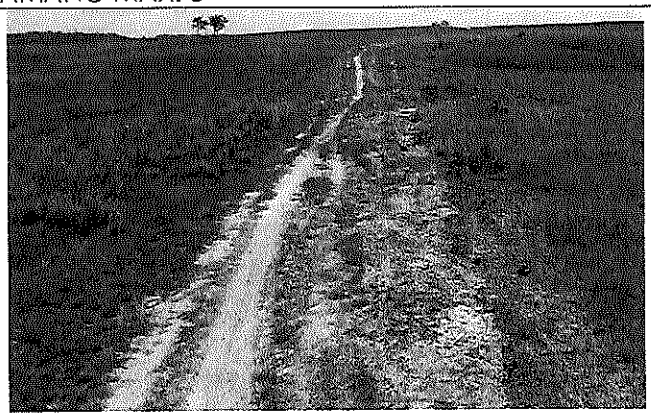


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

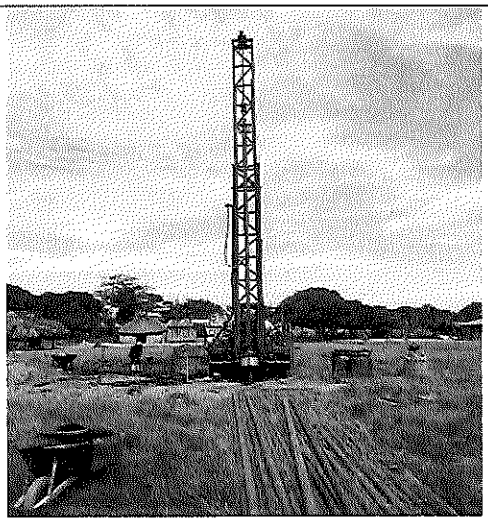
# RESGUARDO DOMOPLANAS

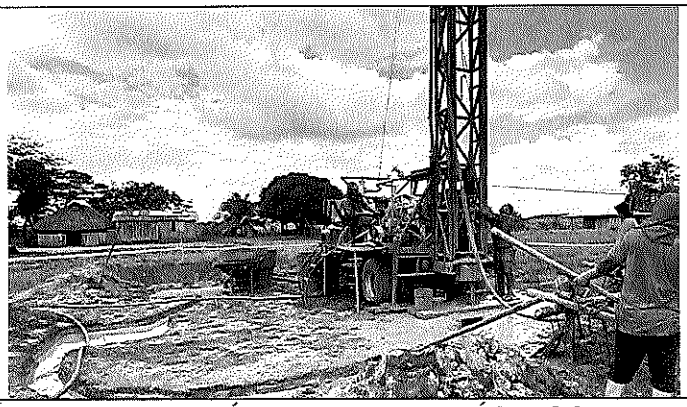
| COMUNIDAD VILLAMARCIA | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.<br>**Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| COMUNIDAD PUERTO GAVILAN | |
|---|---|
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL |
|  |  |
| **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR |
|  |  |

| **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE |
|---|---|
|  |  |

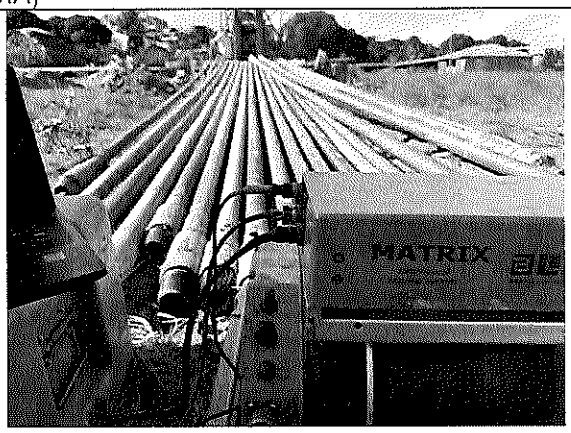
| **COMUNIDAD LAS DELICIAS** | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |



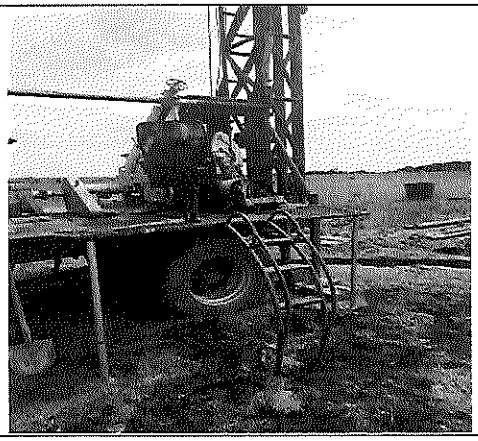
**Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)



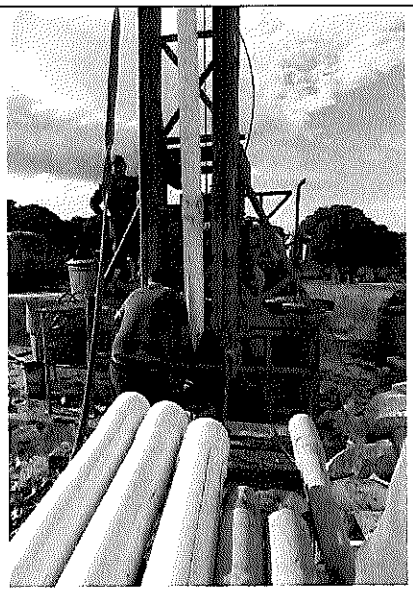
**Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"



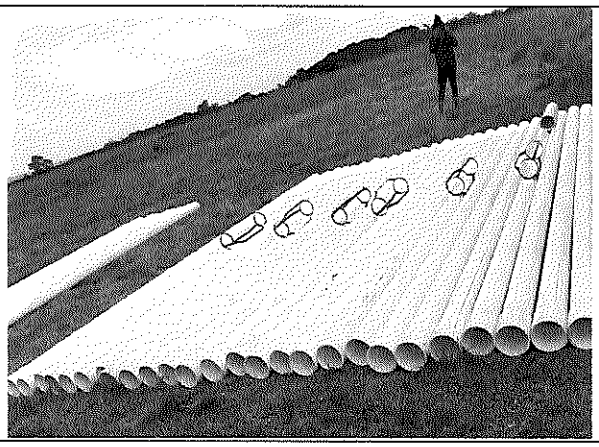
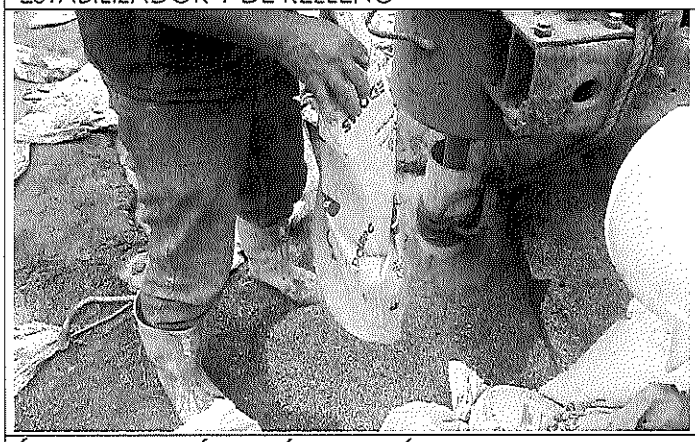
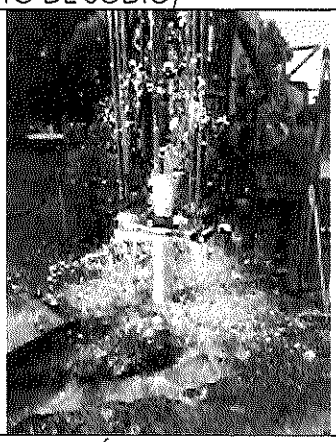
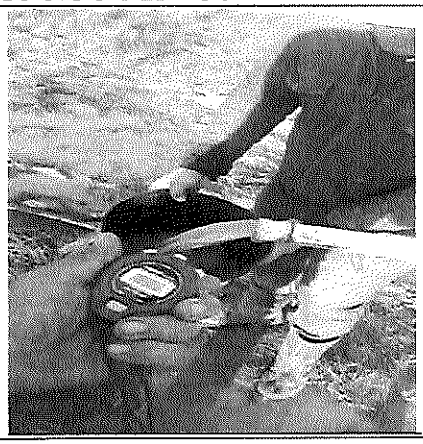

**Ítem 1,7)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M

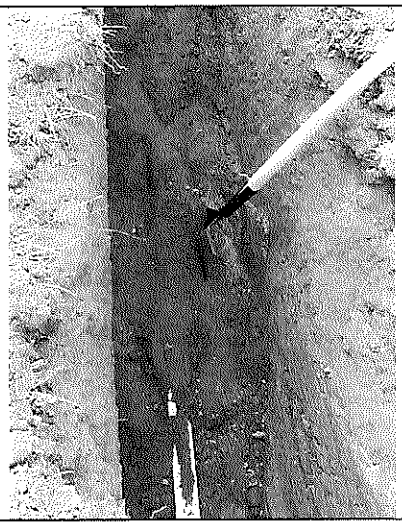
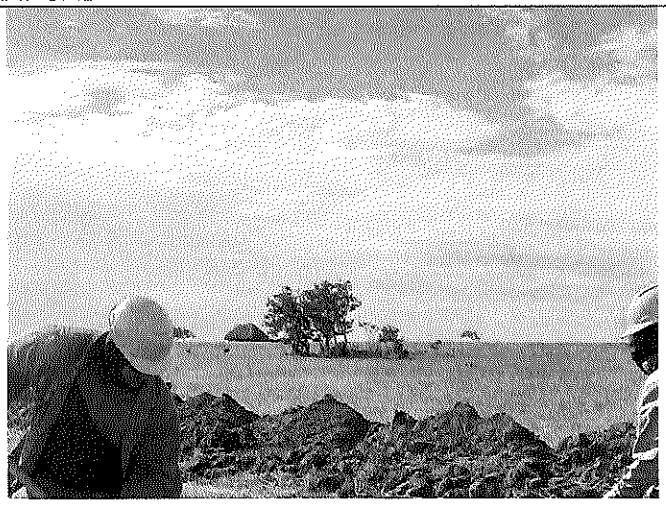
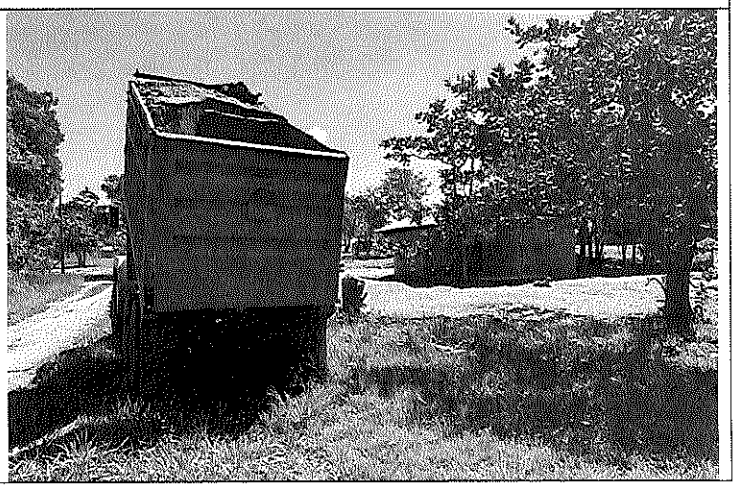


**Ítem 1,8)** AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)

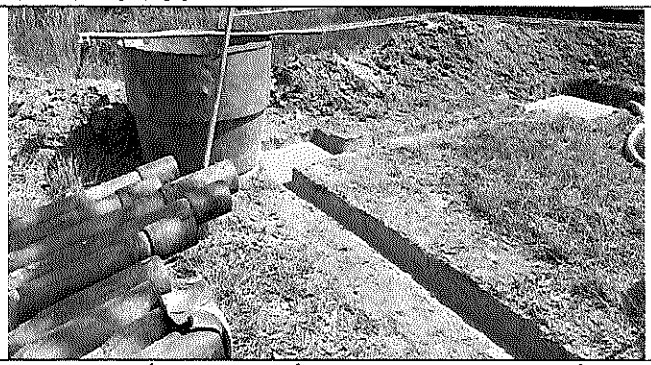
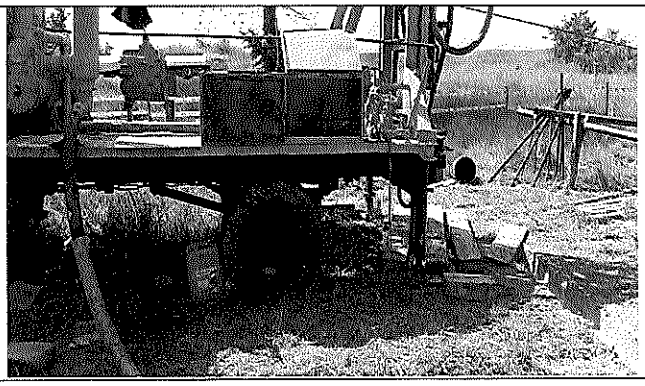


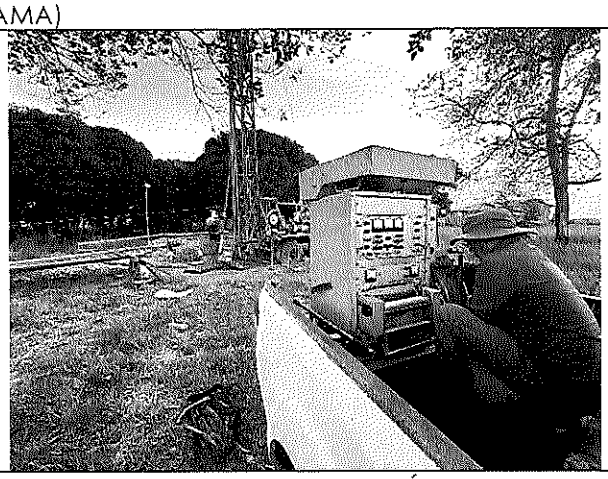
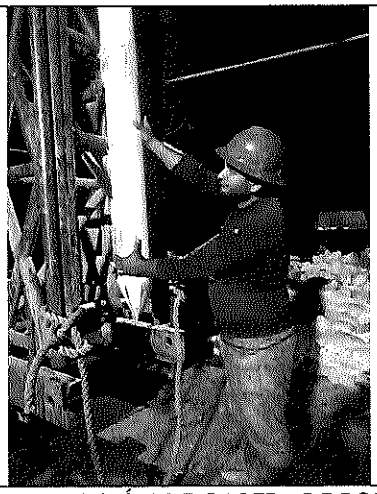

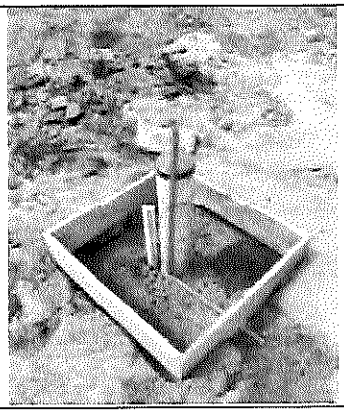
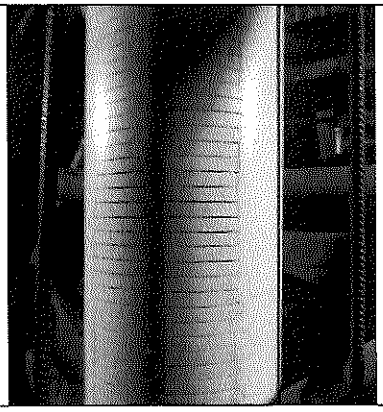


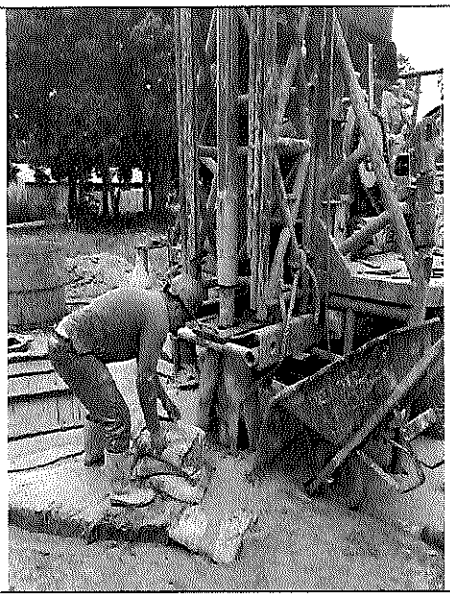
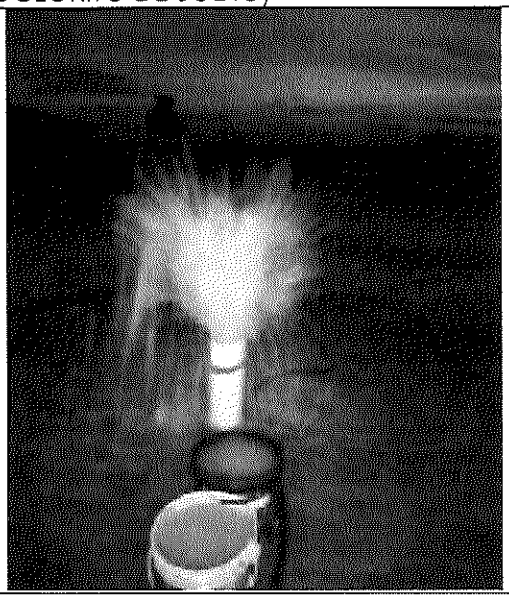
| | |
|---|---|
| **Ítem 1,9)** CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | **Ítem 1,10)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION |
|  |  |
| **Ítem 1,11)** SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.<br>**Ítem 1,12)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | **Ítem 1,13)** LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTINGAIRE COMPRIMIDO)<br>**Ítem 1,14)** DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) |
|  |  |
| **Ítem 1,15)** ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA | **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS |
|  |  |

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE |
|  |  |
| **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL |
|  |  |
| **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR |
|  |  |

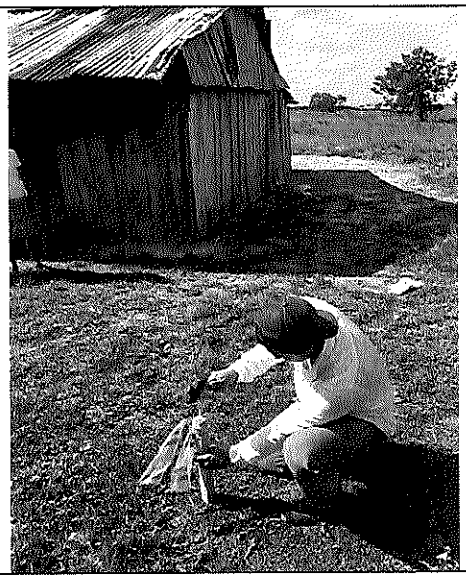
| **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE |
|---|---|
|  |  |

| **COMUNIDAD CACHAMITAS** | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |

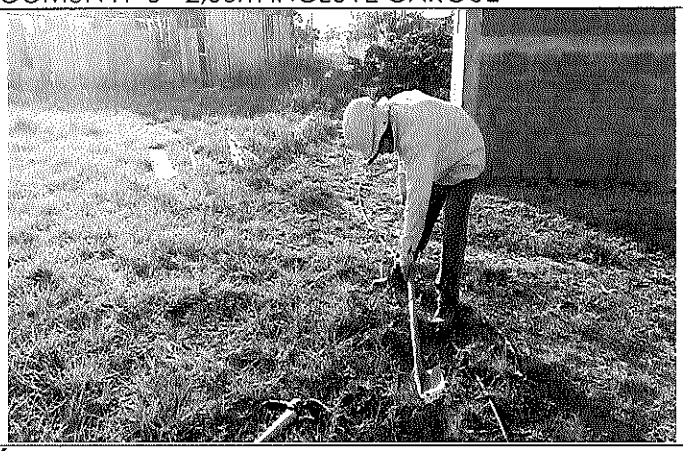
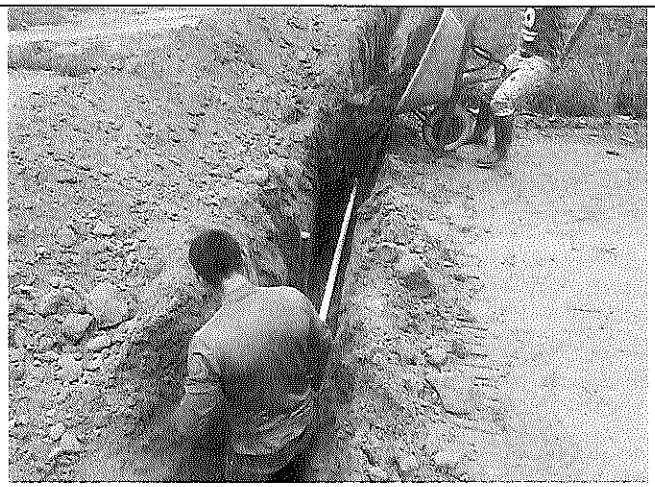
| | |
|---|---|
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |
|  |  |
| **Ítem 1,7)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | **Ítem 1,8)** AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) |
|  |  |
| **Ítem 1,9)** CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | **Ítem 1,10)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION |
|  |  |

| | |
|---|---|
| **Ítem 1,11)** SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.<br>**Ítem 1,12)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | **Ítem 1,13)** LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)<br>**Ítem 1,14)** DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) |
|  |  |

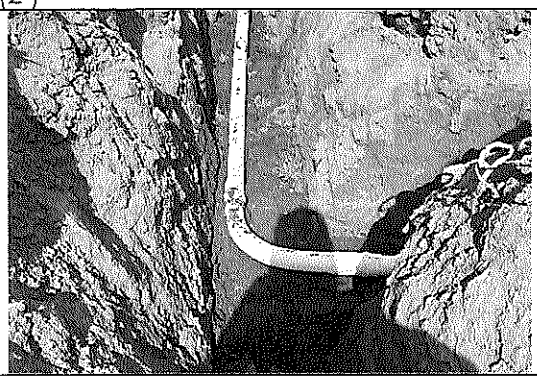
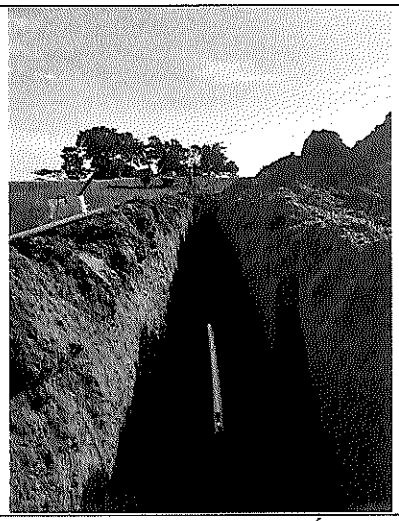
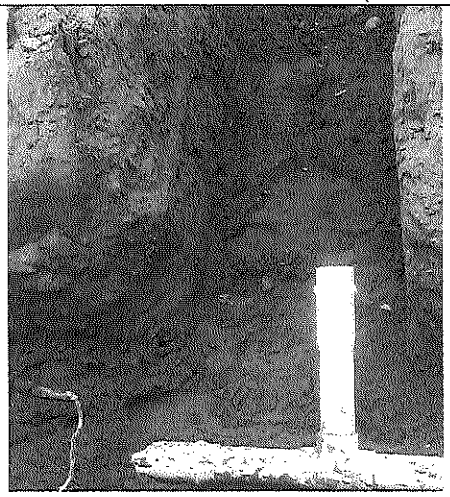
## RESGUARDO WACOYO

| COMUNIDAD KALIWIRNAE | |
|---|---|
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |

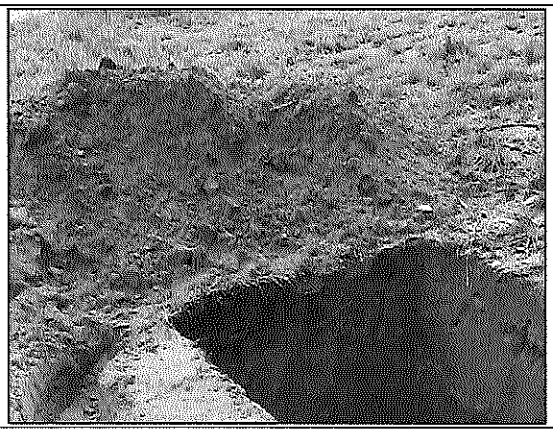
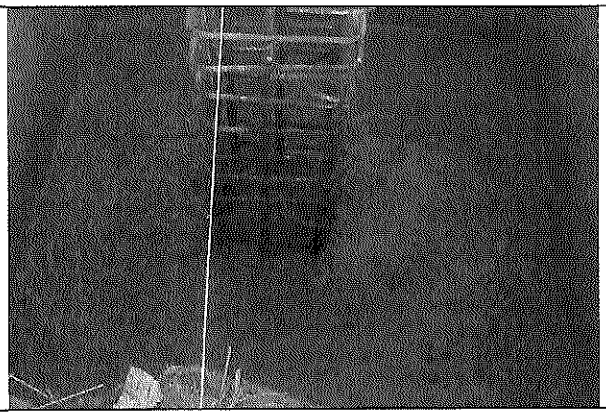
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

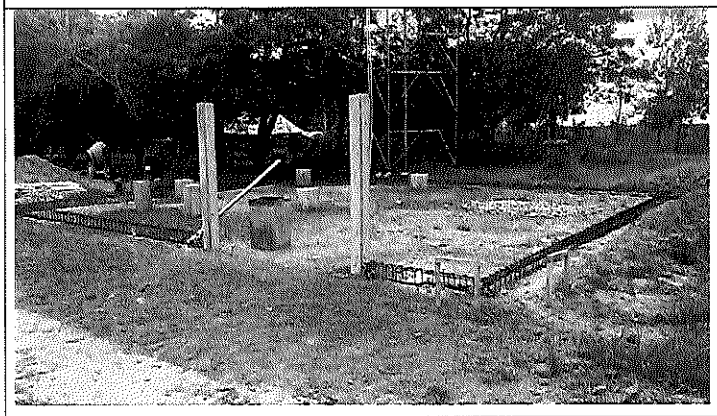
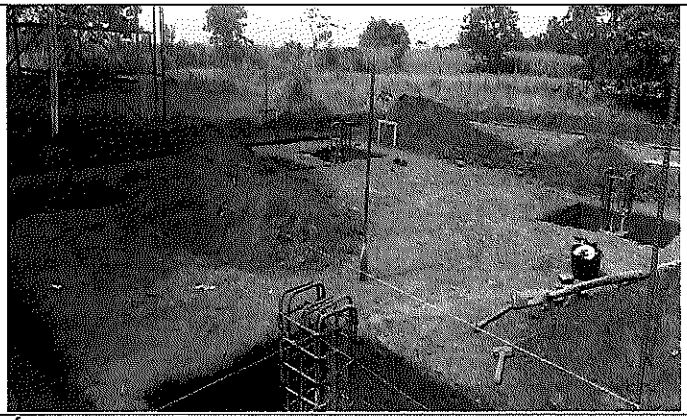
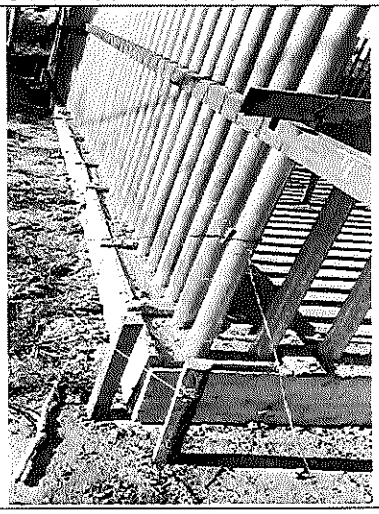
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|  |  |
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

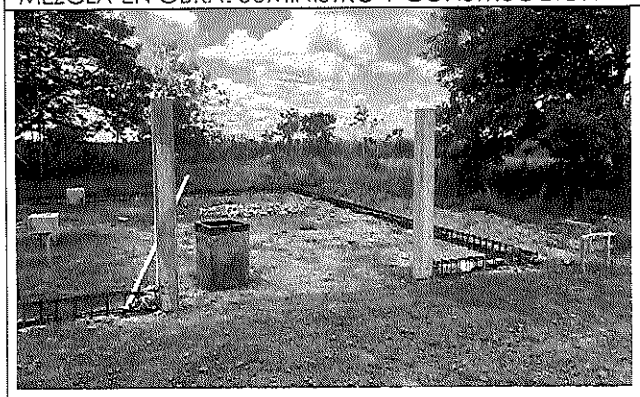
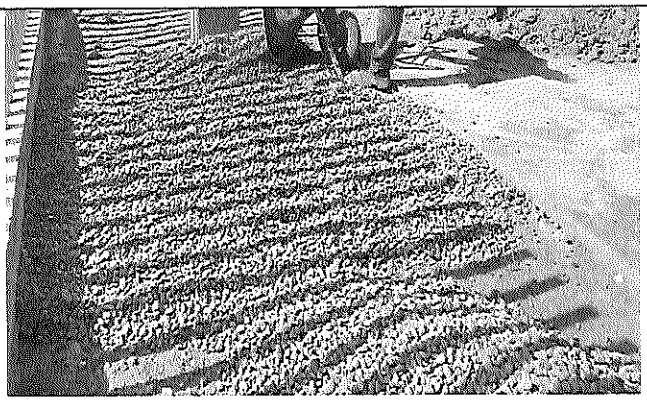
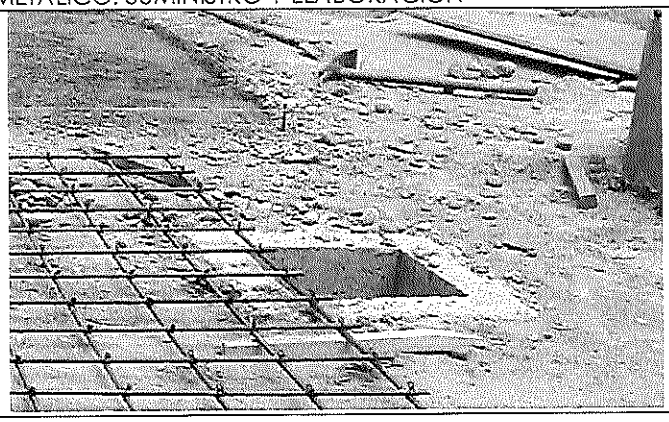
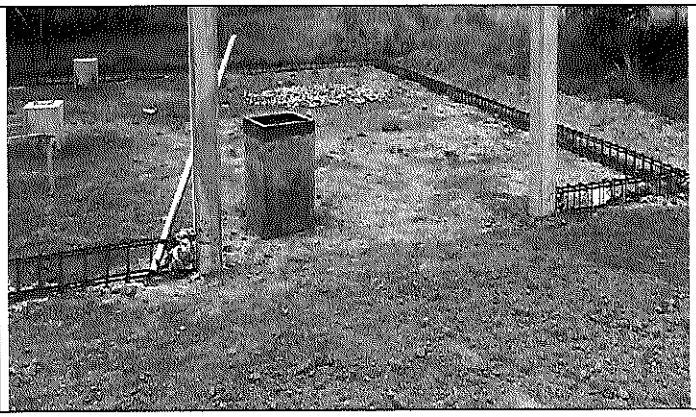
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,9)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO) | **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") |
|  |  |
| **Ítem 4,11)** CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) |
|  |  |
| **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

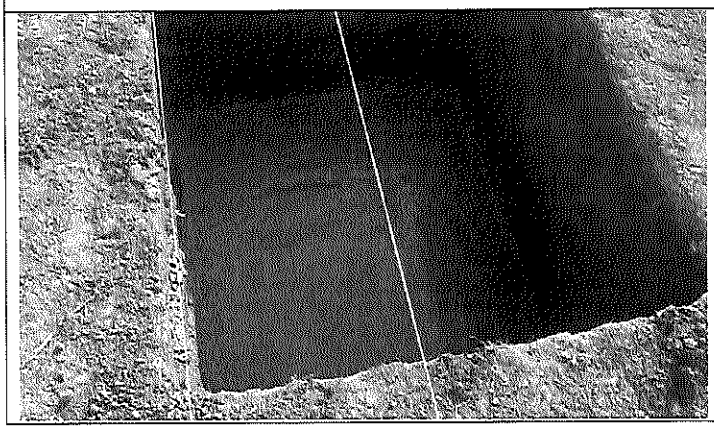
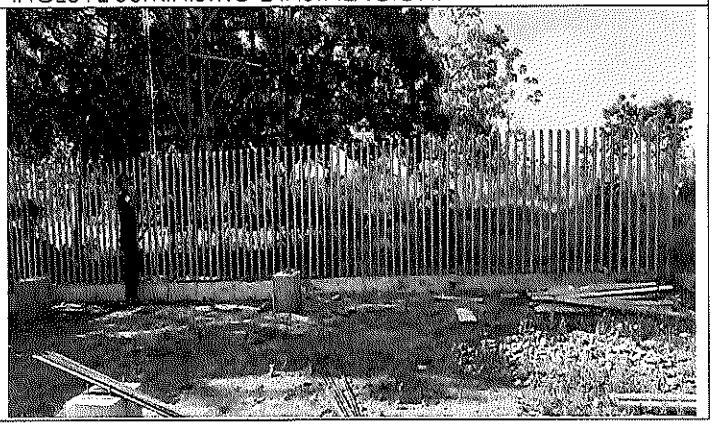
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) |
|  |  |
| **Ítem 5,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE | **Ítem 5,4)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. |
|  |  |
| **Ítem 5,5)** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | **Ítem 5,6)** COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN |
|  |  |

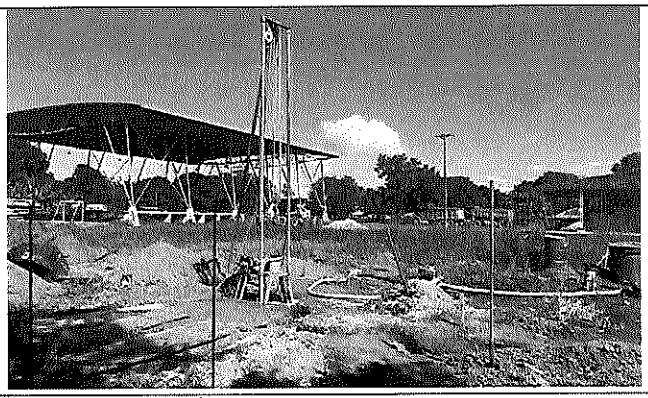
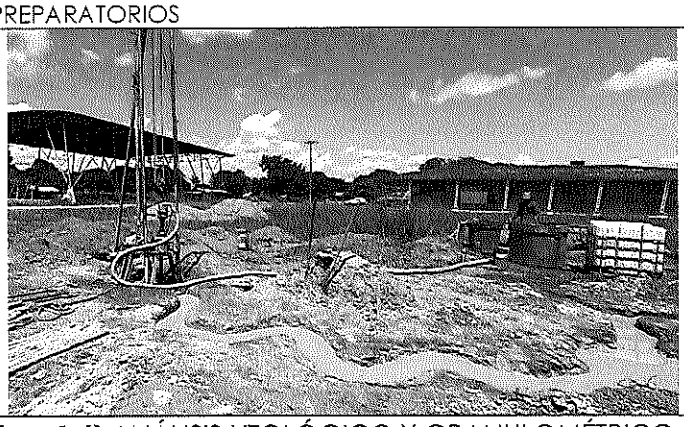
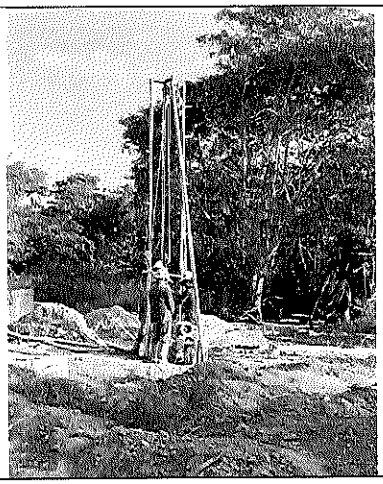
| | |
|---|---|
| **Ítem 5,7)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. | **Ítem 5,8)** SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) |
|  |  |
| **Ítem 6,1)** LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA | **Ítem 6,2)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE |
|  |  |
| **Ítem 6,3)** CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | **Ítem 6,4)** VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

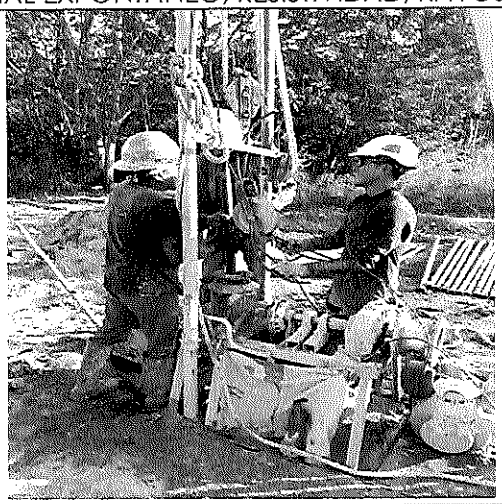
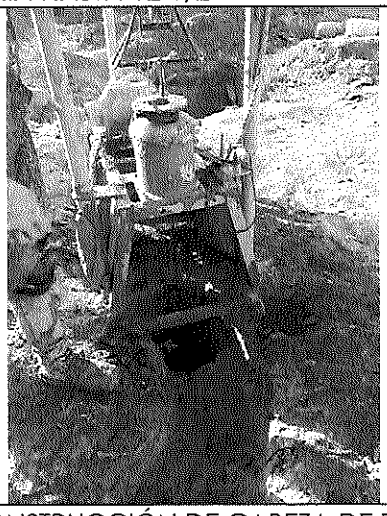
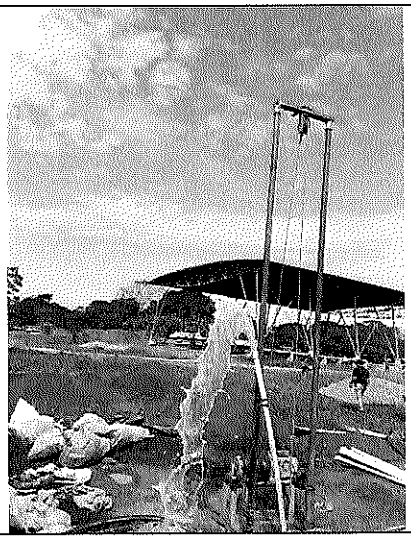
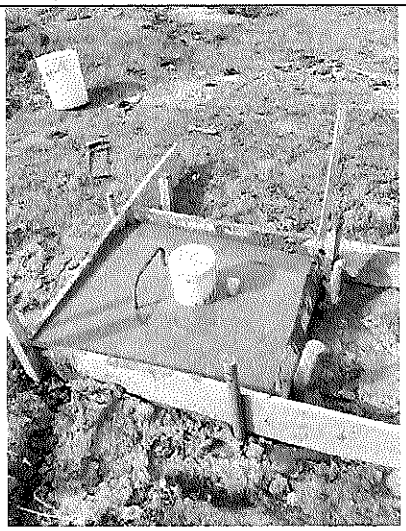
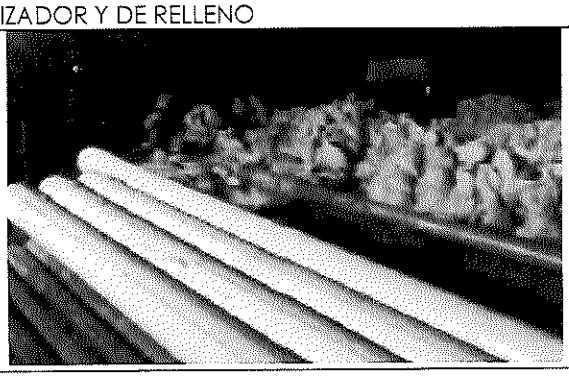
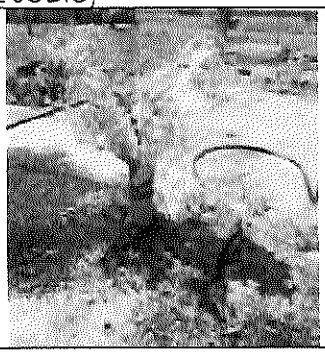
| | |
|---|---|
| **Ítem 6,5)** COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | **Ítem 6,6)** RELLENO CON GRAVILLA |
|  |  |
| **Ítem 6,7)** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | **Ítem 6,8)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. |
|  |  |
| **Ítem 6,9)** CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | **Ítem 6,10)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

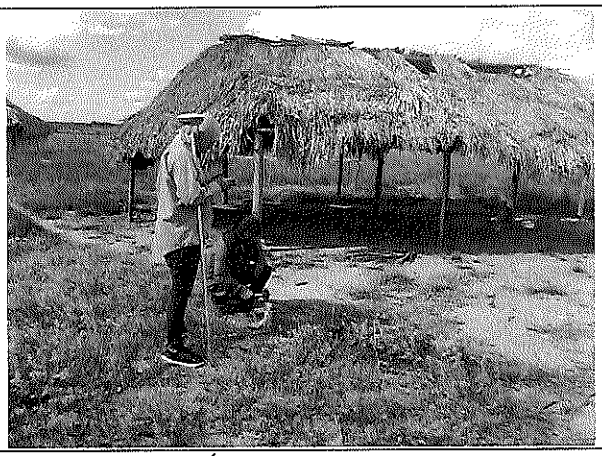
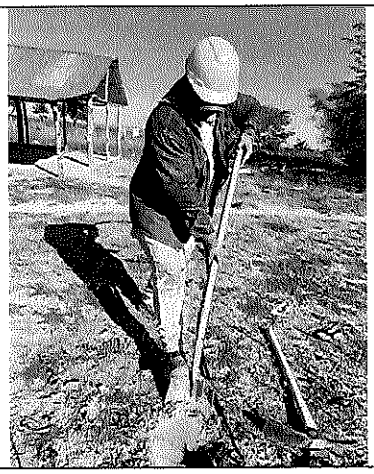
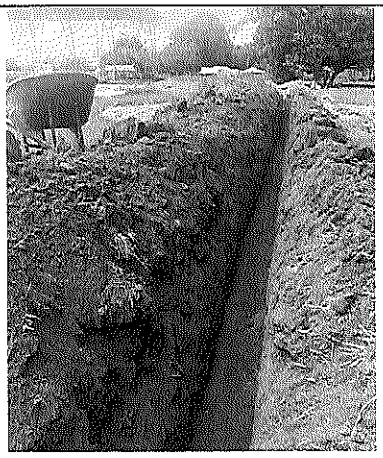
| **Ítem 6,11)** SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI) | **Ítem 6,12)** TUBO GALVANIZADO DE 2" (L= 2 M, E = 1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. |
|---|---|
|  |  |

| **COMUNIDAD ESMERALDA WALABO** | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |

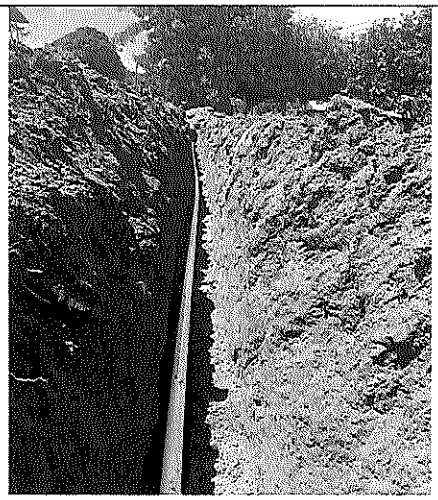
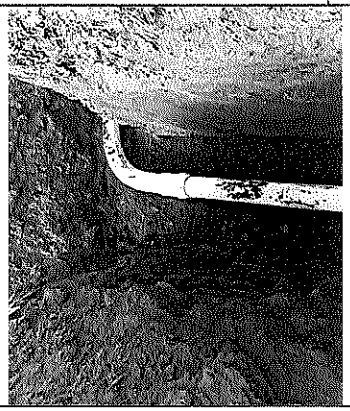
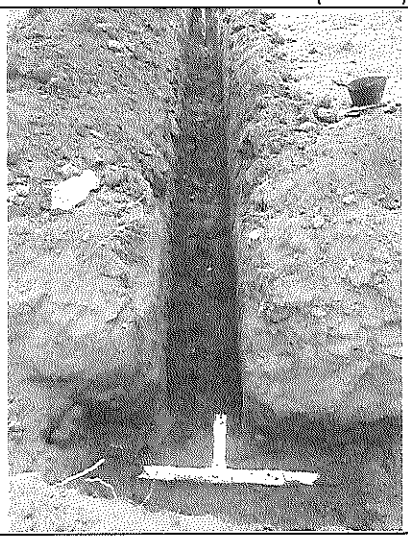
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |
|  |  |
| **Ítem 1,8)** AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) | **Ítem 1,9)** CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES |
|  |  |
| **Ítem 1,11)** SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.<br>**Ítem 1,12)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | **Ítem 1,13)** LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)<br>**Ítem 1,14)** DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) |
|  |  |

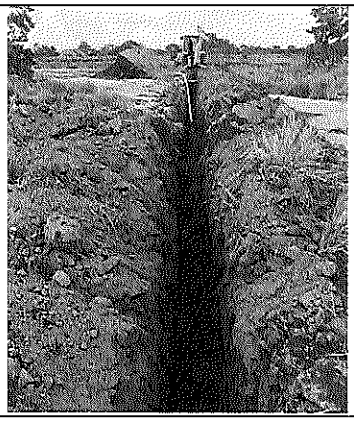
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|  |  |

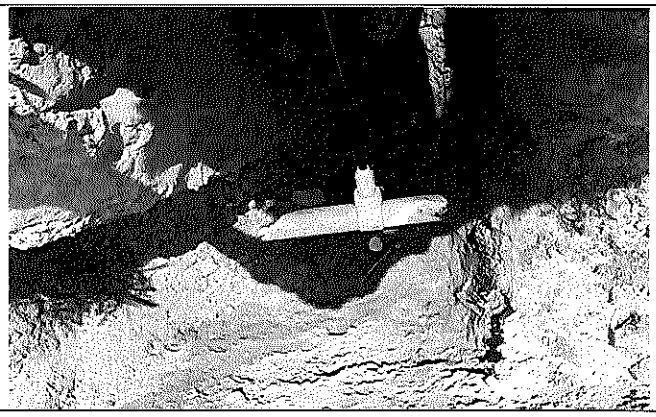
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

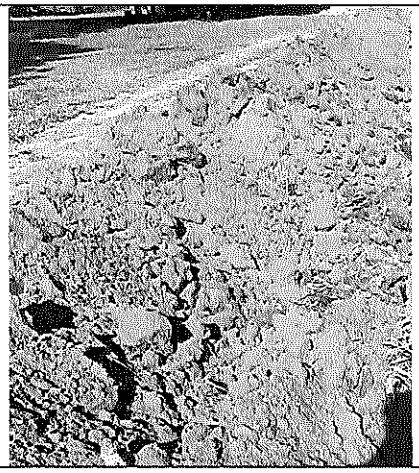
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|---|---|
|  |  |
| **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,11)** CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") |
|  |  |
| **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

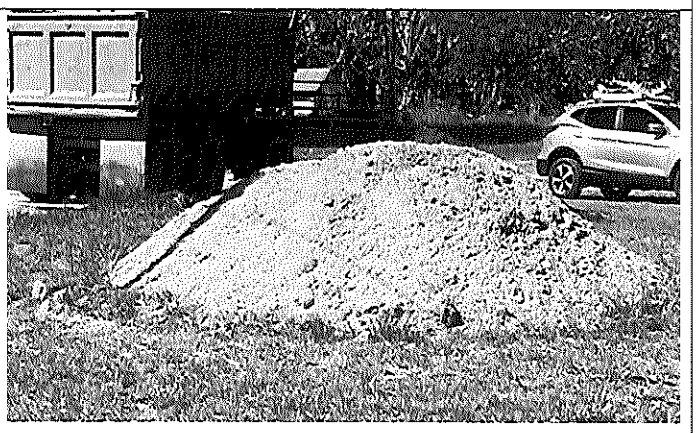
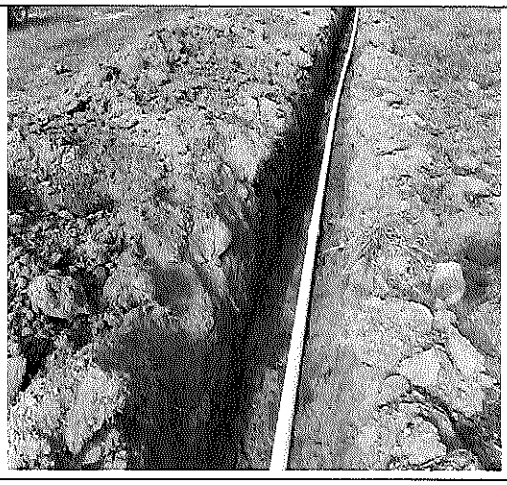
| **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE |
|---|---|
|  |  |

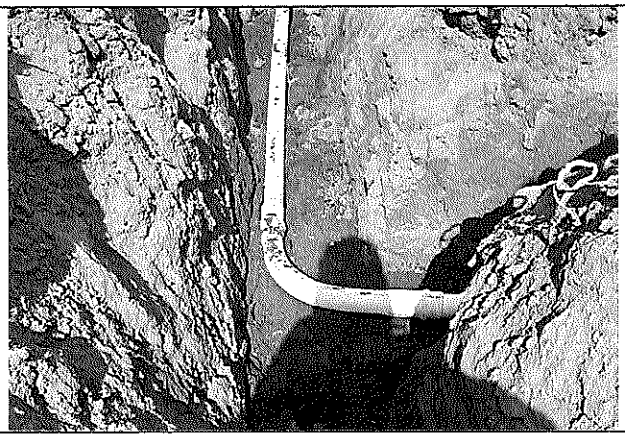
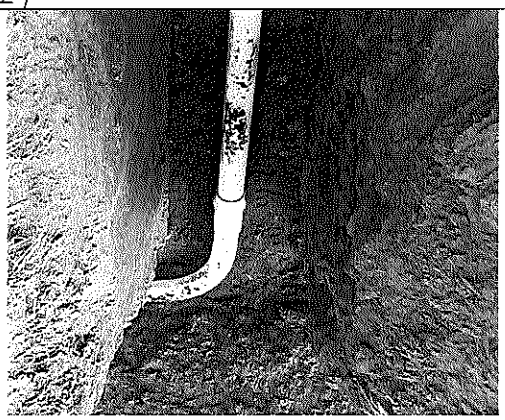
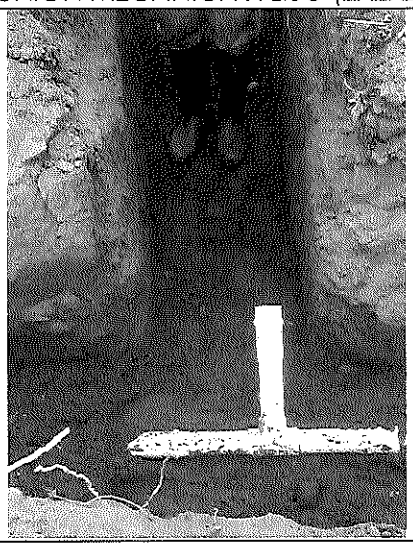
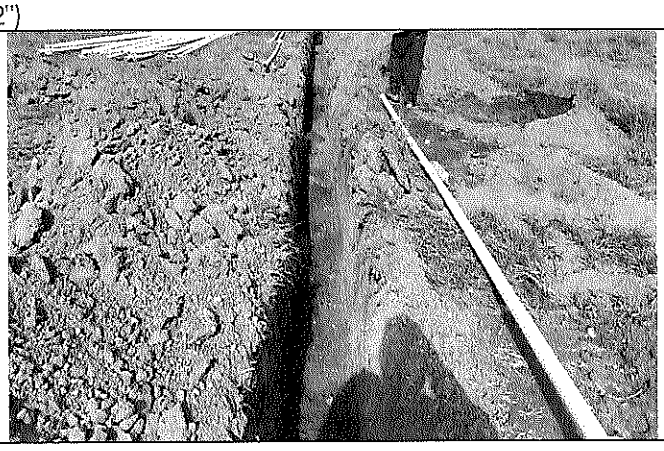
**Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)

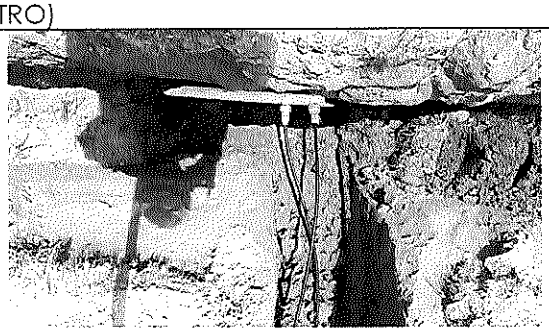
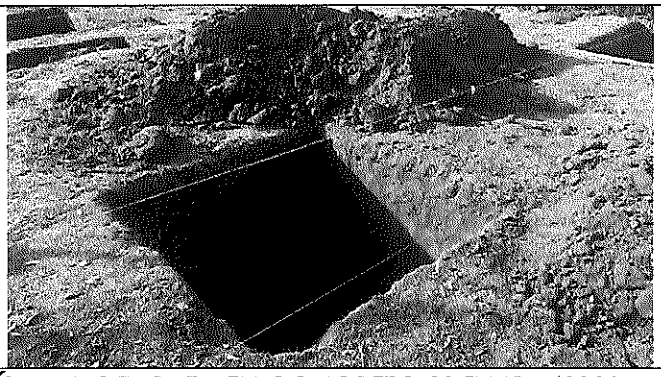
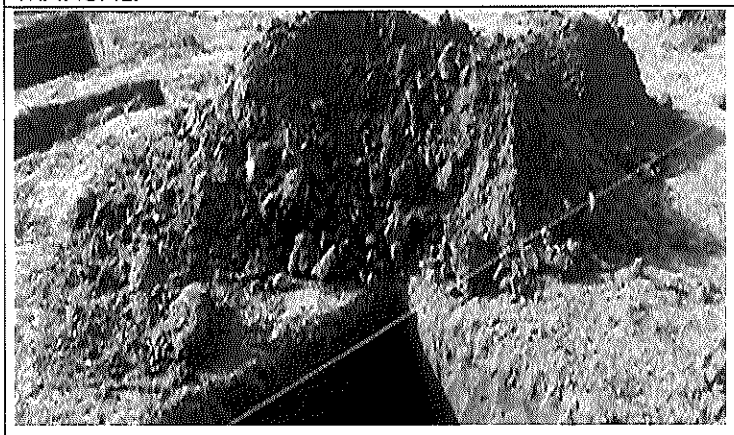
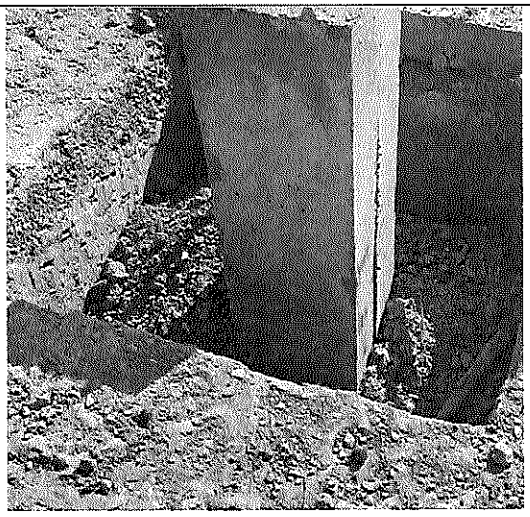
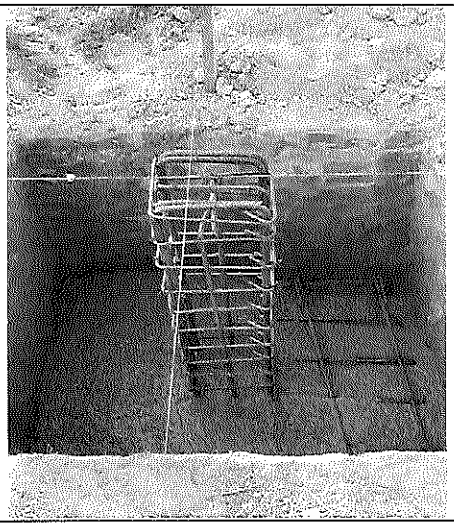


| **COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO** | |
|---|---|
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

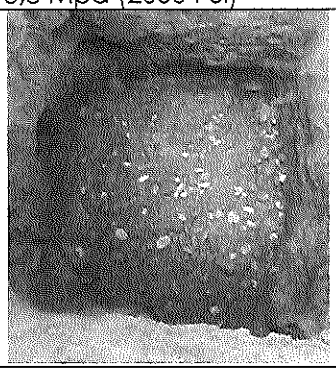
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|  |  |
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|  |  |

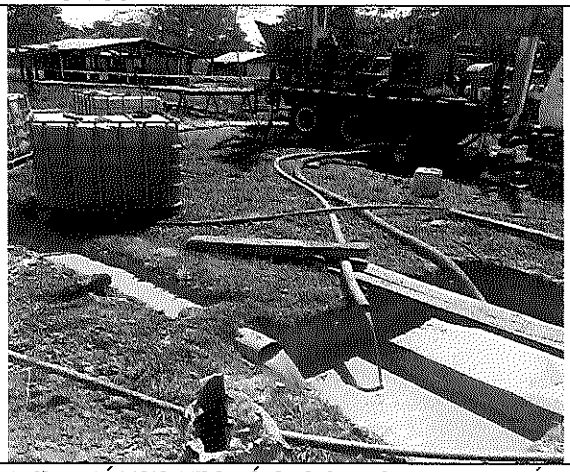
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,11)** CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") |
|  |  |
| **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN |
|  |  |
| **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE |
|  |  |

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) | **Ítem 5,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE |
|  |  |
| **Ítem 5,4)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. | **Ítem 5,5)** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN |
|  |  |
| **Ítem 5,6)** COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | **Ítem 5,7)** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. |
|  |  |

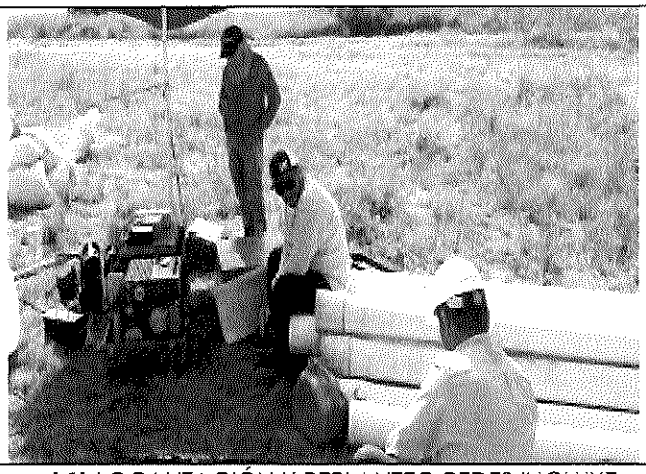

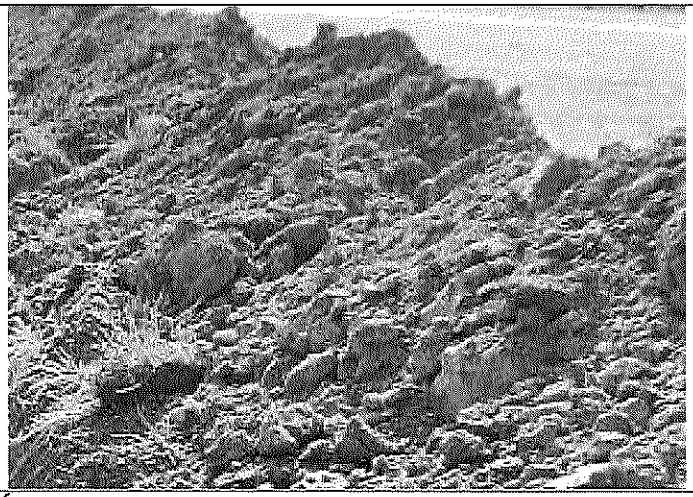
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

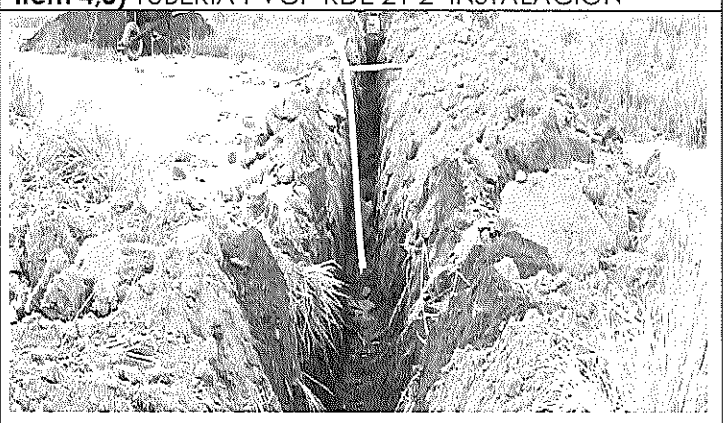
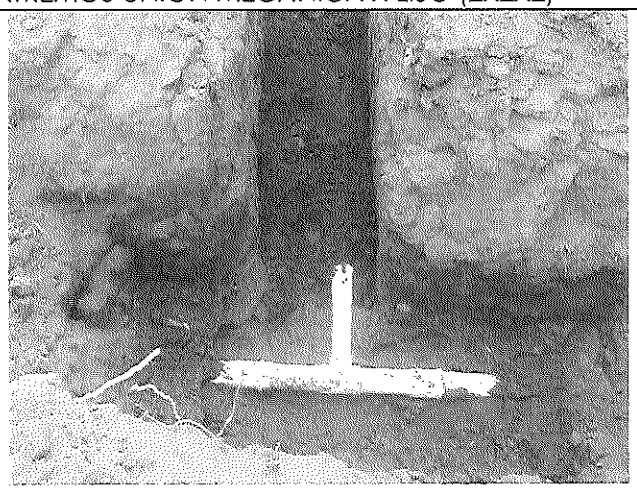
**Ítem 5,8)** SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)



| **COMUNIDAD LA UNIÓN** | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |

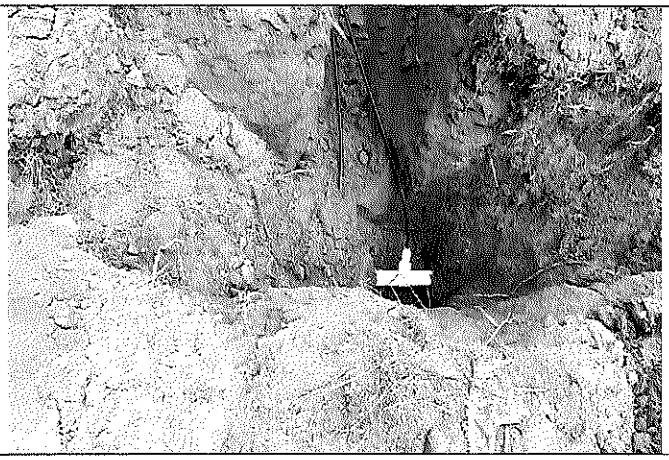
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |
|  |  |
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |

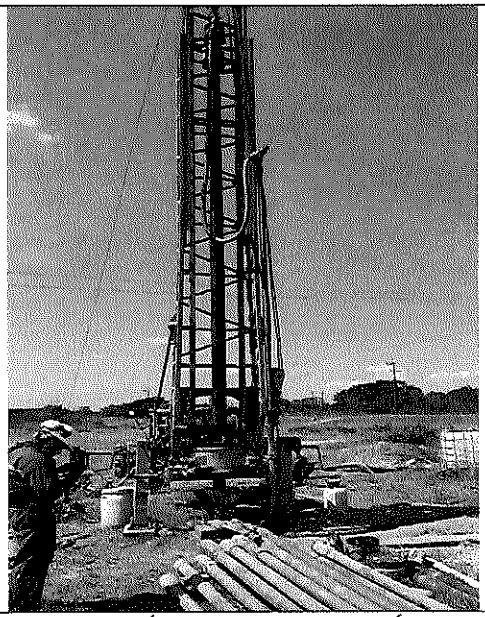
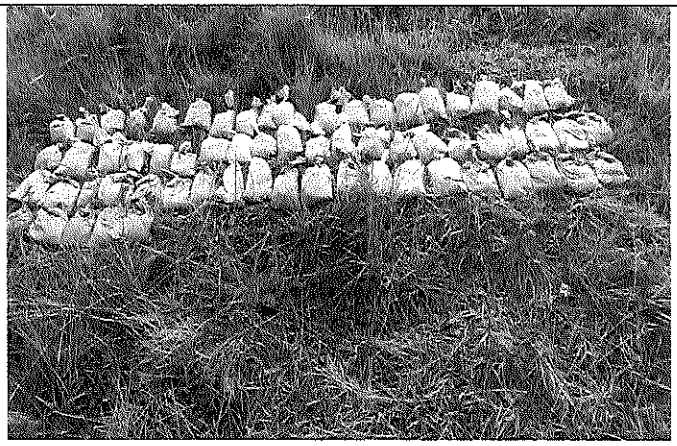
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|  |  |
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN |
|  |  |

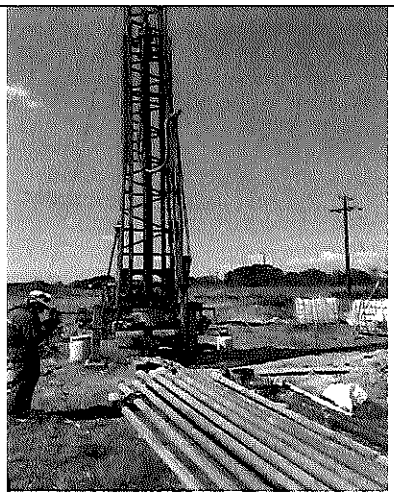
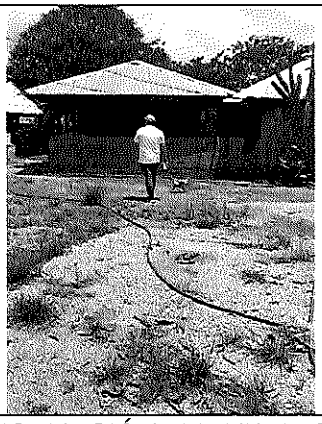
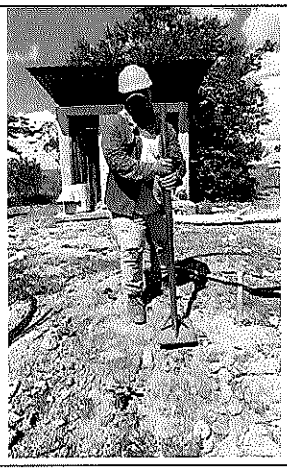
| **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE |
|---|---|
|  |  |

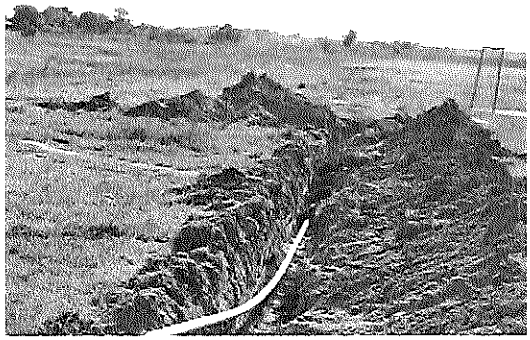
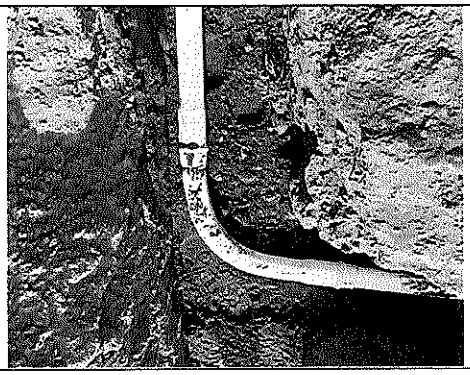
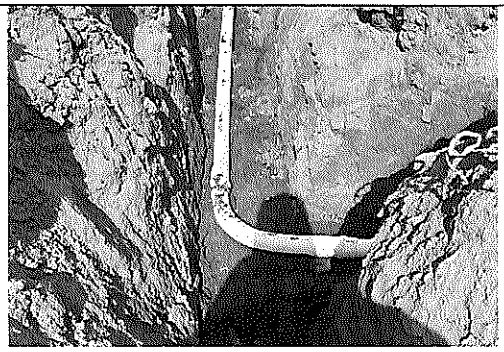
**Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)

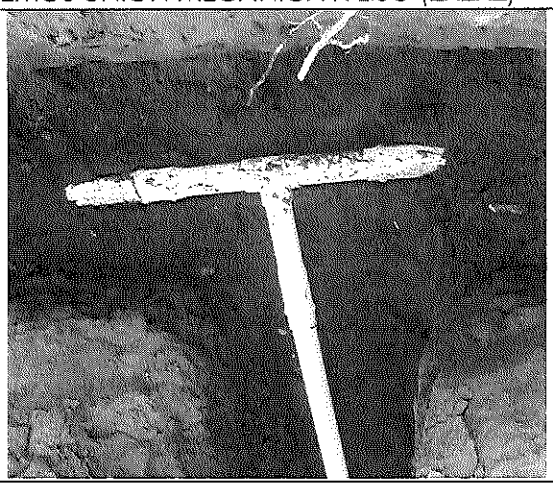
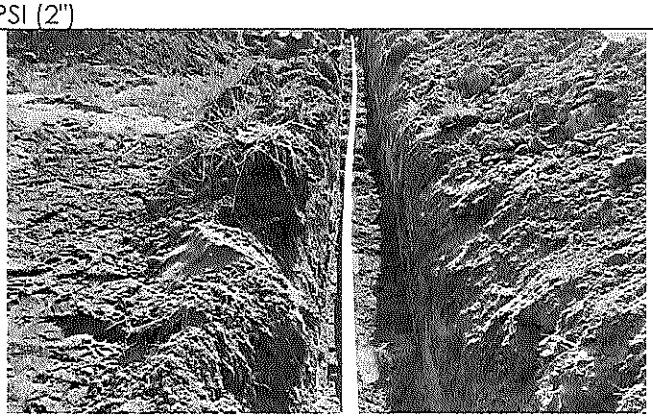
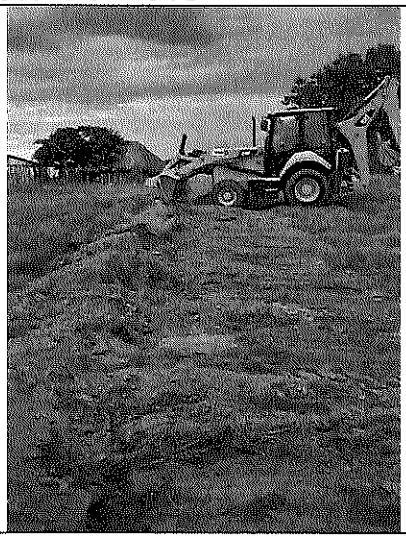


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

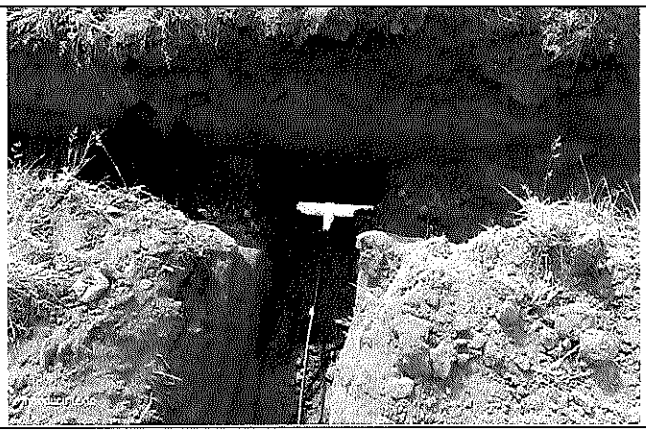
| COMUNIDAD PUNTO GRILLO | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |


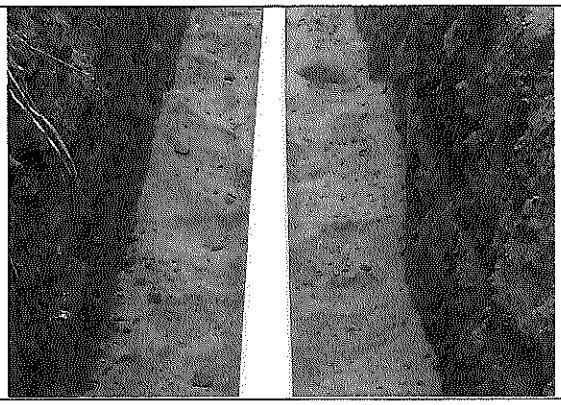
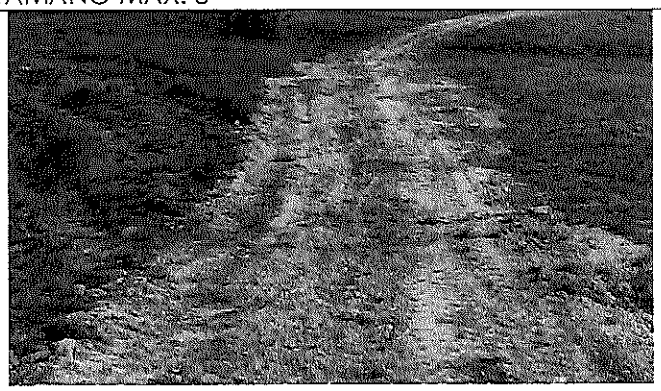
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|---|---|
|  |  |
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,11)** CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") |
|  |  |

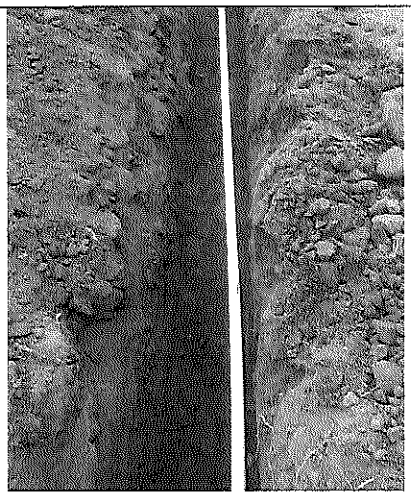
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) | **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN |
|  |  |
| **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") | **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE |
|  |  |

**Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)



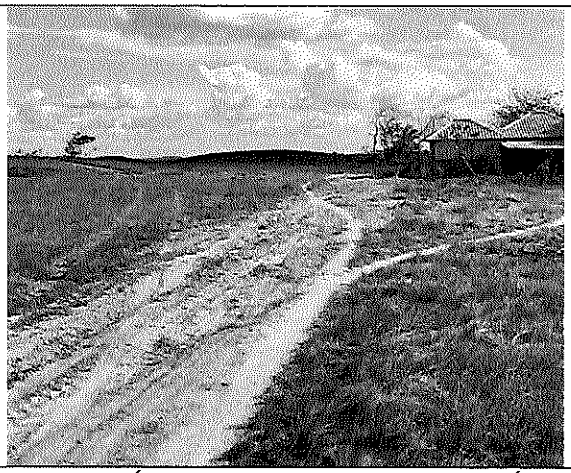
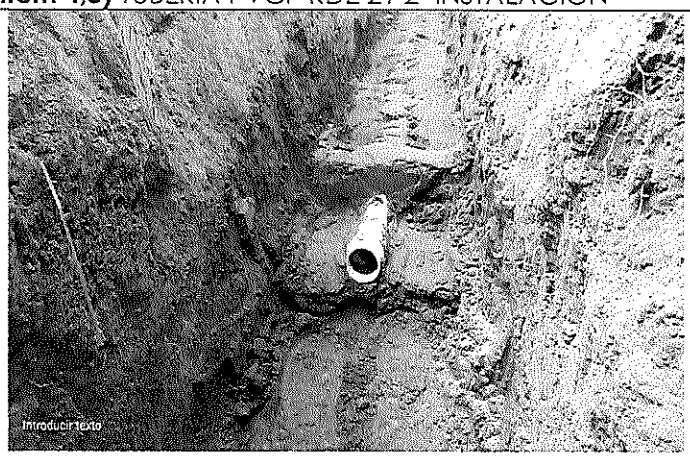
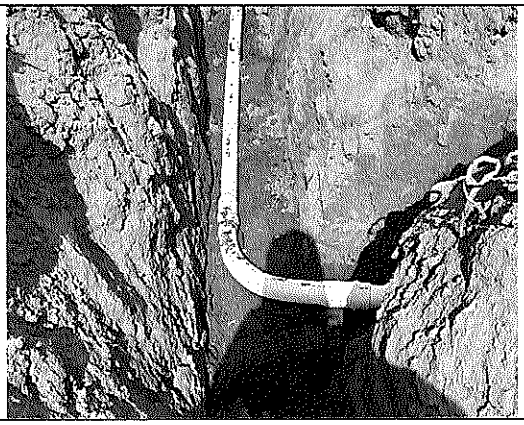
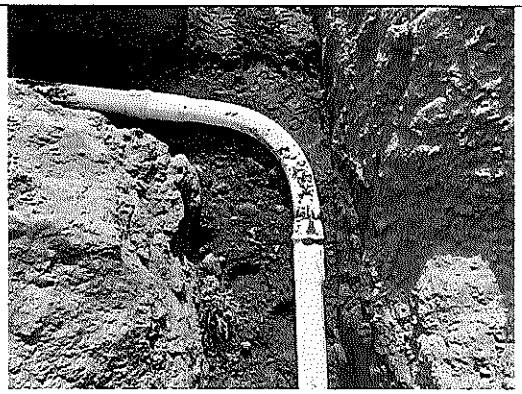
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| COMUNIDAD ALGARROBO | |
|---|---|
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL |
|  |  |
| **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR |
|  |  |

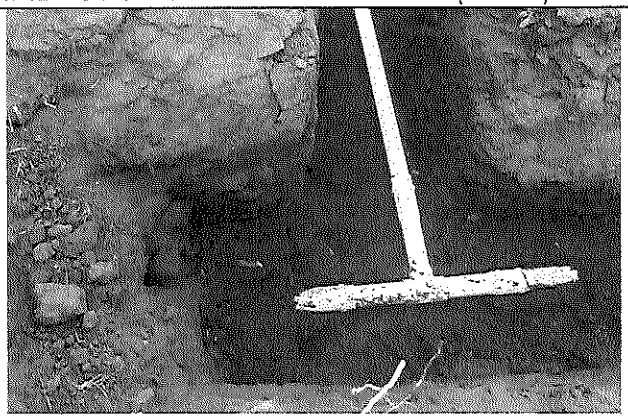
| **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE |
|---|---|
|  |  |

| **COMUNIDAD MATAPALITO** | |
|---|---|
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |

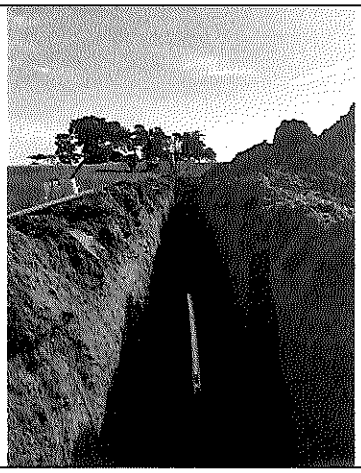
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|  |  |
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|  |   |
| **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,11)** CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") |
|  |  |

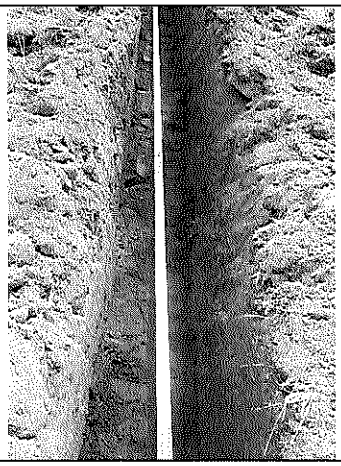
**Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)



**Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN



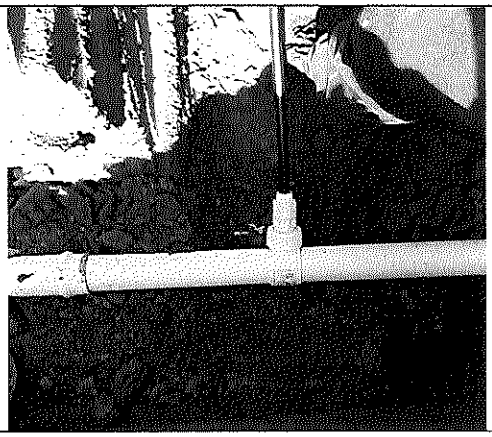
**Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")



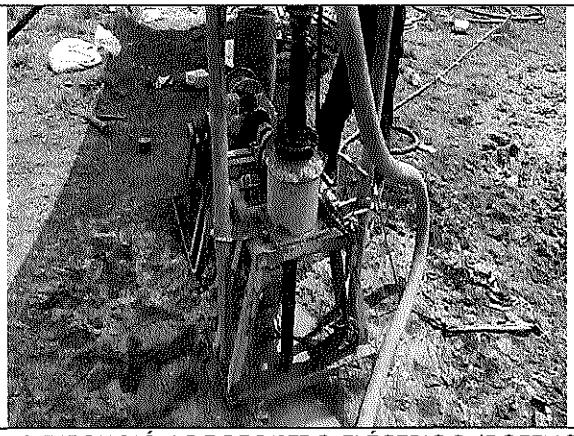
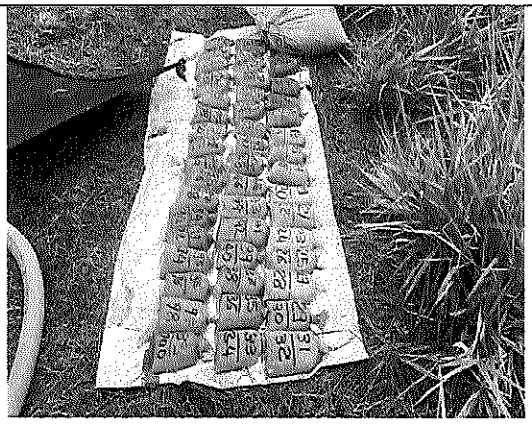
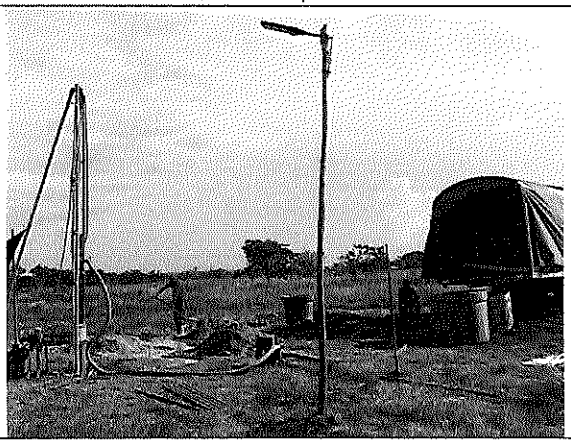
**Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE



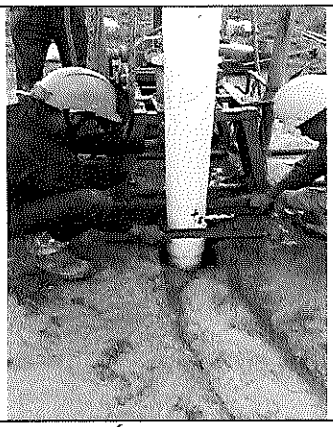

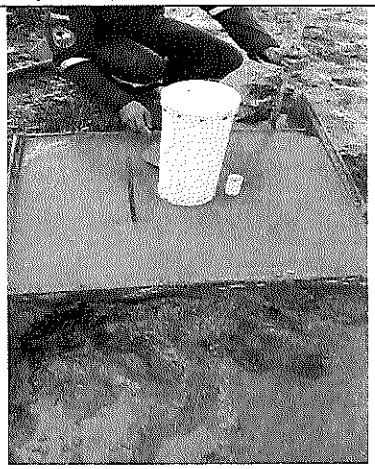
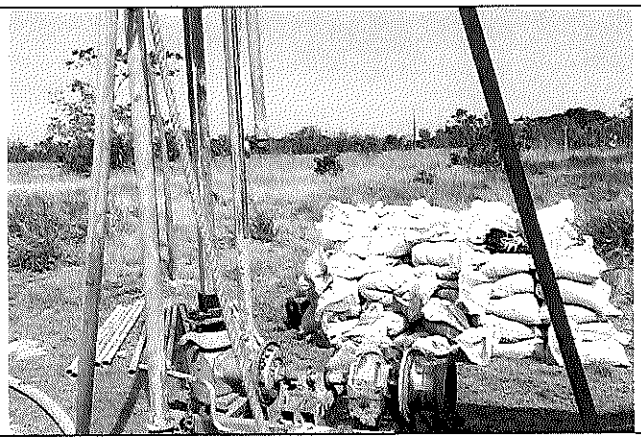
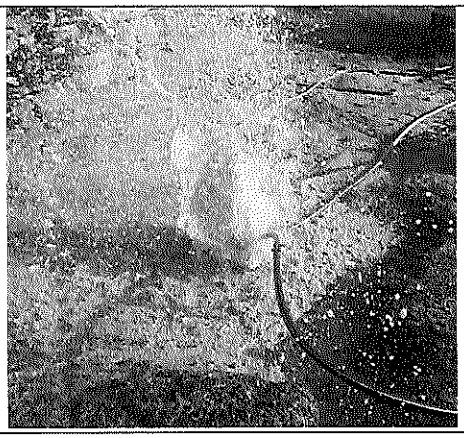
**Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)

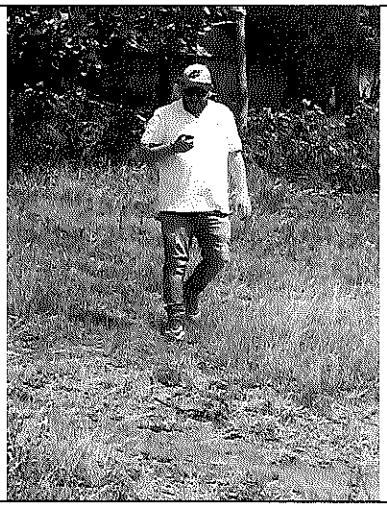
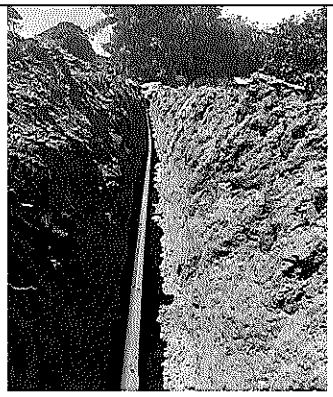

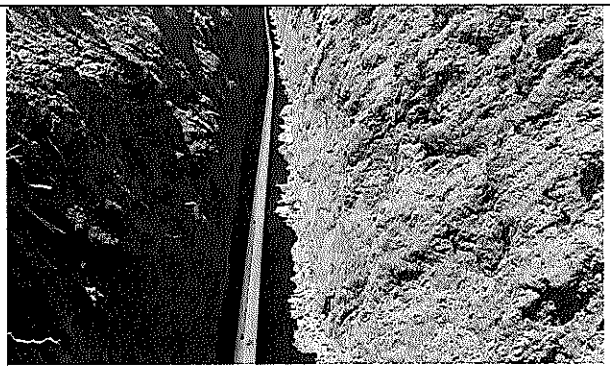


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

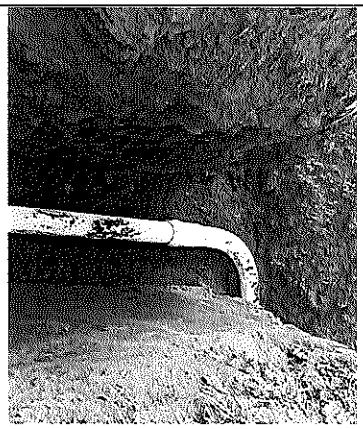
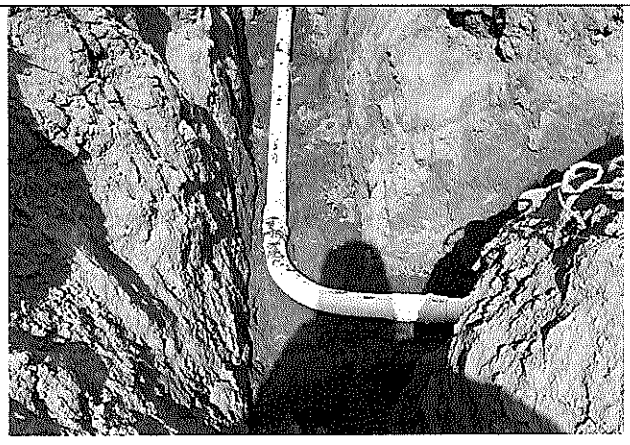
| COMUNIDAD LA PORFIA | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 1,7)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | **Ítem 1,8)** AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) |
|  |  |
| **Ítem 1,9)** CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | **Ítem 1,10)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION |
|  |  |
| **Ítem 1,11)** SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.<br>**Ítem 1,12)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO | **Ítem 1,13)** LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) |
|  |  |

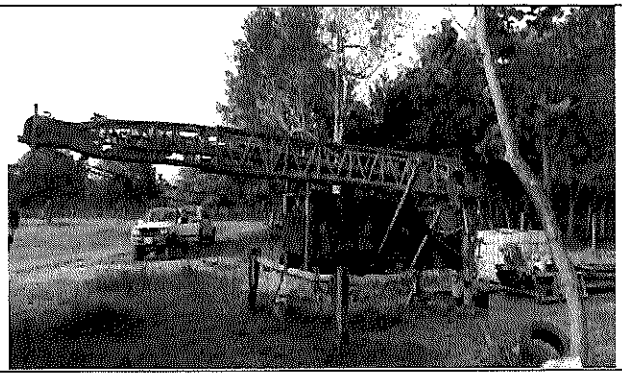
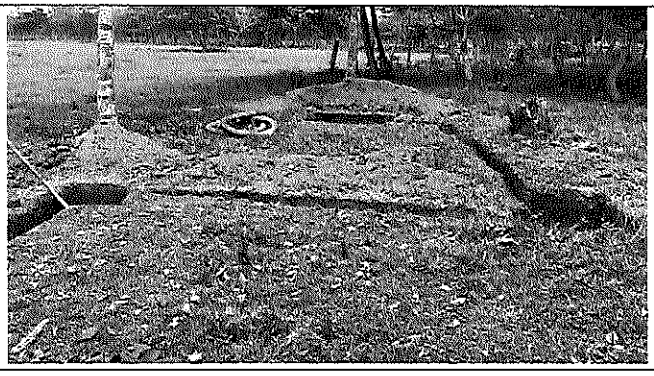
| | |
|---|---|
| **Ítem 1,14)** DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)<br>**Ítem 1,15)** ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA | **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS |
|  |  |
| **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE |
|  |  |
| **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS | **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

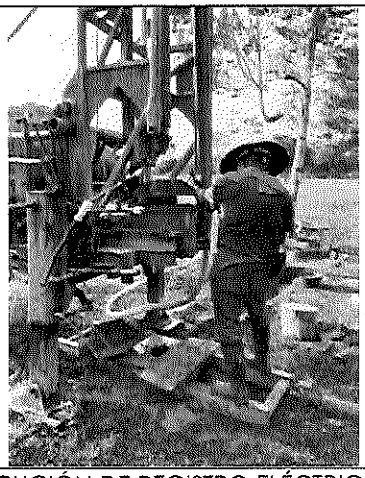
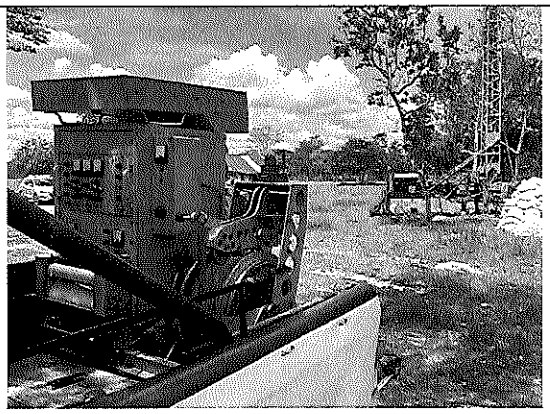
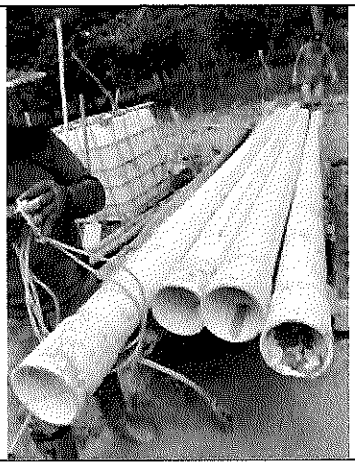
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" | **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR |
|  |  |
| **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN | **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") |
|   |  |
| **Ítem 4,11)** CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

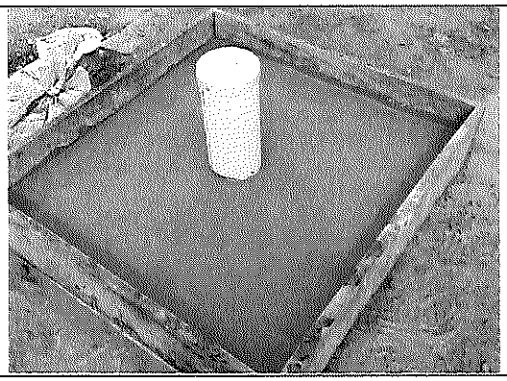
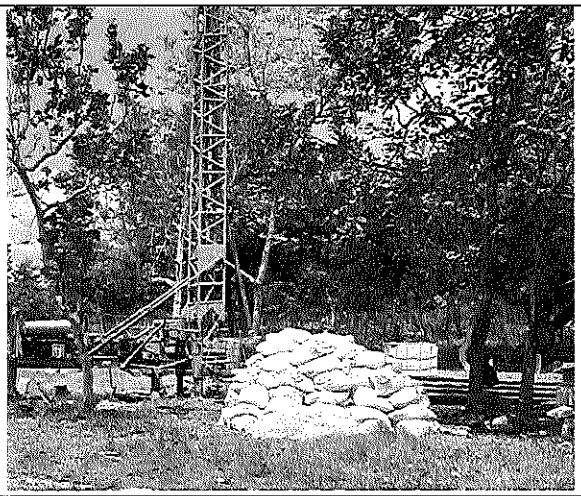
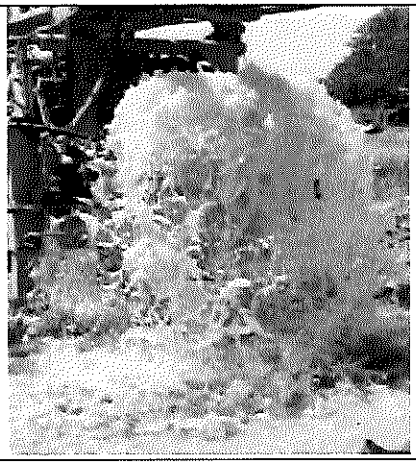
| **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") |
|---|---|
|  |  |
| **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) |
|  |  |

| **COMUNIDAD LA CAIMANA** | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |

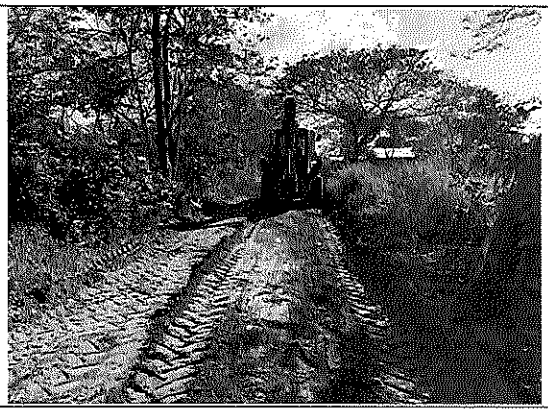
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |
|  |  |
| **Ítem 1,7)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | **Ítem 1,8)** AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) |
|  |  |

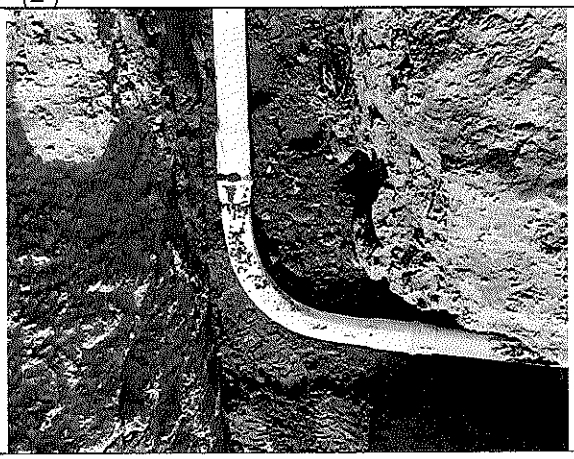
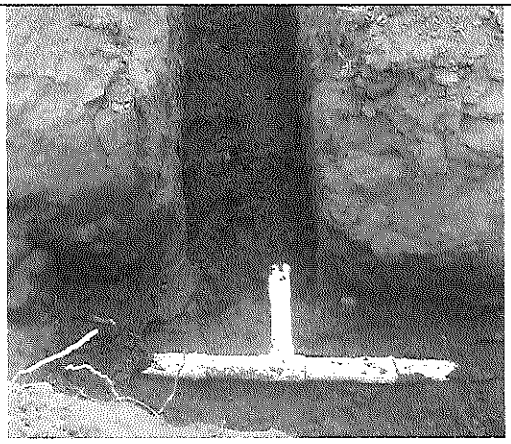
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

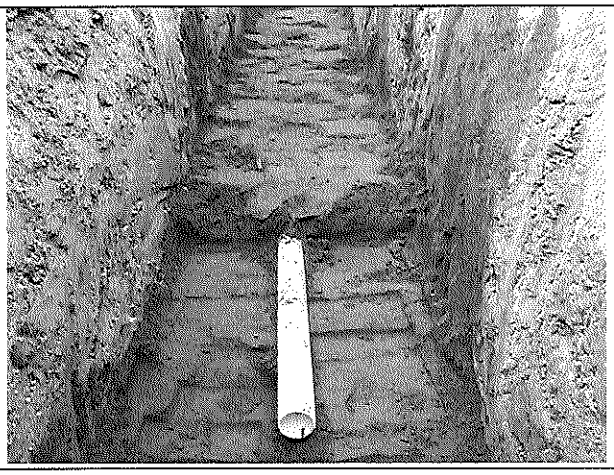
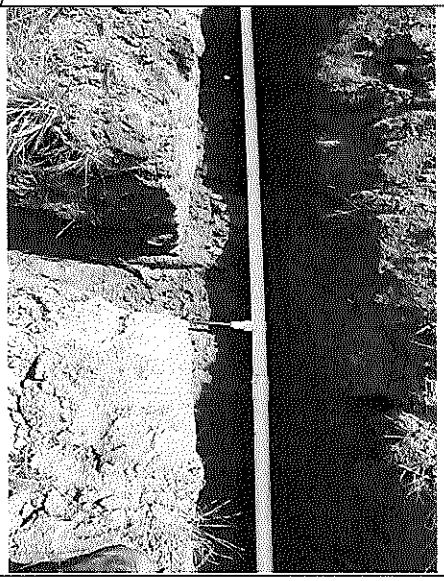
| | |
|---|---|
| **Ítem 1,9)** CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | **Ítem 1,10)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION |
|  |  |
| **Ítem 1,11)** SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | **Ítem 1,12)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO |
|  |  |
| **Ítem 1,13)** LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTINGAIRECOMPRIMIDO) | **Ítem 1,14)** DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | **Ítem 4,2)** RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,3)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,4)** CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS |
|  |  |
| **Ítem 4,5)** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL | **Ítem 4,6)** RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3" |
|  |  |

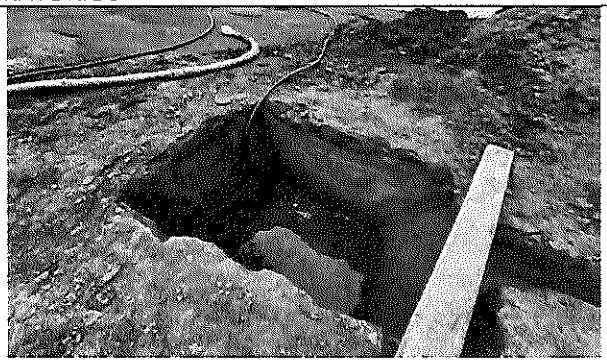
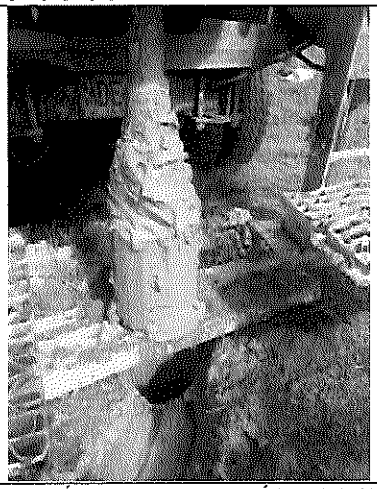
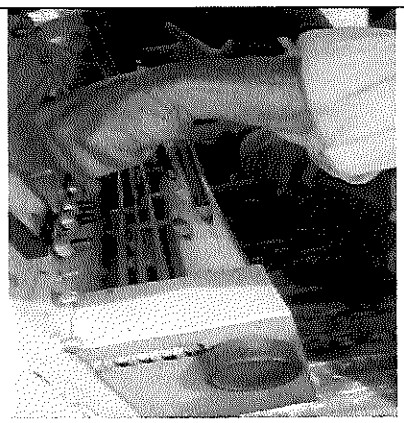
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 4,7)** TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | **Ítem 4,8)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN |
|  |  |
| **Ítem 4,9)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO) | **Ítem 4,10)** CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") |
|  |  |
| **Ítem 4,11)** CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2") | **Ítem 4,12)** TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2) |
|  |  |

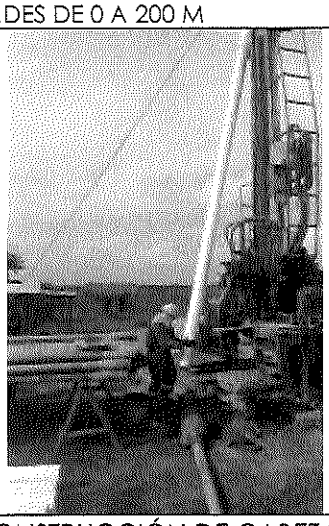
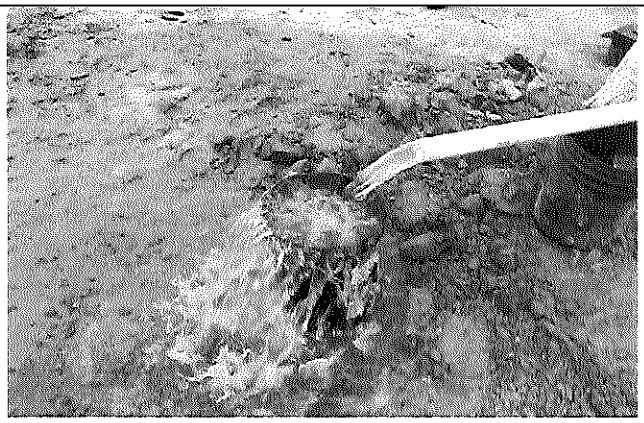
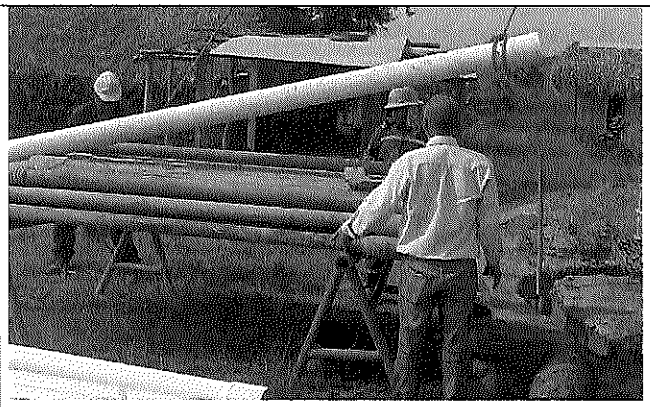
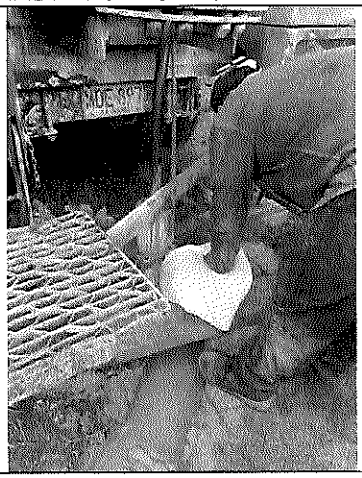
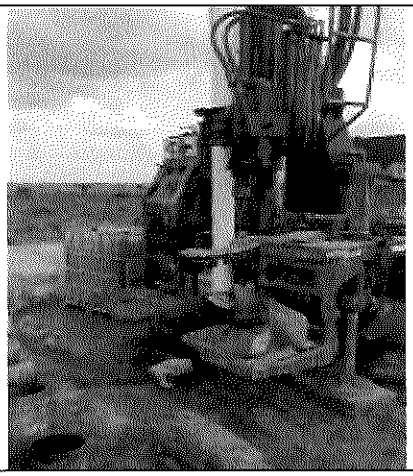
| | |
|---|---|
| **Ítem 4,13)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN | **Ítem 4,14)** TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2") |
|  |  |
| **Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE | **Ítem 4,16)** ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO) |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

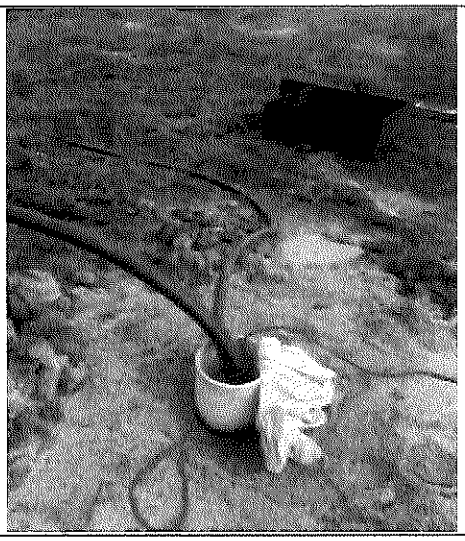
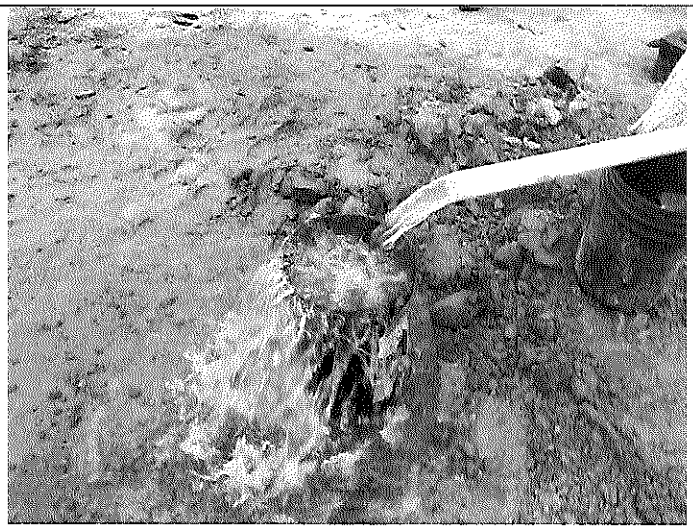
# RESGUARDO ASEINPOME

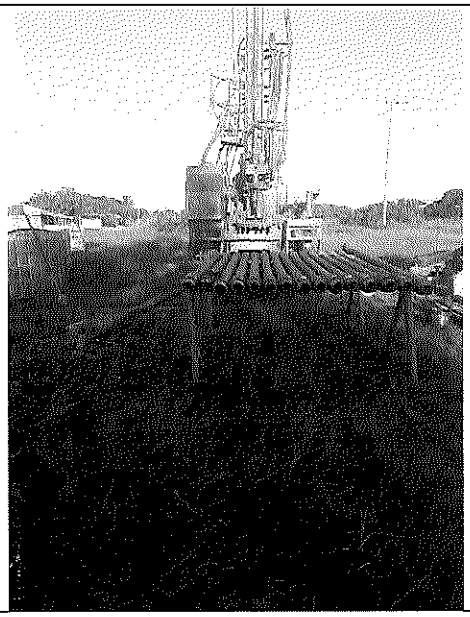
| COMUNIDAD KEKO ASEINPOME | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |   |
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |
|  |  |

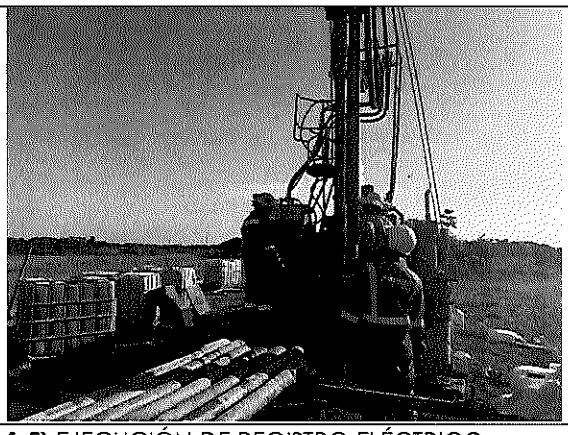
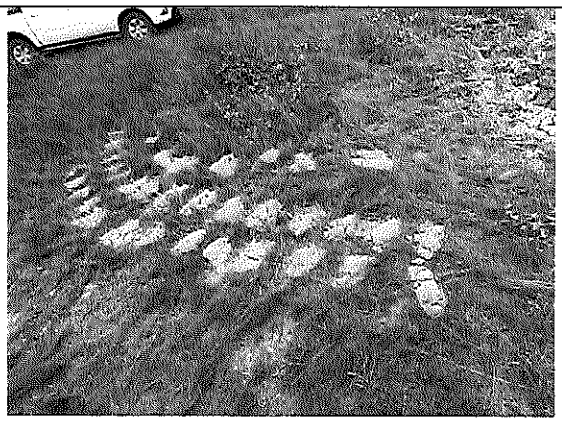
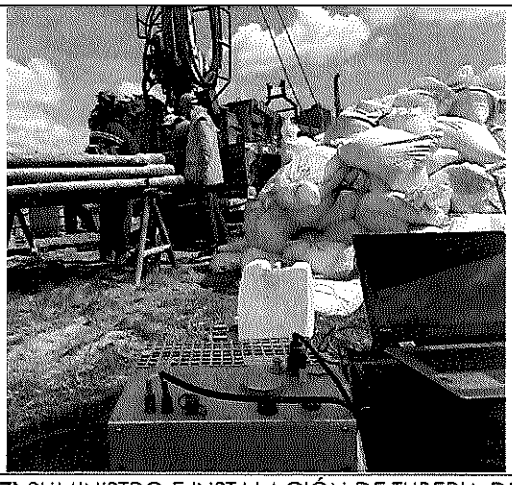
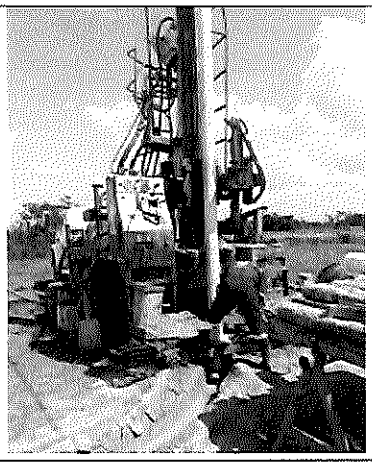
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 1,7)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | **Ítem 1,8)** AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) |
|  |  |
| **Ítem 1,9)** CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | **Ítem 1,10)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION |
|  |  |
| **Ítem 1,11)** SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | **Ítem 1,12)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO |
|  |  |

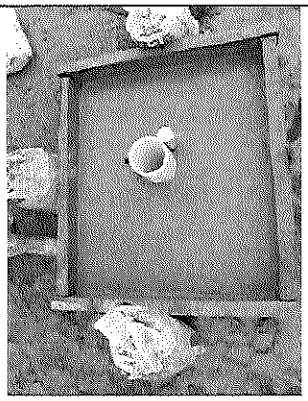
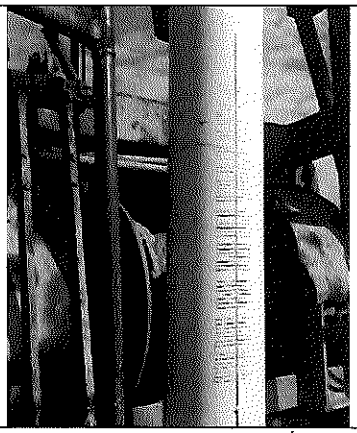
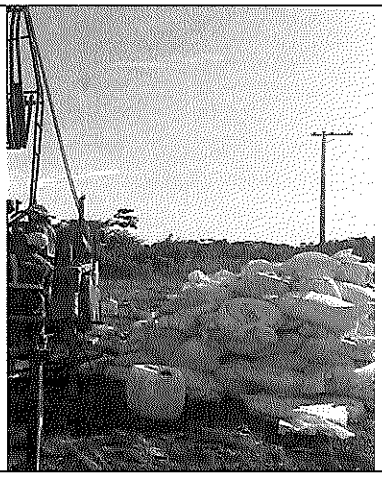
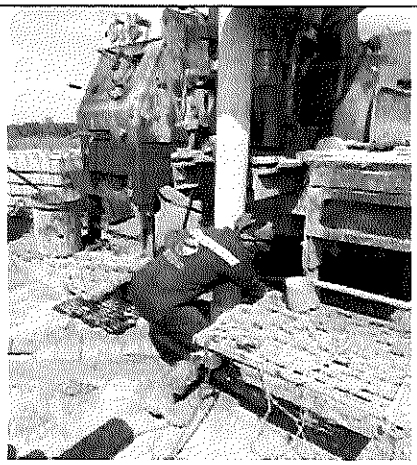
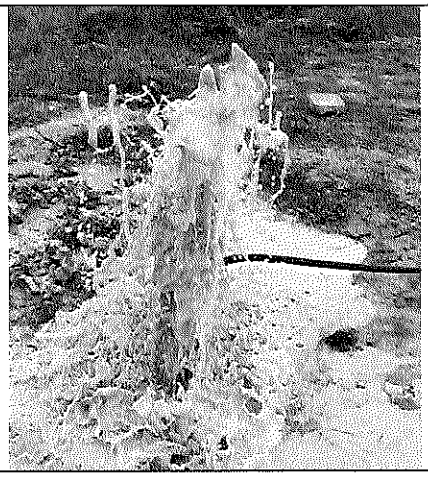
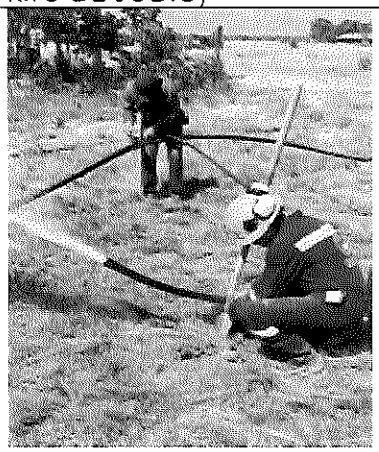
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| **Ítem 1,13)** LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | **Ítem 1,14)** DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)<br>**Ítem 1,15)** ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA |
|---|---|
|  |  |

| **COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ** | |
|---|---|
| **Ítem 1,1)** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS | **Ítem 1,2)** INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS |
|  |  |

| | |
|---|---|
| **Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. | **Ítem 1,4)** ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO |
|  |  |
| **Ítem 1,5)** EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) | **Ítem 1,6)** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" |
|  |  |
| **Ítem 1,7)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M | **Ítem 1,8)** AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) |
|  |  |

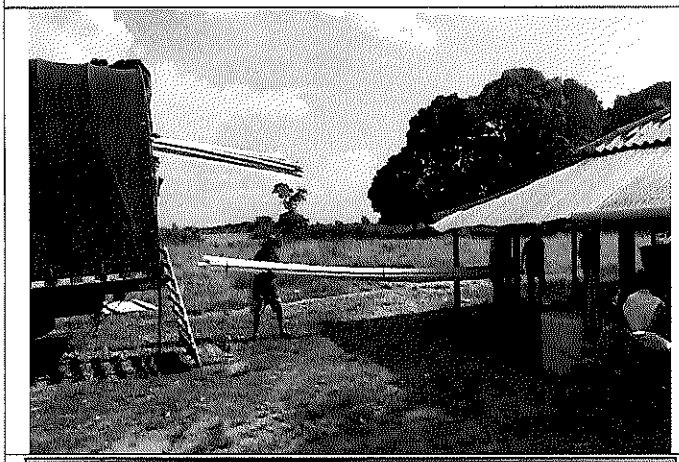
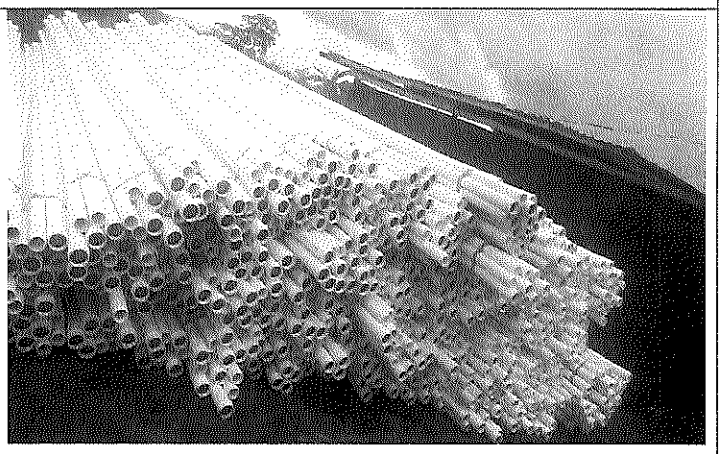
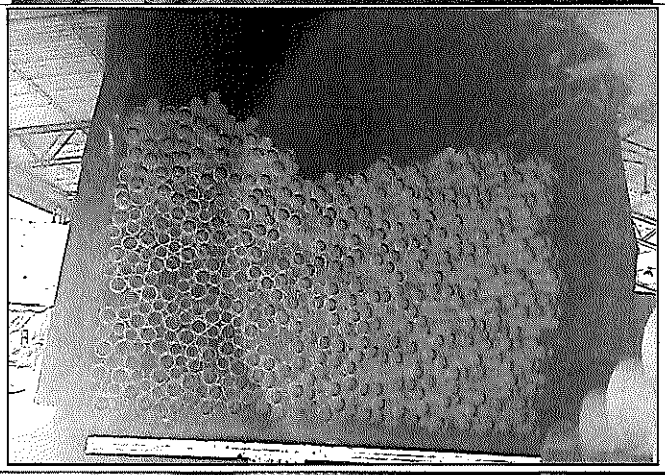
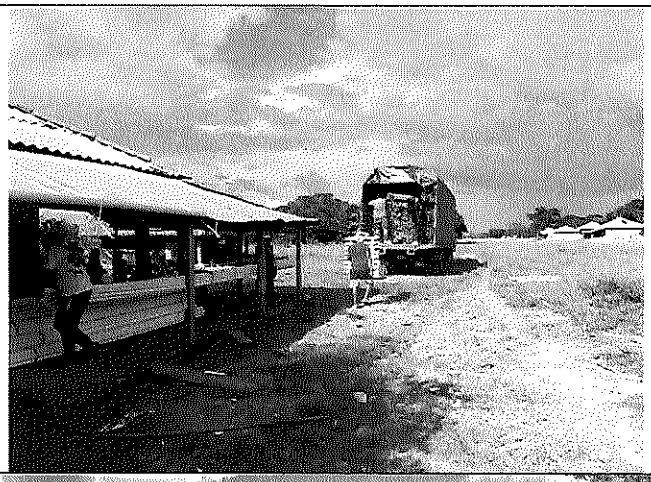
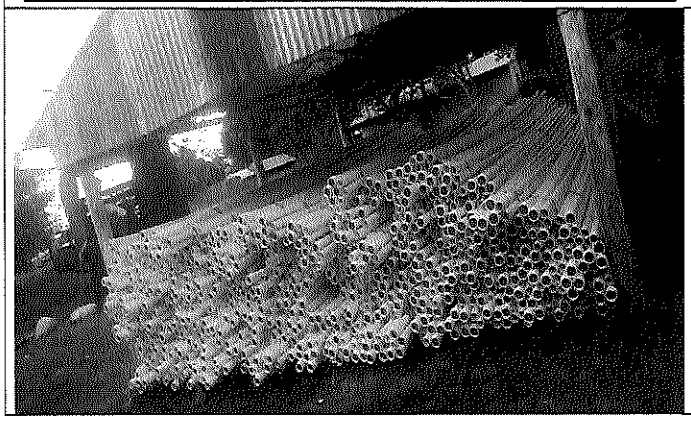
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

| | |
|---|---|
| **Ítem 1,9)** CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVLLLADORES | **Ítem 1,10)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION |
|  |  |
| **Ítem 1,11)** SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS. | **Ítem 1,12)** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO |
|  |  |
| **Ítem 1,13)** LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO) | **Ítem 1,14)** DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO) |
|  |  |

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

## SUMINISTROS

**Ítem 4,17)** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

