FECHA (D/M/A): 15 | 12 | 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Señalización
RANGO:	—
CANTIDAD:	
ZONA	5
COMUNA	14
BARRIO	Loma los Gonzalez
FRENTE DE TRABAJO:	20

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00 PM	\ \ \
TERMINACIÓN: 4:40 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA —
	TARDE —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al punto programado de inicio Cr 43A AV poblado, el cual no se pudo trabajar por falta del puntero. Cuadrilla decide moverce de lugar para realizar plastico en frio en la 5 sur Cr 42 a la Cr 43A.

Se inicia instalando señalizacion y cerramiento por carril para garantizar paso vehicular.

Comienzan de Abajo hacia Arriba. partiendo de paso peatonal lineas divisorias flechas y terminan con interseccion del RAB.

Actividad terminada a las 4:40 Am.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	Tatiana Hano Perez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Una María Ramos	NOMBRE: Edwin Rodriguez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	—		Consorcio.
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jader Cardenas	—		
7	Ayudante	Juan Camilo Arboleda	—		
8	Ayudante	Maira Mesa	—		
9	Ayudante	Sebastian Tapasco	—	X	
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Jcgy 330	/		
16	Volqueta(s)				
		maquina de pintura	/		

Powered by CamScanner

Plastico en frio


FECHA (D/M/A): 15/12/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	CANTIDAD (UND)	DIMENSIONES AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
4004824	4.1.5		Lazo 5Sur Cr 43A	—	4.46 m	4.46 m	Linea de detención 0,40
4004824	4.1.5			—	21 m	21 m	Lineas paso peatonal 0,40
4004824	4.1.1			1	1,43 m²	1,43 m²	Triangulo ceda el paso 0,40
4004824	4.1.5		" " "	—	4,8 m	4,8 m	Pasos Ceda el paso 0,40
4004824	4.1.5.		Cl 5Sur Cr 42 y 43A	—	45,5 m	45,5 m	Linea paso peatonal 0,40
4004824	4.1.1		" "	3	1,2 m²	3,6 m²	flectha de frente
4001097	4.1.1		" "	2	2,2 m²	4,4 m²	flectha frente y Giro
4001097.	4.1.5		Cl 5 Sur Cr 42	—	46,88 m	46,88 m	RAB 0,40
TOTALES							

FECHA (D/M/A): 15/12/2025

10. ESQUEMAS

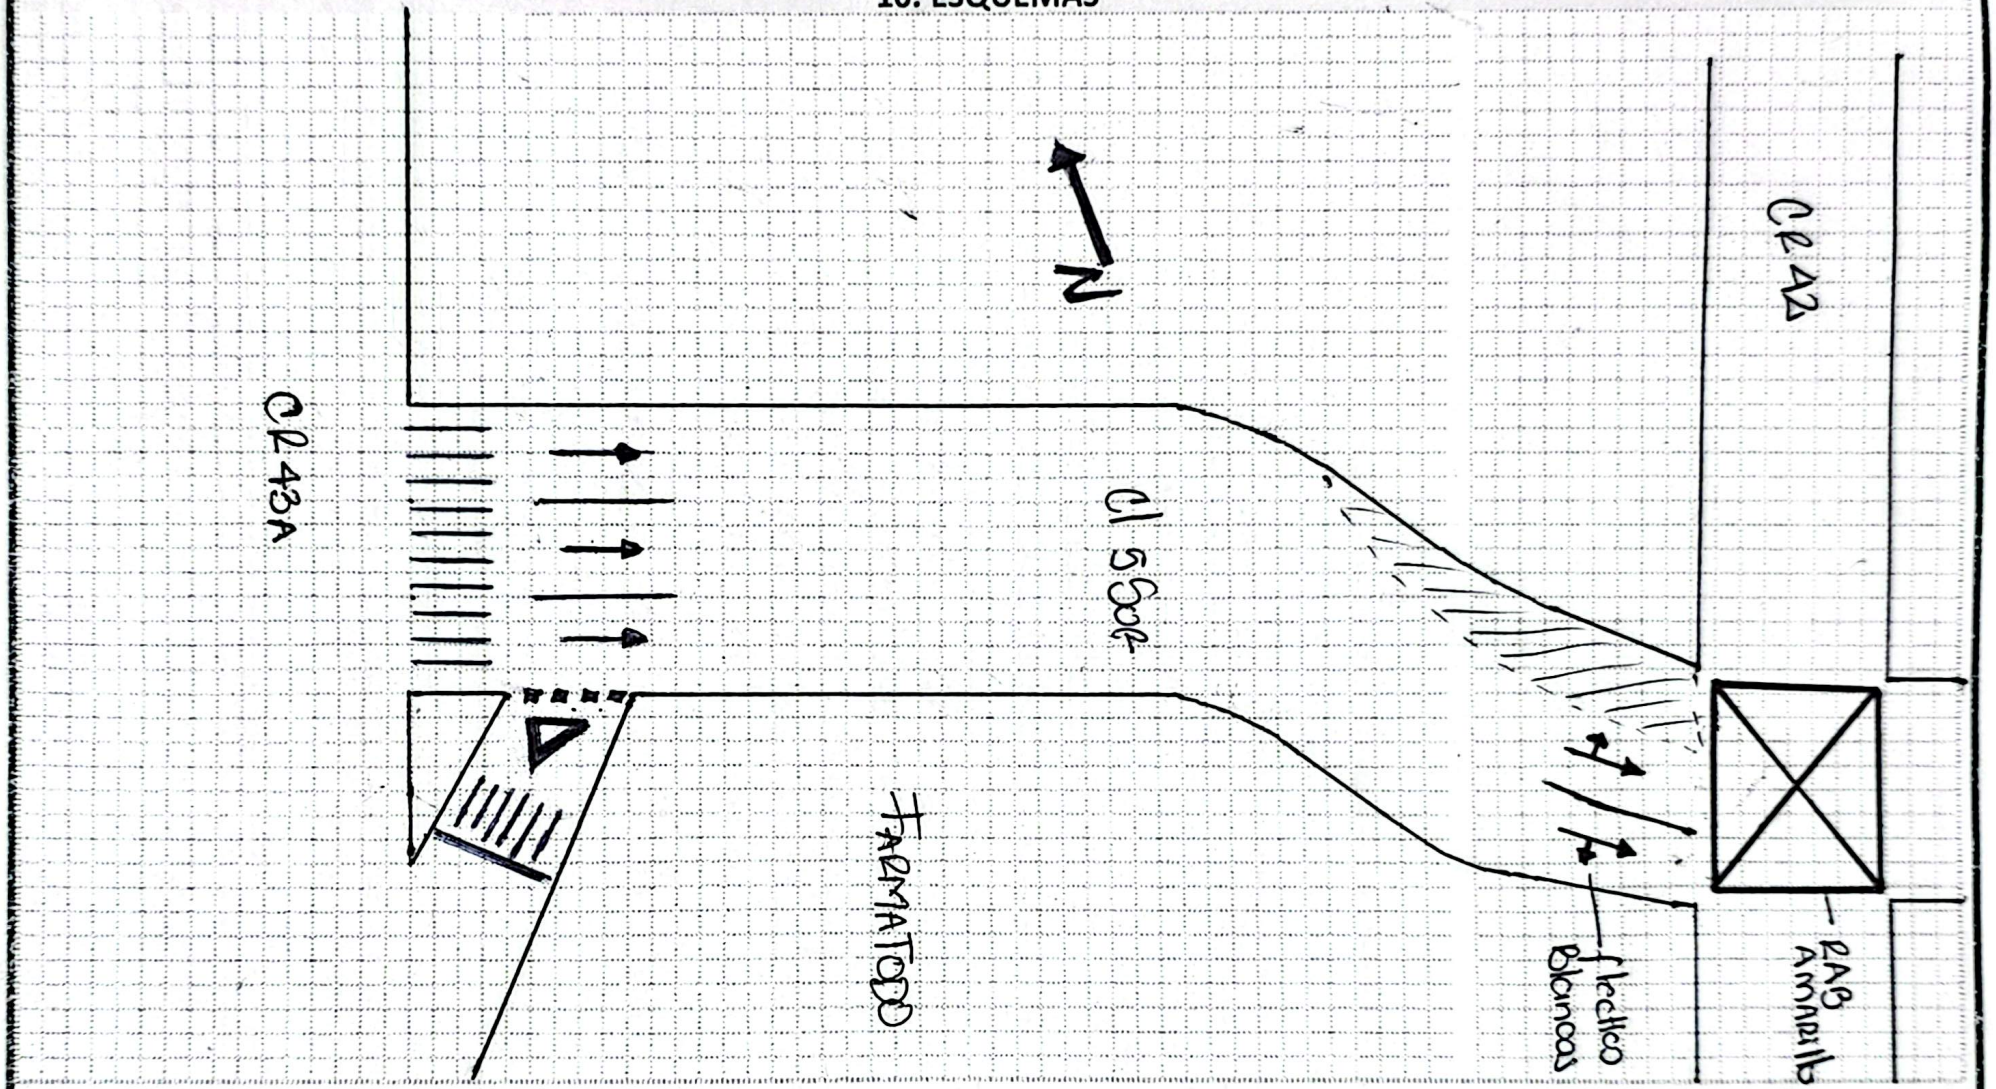

TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	Loma los Gonzales	DIRECCIÓN	Cl 5 SUR CR 43A CR 42

Powered by CamScanner
