FECHA (D/M/A): 16/12/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Señalización

RANGO: —

CANTIDAD:

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA: 5

COMUNA: 14

BARRIO: AV Poblado.

FRENTE DE TRABAJO: 20

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 9:00 PM.

TERMINACIÓN: 4:00. AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: —

TARDE: —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al lugar de intervención, se Horbican y empiezan con instalación de cerramiento y señalización, se termina segmento faltante en Acrilico y el segmento de la cl 9 y cl 10 se Empieza en plastico frio con paso peatonal y linea Berma Amarilla en sentido SUR NORTE.

Se Toma visito de personal del PMT.

Actividad se le Realizan PRUEBAS de Reflectividad.

Lineas paso Peatonal · 278 · 258 · 260

Linea de RAB · 223 · 237 · 229

Linea Berma Amarilla · 243 · 244 · 215

y a su vez en linea Peatonal se Realizo prueba con Galga (de espesor) Dando Resultado R+ 50.

Jornada Terminado a las 4:00 Am

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: Tatiana Henao Perea. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Lina María	FIRMA:
NOMBRE: Lina María Ramos Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Eduardo Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	—		Consorcio.
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	SEBASTIAN TAPASCO	—		
7	Ayudante	Juan Camilo ARBOLEDA	—		
8	Ayudante	Yader Cardenas.	—		
9	Ayudante	Maira Mesa.	—		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhovatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	J44 370	—		
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

(D/M/A): 16/12/2025.


9. CALCULO DE CANTIDADES

MENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2001031	4,1,4		CR 43A C18 YC19	—	30 m	30 m	Linea division Carril 0,12
2001031	4,1,2		" "	2	1,2 m^2	2,4 m^2	flecha de front
2001031	4,1,2		" "	1	3,52 m^2	3,52 m^2	Velocidad 50 Km/h
	\			\	\	\	\ \
			PLASTICO EN	FRIO			Linea paso peatonal 0,40
2001032	4,1,5		CR 43A C19 Y C10	—	129,8 m	129,8 m	Linea de borde Amarillo 0,12
2001032	4,1,3		" "	—	54,95 m	54,95 m	RAB 0,40
2001032	4,1,5		" "	—	9,72 m	9,72 m	
			TOTALES				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16/12/2025

10. ESQUEMAS

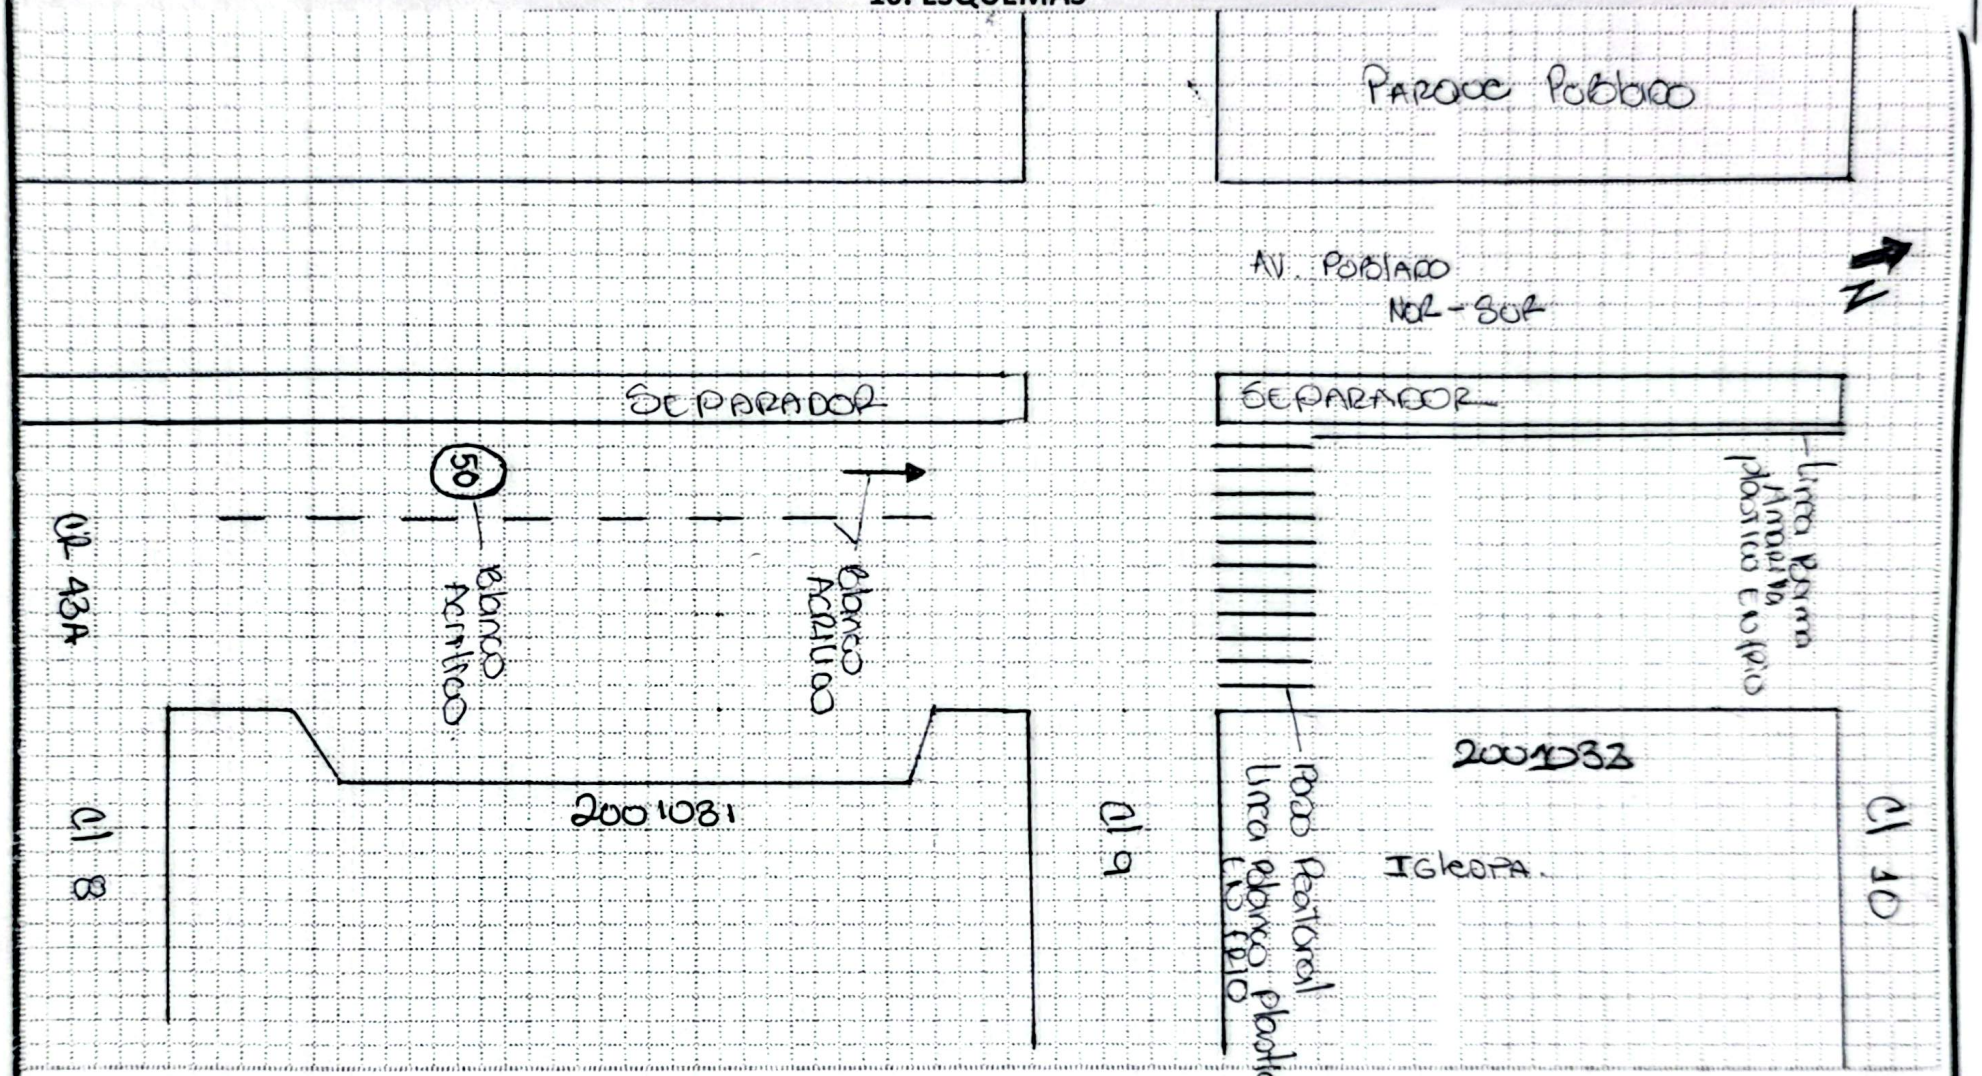

TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	AV. Poblado	DIRECCIÓN	CR 43A Cl 9 Y Cl 10.

Powered by CamScanner
