FECHA (D/M/A): 18/12/2025.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): SEÑALIZACION

RANGO: —— CANTIDAD:

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA: 3
COMUNA: 10.
BARRIO: Parque Socorro

FRENTE DE TRABAJO: 20

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 8:00 PM
TERMINACIÓN: 4:00 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: \\\

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: ——
TARDE: ——

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al punto de inicio como los Gaseosos 8:20 pm, el cual se evalua que no se puede continuar por estado de humedad del pavimento. Se mira entre Contratista e Interventoria punto para intervenir. Se Desplazan para la Cl 33 Cr 46 y 48 a Realizar Acpites Se Empieza a la Demarcacion de señalizacion a las 9:30 pm con Corramiento Ev + solo carril para luego continuar con el otro y Granizo el paso cebrado Empezando con paso peatonal flechas y W paradero de Buses (3) con Linea Divisoria de carril. al pasar se Realizan paso peatonal Linea Detención flecha y Linea Division carril.

Actividad terminada a las 4:00 am cuando terminan de Recoger.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	TATIANA Henao Perez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Lina María	FIRMA:
NOMBRE: Lina María Ramos Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18 | 12 | 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	—		Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Sebastian tupaso	—		
7	Ayudante	mairo mesa	—		
8	Ayudante	Juan Camilo Arboleda	—		
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JYP 370	—		
16	Volqueta(s)				
		maquina de pintura	—		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18/12/2025


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2001179	4.1.6		Cl 33 Cr 46 Y 48	—	6,58 m	6,58 m	RAB 0,40
2001179	4.1.6		" "	—	44,43 m	44,43 m	Linea paso peatonal 0,40
2001179	4.1.6		" "	—	6,73 m	6,73 m	Linea de detencion 0,40
2001179	4.1.2		" "	2	1.2 m^2	2,4 m^2	flecha de frente
2001179	4.1.4		" "	—	59,5 m	59,5 m	Linea de borde Blanca 0,12
2001179	4.1.4		" "	—	77,39 m	77,39 m	Linea division carril 0,12
2001179	4.1.6		" "	—	17,59m	17,59 m	paradero de Bus (0,40)
—	—	—	—	—	—	—	(28,15m * 0,25/0,40)
2001179	4.1.6		" "	—	18,24m	18,24 m	paradero de Bus 0,40
—	—	—	—	—	—	—	(29,18 m* 0,25/0,40)
2001179	4.1.6		" "	—	18,19m	18,19 m	Paradero de Bus 0,40
—	—	—	—	—	—	—	(29,10 m x 0,25/0,40)
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18/12/2025

10. ESQUEMAS

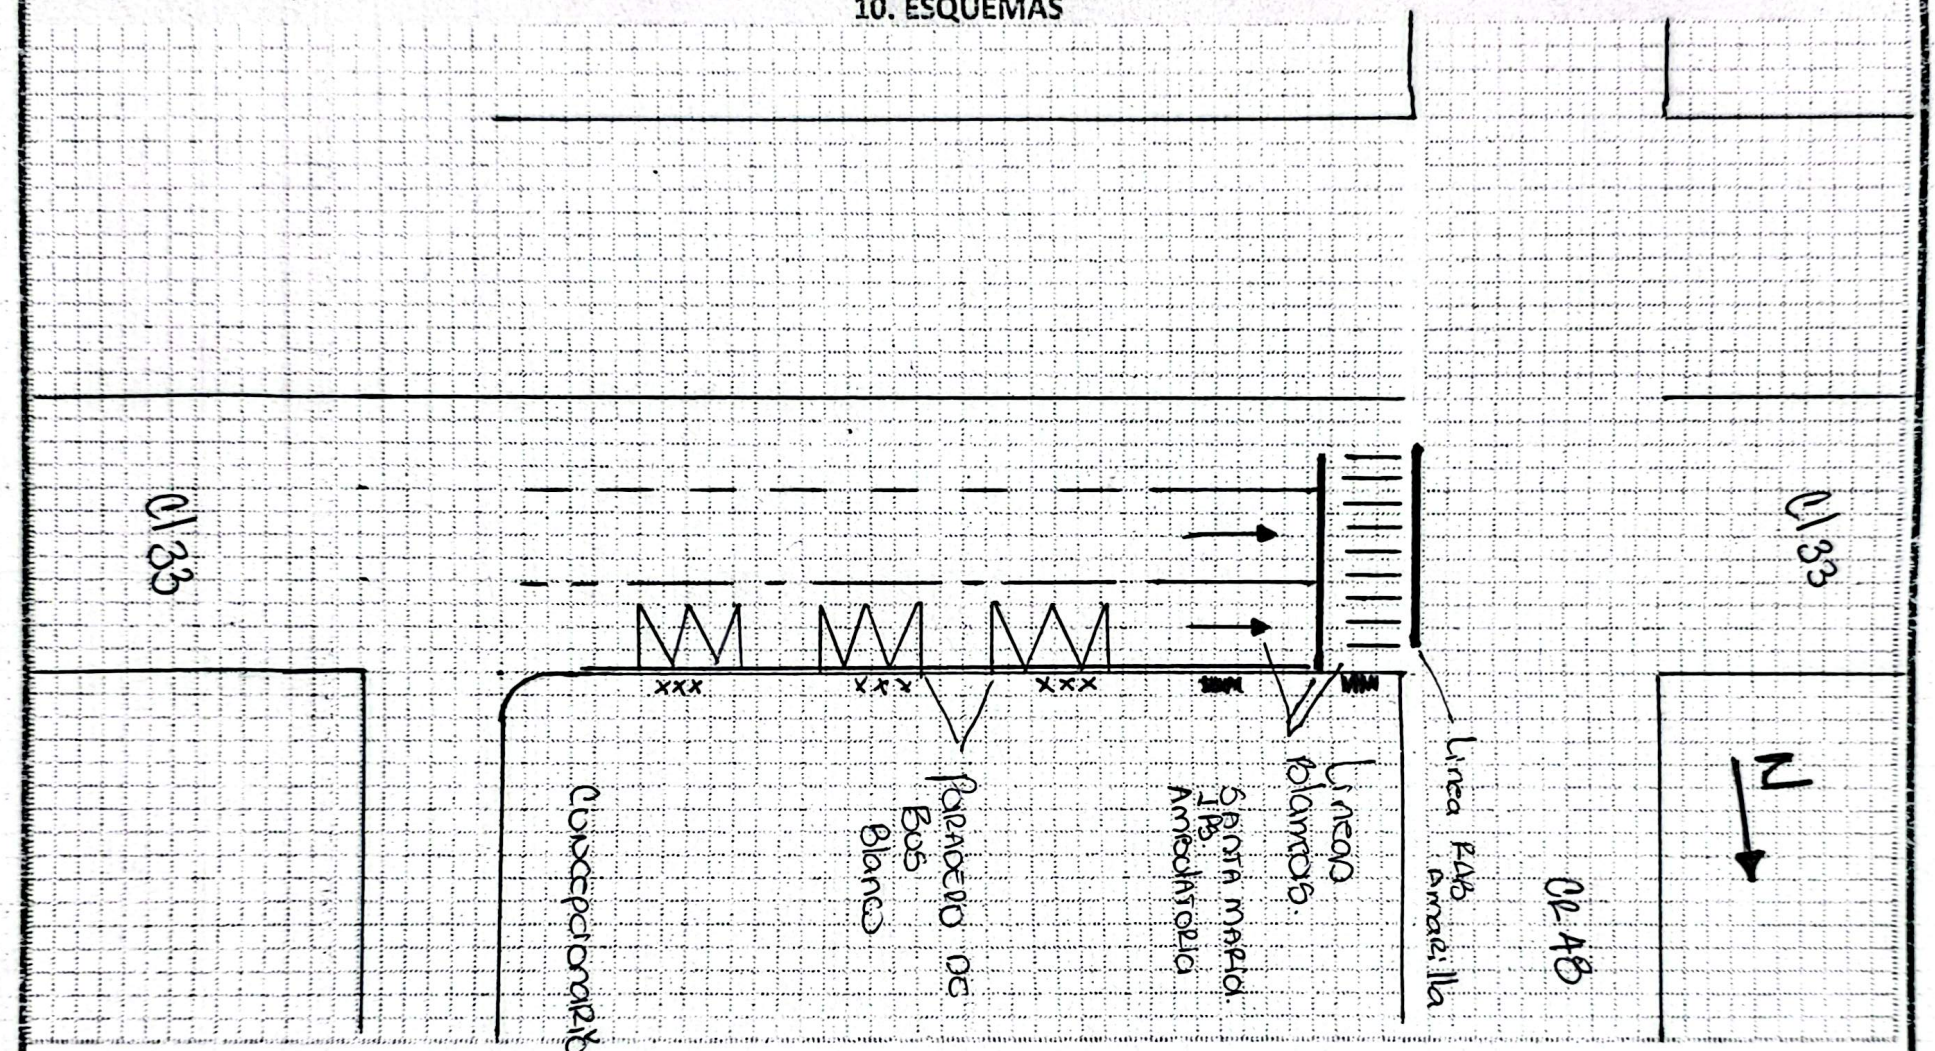

TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	PERPETUO SOCORRO	DIRECCIÓN	Cl 33 Cr 46 Y 48.

Powered by CamScanner
