FECHA (D/M/A): 22 / 12 / 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	SEÑALIZACIÓN
RANGO:	———
CANTIDAD:	
ZONA	5
COMUNA	14.
BARRIO	AV. POBLADO.
FRENTE DE TRABAJO:	20

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:30	\ \ \ \ \
TERMINACIÓN: 5:00 AM.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: ———
TARDE: ———

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Cuadrilla llega al lugar de intervención a las 8:30 pm esperando que disminuya un poco el flujo vehicular. Se empieza con señalizaciones y cerramiento en carriles a las 9:00 pm para la continuidad de plastico en frio en la CR 43A ENTRE Cl 9 y Cl 10. Se tiene visita de Ing jose lops. Se hacen obs. del plastico en frio ya Aplicado que esta muy delgado (poca no cumple espesor Amarillo Berma 120 en unas partes) Se termina Paso peatonal, Lineas Divisorias Linea Detención en Ambos Carriles, flechas de frente y frente y Giro.
Actividad terminada a las 5:00 AM.

Visita de Simon Aux PMT Contratista

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	TATIANA HENAO PEREZ Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Luisa María	FIRMA:
NOMBRE: Luisa María Ramos Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Eduardo Montoya Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	—		Contratista
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Sebastian taipasa	—		
7	Ayudante	Maria meoa	—		
8	Ayudante	Juan camilo Arboleda	—		
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Jyy 370	—		
16	Volqueta(s)				
		maquina de pintura	—		

Powered by CamScanner

PLASTICO EN FRÍO

FECHA (D/M/A): 22/12/2025


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2001032	4,1,5		CR 43A C/9 T C/ 10	—	90,64 m	90,64 m	Linea paso Peatonal 0,40
2001032	4,1,5		" "	—	8,9 m	8,9 m	Linea de detencion 0,40
2001082	4,1,3		" "	—	49,64 m	49,64 m	Linea division Carril 0,12
2001082	4,1,1		" "	5	1,2 m²	6,0m²	flecha de frente
2001032	4,1,1		" "	1	2,2 m²	2.2 m²	flecha frente y Giro
2001032	4,1,3		" "	—	53,17 m	53,17 m	Linea de Borde blanco 0,12
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22 / 12 / 2025

10. ESQUEMAS

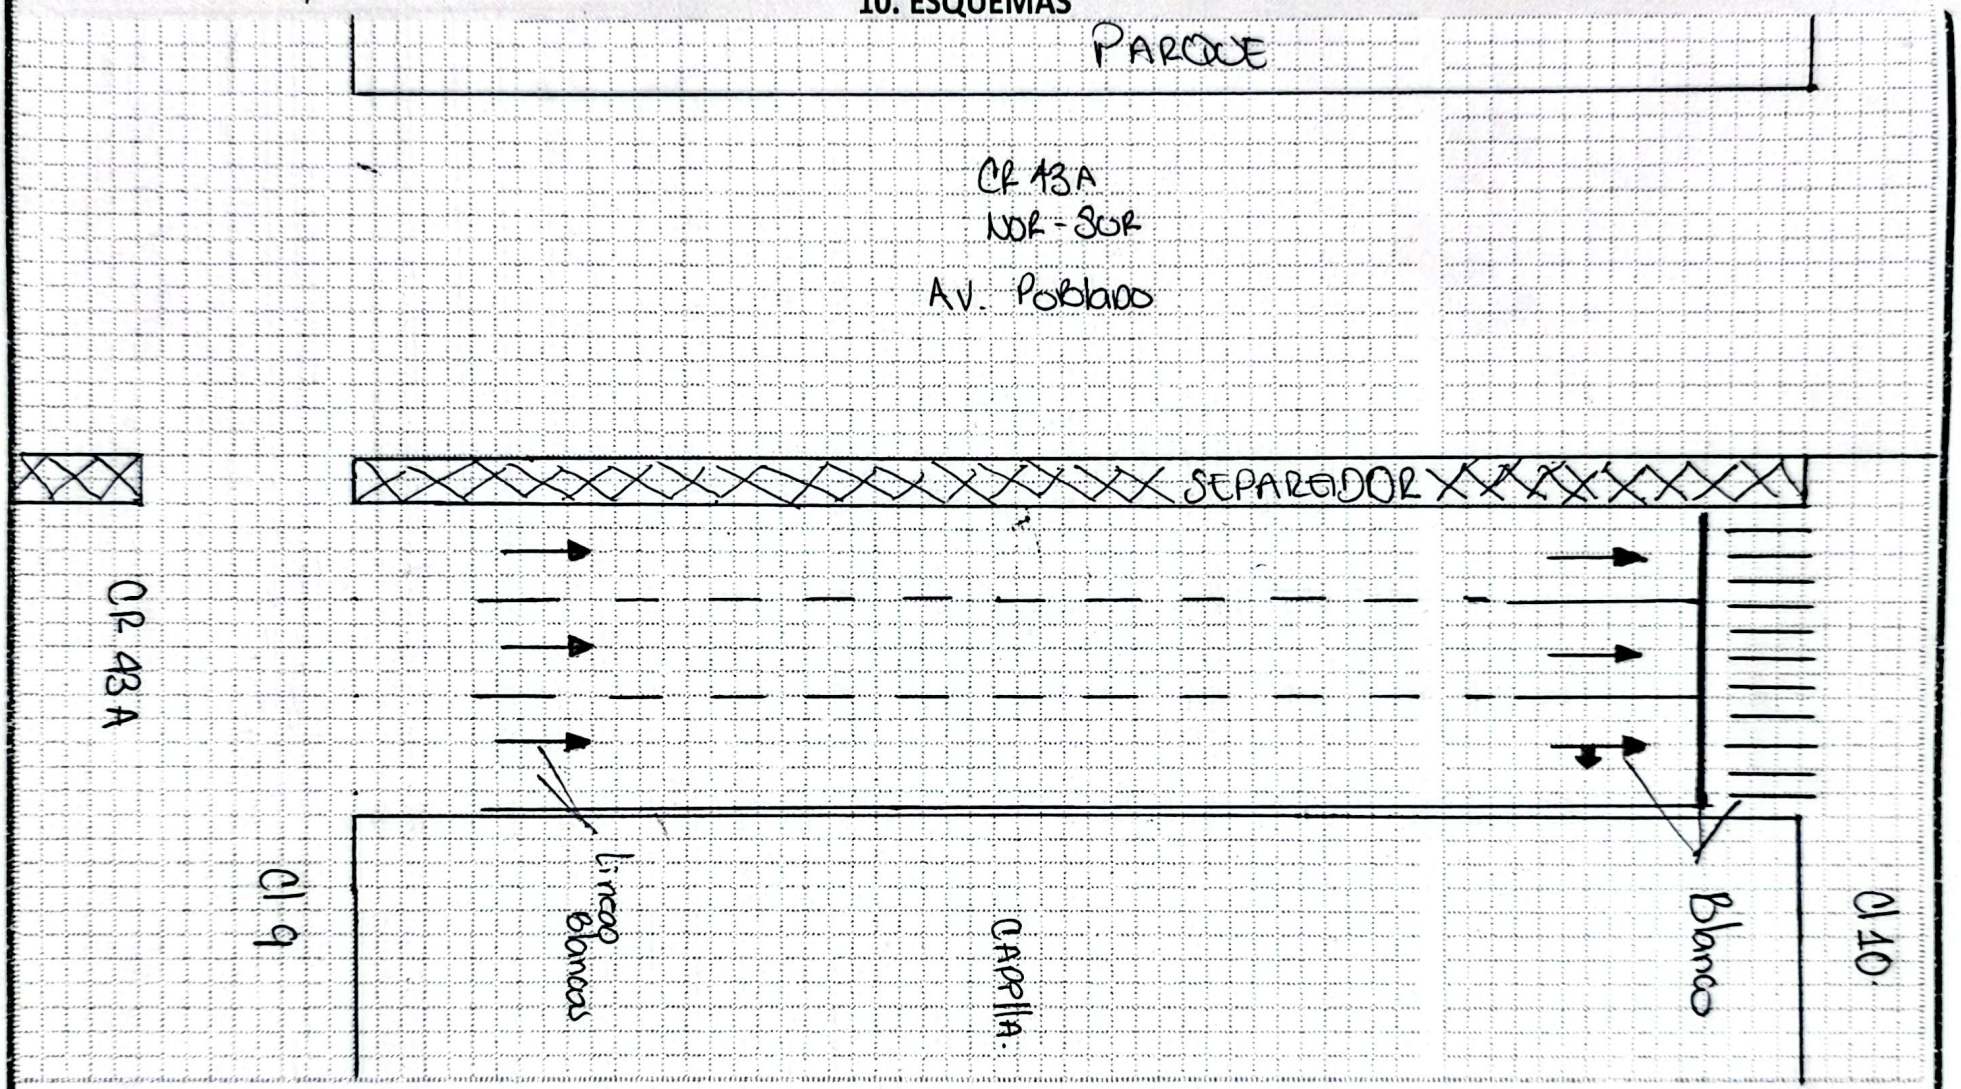

TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACION	FRENTE	20
RANGO:	——	CANTIDAD:	PLASTICO EN FRIO
BARRIO	AV. POBLADO	DIRECCIÓN	AV. Pob. CR 43A CL 9 T CL10

Powered by CamScanner
