SARO COMPANY S.A.S.

DOCUMENTOS VARIOS TOMO I

Notificaciones:
Dirección electrónica :(e-mail) groupsarocompany@gmail.com
Celular: 3204540712-3114830228

INFORME DE AVANCE FINAL DE OBRA

FECHA. 11 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 10 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

CONTRATANTE:

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

OBJETO: *MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.*

CONTRATISTA: *CONSORCIO SARO.*
(R/L JONHY BLADIMIR SALAS RODRÍGUEZ)
Contratista de obra.

INTERVENTORÍA: *C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.*
Contratista de INTERVENTORÍA.

SUPERVISOR: *Arq. JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO*
Secretario de Infraestructura

MARZO-2026

Contenido

1.0 INTRODUCCIÓN....2

2.0 GENERALIDADES DEL PROYECTO....2

3.0 DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN....3

4.0 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO OBRA....4

3.1 RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA....5

GENERALIDADES....5

5.0 CONTROL JURÍDICO Y ESTADO DE PÓLIZAS....7

6.0 CONTROL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE....8

5.1 Personal, seguridad social y parafiscales....8

Personal del contratista – organigrama....8

Seguridad social y parafiscales....8

5.1 Control de equipos....9

5.2 Avance y Blance Financiero....9

5.3 Información contable....10

7.0 CONTROL TÉCNICO....10

6.1 Actividades ejecutadas....10

6.2 Avance de obra....14

6.4 Novedades del periodo....14

6.5 Memoria de Cantidades....15

6.6 Control de estado del tiempo....15

8.0 RECOMENDACIONES....15


9.0 CONCLUSIONES....17

1.0 INTRODUCCIÓN.

El presente informe presenta un informe detallado de la ejecución física y financiera del contrato de obra No 442-2025 el cual tiene por objeto el "Mejoramiento con Pavimento Rígido de la Carrera 4 entre las Calles 4 y 5" en él se plasma detalles específicos de cada una de las actividades y su avance, así como aspectos relevantes que en su conjunto permiten una adecuada ejecución de las mismas. Las actividades ejecutadas física, administrativa y financieramente dentro de este informe final abarcan el periodo comprende desde el 11 de diciembre de 2025 al 10 de marzo de 2026.

2.0 GENERALIDADES DEL PROYECTO.

Localización del proyecto:

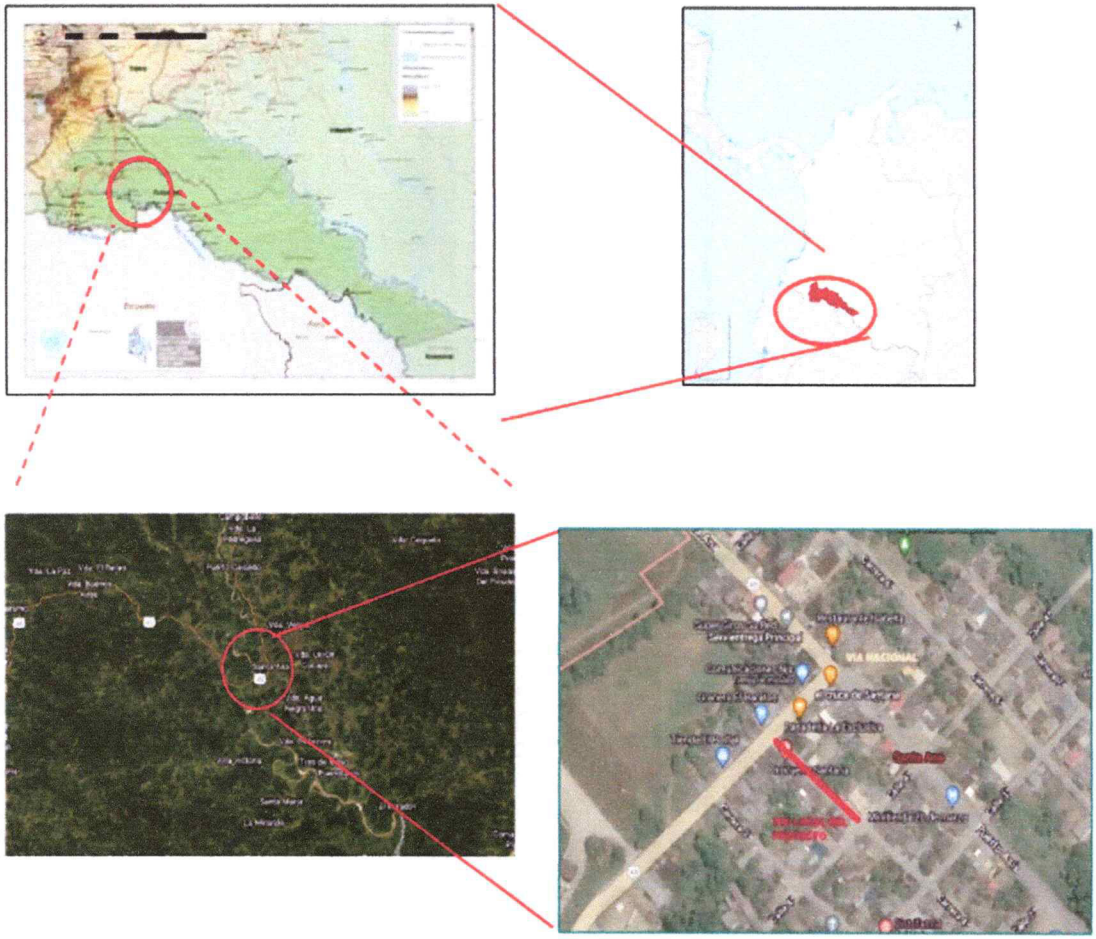

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

El proyecto tuvo como objetivo el "***MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.***", Esta intervención se planteó debido

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

al deterioro de la malla vial ocasionado por factores climáticos y el tránsito vehicular, así como por la presencia de afecciones respiratorias en la población del sector, generadas por el polvo o material particulado producido por el paso de los vehículos.

En consecuencia, se hizo necesaria la pavimentación del tramo, la cual contempla las siguientes actividades:

1.0 REALIZA PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
1.2 DESMONTE E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO
2.0 REALIZA EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS
2.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA
2.2 EXCAVACION A MANO
2.3 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES
3.0 REALIZA ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR
3.2 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL
3.3 SUBBASE GRANULAR
3.4 PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa
3.5 ACERO DE REFUERZO
3.6 JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO
3.7 SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI
4.0 REALIZA OBRAS DE URBANISMO-ANDENES
4.1 PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA e: 10 cm
5.0 REALIZA SEÑALIZACION
5.1 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO.
5.2 DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO.
6.0 REALIZA INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
6.1 CONST CAJAS INSP DOMICILIARIAS ALCANT 0,70 X0,70
6.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
6.3 ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN
6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAM: (6pulg)
6.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE PVC DIAM: 6pulg*10pulg
6.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO-6pulg
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

De conformidad con la ejecución real encontrada en campo y de acuerdo con el seguimiento y balances financieros dentro de la ejecución de acuerdo con las actividades contractuales y cantidades las cuales permiten un proyecto funcional y que cumpla con el objeto del proyecto, surgió el Modificatorio No 01 de fecha 02 de marzo de 2026 el cual dio origen a un nuevo valor contractual el cual se estableció en **CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS $ 412.712.260 MDA/CTE** de acuerdo con el acta de mayores y menores cantidades de obra No 01 del 27 de febrero de 2026, los correspondientes ajustes que contemplo el modificatorio No 01 respecto de las cantidades de obra se plasman en el presente informe en la Tabla No 03.

3.0 DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

En concordancia con la ejecución en campo de las actividades contractuales, se realizó el seguimiento, control y balance de las cantidades de obra ejecutadas, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y de las metas físicas establecidas. Este proceso se desarrolló considerando la dinámica constructiva del proyecto y la ocurrencia de condiciones no previstas durante la etapa de ejecución.

En este sentido, se requirió la implementación de ajustes técnicos al diseño geométrico de la vía, particularmente en lo relacionado con su alineamiento horizontal y vertical. Dichas modificaciones obedecieron, en primera instancia, a la configuración irregular del entorno construido, evidenciándose una disposición heterogénea de las viviendas a lo largo del corredor vial, con incumplimiento de líneas de paramento y restricciones de espacio que condicionaban el desarrollo del diseño inicialmente planteado.

Adicionalmente, se identificaron interferencias con redes de servicios públicos, específicamente postes de energía, cuya localización afectaba la sección transversal proyectada y la operación segura de la vía, por lo cual se hizo necesaria su reubicación o ajuste dentro del diseño.

De igual manera, fue necesario realizar la optimización de la rasante mediante el ajuste de pendientes longitudinales, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de drenaje superficial, incorporando pendientes transversales (bombeo) que permitan la correcta evacuación de aguas lluvias. Estas modificaciones también buscaron minimizar diferencias altimétricas en los accesos a predios y viviendas, evitando afectaciones funcionales y constructivas.

Como resultado de lo anterior, se efectuó la redefinición del eje vial y la actualización integral del diseño geométrico, en cumplimiento de criterios técnicos y normativos aplicables, asegurando condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad vial y drenaje.

Estos ajustes técnicos dieron origen a la suscripción de la primera modificación al contrato de obra, correspondiente al reconocimiento de mayores y menores cantidades de obra, debidamente soportadas en el balance de obra y en las condiciones reales encontradas en campo.

4.0 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO OBRA

Tabla No. 1: Información del contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA	No. 442-2025.
CONTRATISTA	CONSORCIO SARO
NIT/CC.	R/L JONHY BLADIMIR SALAS RODRÍGUEZ NIT: 902.004.925-8
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
OBJETO	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($413.098.672) MDA/CTE.
VALOR FINAL SEG MODIFICATORIO No 01	CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS $ 412.712.260 MDA/CTE.
PLAZO:	TRES (03) MES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE MARZO DE 2026.

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

3.1 RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA.

GENERALIDADES

La alcaldía del municipio de Puerto Asís putumayo contrato con la empresa jurídica CONSORCIO SARO cuyo representante legal es el ING. JONHY BLADIMIR SALAS RODRÍGUEZ el contrato de obra No 442-2025 cuyo objeto es MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. dentro del cual existen los ítems y cantidades contractuales iniciales que se relacionan a continuación.

Tabla No. 2: Actividades y cantidades contractuales iniciales.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**REALIZAR PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	596,82	$ 3.652,00	$ 2.179.587,00
1,2	DESMONTE E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO	UN	2,00	$ 4.417.401,00	$ 8.834.802,00
2,0	**REALIZAR EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS**				
2,1	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	711,53	$ 25.630,00	$ 18.236.514,00
2,2	EXCAVACIÓN A MANO	M3	33,55	$ 62.369,00	$ 2.092.480,00
2,3	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	931,35	$ 41.608,00	$ 38.751.611,00
3,0	**REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR	M2	596,82	$ 11.171,00	$ 6.667.076,00
3,2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	179,05	$ 126.908,00	$ 22.722.877,00
3,3	SUBBASE GRANULAR	M3	119,36	$ 223.838,00	$ 26.717.304,00
3,4	PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa	M3	107,43	$ 1.402.534,00	$ 150.674.228,00
3,5	ACERO DE REFUERZO	KG	1440,45	$ 12.124,00	$ 17.464.016,00
3,6	JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO	ML	310,83	$ 58.648,00	$ 18.229.558,00
3,7	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	206,10	$ 93.821,00	$ 19.336.508,00
4,0	**REALIZAR OBRAS DE URBANISMO-ANDENES**				
4,1	PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA e- 10cm	M2	206,13	$ 174.420,00	$ 35.953.195,00
5,0	**REALIZAR SEÑALIZACION**				
5,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO	UN	2,00	$ 561.403,00	$ 1.122.806,00
5,2	DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	M2	39,20	$ 50.192,00	$ 1.967.526,00
6,0	**REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
6,1	CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7	UN	3,00	$ 714.941,00	$ 2.144.823,00
6,2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,95	$ 116.860,00	$ 578.457,00
6,3	ARENA DE BASE PARA NIVELACION	M3	2,25	$ 131.560,00	$ 296.010,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DIÁM: (6 pulg)	ML	18,00	$ 76.631,00	$ 1.379.358,00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE PVC DIAM:6pulg*10pulg.	UN	3,00	$ 202.364,00	$ 607.092,00
6,6	SUMINISTRO E INSTALACION SEMICODO-6 pulg	UN	3,00	$ 70.948,00	$ 212.844,00

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
				SUB TOTAL OBRA	**$ 376.168.672,00**
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 21.190.000,00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 15.740.000,00
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 413.098.672,00

Posteriormente y de conformidad con la ejecución del contrato en sitio se procedió realizar la modificación No 01, las cuales obedecieron a que:

- En campo la cercanía de las cuerdas de energía con las viviendas limita que se ajuste el diseño inicial.

- La geometría en planta de la vía de acuerdo con los paramentos y proximidad de las cuerdas con las viviendas evidencia la necesidad de ajustar el diseño, adicional a ello se buscaba que los postes no interfirieran en el tránsito de vehículos y peatones.

- De acuerdo con la inspección realizada en el sitio se determinó cambiar el sentido de transversal de la pendiente debido a que técnicamente las viviendas quedarían altas en relación con los niveles de la vía, adicional a ello y evidenciado que sobre la calle 5 tiene una adecuada pendiente para el manejo de aguas lluvias las cuales desencolan sobre el mismo humedal donde escurre el agua que baja sobre la calle 4 (vía nacional) fue técnicamente conveniente la modificación del diseño geométrico de conformidad con el replanteo realizado.

Como resultado de lo anterior se suscribe el Acta de Mayores y menores cantidades de obra No 01.

Tabla No. 3: Actividades y cantidades según Modificatorio No 01.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**REALIZAR PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	786,48	$ 3.652,00	$ 2.872.225,00
1,2	DESMONTE E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO	UN	2,00	$ 4.417.401,00	$ 8.834.802,00
2,0	**REALIZAR EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS**				
2,1	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	620,36	$ 25.630,00	$ 15.899.827,00
2,2	EXCAVACIÓN A MANO	M3	26,46	$ 62.369,00	$ 1.650.284,00
2,3	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	808,53	$ 41.608,00	$ 33.641.316,00
3,0	**REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR	M2	598,14	$ 11.171,00	$ 6.681.822,00
3,2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	252,46	$ 126.908,00	$ 32.039.194,00
3,3	SUBBASE GRANULAR	M3	119,63	$ 223.838,00	$ 26.777.740,00
3,4	PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa	M3	107,65	$ 1.402.534,00	$ 150.982.785,00
3,5	ACERO DE REFUERZO	KG	1.536,14	$ 12.124,00	$ 18.624.161,00
3,6	JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO	ML	278,12	$ 58.648,00	$ 16.311.182,00
3,7	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	200,03	$ 93.821,00	$ 18.767.015,00
4,0	**REALIZAR OBRAS DE URBANISMO-ANDENES**				

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,1	PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA e- 10cm	M2	197,12	$ 174.420,00	$ 34.381.670,00
5,0	**REALIZAR SEÑALIZACION**				
5,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO	UN	2,00	$ 561.403,00	$ 1.122.806,00
5,2	DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M2	28,96	$ 50.192,00	$ 1.453.560,00
6,0	**REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
6,1	CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7	UN	3,00	$ 714.941,00	$ 2.144.823,00
6,2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	6,00	$ 116.860,00	$ 701.160,00
6,3	ARENA DE BASE PARA NIVELACION	M3	1,80	$ 131.560,00	$ 236.808,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DIÁM: (6 pulg)	ML	24,00	$ 76.631,00	$ 1.839.144,00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE PVC DIAM:6pulg*10pulg.	UN	3,00	$ 202.364,00	$ 607.092,00
6,6	SUMINISTRO E INSTALACION SEMICODO-6 pulg	UN	3,00	$ 70.948,00	$ 212.844,00
				SUB TOTAL OBRA	**$ 375.782.260,00**
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 21.190.000,00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 15.740.000,00
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO No 01	$ 412.712.260,00

5.0 CONTROL JURÍDICO Y ESTADO DE PÓLIZAS

El contrato de obra se encuentra amparado bajo los siguientes anexos los cuales se describen y resumen en los siguientes cuadros.

Tabla No. 3: Pólizas con respecto a la suscripción del contrato.

GARANTÍA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO				
SEGÚN FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO				
Póliza No. AGP-100005627, Anexo 0			**Fecha Expedición: 06/11/2025**	
GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento del contrato	Seguros Mundial	06/11/2025	06/06/2026	$ 41.309.867,20
Buen Manejo del anticipo	Seguros Mundial	06/11/2025	06/06/2026	$ 206.549.336,00
Prestaciones Sociales	Seguros Mundial	06/11/2025	06/02/2029	$ 20.654.933,60
Estabilidad de la Obra	Seguros Mundial	06/02/2026	06/02/2031	$ 82.619.734,40
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD DERIVADO DE CUMPLIMIENTO				
SEGÚN FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO				
Póliza No. AGP-100000992, Anexo 0			**Fecha Expedición: 06/11/2025**	
GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**SUMA ASEGURADA**
Básico Responsabilidad Civil	Seguros Mundial	06/11/2025	06/11/2025	$ 284.700.000,00

Tabla No. 4: Pólizas con respecto a la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.

GARANTÍA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO				
SEGÚN FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO				
Póliza No. AGP-100005627, Anexo 1			**Fecha Expedición: 11/12/2025**	
GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**SUMA ASEGURADA**

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

Cumplimiento del contrato	Seguros Mundial	11/12/2025	11/07/2026	$ 41.309.867,20
Buen Manejo del anticipo	Seguros Mundial	11/12/2025	11/07/2026	$206.549.336,00
Prestaciones Sociales	Seguros Mundial	11/12/2025	13/03/2029	$ 20.654.933,60
Estabilidad de la Obra	Seguros Mundial	13/03/2026	13/03/2031	$ 82.619.734,40
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD DERIVADO DE CUMPLIMIENTO				
SEGÚN FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO				
Póliza No. AGP-100000992, Anexo 1			**Fecha Expedición: 06/11/2025**	
GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**SUMA ASEGURADA**
Básico Responsabilidad Civil	Seguros Mundial	11/12/2025	13/03/2026	$ 284.700.000,00

Tabla No. 5: Pólizas con respecto a la fecha de suscripción del acta de recibo final.

GARANTÍA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO				
SEGÚN FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO				
Póliza No. AGP-100005627, Anexo 3			**Fecha Expedición: 11/12/2025**	
GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento del contrato	Seguros Mundial	11/12/2025	11/07/2026	$ 41.309.867,20
Buen Manejo del anticipo	Seguros Mundial	11/12/2025	11/07/2026	$206.549.336,00
Prestaciones Sociales	Seguros Mundial	11/12/2025	13/03/2029	$ 20.654.933,60
Estabilidad de la Obra	Seguros Mundial	10/03/2026	13/03/2031	$ 82.619.734,40

6.0 CONTROL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE

5.1 Personal, seguridad social y parafiscales

Personal del contratista – organigrama



Seguridad social y parafiscales

El personal vinculado para la ejecución de la obra es el registrado según el organigrama de dicho personal se presenta el anexo de presente informe las respectivas planillas de seguridad social.

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

5.1 Control de equipos.

Para la ejecución de las actividades del contrato se dispone de la siguiente Maquinaria y equipos (Ver Registro fotográfico):

- Retroexcavadora sobre orugas
- 5 volquetas.
- Motobomba.
- Planta eléctrica.
- Vibro-Compactador
- Motoniveladora.
- Vibrocompactador.
- Mezcladoras de concreto
- cortadora de concreto.
- Vibro para concreto.

5.2 Avance y Blance Financiero.

Tabla No. 5: Tabla de avance financiero.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE FINAL EJECUCIÓN OBRA DESDE 11/12/25 AL 10/03/2026	
						CAT EJEC	VALOR EJECUTADO
1,0	**REALIZAR PRELIMINARES**						
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	786,48	$ 3.652,00	$ 2.872.225,00	786,48	$ 2.872.225,00
1,2	DESMONTE E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO	UN	2,00	$ 4.417.401,00	$ 8.834.802,00	2,00	$ 8.834.802,00
2,0	**REALIZAR EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS**						
2,1	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	620,36	$ 25.630,00	$ 15.899.827,00	620,36	$ 15.899.827,00
2,2	EXCAVACIÓN A MANO	M3	26,46	$ 62.369,00	$ 1.650.284,00	26,46	$ 1.650.284,00
2,3	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	808,53	$ 41.608,00	$ 33.641.316,00	808,53	$ 33.641.316,00
3,0	**REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO**						
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR	M2	598,14	$ 11.171,00	$ 6.681.822,00	598,14	$ 6.681.822,00
3,2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	252,46	$ 126.908,00	$ 32.039.194,00	252,46	$ 32.039.194,00
3,3	SUBBASE GRANULAR	M3	119,63	$ 223.838,00	$ 26.777.740,00	119,63	$ 26.777.740,00
3,4	PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa	M3	107,65	$ 1.402.534,00	$ 150.982.785,00	107,65	$ 150.982.785,00
3,5	ACERO DE REFUERZO	KG	1.536,14	$ 12.124,00	$ 18.624.161,00	1.536,14	$ 18.624.161,00
3,6	JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO	ML	278,12	$ 58.648,00	$ 16.311.182,00	278,12	$ 16.311.182,00
3,7	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	200,03	$ 93.821,00	$ 18.767.015,00	200,03	$ 18.767.015,00
4,0	**REALIZAR OBRAS DE URBANISMO-ANDENES**						
4,1	PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA e- 10cm	M2	197,12	$ 174.420,00	$ 34.381.670,00	197,12	$ 174.420,00
5,0	**REALIZAR SEÑALIZACION**						
5,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO	UN	2,00	$ 561.403,00	$ 1.122.806,00	2,00	$ 1.122.806,00
5,2	DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M2	28,96	$ 50.192,00	$ 1.453.560,00	28,96	$ 1.453.560,00
6,0	**REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**						
6,1	CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7	UN	3,00	$ 714.941,00	$ 2.144.823,00	3,00	$ 2.144.823,00
6,2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	6,00	$ 116.860,00	$ 701.160,00	6,00	$ 701.160,00
6,3	ARENA DE BASE PARA NIVELACION	M3	1,80	$ 131.560,00	$ 236.808,00	1,80	$ 236.808,00

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE FINAL EJECUCIÓN OBRA DESDE 11/12/25 AL 10/03/2026	
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DIÁM: (6 pulg)	ML	24,00	$ 76.631,00	$ 1.839.144,00	24,00	$ 1.839.144,00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE PVC DIAM:6pulg*10pulg.	UN	3,00	$ 202.364,00	$ 607.092,00	3,00	$ 607.092,00
6,6	SUMINISTRO E INSTALACION SEMICODO-6 pulg	UN	3,00	$ 70.948,00	$ 212.844,00	3,00	$ 212.844,00
				SUB TOTAL OBRA	**$ 375.782.260,00**		**$ 357.782.260,00**
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 21.190.000,00		$ 21.190.000,00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 15.740.000,00		$ 15.740.000,00
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 412.712.260,00		
				VALOR TOTAL EJECUTADO FINANCIERAMENTE PARA ACTA PARCIAL No 01			**$ 412.712.260,00**
					PORCENTAJE DE AVANCE FINAL		100,00%

5.3 Información contable

Tabla No. 6: Tabla de información contable.

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato:	$ 413.098.672,00
Según la forma de pago el contrato se encuentra con el 50% de anticipo	$ 206.549.336,00
Valor Adicionado:	$ 0,00
Valor Total del Contrato:	$ 413.098.672,00
Valor Actualizado del contrato según Modificatorio No 01	$ 412.712.260,00
Valor Recibido por el Contratista (Anticipo 50%)	$ 0,00
Valor Amortizado del Anticipo:	$ 0,00
Valor Pagado en el Acta de Recibo Parcial:	$ 0,00

El contrato contempla, dentro de su forma de pago, un anticipo del 50%. No obstante, no se adelantó ningún trámite para su desembolso, debido a que los procesos fiduciarios con la entidad bancaria se prolongaron, lo que impidió efectuar dicho pago. En consecuencia, las actividades ejecutadas fueron financiadas con recursos propios del contratista de obra. En virtud de lo anterior, el contratista de obra suscribe el documento de desistimiento del anticipo.

7.0 CONTROL TÉCNICO.

6.1 Actividades ejecutadas.

1.0 REALIZA PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

Para el desarrollo de esta actividad se realizó con presencia de la interventoría, se realiza la ubicación de la vía a replantear y se toman los nuevos puntos, se ubican en terreno tomando los niveles y verificando las dimensiones del pavimento existente para proyectar la construcción del nuevo, esta actividad fue desarrollada en un 100.00%.

1.2 DESMONTE E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO.

Para el desarrollo de esta actividad se realizó con presencia de la interventoría, para lo cual se dispuso del replanteo realizado y de la nueva ubicación para desplazarlos en el sitio donde no afecte la circulación de vehículos y de peatones.

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

En el desarrollo de la actividad fue necesario el acompañamiento de la empresa de energía del bajo putumayo, se dispuso de un vehículo tipo grúa y del personal idóneo, esta actividad fue desarrollada en un 100.00%.

2.0 REALIZAR EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS
2.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA.
Esta actividad se desarrolló entre las abscisas K0+040 a la K0+098,31 en presencia continua de la interventoría constatando en las jornadas de trabajo los eventos encontrados en las diferentes excavaciones realizados por la máquina Retroexcavadora tipo oruga 320-caterpillar, dentro de los eventos encontrados se puede recalar:

Mediante las excavaciones se retiraron fallos de la subrasante entre las Abscisas:

- Entre las Abscisas K0+045 y K0+055.
- Entre las Abscisas K0+050 y K0+070.
- Entre las Abscisas K0+070 y K0+075.
- Entre las Abscisas K0+090 y K0+098,31.

El avance de ejecución de esta actividad en el mes corresponde al 100.00%, ver ANEXO-REGISTRO FOTOGRÁFICO

2.2 EXCAVACIÓN A MANO
Las diferentes excavaciones a mano fueron realizadas para: las tuberías de conexión de las domiciliarias, cajas de inspección, tuberías, andenes. El avance en su ejecución fue del 100.00%.

2.3 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES
Los desalojos realizados corresponden al 100,00% y están representados en la excavación a máquina y manuales que fueron realizadas entre las Abscisas K0+00- y la Abscisas K0+098,31, ver ANEXO- REGISTRO FOTOGRÁFICO.

3.0 REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR
En la ejecución de este ítem se tiene un avance del 100,00%, y se ha ejecutado de acuerdo con los anchos en las excavaciones, esto con el fin de impedir que el material de mejoramiento se mezcle con las arcillas presentes en el sitio.

3.2 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL

El mejoramiento de la subrasante se realizó con adición de material el cual se instaló y compacto según las condiciones técnicas del proyecto en los espesores indicados, las variaciones de dicho espesor cambiaron de conformidad a las cantidades de ejecución de obra que soportan esta acta parcial las abscisas son las siguientes:

- Entre las Abscisas K0+045 y K0+055.
- Entre las Abscisas K0+050 y K0+070.
- Entre las Abscisas K0+070 y K0+075.

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

- Entre las Abscisas K0+090 y K0+098,31.

Lo anterior debido a los fallos de material arcilloso de baja plasticidad los cuales fue necesario rellena mediante la incorporación de material de adición, por ello los volúmenes cambian de acuerdo con las condiciones reales encontradas en campo. El avance de ejecución de la actividad en este mes correspondió al 100.00%

3.3 SUBBASE GRANULAR

La actividad ejecutada en el período que comprende esta acta de recibo parcial No 01 tiene un avance de ejecución del 100,00% y se realizó en un espesor compacto de 20 cm, en un ancho de 6.00 mts, cabe destacar que el material de subbase se le ha realizado los ensayos de laboratorio lo cual evidencia unas condiciones adecuadas para su instalación.

3.4 PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa

Esta actividad se ejecutó en un 100,00% y contemplo la preparación e instalación de concreto con Mr: 3,8 Mpa en un espesor a lo largo de la vía de 18 cm, se realizó el respectivo control en la mezcla para las fundiciones realizadas, en el ANEXO-REGISTRO FOTOGRÁFICO TOMA DE MUESTRAS

3.5 ACERO DE REFUERZO

Esta actividad fue ejecutada en un 100,00% y considera la estructura de soporte en varilla de 6,00mm para los pasadores en varillas lisa de 7/8 de pulgada, acero transversal de 1/2 pulgada y acero de ½ pulgada para reforzar las placas con geometrías irregulares, y el refuerzo para bordillos y tapas de las cajillas domiciliarias, ver ANEXO- REGISTRO FOTOGRÁFICO.

3.6 JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO

Este ítem comprendió el corte de placas de acuerdo con la modulación y la instalación del cordón de respaldo junto con el sellante en todas las juntas definidas la actividad fue ejecutada en un 100,00%, ver ANEXO- REGISTRO FOTOGRÁFICO.

3.7 SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI

La ejecución de este ítem comprendió la instalación de la formaleta alineada según la geometría de la vía, posterior a ello se realizó el preparado y fundición del concreto de acuerdo con las especificaciones según las medidas del bordillo la actividad fue ejecutada en un 100,00%, ver ANEXO- REGISTRO FOTOGRÁFICO.

4.0 REALIZAR OBRAS DE URBANISMO-ANDENES

4.1 PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA e- 10cm.

La ejecución de este item comprende la totalidad de los andenes de los dos carriles derecho e izquierdo abarco la disposición de formaleta según la geometría y el proceso constructivo en donde se fundieron placas intermedias, cabe destacar que la colocación y preparación se dio previo a la instalación de la malla electrosoldada, el avance de ejecución correspondió al 100,00%.

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

5.0 REALIZAR SEÑALIZACION
5.1 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO

La ejecución de este item corresponde al 100,00% y abarco la disposición, plome y fundición de la señalización vertical de PARE en los sitios definidos en el proyecto, para tal fin se programó su instalación de acuerdo con las fundiciones de los andenes.

5.2 DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO

La ejecución de este item corresponde al 100,00% y se realizó previa limpieza de la placa de concreto y en las zonas definidas en el proyecto las cuales contemplaron el eje central, las cebras y fechas.

6.0 REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

7.1 CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7.

La ejecución de este item corresponde al 100,00% y abarco la preparación e instalación de concreto de 3000 Psi de conformidad con el montaje y aplome de las formaletas manteniendo la geometría de la cajilla según las especificaciones técnicas del proyecto.

6.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.
6.3 ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN

Estas actividades contemplaron el suministro e instalación de un encamado de arena a fin de nivelar y alistar la base de cimentación de la tubería de las domiciliarias, posterior a su alistado se llena con material seleccionado, el avance en la ejecución de esta actividad correspondió al 100,00 %. para el material seleccionado y el 100.00% para el encamado de arena.

6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁM: (6 pulg)
6.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE PVC DIAM:6pulg*10pulg.
6.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO-6 pulg
Estas actividades se ejecutaron de manera conjunta previa excavación manual e instalación del encamado de arena de cada una de las domiciliarias, para la instalación de cada uno de los componentes se dispuso de los elementos y materiales adecuados como sika, sellos y amarres los cuales en su conjunto permitieran un adecuado funcionamiento de las domiciliarias intervenidas.

El avance en cada uno de los componentes es el siguiente:

1. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁM: (6 pulg)**. El avance corresponde al 100,00%.
2. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE PVC DIAM:6pulg*10pulg**. El avance corresponde al 100,00%.
3. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO-6 pulg**. El avance corresponde al 100,00%.

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

6.2 Avance de obra

El avance físico por actividades ejecutado en este periodo corresponde según la tabla:

Tabla No. 7: Avance físico por actividad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRATADA	AVANCE FINAL EJECUCIÓN OBRA DESDE 11/12/25 AL 10/03/2026	
				CANT EJEC	% EJECUTADO
1,0	**REALIZAR PRELIMINARES**				**100,00%**
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	786,48	786,48	100,00%
1,2	DESMONTE E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO	UN	2,00	2,00	100,00%
2,0	**REALIZAR EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS**				**100,00%**
2,1	EXCAVACION A MAQUINA	M3	620,36	620,36	100,00%
2,2	EXCAVACION A MANO	M3	26,46	26,46	100,00%
2,3	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES	M3	808,53	808,53	100,00%
3,0	**REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO**				**100,00%**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR	M2	598,14	598,14	100,00%
3,2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL	M3	252,46	252,46	100,00%
3,3	SUBBASE GRANULAR	M3	119,63	119,63	100,00%
3,4	PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa	M3	107,65	107,65	100,00%
3,5	ACERO DE REFUERZO	KG	1.536,14	1.536,14	100,00%
3,6	JUNTAS DE EXPANSION Y SU RESPECTIVO SELLADO	ML	278,12	278,12	100,00%
3,7	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	200,03	200,03	100,00%
4,0	**REALIZAR OBRAS DE URBANISMO-ANDENES**				**100,00%**
4,1	PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA e- 10cm	M2	197,12	197,12	100,00%
5,0	**REALIZAR SEÑALIZACION**				**100,00%**
5,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO	UN	2,00	2,00	100,00%
5,2	DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M2	28,96	28,96	100,00%
6,0	**REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**100,00%**
6,1	CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7	UN	3,00	3,00	100,00%
6,2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	6,00	6,00	100,00%
6,3	ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN	M3	1,80	1,80	100,00%
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁM: (6 pulg)	ML	24,00	24,00	100,00%
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE PVC DIAM:6pulg*10pulg.	UN	3,00	3,00	100,00%
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO-6 pulg	UN	3,00	3,00	100,00%
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				100.00%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				100.00%

El avance de ejecución física al finalizar el contrato correspondió al **100.00%** que guarda similitud con el avance financiero.

6.4 Novedades del periodo

- Se realizo reunión de socialización del proyecto con la comunidad de donde se procedió a orientar la conformación de la veeduría de la misma.

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

- Los trámites administrativos para trasladar los postes de energía determinaron un retraso en el inicio de los trabajos.
- De acuerdo con la topografía en la localización y el replanteo se logró determinar que la vía no cuenta con la con la longitud originalmente proyectada en el proyecto, se puede evidenciar que la abscisa final fue tomada sin tener en cuenta la placa de concreto existente ubicada sobre la vía nacional (ver Registro fotografico-1), lo anterior no afecta la terminación y uso final del pavimento contemplado en el presente contrato por cuanto corresponde a una longitud inferior de la contemplada en el proyecto original la cual conecta las calles 4 y 5 (ver registro fotográfico).
- Se ejecutaron actividades anticipando situaciones que pudieran generar retrasos de obra.
- Una vez realizada la localización y replanteo en conjunto con la interventoría y de acuerdo con el acta de comité de obra se procedió a modificar el diseño geométrico lo anterior teniendo en cuenta los siguientes aspectos.
- De acuerdo con los ajustes que surgieron de acuerdo con la modificación No 01 fue necesaria la reprogramación de la obra debido a que existen a actividades que requieren verse reflejadas en su totalidad al finalizar el último mes de ejecución.

- De acuerdo con el seguimiento y el control llevado de manera continua a la ejecución del contrato, junto con la interventoría se procedió hacer un balance del contrato encontrando que se hace necesario ajustar en mayores y menores cantidades de obra de acuerdo con las condiciones encontradas en la ejecución física, en virtud de ello se originó el modificatorio No 01 el cual se encuentra plasmado en este informe y se tendrá en cuenta en los tramites de recibo final y de liquidación.

6.5 Memoria de Cantidades

Las cantidades de ejecución de obra se encuentran soportadas según el **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA.**

6.6 Control de estado del tiempo

El reporte del estado del tiempo se reporta en el respectivo **ANEXO-ESTADO DEL TIEMPO**

8.0 RECOMENDACIONES

8.1 MANTENIMIENTO

Dentro de la conservación vial es indispensable el mantenimiento el cual permite primordialmente que el proyecto perdure en el tiempo después de su entrega.

La sostenibilidad de las obras ejecutadas, se realiza tanto a nivel (gobierno, comunidad, individuos, etc.) los cuales deben disponer de:

- Capacidad técnica y de gestión necesaria para mantener las actividades o bienes generados por el proyecto.
- Recursos suficientes para financiar los gastos de operación (salarios de personal, mantenimientos) que generará a medio y largo plazo.

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

Asegurar la sostenibilidad de las actividades y beneficios del proyecto más allá de la vida del mismo, incrementará las posibilidades de igualar los costos de mantenimiento con los beneficios generados por el uso de la infraestructura ofrecida.

Con las intervenciones o actividades adecuadas, se deberá considerar incluir el mantenimiento de las obras a construir a través del tiempo, esto con el propósito de asegurar el funcionamiento aceptable a largo plazo de las vías en el menor costo posible.

Las actividades a considerar para el mantenimiento de las obras realizadas las cuales contemplan una placa de Pavimento hidráulico, y complementarias de drenaje, se pueden ordenar en tres grupos específicos: Mantenimiento Preventivo, Periódico y Correctivo (Atención de Emergencias).

Las actividades que se deben desarrollar con la culminación de este contrato de obra corresponden ha:

- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO O RUTINARIO**

Este programa estratégico de conservación vial, se proyecta para detener deterioros leves, retardar fallas progresivas y reducir la necesidad de obras de rehabilitación y reconstrucción.

El mantenimiento preventivo es cíclico, es planeado y no produce mejoras en la capacidad portante de los pavimentos, pero ayuda a prolongar su vida útil y mantiene o mejora el nivel de servicio Este mantenimiento comprende obras programadas con intervalos variables de tiempo, destinadas a mantener las condiciones y especificaciones del nivel de servicio original de la vía tanto en la calzada como en el entorno de la misma. Las reparaciones menores y localizadas en la superficie se contemplan las siguientes:

Entorno de la vía:

- Rocería y limpieza
- Jardinería y riego de plantas ornamentales.
- Control de vegetación.

Estructuras viales:

- Mantenimiento rutinario de las estructuras viales.

Señalización y ayuda a la viabilidad:

- limpieza permanente de la calzada, bermas.
- Limpieza y reparación de señales verticales.
- Mantenimiento rutinario de líneas de demarcación y de marcas viales.

Es necesario precisar que el mantenimiento rutinario se debe realizar durante todo el periodo de vida del pavimento, constituye prácticamente la única actividad que se ejecuta durante su etapa inicial de servicio.

- **MANTENIMIENTO PERIÓDICO**

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

Corresponde todas las actividades necesarias para solucionar los problemas de fallas superficiales y en algunas ocasiones aumentar la vida útil de los elementos de la Placa de concreto hidráulico. Puede incluir sello de fisuras en elementos de placa de concreto hidráulico y mantenimiento en obras de drenaje.

Calzada pavimentada:

- Sello de fisuras y grietas.
- Reposición de sello de juntas en pavimentos rígidos.

Drenaje:

- Limpieza obras de drenaje superficial longitudinal.
- Limpieza obras de drenaje transversal.
- Reparación y limpieza de los dispositivos para el control de tránsito.
- Limpieza y reparaciones menores y localizadas de obras de drenaje o de arte.

- **MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ATENCIÓN DE EMERGENCIAS)**

Para atender las emergencias y conservar las obras construidas, se hace necesaria la ejecución de trabajos tendientes a superar situaciones que no permitan el uso del tramo de vía rehabilitado en condiciones de seguridad física para el tránsito, en el menor tiempo posible y llevar a cabo las actividades que sean del caso para evitar o minimizar las restricciones al uso de la vía.

Las actividades generales de atención de emergencias pueden ser necesarias por:
- por sismo (falla)
- evento de lluvia o inundación o avalancha
- sobrecargas (cargas extradimensionadas)

Y puede incluir demolición y reconstrucción de la placa de concreto, reparación o reconstrucción de obras de drenaje, placas de concreto hidráulico o de ciclópeo, reconstrucción de capa granular, entre otras.

Para el presente proyecto, se construyó un escenario de conservación en el cual se involucra para el periodo estudiado dos tipos de intervención: El mantenimiento rutinario que se estima debe realizarse dos veces al año e interviniendo el 100% de la vía y el mantenimiento periódico se asume que se realizará una vez al año interviniendo el 25% de la vía.

ESCENARIO DE CONSERVACIÓN	
TIPO DE INTERVENCIÓN	**% DE INTERVENCIÓN EN LA VÍA**
Mantenimiento Rutinario	100%
Mantenimiento Periódico	25%

9.0 CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en este periodo junto con los meses anteriores corresponden al 100%.

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

De acuerdo con lo reportado el avance de ejecución es satisfactorio si se tiene en cuenta la fecha de corte del reporte.

Los aspectos de carácter técnico y que implicaron modificaciones finales obedecieron a las condiciones reales encontradas en campo, esto con el fin de garantizar el cumplimiento técnico de los procesos constructivos y de las condiciones de diseño contempladas según el proyecto original.


Firma:

CONSORCIO SARO
(R/L ING. JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ)

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228


ANEXO- REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

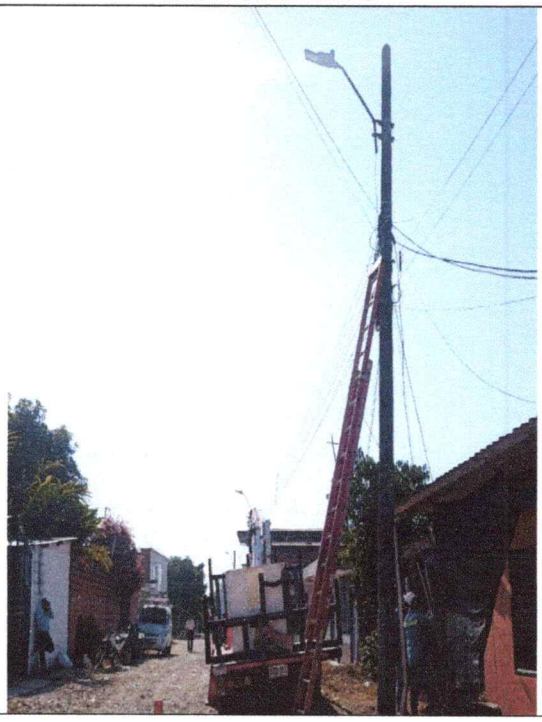LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	DESMONTE E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO
	

EXCAVACIÓN A MAQUINA	
	

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

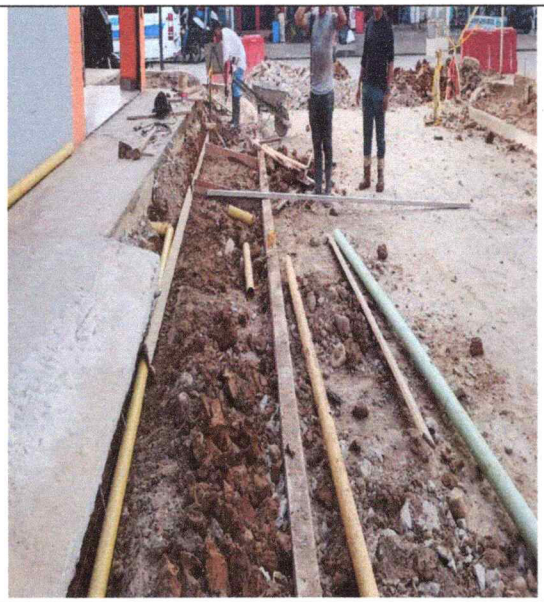
EXCAVACIÓN A MANO	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES
	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR	
	

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL

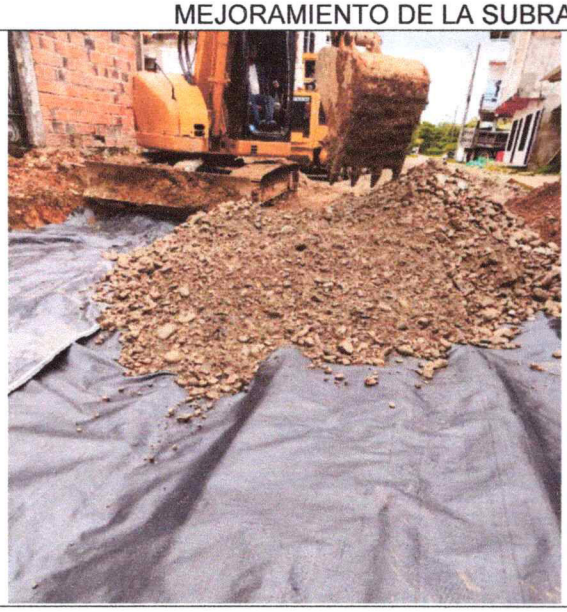




REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUBBASE GRANULAR COMPACTA E=20CM



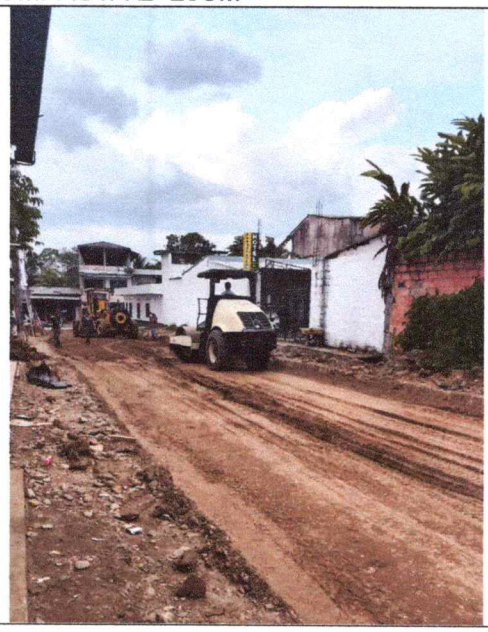


Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

REGISTRO FOTOGRÁFICO


PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa



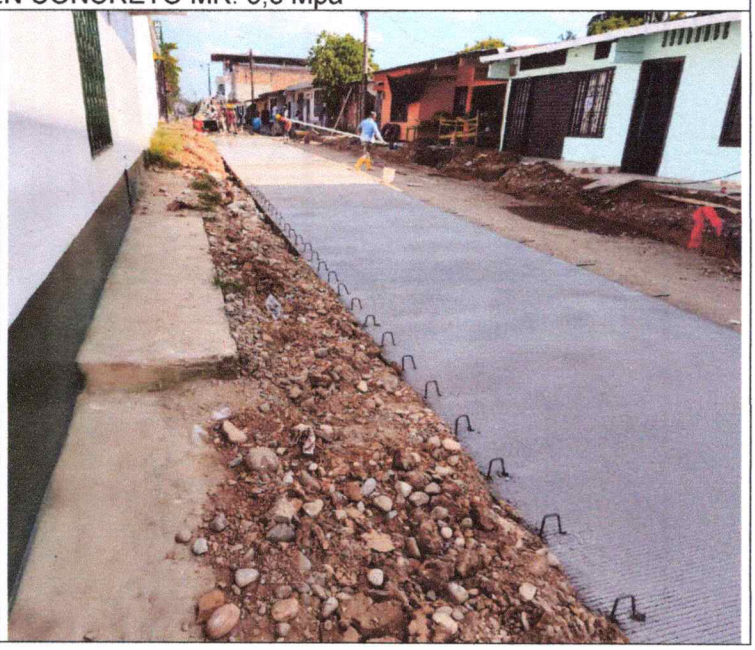

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa

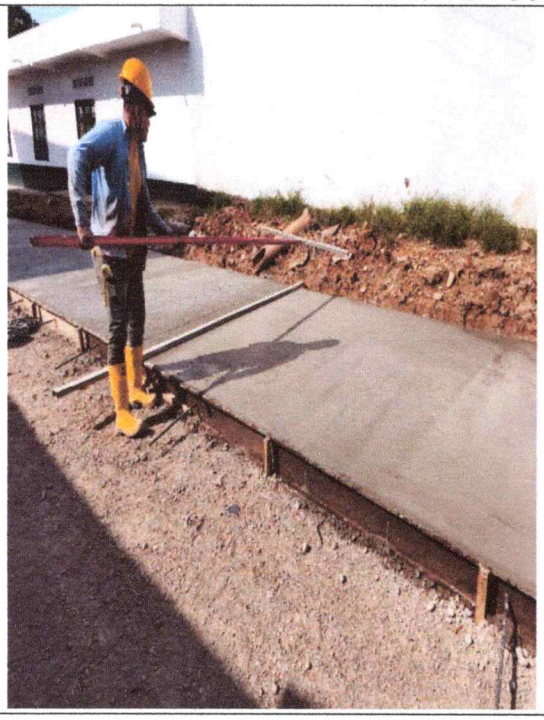




Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa




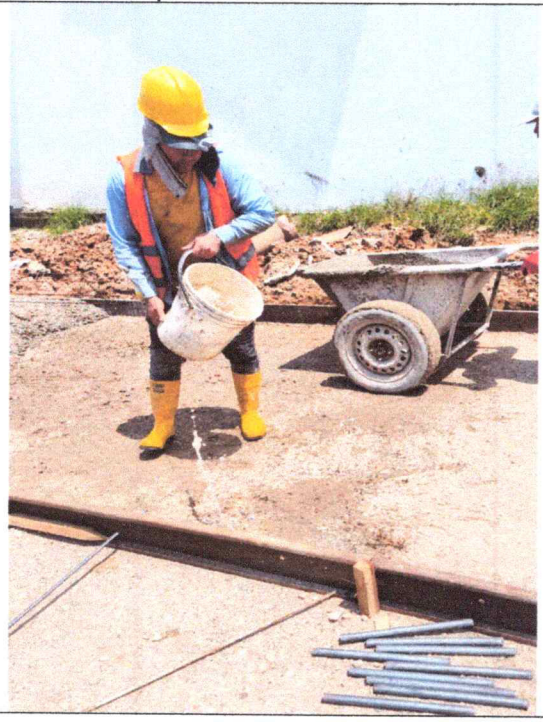

REGISTRO FOTOGRÁFICO


ACERO DE REFUERZO



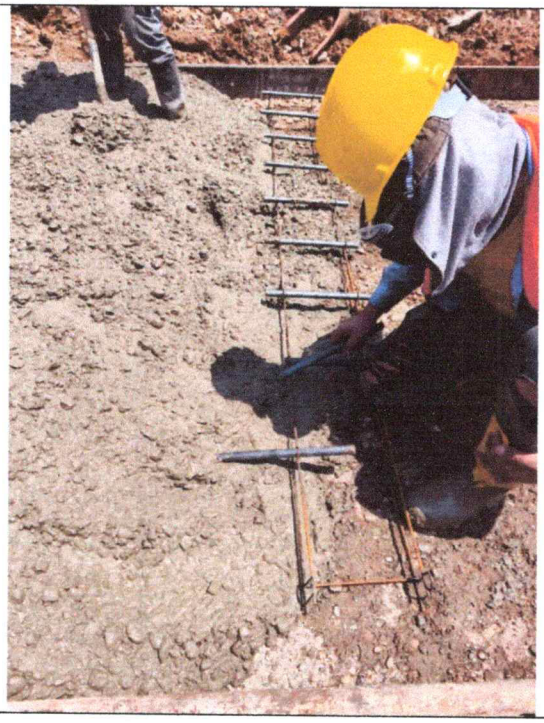

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228



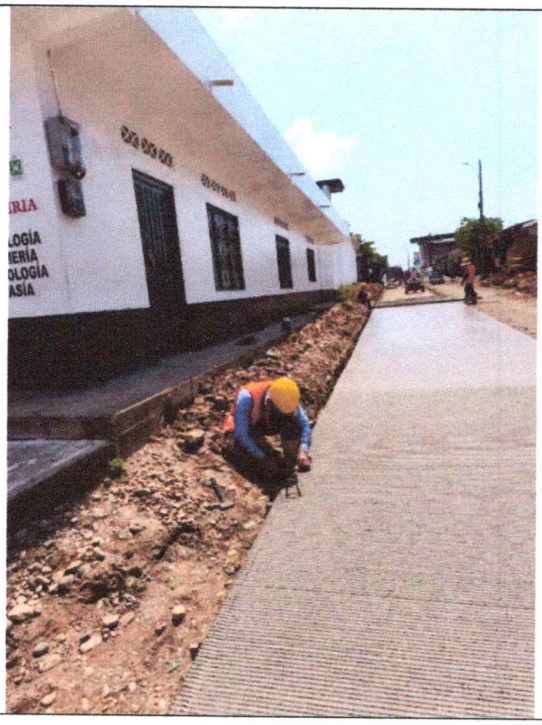


REGISTRO FOTOGRÁFICO


ACERO DE REFUERZO








Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

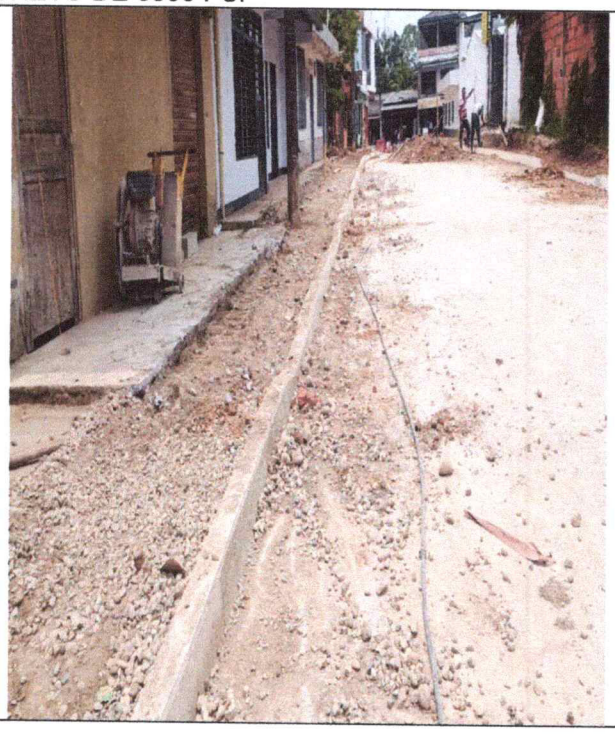SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	
	

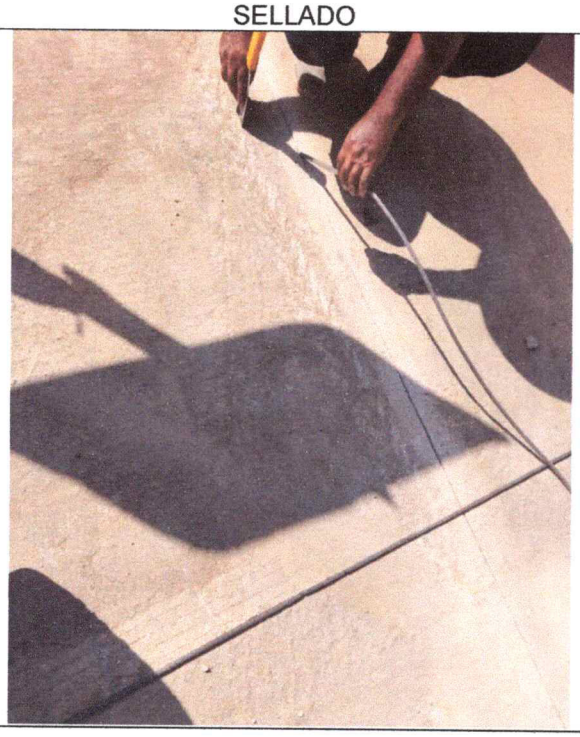
JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO	DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO
	

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

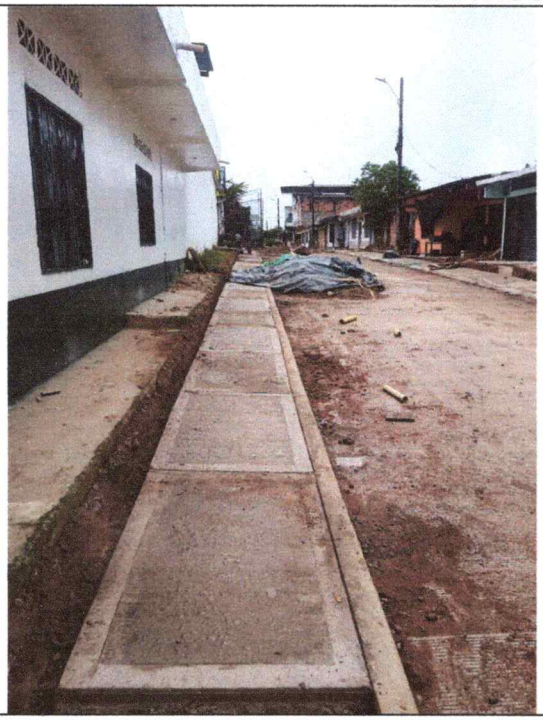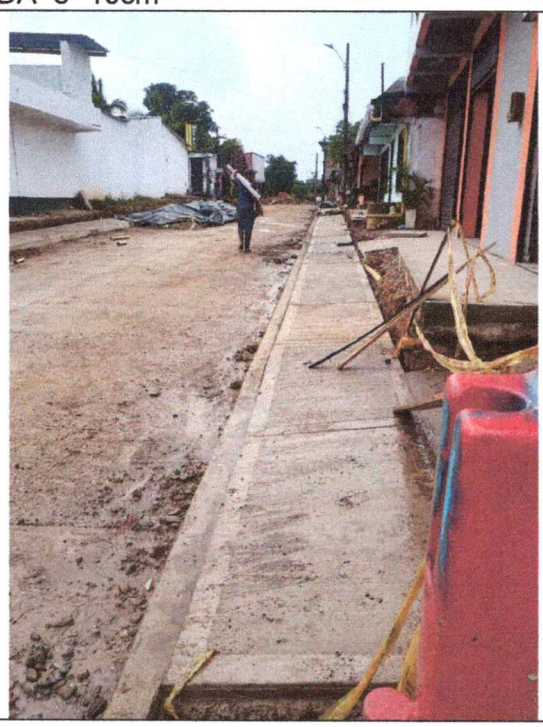PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA e- 10cm	
	

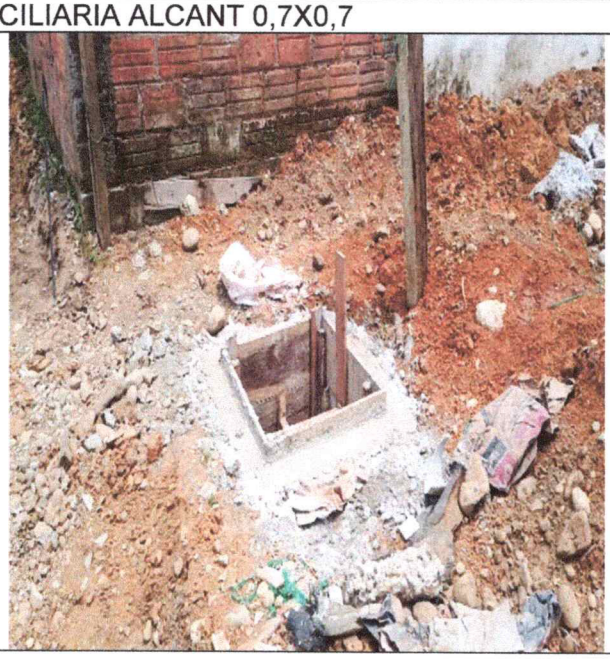CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7	
	

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

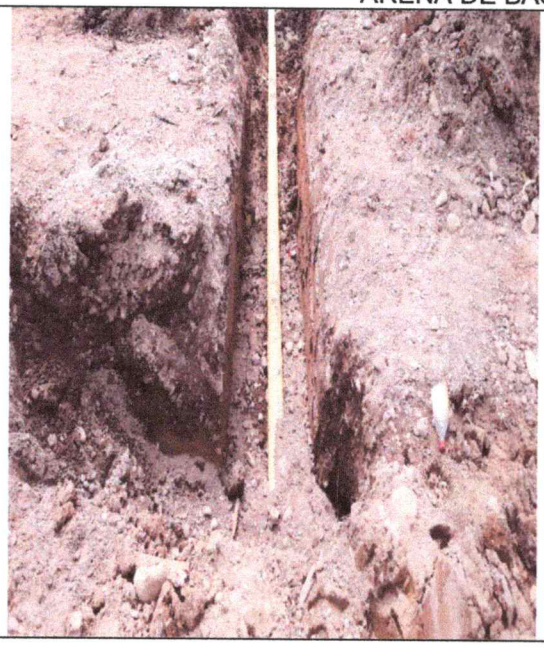RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN	
	


SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁM: (6 pulg)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE PVC DIM:6pulg*10pulg.
	


Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228


SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO-6 pulg	
	

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

REGISTRO FOTOGRÁFICO
TOMA DE MUESTRAS

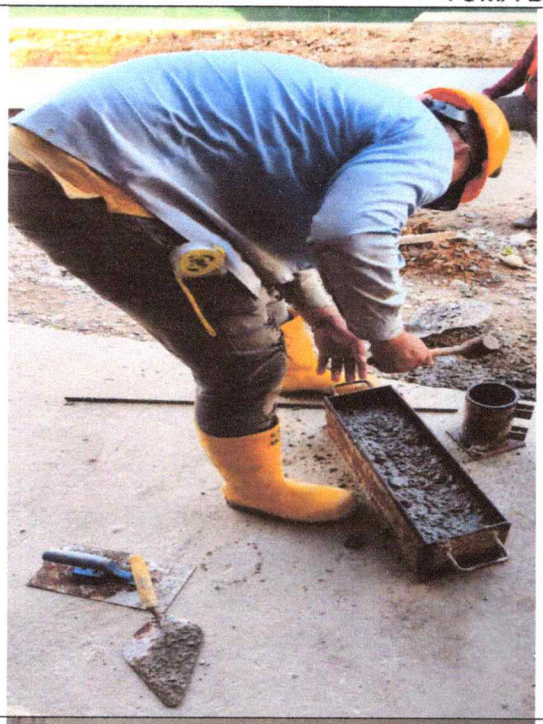

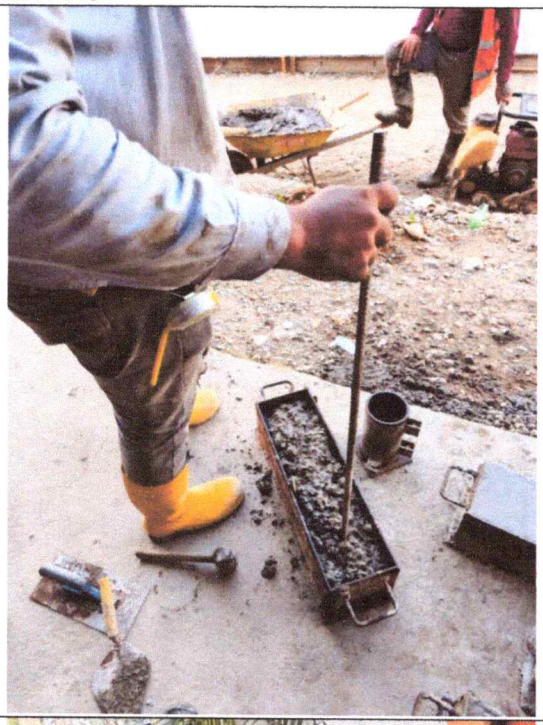

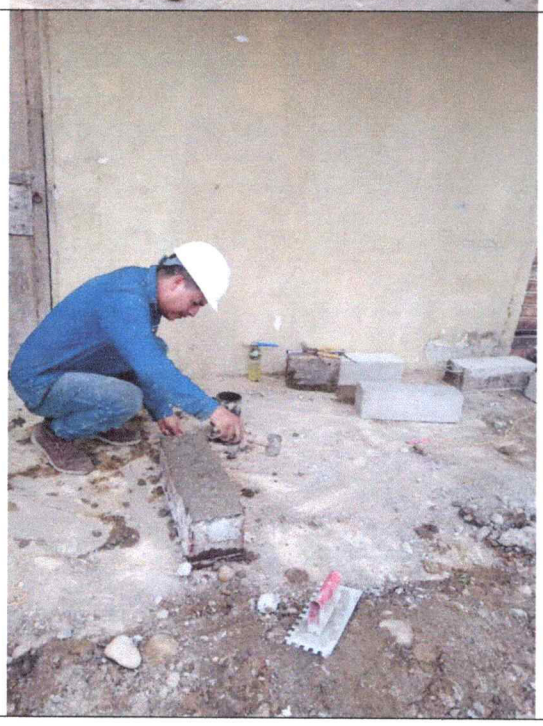



Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

SARO COMPANY S.A.S.

Puerto asís, 15 de diciembre de 2025

Señor:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
Calle 10-Cra 29 / Esquina-Barrio Centro
Puerto Asis - Putumayo

Ref: Contrato de Obra No 442-2025 cuyo objeto es **MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**.

Asunto: desistimiento del anticipo.

Cordial saludo

Teniendo en cuenta la forma de pago establecida en el contrato de la referencia y que los trámites fiduciarios adelantados por el **CONSORCIO SARO** ante la entidad bancaria para el giro de los recursos por concepto de anticipo han tomado un tiempo considerable sin resolverse a la fecha, y considerando además que los trabajos de la obra deben concluirse, el consorcio estima conveniente desistir del anticipo y continuar con le ejecucion de los trabajos con recursos propios de la firma contratista de obra.

.
Por la atención brindada anticipamos nuestros sinceros agradecimientos.

Atentamente,

JONNY BLADIMIR SALAS RODRÍGUEZ
R.L. CONSORCIO CONSORCIO SARO

Notificaciones:
Dirección electrónica :(e-mail) groupsarocompany@gmail.com
Celular: 3204540712-3114830228

INFORME DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. 442 DEL 2026

INFORME FINAL

11 DE DIC DE 2025 -10 DE MARZO DE 2026

CONSORCIO SARO

CONTRATANTE: *ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS*

OBJETO: MEJORAMIENTO RIGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: *CONSORCIO SARO S.A.S.*
(R/L JHONNY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ)

SUPERVISOR: *SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL*

INTRODUCCIÓN

El presente informe final detalla las actividades realizadas en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SISO) durante el proyecto *"Mejoramiento con pavimento rígido de la Carrera 4 entre calles 4 y 5 en el corregimiento de Santa Ana, Municipio de Puerto Asís, Putumayo"*, ejecutado por el Consorcio SARO.

Este documento tiene como objetivo registrar y evaluar las acciones implementadas para la prevención, promoción y control de riesgos laborales en el periodo comprendido entre el **11 de diciembre de 2025 y el 10 de marzo de 2026**,

La gestión de seguridad y salud en el trabajo es un componente esencial para garantizar la integridad física y mental de nuestros trabajadores, prevenir incidentes y accidentes de trabajo, y promover un ambiente laboral seguro y saludable. En este sentido, se adoptado medidas enfocadas al uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), capacitación constante al personal y la implementación de la seguridad que busco prevenir incidentes y accidentes en el lugar de trabajo.

A través de este informe se evidencio el compromiso del **CONSORCIO SARO**, con la seguridad y salud en el trabajo el bienestar de todos los trabadores involucrados en el proyecto. Todo esto se logró a través de charlas pre operacionales, inducciones y rigurosas inspecciones de herramientas y equipos, se promovió un ambiente seguro y saludable este esfuerzo no solo buscaba cumplir con la normatividad vigente, si no también fomentar una cultura de seguridad que priorizo el bienestar de todos los involucrados. Con el análisis de los resultados obtenidos, reafirmamos nuestro compromiso con la mejora continua en la seguridad y salud en el trabajo, asegurando que cada proyecto se ejecute balo los más altos estándares se seguridad.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON UN ENFOQUE GLOBAL

El enfoque global de la seguridad y salud en el trabajo (SST), aplicado en el proyecto *"Mejoramiento con pavimento rígido de la Carrera 4 entre calles 4 y 5 en el corregimiento de Santa Ana, Municipio de Puerto Asís, Putumayo".* Se basó en la gestión integral de riesgo, la mejora continua y la participación activa de todos los niveles operativos, se adaptó una visión preventiva, priorizando la anticipación de peligros y el control oportuno de los riesgos asociados a las actividades constructivas.

Este enfoque integro componentes técnicos, humanos y organizacionales orientados a garantizar la protección de la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, así como el cumplimiento de la normatividad vigente. Se promovió una cultura de seguridad fundamental en el autocuidado, la responsabilidad compartida y la toma de decisiones seguras en campo.

Las acciones desarrolladas se alinearon con los principios del Sistema de Gestión de SST, incluyendo la identificación peligros, evaluación y control de los riesgos, capacitación continua, inspecciones sistemáticas y seguimiento a indicadores de desempeño.

A lo largo de la ejecución del proyecto, se garantizó las medidas preventivas para mitigar los riesgos críticos asociados a pavimentación, excavaciones. Se tomaron medidas de verificación del uso de los EPP, señalizaciones técnicas y constantes.

El enfoque del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, (SGSST) opero bajo una estrategia de mejora continua promoviendo la disciplina y la participación activa de los trabajadores frente a riesgos públicos, químico, físico, biológico ergonómico y de tránsito.

Las inspecciones periódicas sistemáticas de orden y aseo fueron fundamentales para garantizar áreas de trabajo libres de obstáculos, logrando así un balance positivo en la prevención de accidentes y fortaleciendo la confianza del equipo de trabajo de la obra.

1. Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo

El CONSORCIO SARO alineado con la normatividad nacional de seguridad y salud en el trabajo implemento durante la ejecución del proyecto de manera sistemática actividades de promoción y prevención durante las operaciones. Estas acciones estuvieron orientadas a salvaguardar la integridad física y mental de la fuerza laboral mitigando los riesgos inherentes a las labores de la obra y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas.

Las principales actividades realizadas fueron:

Se gestionó y verifico la afiliación integral del 100% del personal vinculado al sistema de seguridad social (EPS, ARL y AFP), asegurando la cobertura total frente a contingencias de salud, riesgos laborales y aportes pensionales

- Se mantuvieron las actividades con un total de (9) trabajadores entre ellos 3 profesional 4 obreros, 1 maestro y 1 oficial.
- Jornadas periódicas de orden y aseo, sensibilizaciones, uso correcto de los elementos de protección personal (EPP), prevención de accidentes laborales y enfermedad laboral y fortalecimiento de la cultura de autocuidado y realizando inspecciones a toda la maquinaria menores y eléctricas utilizada en obra
- entrega de EPP adicionales (guante, tapa oídos, tapabocas, chalecos reflectivos y gafas de seguridad), verificando su uso permanente en el frente de obra.
- Cumplimiento de la jornada laboral conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, garantizando condiciones adecuadas para el personal.

2. Actividades Específicas desarrolladas en SST

Durante el tercer mes de ejecución se implementaron las siguientes acciones concretas en materia de seguridad y salud en el trabajo:

- Desde el inicio de las actividades preliminares el Consorcio SARO garantizó la afiliación y el pago correspondiente a los servicios del sistema de seguridad social de todo el personal vinculado, tanto mano de obra calificada como no calificada. Estos aportes fueron asumidos directamente por el contratista, asegurando que cada trabajador contara con cobertura en salud, riesgos laborales y pensiones, lo cual constituye un requisito indispensable para el cumplimiento normativo y refleja el compromiso con la protección integral de los empleados.
- El personal contratado por el Consorcio SARO, tanto en mano de obra calificada como no calificada, cuenta con experiencia en labores de construcción de infraestructura vial y actividades relacionadas. Durante el periodo de ejecución de las obras se ha observado un adecuado comportamiento en cuanto al autocuidado personal, el cumplimiento de las normas de seguridad y la disposición para el trabajo en equipo. Esta actitud ha permitido que las actividades se desarrollen en un ambiente seguro y colaborativo, reduciendo la probabilidad de incidentes y fortaleciendo la cultura de prevención en el frente de obra
- Se realizaron actividades y jornadas de capacitación orientadas a sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir incidentes y accidentes laborales. En estas sesiones se abordaron riesgos frecuentes en la obra, tales como riesgo Físico, Químico, Biológico, Mecánico, Ergonómico, psicosocial, publico y condiciones de seguridad. Las recomendaciones y medidas impartidas por el profesional de seguridad y salud en el trabajo permitieron promover prácticas seguras y prevenir cualquier tipo de situación que pudiera afectar la integridad física y mental de los trabajadores, así como la seguridad de la comunidad beneficiaria del proyecto.
- Se entregaron a todo el personal los elementos de protección personal (EPP) adicionales necesarios para sus labores, entre ellos guantes, chalecos reflectivos, tapa oídos y tapabocas. Estos equipos permiten reducir la exposición a riesgos propios de la obra y proteger las diferentes partes del cuerpo frente al uso de herramientas, manipulación de materiales y tránsito de maquinaria.

Aunque los EPP no eliminan completamente la posibilidad de un accidente, sí ayudan a disminuir la gravedad de las lesiones en caso de presentarse algún evento. Durante las visitas de inspección y las charlas de seguridad se verificó y exigió su uso permanente durante toda la jornada laboral, reforzando la importancia del autocuidado y la disciplina en el frente de trabajo.

- Se instalaron cintas de peligro, vallas metálicas y avisos de advertencia en las áreas de excavación, delimitando claramente las zonas de riesgo y restringiendo el acceso no autorizado. Esta acción garantizó la seguridad tanto de los trabajadores como de los peatones que transitan cerca de la obra.
- Se efectuaron visitas semanales de seguridad, verificando el cumplimiento de las medidas de prevención, el uso de EPP y el estado de la señalización. Se levantaron registros fotográficos como evidencia de las actividades, lo cual permite documentar el cumplimiento y realizar seguimiento a las observaciones.
- En cada inspección se constató el uso permanente de los elementos de protección personal, recomendando su reemplazo inmediato en caso de deterioro. Esta práctica asegura que los trabajadores estén protegidos frente a los diferentes riesgos a los cuales están expuestos.
- Gracias a la implementación de estas medidas, durante el tercer mes no se registraron incidentes ni accidentes laborales, lo cual refleja el compromiso del contratista y del personal con la seguridad y salud en el trabajo dentro de la obra.

3. Resultados finales.

Durante el periodo reportado se cumplió con las medidas de seguridad y salud en el trabajo: todo el personal está afiliado al sistema de seguridad social, se verificó el uso permanente de los EPP, se realizaron jornadas de capacitación, inspección a los puestos de trabajo, herramientas menores y eléctricas entre otros. se instaló señalización preventiva y se garantizó el manejo adecuado de residuos. No se presentaron incidentes ni accidentes laborales.

INDICADORES SISO		
INDICADOR	RESULTADO OBTENIDO	OBSERVACIONES
Personal afiliado a EPS, ARL y AFP	100 %	Cumplimiento total
Jornada de capacitación e inducción y charlas diarias	23 Ejecutadas el 100%	Enfocadas en uso de EPP, prevención de riesgos incluyendo charlas cumplimiento Total
Inspecciones de seguridad en obra	14 Cumplidas 100%	Con registro fotográfico
Uso de elementos de protección personal	100 %	Verificado en todas las visitas
Incidentes laborales reportados	0	No se presentaron
Accidentes laborales reportados	0	No se presentaron
Señalización preventiva instalada	Completa	Cintas reflectivas y vallas metálicas
Manejo de residuos de construcción orden y aseo e inspecciones	3 inspecciones Adecuado 100%	Clasificación y disposición en sitios autorizados Cumplimiento total

Estos resultados demuestran que el **CONSORCIO SARO** cumplió con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, garantizando la protección del personal y la continuidad de las actividades constructivas sin contratiempos.

CONSOLIDADO TOTAL DE ACTIVIFADES.

Durante el periodo reportado, el **CONSORCIO SARO** dio cumplimiento estricto a la normatividad de seguridad y salud en el trabajo (SST), la gestión se enfocó en la prevención activa, logrando un entorno laboral seguro que garantizó la continuidad de las actividades constructivas sin contratiempo.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES				
ACTIVIDADES	11/DIC/10/ENE	11/ENE/10/FEB	11/FEB/10/MAR	TOTAL
INDUCCIONES	5	5	0	10
CHARLAS PRE OPERACIONALES	3	5	5	13
ENTREGA DE EPP	0	1	2	3
ENTREGA DE HERRAMIENTAS MENORES	2	0	1	3
INSPECIONES DE ORDEN Y ASEO	1	1	1	3
INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	1	2	1	4
INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLA	1	0	0	1
INSPECCION DE EXTINTOR	1	0	0	1
INSPCCION DE PULIDORA Y TALADRO	0	1	2	3
INSPECCION D MEZCLADORA	0	1	1	2

CONCLUSIONES

Durante los tres meses de ejecución del proyecto se garantizó el cumplimiento satisfactorio de los estándares de seguridad y salud en el trabajo (SST). Gracias a la implementación efectiva de acciones preventivas, el contrato finaliza con un indicador de accidentalidad de cero (0), sin registro de incidentes, accidentes ni enfermedades laborales en todo el periodo.

Se aseguró la cobertura del personal en seguridad social para el 100% del personal. Asimismo se suministró la dotación y los elementos de protección personal (EPP) requeridos, verificando su uso permanente en obra para mitigar riesgos operativos.

Se mantuvo las charlas pre operacional y las capacitaciones periódicas (semanales y mensuales), fortalecieron la cultura de prevención, esto permitió que los trabajadores participaran activamente en la identificación de peligros, especialmente durante las fases críticas de pavimento rígido e interacción con maquinaria pesada.

Se llevaron a cabo inspecciones exhaustivas de herramientas menores y eléctricas, así como de los puestos de trabajo garantizando que cumplieran con los estándares de calidad. Se verifico el estado del botiquín, extintor y camilla, asegurando que estuvieran disponibles y en condiciones óptimas para su uso.

Esto refleja el compromiso del consorcio SARO con la seguridad y salud de los trabajadores priorizando su bienestar y la prevención de riesgos laborales, continuaremos mejorando nuestras prácticas de SISO para asegurar nuestras actividades futuras.

NOTA:


El presente informe final anexa la totalidad de las evidencias y soportes que respaldan la gestión de seguridad realizada durante los tres meses de duración de la obra

Elaboro:


BLANCA DENIT BERNAL VELASQUEZ
Inspectora Siso
Consorcio Saro

CONTRATO DE OBRA N° 442 DEL 2026 *"MEJORAMIENTO RIGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"* *INFORME SISO*	**CONSORCIO SARO.**


REGISTRO FOTOGRAFICO

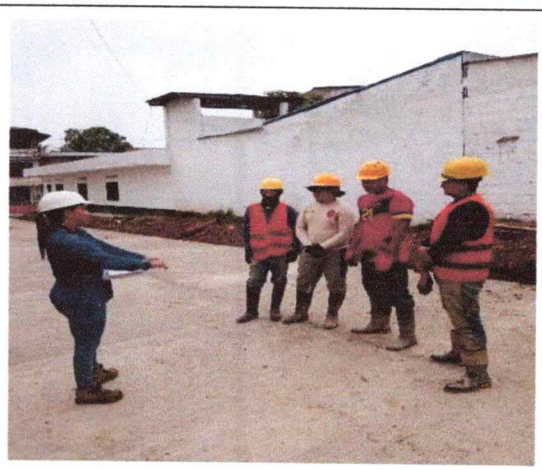ENTRGA DE EPP ADICIONALES	
INSPECCION A PUESTOS DE TRABAJO, NIVELACION DEL TERRENO PARA VACIAR CONCRETO, PAVIMENTO RIGIDO	
CHARLAS PREOPERACIONALES	

CONTRATO DE OBRA N° 442 DEL 2026 *"MEJORAMIENTO RIGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"* *INFORME SISO*	**CONSORCIO SARO.**

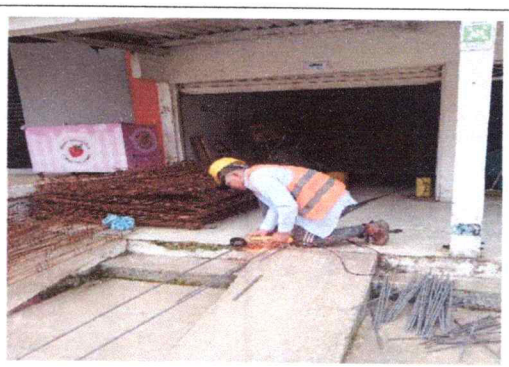INSPECCION HERRAMIENTAS MENOR	
INSPECCION DE LA RANA	
INSPECCION A EXCAVACION O CAJEO CON ORUGA	
INSPECCION CORTE DE HIERRO	

CONTRATO DE OBRA N° 442 DEL 2026 *"MEJORAMIENTO RIGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"* *INFORME SISO*	**CONSORCIO SARO.**

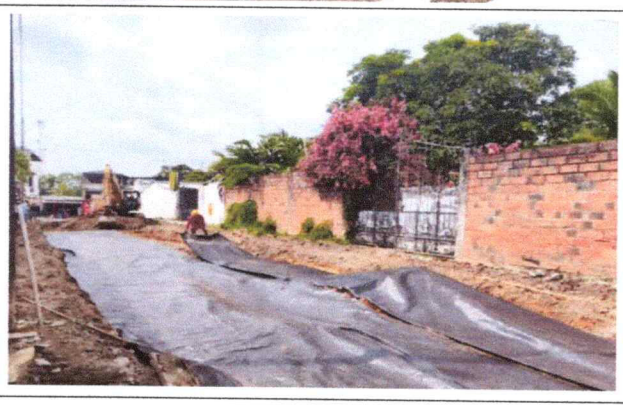INSPECCIÓN DE MEZCLADORA	
SEÑALIZACION Y RECUBRIMIENTO DE ESCOMBROS	 
HIDRATACION AL PERSPNAL	
INSPECCION DE INSTALACIO DE GEOTESTIL PARA VASEAE PEDRA PLEN	

CONTRATO DE OBRA N° 442 DEL 2026 *"MEJORAMIENTO RIGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"* *INFORME SISO*	**CONSORCIO SARO.**

INSPECCION A EXCAVACION MANUEL DE DOMICILIARIAS	

ANEXOS INFORME

11/DIC/10/ENE

1. **Inducciones**
2. **Charlas pre operacionales**
3. **Inspección orden y aseo**
4. **Entrega de herramientas menores**
5. **Inspección de herramientas menores**
6. **Inspección de botiquín y camilla**
7. **Inspección del extintor**

CONSORCIO SARO S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FO-HSE-001
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	12/15/2025
	Versión:	01

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 18. Dic. 2025 C **INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: Fernain Casanova Lopez obrero **CEDULA:** 1006962107

AREA/SECCION: **CARGO:**

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Denit Bernal H.S.E

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra **CONSORCIO SARO S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 20: MINITOS

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
c.c. 1006962107

Responsable del SG-SST
c.c. 41.170.982

CONSORCIO SARO S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FO-HSE-001
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	12/15/2025
	Versión:	01

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 18- Dic - 2025 **INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: Emerson Guzman obrero **CEDULA:** 1163101953

AREA/SECCION: operativo **CARGO:**

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Denit Bernal H.S.E

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra **CONSORCIO SARO S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 20: MINITOS

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Emerson Guzman
Firma del Trabajador
C.C. 1163101953

Responsable del SG-SST
C.C. 41.170.982

CONSORCIO SARO S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	**FO-HSE-001**
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	**Fecha:**	12/15/2025
	Versión:	01

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 18 - Diciembre - 2025 **INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: Luis Carlos Salas Residente **CEDULA:** 1121506227

AREA/SECCION: **CARGO:**

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Blanca Denit Bernal HSE

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra **CONSORCIO SARO S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 20: MINITOS

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
c.c. 1.121.506.227

Responsable del SG-SST
c.c. 41170982

CONSORCIO SARO S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	**FO-HSE-001**
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	**Fecha:**	12/15/2025
	Versión:	01

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 18- Dic- 2025 **INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: Ever Andres Casanova Maestro **CEDULA:** 1125413063

AREA/SECCION: Operativa **CARGO:**

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Blanca Denit Bernal HSE

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra **CONSORCIO SARO S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 20: MINITOS

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 1125413063

Responsable del SG-SST
C.C.

CONSORCIO SARO S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FO-HSE-001
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	12/15/2025
	Versión:	01

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 18-Dic-2025 **INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: Jhony Salas Director obra **CEDULA:** 10113158

AREA/SECCION: Operativa **CARGO:**

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN: Denit Bernal HSE

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra **CONSORCIO SARO S.A.S** las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 20: MINITOS

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Jhony Salas

Firma del Trabajador
C.C. 10113158

Responsable del SG-SST
C.C.
