Puerto Gaitán, 17 de abril del 2026 1090-0631

Doctora:
ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
Secretaría de contratación
Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No 0821 DE 2025**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META."

Asunto: Remisión de informe mensual N° 4 del contrato de la referencia

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su despacho la documentación entregada por el contratista de obra del contrato No. 0821 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.", la cual fue aprobada por la interventoría y verificada por la secretaría de infraestructura, respecto al Informe mensual N° 4 en el periodo del 01/12/2025 al 31/12/2025.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por: Karen
Fecha 20 ABR 2026
Hora: 9:43 am

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

Elaboró: Hanlly Lorena Vergara Camargo – Profesional de Apoyo CPS 1106 de 2025
Revisó: Christian Julián Fernández Reyes - Secretario de Infraestructura

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Puerto Gaitán, 02 de marzo del 2026

1090-0448

ALCALDÍA MUNICIPAL
02-mar-2026
4:25pm
Dirección DACP
PUERTO GAITÁN META

Doctora:
ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
Secretaría de contratación
Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No 0821 DE 2025**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META."

Asunto: Remisión de informe mensual N° 4 del contrato de la referencia

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su despacho la documentación entregada por el contratista de obra del contrato No. 0821 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.", la cual fue aprobada por la interventoría y verificada por la secretaría de infraestructura, respecto al Informe mensual N° 4 en el periodo del 01/12/2025 al 31/12/2025.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

Elaboró: Jesús Andrés Devia Tarache– Profesional de Apoyo CPS 1087 de 2025 Jesus A.
Revisó: Hanlly Lorena Vergara Camargo – Profesional de Apoyo CPS 1106 de 2025

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

C-013.26
Villavicencio (Meta), 19 enero de 2026

Ingeniero:
Ing CRISTIAN JULIAN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Calle 10No. 10-90 Barrio Centro – Palacio Municipal
e-mail: infraestructura@puertogaitan-meta.gov.co
Puerto Gaitán – Meta.

Puerto Gaitan 2261.11.0000412
Tipo: Radicado Entrada Fecha Rad:20/01/2026 15:13 Folios: 0
Asunto: INFORME MENSUAL Nº 4 CONTRATO DE OBRA 821 – 2025
Radicador: LEIDY.VASQUEZ
Procedencia: JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO/CONSORCIO INTERVENTOR
Destinatario: CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
La recepción del documento no implica aceptación

Ref.: Contrato de Interventoría No. 1004 de 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEIMPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META.

Asunto: Entrega de informe mensual No.4 Contrato de obra 0821 de 2025

Cordial Saludo:

A continuación, hacemos entrega del informe de actividades de obra del contrato No 0821 de 2025, informe que fue revisado y ajustado a requerimientos contractuales.

- ✓ Original informe mensual No.04 correspondiente al contrato de obra 0821 de 2025, junto con sus anexos. Periodo del (01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025). # de carpetas:1.

Cordialmente,

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
R.L. CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDIGENAS 2025

Anexo. lo enunciado en 1 carpeta

CE-001-2026

Villavicencio, 06 de enero de 2026

Ingeniero:
JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
Calle 41B #30 – 11
e-mail: interventoria.acindigenas@gmail.com
Ciudad

Ref.: Contrato de Obra No. 0821 de 2025 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"

Asunto: Entrega informe mensual No. 4

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito entregar el informe mensual No.4 del periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2025, para su respectiva revisión, aprobación y tramite.

Agradeciendo la atención prestada y a la espera de sus indicaciones.

Atentamente,

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R.L. CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
Contratista

Anexo: lo enunciado en 1 carpeta

D.C

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA Infraestructura			Puerto Gaitán
	Codigo:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN 19/01/2026

Contrato de obra No.: 821 DE 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

Radicado No: Fecha:

Periodo del informe: Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
1,01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			
2	INFORMACION DEL CONTRATO					
2,01	**Cuadro de trazabilidad:** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			
3	INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO					
3,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			
4	INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO					
4,01	Plan de inversión de anticipo	X	X			
4,02	Información de avance financiero de la obra	X	X			
4,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de obra.	X	X			
4,04	Acta de desembolso del anticipo de obra (si aplica).				X	
4,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra .	X	X			
4,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			
4,07	Ordenes de pago efectuadas (Desembolso de anticipo y pagos parciales)	X	X			
5	INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO					
5,01	Grafico avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas. (financiera, por porcentajes)	X	X			
5,02	Cuadro de avance con acumulado mes a mes	X	X			
5,03	Control del estado del tiempo resumen (día a dia mes reportado en el informe)	X	X			
6	INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					
6,01	Cuadro de relación de personal de obra (profesional - operativo) propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) y organigrama de personal	X	X			
6,02	Certificado del representante legal y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matricula y antecedentes de la junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	X	X			
6,03	Paz y salvo de los trabajadores (retirados al corte)	X	X			
7	CUADRO DE LABORATORIOS TOMADOS EN EL PERIODO				X	
8	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)	X	X			
9	INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO					
9,01	Certificación del cumplimiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del proyecto (prediales, ambientales, de construcción en otros).	X	X			
9,02	Seguimiento a la disposición de materiales	X	X			
9,03	Registro fotográfico de actividades ambientales	X	X			
10	ANEXOS					
10,01	Actas de socialización (informes Inicial)	X	X			
10,02	Actas de vecindad (de apertura y cierre - si aplica)	X	X			
10,03	Relación de comités de obra. (según orden cronológico y debidamente numeradas)				X	
10,04	Registro fotográfico del acta de avance con acumulado mes a mes	X	X			
10,05	Cartera topográfica de obra (si en el periodo se ejecutaron labores que requiera esta labor)				X	
10,06	Calidad de los materiales, ensayos de laboratorio y certificados de calidad, (anexar de acuerdo al tipo de obra y obligaciones legales , anexando certificados de los materiales y de calibración de equipos utilizados en los ensayos o levantamientos topográficos)	X	X			

	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA			
ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META	Infraestructura			Puerto Gaitán
	Codigo:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN 19/01/2026

Contrato de obra No.: 821 DE 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

Radicado No: Fecha:

Periodo del informe: Desde: 01/12/2025 Hasta: 31/12/2025

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
10,07	Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)				X	
10,08	Informe de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en el cual se registre el seguimiento de las capacitaciones, entregas de EPP, protocolos de prevención y mitigación del COVID-19 y su seguimiento mediante registros (planillas, formatos, etc.) debidamente firmados por el profesional correspondiente	X	X			
10,09	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según aplique (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	X	X			
10,1	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratados por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	X	X			
10,11	Ordenes de operación de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de obra (si aplica)	X	X			
10,12	Aprobación del contrato fiduciario (si aplica)	X	X			
10,13	Informe del contrato fiduciario del anticipo del contrato de obra (si aplica)	X	X			
10,14	Anexos (cada ficha de PMA o PAGA genera una evidencia la cual debe venir relacionada en el informe de interventoría, así como del cumplimiento de los deberes derivados de los actos administrativos, registro fotográfico). firmado por el profesional (si aplica).				X	
11	**CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)**	X	X			

NOTA: Se aclara así alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaria de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoría, deben allegarse por la interventoría conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) días del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.

Revisó y aprobó:

R/L JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

Nota: se debe paginar los informes

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

INFORME DE OBRA

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 821 DE 2025

"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"

INFORME MENSUAL No. 4

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA:
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1
R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

INTERVENTOR:
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
NIT. 901.972.868 – 4
R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo 5
2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba 6
2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas 6
2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome 7
2.1.5 Comunidad beneficiada 8
3. ALCANCE DEL PROYECTO 8
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 9
5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO 10
5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS 11
6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 12
6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO 12
6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO 13
6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 15
6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 15
6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP. 16
6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP. 16
6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS 17
7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 17
7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES 17
7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO 18
7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 19
7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES. 25
7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 24
7.5 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO 26
8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 27

8.1 RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO) 27
8.2 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 28
8.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 29
8.4 PAZ Y SALVO PERSONAL 29
9 CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 30
10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 30
11 INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO. 30
12 CONCLUSIONES 31
13 ANEXOS 32

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las leyes y normas, principalmente del artículo 366 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las actividades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento básico y de agua potable"*, el municipio de Puerto Gaitán en enmarcado en el cumplimiento de las metas de su Plan de Desarrollo **"JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027"** PDM 0344- Construcción, ampliación, optimización, y adecuación de redes de acueducto y plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Atendiendo a la política pública de VIVIENDA, establece como uno de los fines principales de la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está el acceso al servicio de agua potable, que es fundamental para la vida humana. El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea.

Algunas comunidades Indígenas del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, presentan vulneración en el servicio de agua potable ya que no cuentan con sistemas de acueductos, se han visto afectadas por la carencia de agua potable, llevando a realizar malas prácticas de la captación del agua, tomando como forma de abastecimiento los pozos profundos rudimentarios en algunas de sus viviendas, que con el tiempo por el desconocimiento sobre las consecuencias que se podrían presentar, algunas familias construyeron pozos sépticos o letrinas a corta distancia de la fuente, lo cual ocasiona la contaminación inmediata de los mismos; evidenciándose condiciones incorrectas para el acceso al agua potable.

Surtidos los tramites de planeación del proyecto, mediante resolución No. 0014 del 10 de junio de 2025 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIP-005-2025"* se inició el proceso de contratación el cual culmino con la adjudicación y suscripción del Contrato de Obra Pública No. 821 del 17 de julio de 2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"**.

Así las cosas, con la presentación del presente informe damos cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 821 – 2025 en su cláusula *OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:* numeral *6. Cumplir con la entrega de informes mensuales de ejecución, según el avance de la obra (secuencias de actividades, etc.) de acuerdo al plazo pactado.*

Así mismo, el presente informe cumple con los requerimientos exigidos en el *FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA (INF-FR-72 V05 vigente desde el 10/01/2025)* establecido por la entidad para tal fin.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza y beneficia a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas de la zona rural del municipio de Puerto Gaitán – Meta, así:

2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo

RESGUARDO WACOYO									
CÓDIGO	COMUNIDAD/POZO	COMUNIDADES BENEFICIADAS	TOTAL COMUNIDADES	ESTE	NORTE	COTA	LONGITUD	LATITUD	A GAITÁN
WAC01	POZO KALIWIRNAE	ACACIOS	2	898322.2694m	973031.6969m	204.700m	W71° 59' 36.52"	N4° 21' 06.35"	14,00 KM
WAC02	POZO ESMERALDA WALABO	LAS BRISAS, MANANTIAL Y WALABO	4	900418.0667m	972896.7131m	226.400m	W71° 58' 28.56"	N4° 21' 02.04"	16,00 KM
WAC03	POZO PALOGRANDE WALABO	PALOMEKO, PARAISO Y CAIMANA 2	4	900588.5666m	972854.4974m	226.400m	W71° 58' 23.03"	N4° 21' 00.67"	16,00 KM
WAC04	POZO LA UNION		1	902309.6873m	973188.3818m	218.100m	W71° 57' 27.23"	N4° 21' 11.61"	16,00 KM
WAC05	POZO PUNTO GRILLO	CARO CARO, LA BALSA, LLANO ALTO, ACEITICO	5	903640.5670m	974478.3613m	221.500m	W71° 56' 44.12"	N4° 21' 53.65"	18,00 KM
WAC06	POZO ALGARROBO	SANTA INES, VILLANUEVA	3	904014.1047m	975025.1358m	221.100m	W71° 56' 32.02"	N4° 22' 11.46"	19,00 KM
WAC07	POZO MATAPALITO	LAS PIEDRAS	2	906626.4761m	979804.6633m	209.800m	W71° 55' 07.48"	N4° 24' 47.14"	27,00 KM
WAC08	POZO LA PORFIA	LA HERMOSA	2	907524.2409m	981153.8279m	191.200m	W71° 54' 38.41"	N4° 25' 31.09"	29,00 KM
WAC09	POZO LA CAIMANA	VERGEL	2	900487.6913m	971329.8396m	202.200m	W71° 58' 26.24"	N4° 20' 11.04"	18,00 KM

Tabla 1. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

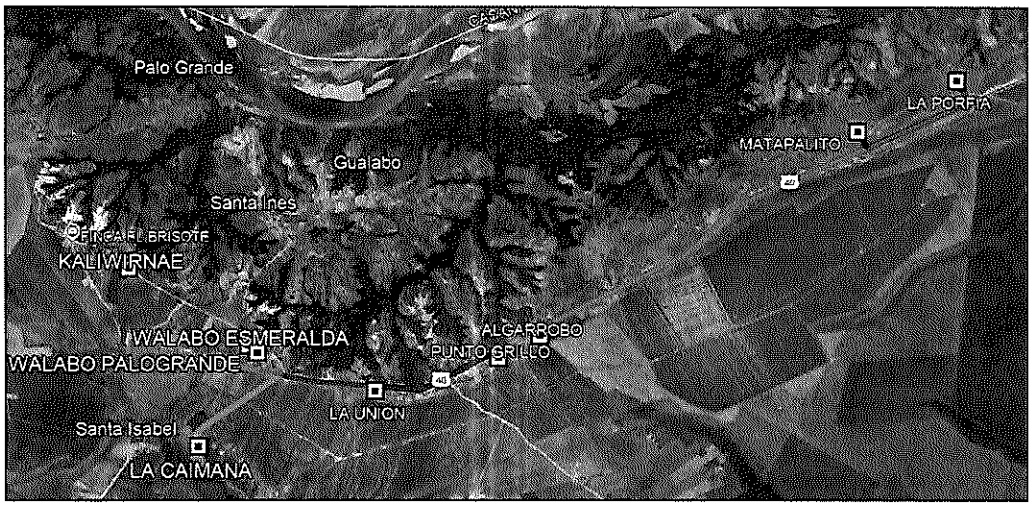


Figura 1. Localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba

RESGUARDO AWALIBA										
PUNTO	COMUNIDAD			ESTE	NORTE	COTA	LONGITUD	LATITUD	DISTANCIA
AWA01	POZO MAKAPAY	LA VEREMOS	2	927966.5314m	948604.7669m	234.100m	W71° 43' 34.52"	N4° 07' 52.17"	81,00 KM
AWA02	POZO COMUNITARIO AWALIVA CENTRAL	CEREQUITO, LA BRISA, LA PISTA, CHAVALIVALI, LA ENVIDIA, DESEO	7	932219.8422m	949522.6407m	240.200m	W71° 41' 16.65"	N4° 08' 22.16"	85,00 KM
AWA03	POZO PUERTO LOPEZ		1	933332.3132m	944145.5908m	206.500m	W71° 40' 40.45"	N4° 05' 27.15"	90,00 KM
AWA04	POZO PUNTO GRILLO		1	932807.1761m	942400.7501m	187.200m	W71° 40' 54.19"	N4° 04' 30.33"	93,00 KM
AWA05	POZO SAN GIL	TAPIVA, BELLAVISTA	3	942563.2402m	947574.8922m	203.600m	W71° 35' 41.26"	N4° 07' 18.99"	96,00 KM
AWA06	POZO FACUNAE		1	935423.3607m	942265.4095m	194.400m	W71° 39' 32.61"	N4° 04' 25.99"	93,00 KM

Tabla 2. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

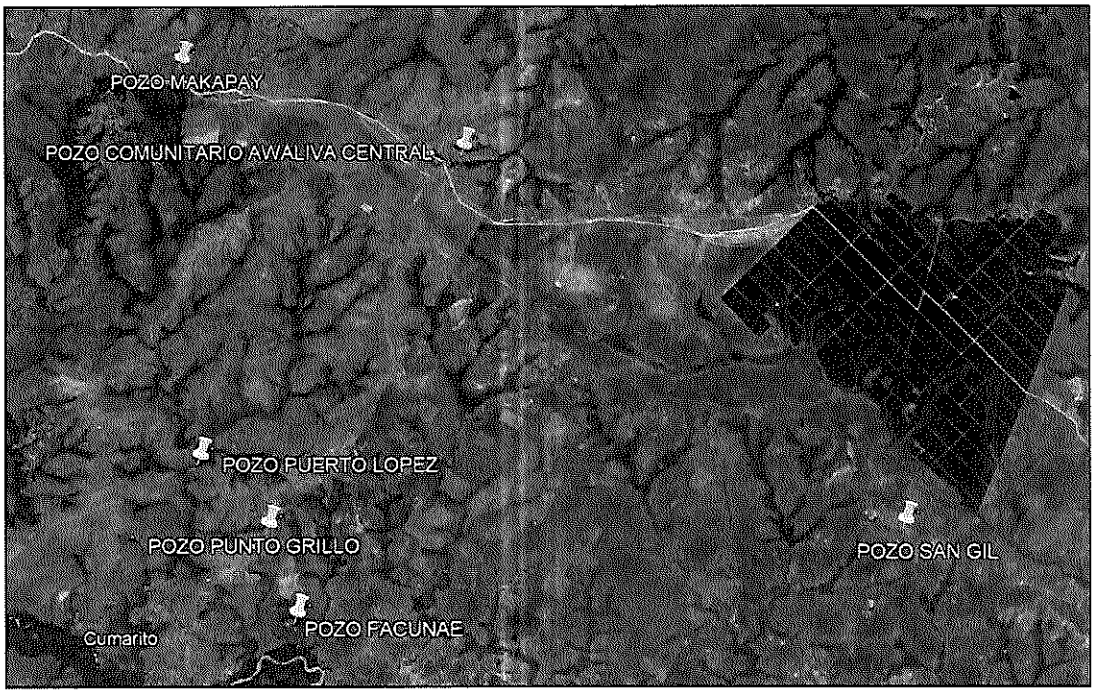


Figura 2. Localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas

RESGUARDO DOMOPLANAS									
PUNTO	COMUNIDAD			ESTE	NORTE	COTA	LONGITUD	LATITUD	DISTANCIA
DOM01	POZO OLIVOS	WARROJO	2	979779.5881m	963044.8119m	185.800m	W71° 15' 34.74"	N4° 15' 43.15"	132,00 KM
DOM02	POZO PARAISO	VISTA HERMOSA	2	970139.3986m	962795.7268m	201.100m	W71° 20' 47.85"	N4° 15' 34.95"	125,00 KM
DOM03	POZO BUENAVISTA		1	968868.4144m	958179.8691m	232.350m	W71° 21' 34.94"	N4° 10' 21.70"	112,00 KM
DOM04	POZO VILLAMARCIA	DILUVIO	2	976124.0172m	945937.1103m	194.500m	W71° 17' 33.14"	N4° 06' 26.18"	124,00 KM
DOM05	POZO LAS BRISAS		1	977507.6932m	947082.3612m	200.550m	W71° 16' 48.28"	N4° 07' 03.47"	124,00 KM
DOM06	POZO CUMARALITO		1	977551.1217m	944929.9396m	197.550m	W71° 16' 46.86"	N4° 05' 53.40"	126,00 KM
DOM07	POZO YATORROBO		1	976876.8066m	943115.3330m	194.300m	W71° 17' 08.70"	N4° 04' 54.32"	129,00 KM
DOM08	POZO CERRITO		1	980241.7249m	947463.0825m	188.500m	W71° 15' 19.64"	N4° 07' 15.89"	126,00 KM
DOM09	POZO PUERTO GAVILAN	SOLEDAD	2	983468.1415m	944928.3256m	203.100m	W71° 13' 35.02"	N4° 05' 33.86"	132,00 KM
DOM10	POZO LAS DELICIAS		1	985468.1246m	941561.4449m	180.200m	W71° 12' 30.16"	N4° 04' 03.79"	137,00 KM
DOM11	POZO CACHAMITAS		1	979870.7300m	939807.9630m	186.933m	W71° 15' 31.62"	N4° 03' 06.67"	134,00 KM

Tabla 3. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

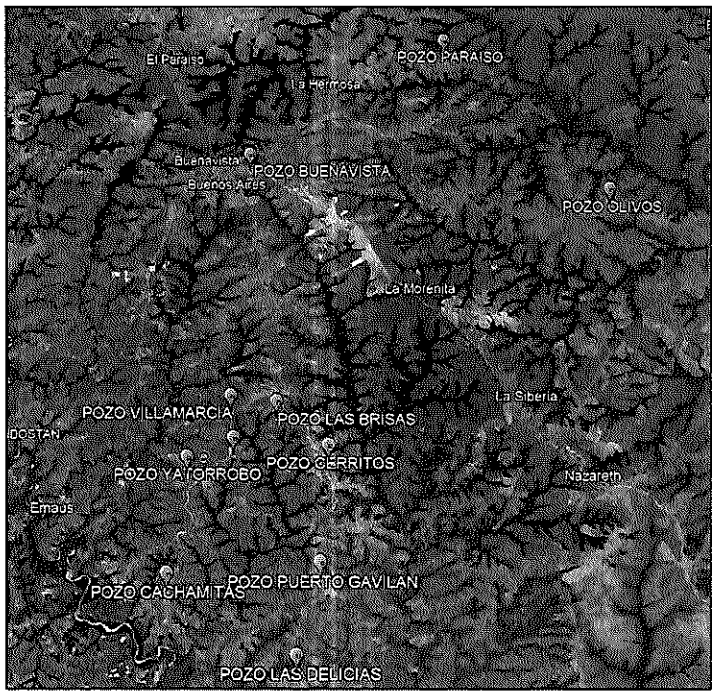


Figura 3. Localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome

RESGUARDO ASEINPOME										
RESGUARDO	COMUNIDAD			ESTE	NORTE	COTA	LONGITUD	LATITUD	DISTANCIA
UNU01	KEKO		1	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92,00 KM
UNU01	SIETE RODRIGUEZ	SAN FERNANDO	2	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92,00 KM

Tabla 4. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome



Figura 4. Localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome

2.1.5 COMUNIDAD BENEFICIADA


El número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto es de 3.246 habitantes como se muestra a continuación:


GRUPOS ÉTNICOS:	Población Indígena		
ETARIA:	**Edad:**	0 a 14 años	1.087
		15 a 19 años	390
		20 a 59 años	1.617
		Mayor de 60 años	152
GÉNERO:	**Masculino:**	1.737	
	Femenino:	1.509	

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto como se mencionó anteriormente beneficiara a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas distribuidos en toda la zona rural del municipio de Puerto Gaitán, cada sistema está concebido que sea igual para todas las comunidades, que requieran de la menor operación y que brinde agua potable para el beneficio de las comunidades.

El sistema consta de manera general de los siguientes componentes:

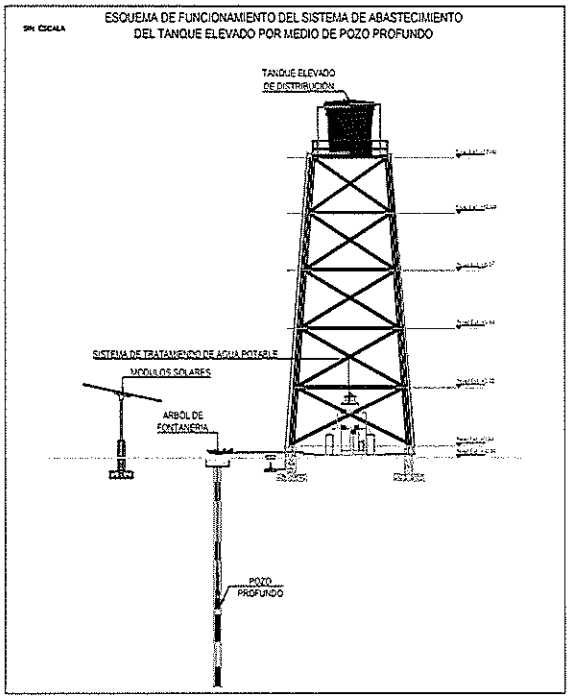

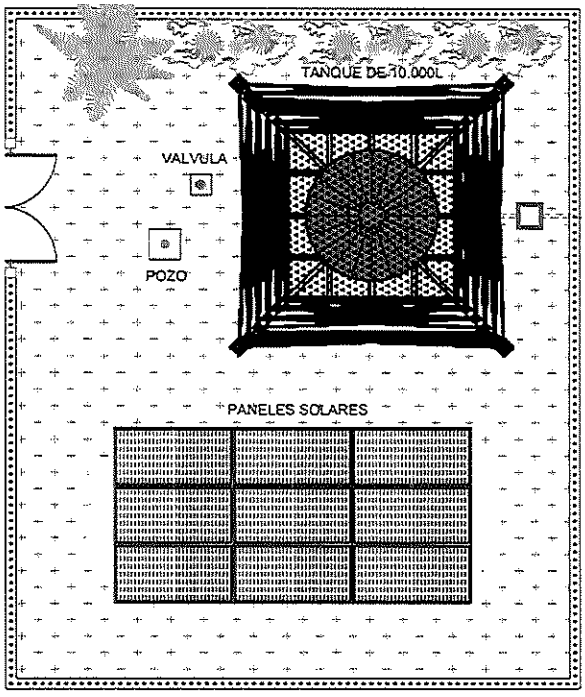

- **Pozo profundo:** Se contemplan profundidades de perforación desde 90 metros hasta los 153 metros, en tubería PVC de 6" al igual que los filtros.

- **Equipo de bombeo y sistema de energía solar:** bombas sumergibles solares de potencias entre 1.500, 3.000 y 16.000 wattios. Controladores de carga, sensores de nivel para tanque y pozo, y sistema de protección de malla a tierra.
  Paneles solares monocristalinos de 570 wattios, distribuidos en módulos de 5, 9 y 22 paneles según las características de cada sistema.

- **Sistema de tratamiento de agua:** compuestos por una unidad presurizada en acero inoxidable que filtra, clarifica y purifica; diseñados para tratar caudales de 0.5 lts/seg, 1 lts/seg y 2 lts/seg según el requerimiento de cada sistema.

- **Redes de acueducto:** 56.682.22 metros de tubería de pvc 2" RDE 21 – 941 acometidas domiciliarias y sus respectivos accesorios (válvulas, uniones, tapones, codos, tees).

- **Tanque elevado de distribución:** tanques plásticos de 6.000 lts, 10.000 lts, y 20.000 lts, soportados en estructuras de acero estructural ASTM de 13.7 metros de altura cimentados en zapatas y pedestales en concreto de 3.000 psi.

- **Cerramiento perimetral:** en tubo galvanizado de 2" soportados en viga de cimentación y concreto ciclópeo con portón de acceso.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DEL PROCESO		LP-SIP-005-2025
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**NÚMERO:**	821 DE 2025
	FECHA:	17 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
CONTRATISTA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT. 901.965.630 – 1 R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

VALOR DEL CONTRATO	**EN LETRAS**	CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
	EN NUMEROS	$42.408.897.278,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		QUINCE (15) MESES
INTERVENTOR DEL CONTRATO:		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 NIT. 901.972.868 – 4 R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO C.C. 79.134.525 DE FONTIBÓN interventoria.acindigenas@gmail.com
SUPERVISOR		CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA ACTA DE INICIO		29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL		28 DE NOVIEMBRE DE 2026
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		25,08%
COSTO EJECUTADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		$10.635.190.003,00
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		20,29%
COSTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		$ 8.602.601.926,00
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL ACTA DE INICIO		125 días
DIAS PENDIENTES DE EJECUCION		331 días
PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO		27,41%

5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

A continuación, se describen las pólizas expedidas por la compañía BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. que amparan la ejecución del contrato desde su suscripción y las correspondientes modificaciones que se han realizado a la fecha del presente informe y que aplican para actualización de pólizas.

- Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 93833.
- Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 27002.

5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS

PÓLIZAS INICIALES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 17 DE JULIO DE 2025.

Póliza No. 93833				Endoso 0			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				**Endoso 0**			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17	07	2025	17	10	2026	$2.120.444.864,00

PÓLIZAS INICIALES CORRECIÓN NIT. DEL CONTRATISTA.

Póliza No. 93833				Endoso 1			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				**Endoso 1**			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17	07	2025	17	10	2026	$2.120.444.864,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025.

Póliza No. 93833				Endoso 2			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	08	2025	01	04	2027	$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29	08	2025	01	12	2029	$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	29	08	2025	01	04	2027	$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29	08	2025	28	11	2031	$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				**Endoso 2**			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	29	08	2025	01	12	2026	$2.120.444.864,00

6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

El contrato de obra No. 821 de 2025 cuenta con un anticipo del 50% del valor del contrato correspondiente a la suma de $21.204.448.639,00; por concepto de FONSET la entidad retiene el 5% de este valor que son $1.060.222.431,95 es decir que el valor neto entregado del anticipo corresponde a $20.144.226.207,05.

En cumplimento de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR DEL CONTRATO, ANTICIPO Y FORMA DE PAGO del contrato, el contratista suscribió con la FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS denominado **PATRIMONIO AUTONOMO ANTICIPO CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, con el fin de manejar y girar los recursos del anticipo del contrato.

De igual manera se registra la cuenta de ahorros No. 500807651648 del Banco Popular correspondiente al fideicomiso donde se deben abonar los recursos objeto del contrato fiduciario.

A continuación, se presenta el plan de inversión del anticipo aprobado inicialmente y que se encuentra vigente a la fecha.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%	% PORCENTAJE PROGRAMADO DE INVERSION EN EL TIEMPO EN MESES				
				1	2	3	4	5
1	MANO DE OBRA, PRESTACION DE SERVICIOS Y PAGOS DEL PERSONAL OFERTADO Y OPERATIVO (SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, DOTACIONES)	$2.417.307.144,85	12%	2%	3%	3%	3%	1%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$13.496.631.558,72	67%	15%	20%	20%	5%	7%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$4.230.287.503,48	21%	3%	5%	5%	5%	3%
TOTALES		**$20.144.226.207,05**	**100%**					

6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

A continuación, se mencionan y describen cada uno de las ordenes de giro a la fiducia durante el periodo del informe

CONSECUTIVO	ITEM	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	SALDO ANTICIPO
ORDEN GIRO No. 32	1	1/12/2025	CONSORCIO AGUAS GAITAN	$ 31.788.377,00	$ 13.631.905.464,14
ORDEN GIRO No. 33	1	1/12/2025	NELSON MORALES ROJAS	$ 26.823.312,00	$ 13.605.082.152,14
ORDEN GIRO No. 34	1	2/12/2025	TERRACQUA SAS	$ 35.700.000,00	$ 13.569.382.152,14
ORDEN GIRO No. 35	1	4/12/2025	BRAYAM GOMEZ ARIAS	$ 27.670.566,00	$ 13.541.711.586,14
ORDEN GIRO No. 36	1	4/12/2025	MARLON MURCIA TOBON	$ 23.968.693,00	$ 13.517.742.893,14
ORDEN GIRO No. 37	1	4/12/2025	ELIZABETH ARIAS PARRA	$ 31.895.936,00	$ 13.485.846.957,14
ORDEN GIRO No. 38	1	4/12/2025	BRAYAN MURCIA TOBON	$ 30.848.941,00	$ 13.454.998.016,14
ORDEN GIRO No. 39	1	4/12/2025	GILBERTO PIÑEROS CASTRO	$ 27.499.999,68	$ 13.427.498.016,46
ORDEN GIRO No. 40	1	5/12/2025	EDUAR BENJAMIN PEREZ	$ 29.746.367,00	$ 13.397.751.649,46
ORDEN GIRO No. 41	1	9/12/2025	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	$ 30.597.560,00	$ 13.367.154.089,46
ORDEN GIRO No. 42	1	9/12/2025	LUZ DARY CASTELLANOS PAEZ	$ 1.409.730,00	$ 13.365.744.359,46

ORDEN GIRO No. 43	1	11/12/2025	CONSORCIO AGUAS GAITAN	$ 11.199.620,00	$ 13.354.544.739,46
ORDEN GIRO No. 44	1	11/12/2025	TERRACQUA SAS	$ 19.829.869,01	$ 13.334.714.870,45
ORDEN GIRO No. 45	1	11/12/2025	GEODELTA SAS	$ 28.350.000,01	$ 13.306.364.870,44
ORDEN GIRO No. 46	1	12/12/2025	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS	$ 59.848.167,79	$ 13.246.516.702,65
ORDEN GIRO No. 47	1	12/12/2025	CONSTRUCIVIL M&A S.A.S	$ 230.474.307,87	$ 13.016.042.394,78
ORDEN GIRO No. 48	1	12/12/2025	EDUAR BENJAMIN PEREZ	$ 49.350.000,00	$ 12.966.692.394,78
ORDEN GIRO No. 49	1	12/12/2025	ANCIZAR GUILLERMO ARREDONDO ARBOLEDA	$ 15.510.000,00	$ 12.951.182.394,78
ORDEN GIRO No. 50	1	12/12/2025	LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S	$ 886.147,00	$ 12.950.296.247,78
ORDEN GIRO No. 51	1	15/12/2025	NELSON MORALES ROJAS	$ 23.328.000,00	$ 12.926.968.247,78
ORDEN GIRO No. 52	1	15/12/2025	ANGY XIMENA CASTILLO	$ 885.000,00	$ 12.926.083.247,78
ORDEN GIRO No. 53	1	15/12/2025	AGOFER S.A.S	$ 17.732.659,00	$ 12.908.350.588,78
ORDEN GIRO No. 54	1	15/12/2025	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	$ 92.600.775,00	$ 12.815.749.813,78
ORDEN GIRO No. 55	1	15/12/2025	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	$ 101.487.194,70	$ 12.714.262.619,08
ORDEN GIRO No. 56	1	15/12/2025	TERRACQUA SAS	$ 34.300.000,00	$ 12.679.962.619,08
ORDEN GIRO No. 57	1	15/12/2025	GEODELTA SAS	$ 24.500.000,34	$ 12.655.462.618,74
ORDEN GIRO No. 58	1	15/12/2025	ORLANDO BONILLA CASTELLANOS	$ 2.202.365,00	$ 12.653.260.253,74
ORDEN GIRO No. 59	1	15/12/2025	ARCOE SAS	$ 49.764.361,29	$ 12.603.495.892,45

6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

MES		VALOR PROGRAMADO		VALOR EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	29-08-2025 a 30-09-25	$ 1.132.883.754,00	$ 1.132.883.754,00	$ 1.165.283.191,00	$ 1.165.283.191,00
2	01-10-25 a 31-10-25	$ 1.533.938.149,00	$ 2.666.821.903,00	$ 1.615.778.986,00	$ 2.781.062.177,00
3	01-11-25 a 30-11-25	$ 2.752.982.664,00	$ 5.419.804.567,00	$ 4.469.897.773,00	$ 7.250.959.950,00
4	01-12-25 a 31-12-25	$ 3.182.797.359,00	$ 8.602.601.926,00	$ 3.384.230.051,00	$ 10.635.190.003,00
5	01-01-26 a 31-01-26	$ 3.054.586.452,00	$ 11.657.188.378,00		
6	01-02-26 a 28-02-26	$ 1.361.475.374,00	$ 13.018.663.752,00		
7	01-03-26 a 31-03-06	$ 1.707.014.984,00	$ 14.725.678.736,00		
8	01-04-26 a 30-04-26	$ 2.122.894.222,00	$ 16.848.572.958,00		
9	01-05-26 a 31-05-26	$ 3.538.600.653,00	$ 20.387.173.611,00		
10	01-06-26 a 30-06-26	$ 5.196.889.486,00	$ 25.584.063.097,00		
11	01-07-26 a 31-07-26	$ 6.886.687.533,00	$ 32.470.750.630,00		
12	01-08-26 a 31-08-26	$ 4.957.368.139,00	$ 37.428.118.769,00		
13	01-09-26 a 30-09-26	$ 3.283.638.775,00	$ 40.711.757.544,00		
14	01-10-26 a 31-10-26	$ 1.494.587.472,00	$ 42.206.345.016,00		
15	01-11-26 a 28-11-26	$ 202.576.537,00	$ 42.408.921.553,00		

6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$42.408.897.278,00
VALOR ADICIONES	$0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	$42.408.897.278,00
VALOR ANTICIPO	$20.144.226.207,05

ACTAS PARCIALES	$0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$20.144.226.207,05

6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
NÚMERO	DIS.2025000172
FECHA DE EXPEDICIÓN	16-05-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
CONCEPTO	SPGR CDP 13325 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	$42.408.921.552,00
VALOR ACTUAL	$42.408.921.552,00

6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP.

REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO	RS1.2025000156
FECHA DEL REGISTRO	23-07-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
DESCRIPCIÓN	CTO-821 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
FUENTE O RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	$42.408.897.278,00
VALOR ACTUAL	$42.408.897.278,00

6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No.	VALOR NETO	FECHA
ANTICIPO 50,00%	2025090008	$ 20.144.266.208,00	17/09/2025

7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO


7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES

MES		% PROGRAMADO		% EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	29-08-2025 a 30-09-25	2,67%	2,67%	2,75%	2,75%
2	01-10-25 a 31-10-25	3,62%	6,29%	3,81%	6,56%
3	01-11-25 a 30-11-25	6,49%	12,78%	10,54%	17,10%
4	01-12-25 a 31-12-25	7,51%	20,29%	7,98%	25,08%
5	01-01-26 a 31-01-26	7,20%	27,49%		
6	01-02-26 a 28-02-26	3,21%	30,70%		
7	01-03-26 a 31-03-06	4,03%	34,73%		
8	01-04-26 a 30-04-26	5,01%	39,74%		
9	01-05-26 a 31-05-26	8,34%	48,08%		
10	01-06-26 a 30-06-26	12,25%	60,33%		
11	01-07-26 a 31-07-26	16,24%	76,57%		
12	01-08-26 a 31-08-26	11,69%	88,26%		
13	01-09-26 a 30-09-26	7,74%	96,00%		
14	01-10-26 a 31-10-26	3,52%	99,52%		
15	01-11-26 a 28-11-26	0,48%	100,00%		

Ver anexo No. 1 Cuadro de avance actividades ejecutadas.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

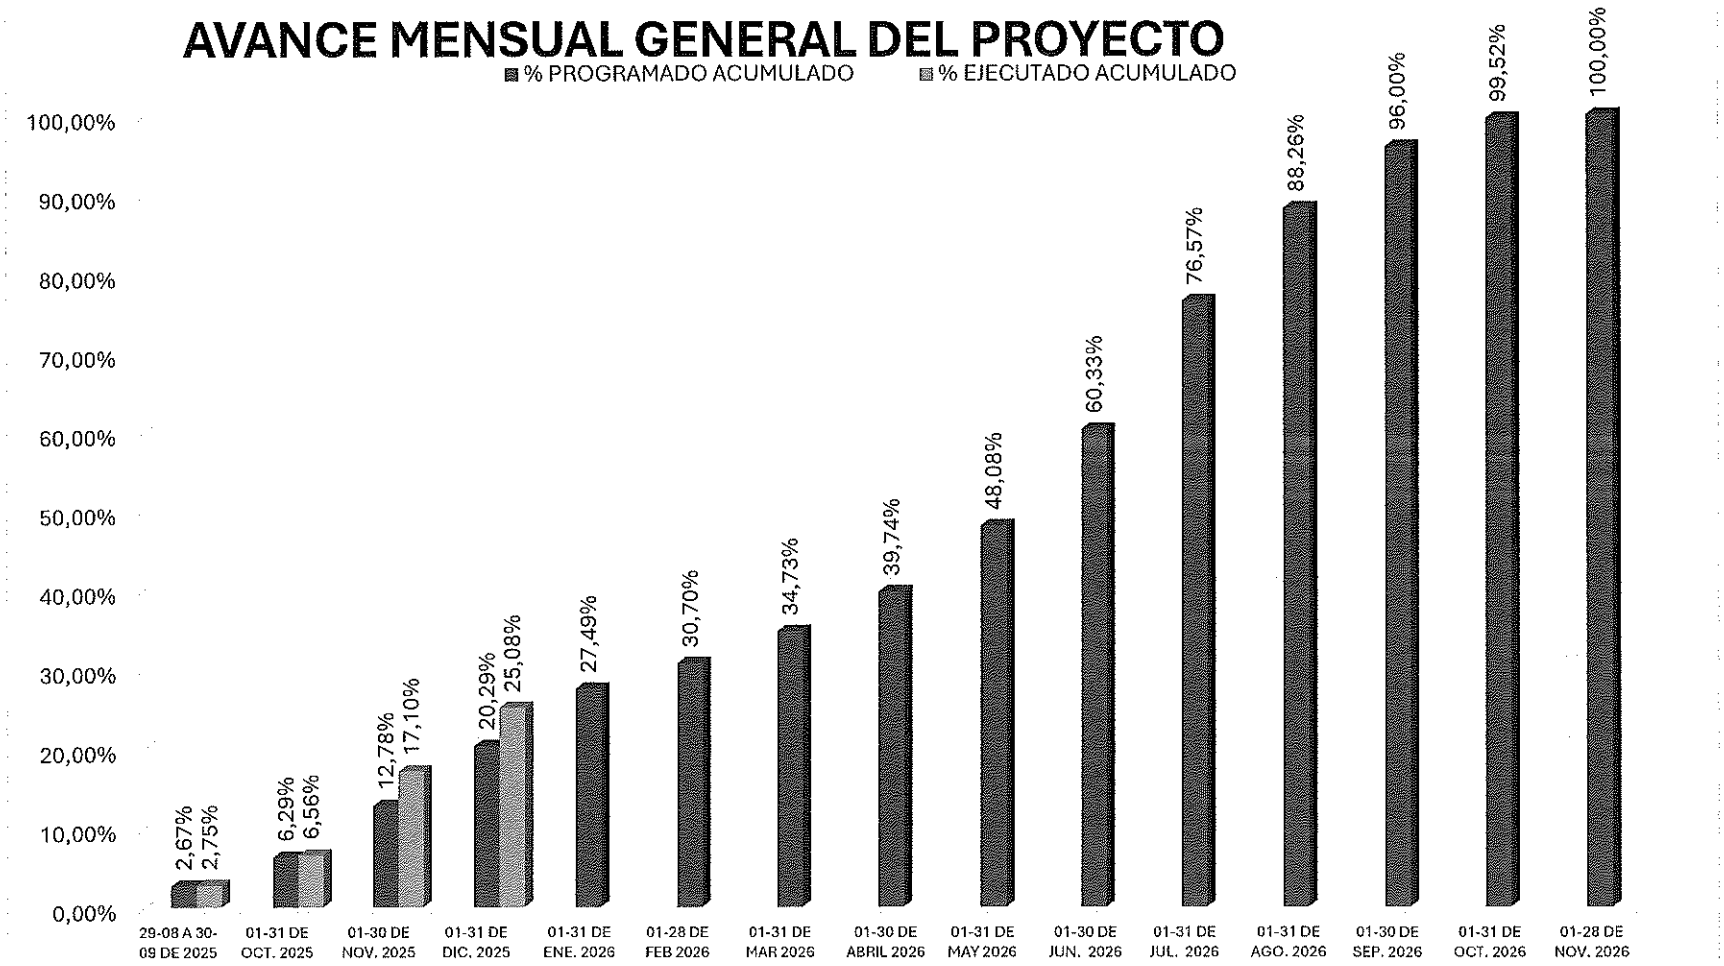

7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relaciona las actividades de obra ejecutadas en el presente corte:

RESGUARDO AWALIBA.

COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro con la ejecución de registro eléctrico, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", después se procede a instalar la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario.

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se continuo con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee, tapones y válvula.

- **CERRAMIENTO PERIMETRAL**

Durante el periodo reportado se realizaron actividades de excavación manual, se realizó instalación del acero para zapatas, vigas, y columnas, fundición del concreto ciclópeo, fundición de concreto con grava ¾ para zapatas, se construyó la caja de inspección de 0.50x0.50x0.50 M en concreto de 3000 PSI elaborada en sitio con su respectiva tapa en concreto reforzado y marco en ángulo metálico.

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se terminó con la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en esta comunidad.

COMUNIDAD PUERTO LOPEZ

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se inicio con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapones.

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas y pedestales de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa, e igualmente se realizó el vaciado del concreto para las columnas.

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se terminó con la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en esta comunidad.

COMUNIDAD PUNTO GRILLO

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro con la ejecución de registro eléctrico, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½".

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se realizó las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapón.

- **TANQUE ELEVADO**

Durante el periodo reportado en este informe, se ejecutaron las actividades de excavación, relleno para la cimentación de la estructura de soporte para los tanques elevados, se realizó el vaciado de concreto para el solado, las zapatas y pedestales de esta cimentación la que incluye la instalación de acero de refuerzo fy=4200 Mpa, e igualmente se realizó el vaciado del concreto para las columnas.

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se terminó con la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en esta comunidad.

COMUNIDAD FACUNAE

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro con la ejecución de registro eléctrico, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½".

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se inicio con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapones.

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se terminó con la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en esta comunidad.

RESGUARDO DOMOPLANAS.

COMUNIDAD VILLAMARCIA

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½".

COMUNIDAD CACHAMITAS

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se termina la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro con la ejecución de registro eléctrico, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", después se procede a instalar la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario.

RESGUARDO WACOYO.

COMUNIDAD ESMERALDA WALABO

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se termina la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro con la ejecución de registro eléctrico, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", después se procede a instalar la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario.

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se terminaron las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapón.

COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se realizó las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapón.

COMUNIDAD LA UNIÓN

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se iniciaron las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapón.

COMUNIDAD PUNTO GRILLO

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se iniciaron las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapón.

COMUNIDAD MATAPALITO

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se iniciaron las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapón.

RESGUARDO ASEINPOME

COMUNIDAD SIETE ROGRIGUEZ

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro con la ejecución de registro eléctrico, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", después se procede a instalar la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario.

Las cantidades ejecutadas y mencionadas anteriormente para el periodo referenciado en este informe se pueden verificar en el **Anexo N°1.**

7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

En el **Anexo No. 2** se encontrarán los certificados de calidad de los materiales usados al corte del presente informe, junto con los certificados de calibración de los equipos usados si aplica.

7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se anexa el informe emitido por parte del profesional SISO, entrega de asistencia de charlas de seguridad, salud en el trabajo y las entregas de dotación.
Ver Anexo No. 3 Informe seguridad y salud en el trabajo (SISO)

7.5 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

RESGUARDO WACOYO DICIEMBRE 2025																														
DIA	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LLUVIAS MODERADAS AM																															
LLUVIAS INTENSAS AM																															X
SECO PM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
LLUVIAS MODERADAS PM																														X	
LLUVIAS INTENSAS PM																															X

RESGUARDO AWALIBA DICIEMBRE 2025																															
DIA	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LLUVIAS MODERADAS AM																															
LLUVIAS INTENSAS AM																															X
SECO PM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
LLUVIAS MODERADAS PM																														X	
LLUVIAS INTENSAS PM																															X

RESGUARDO DOMOPLANAS DICIEMBRE 2025																															
DIA	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LLUVIAS MODERADAS AM																															
LLUVIAS INTENSAS AM																															X

SECO PM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
LLUVIAS MODERADAS PM																												X	
LLUVIAS INTENSAS PM																													X

RESGUARDO ASEINPOME DICIEMBRE 2025																														
DIA	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LLUVIAS MODERADAS AM																															
LLUVIAS INTENSAS AM																															X
SECO PM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
LLUVIAS MODERADAS PM																														X	
LLUVIAS INTENSAS PM																															X

8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

8.1 RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO)

De acuerdo con las necesidades del proyecto, las actividades ejecutadas durante el presente periodo y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en la siguiente tabla:

PERIODO: DICIEMBRE 2025

PERSONAL PROFESIONAL						
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO
LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	R/L Consorcio	86.051.533	PORVENIR	SANITAS	SURA	9497602330
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN	Director de Obra	40.326.478	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9497602330
WENDY VANESA GARZON GARCIA	Residente de Obra 1	1.121.902.403	PROTECCION	SANITAS	SURA	9497602330

GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	Residente de Obra 2	1.121.834.340	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9497602330
GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.869.998	PORVENIR	SANITAS	SURA	9497602330
DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	Contadora	40.395.435	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9497604877
LINA MARCELA GOMEZ LEAL	Auxiliar Contable	40.328.285	PORVENIR	SANITAS	SURA	


PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO							
NOMBRE	**CARGO**	**C.C.**	**AFP**	**EPS**	**ARL**	**PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO**	**FECHA INGRESO Y/O RETIRO**
GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ	Secretaria	1.092.394.700	PORVENIR	SANITAS	SURA	9497604877	
JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	Conductor 1	80.013.513	PORVENIR	SANITAS	SURA	9497604877	
ROSEMBERG MURCIA JOJOA	Conductor 2	1.003.359.252	PORVENIR	SANITAS	SURA	9497602330	
OBER ASMED PEREZ PEREZ	Almacenista	96.193.788	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9497604877	
MIGUEL DIOSID CORREA	Oficial de obra	1.103.470.729	PORVENIR	CAJACOPI	SURA	9497602330	24-10-25 21-12-25
YEFERSON ENRIQUE GALVAN	Operador de maquinaria	78.646.546	COLFONDOS	NUEVA EPS	SURA	9497602330	24-10-25 21-12-25
JOSE JAVIER MONCADA	Oficial de tubería	1.093.921.945	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	9497602330	24-10-25 21-12-25
BRISLEY RAMIREZ	Oficial de obra	1.122.236.284	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	9497602330	24-10-25 21-12-25
DUVAN ARLEY ROMERO	Oficial de tubería	1.004.819.005	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	9497602330	24-10-25 21-12-25

8.2 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se anexan las planillas de pago de seguridad social correspondientes al periodo del informe de cada uno de los empleados tanto profesionales, como operativos y técnicos junto con el certificado emitido por el contador público que avala dichos pagos.

Ver Anexo No. 5. Planillas de pago seguridad social y Certificación contador.

8.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

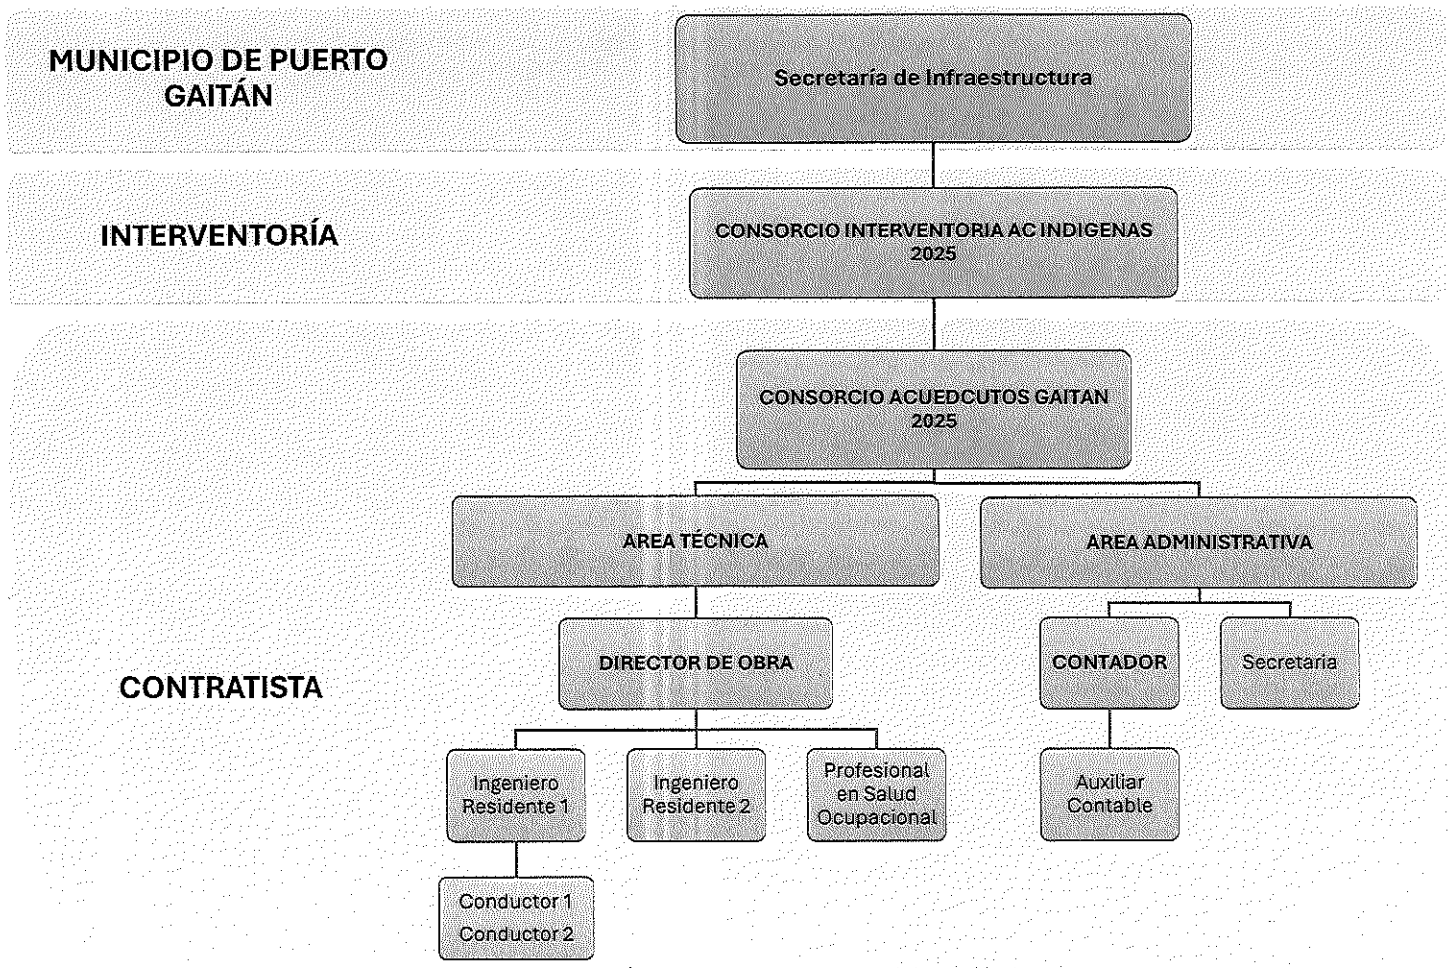

8.4 PAZ Y SALVO PERSONAL.

Se anexa paz y salvo de los trabajadores retirados durante el periodo comprendido a la fecha de corte del presente informe.
Ver Anexo No. 6. Paz y salvo personal retirado

9 CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Se anexa el diseño de mezcla para concretos de 3.000 PSI a utilizar en la construcción de estructuras que lo requieren.
Ver Anexo No. 4. Diseño de mezcla

10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
NIVEL DE PRECISIÓN	NIVEL DE PRECISIÓN TOPCOM	1
ESTACIÓN TOTAL	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA TOPCOM	1
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1
CAMION ESTACAS	CHEVROLET	1
EQUIPO DE PERFORACION	PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8	2
EQUIPO DE PERFORACION	DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	2
RETROEXCAVADORA	HITACHI	1
RETROEXCAVADORA	CARTERPILLA	

11 INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO.

En lo corrido del presente mes las actividades ejecutadas no causaron afectación ambiental en la zona de trabajo.

A la fecha el contrato cuenta con los permisos de prospección y exploración en de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA, los cuales a continuación se relacionan:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	WACOYO	KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ

12 CONCLUSIONES

- Se presenta el siguiente informe con el fin de mantener informadas a las partes involucradas del estado y avance del contrato en el periodo correspondiente al informe mensual No. 4 con corte del (01-12-2025 al 31-12-2025), actividades que se desarrollaron con normalidad.

- En el presente periodo se suministró aproximadamente el 9.41% de la tubería en los resguardos de wacoyo y awaliba, dejando un acumulado del 77,77% de suministro.

- Una vez recibidos los recursos de anticipo en la fiducia constituida para el manejo de este, se continua la inversión de tal forma que se logre el cumplimiento del cronograma, priorizando las actividades que más tiempo requieren en su ejecución.

- Al terminar la ejecución de la actividad de localización y replanteo de las redes de acueducto en las comunidades beneficiarias se evidencio la existencia de nuevos usuarios, así como el desplazamiento de algunos usuarios dentro de la misma comunidad, situación que genera mayor cantidad de actividades de obra por lo que se cuantificara junto con interventoría para realizar el balance del contrato.

- Para efectos de precisión, se deja claridad en que el porcentaje acumulado consignado en el cuadro de avance está redondeado a dos decimales.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.690 – 1

13 ANEXOS

- **ANEXO No. 1.** CUADRO DE AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- **ANEXO No. 2.** CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.
- **ANEXO No. 3.** INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISO).
- **ANEXO No. 4.** DISEÑO DE MEZCLA.
- **ANEXO No. 5.** PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.
- **ANEXO No. 6.** PAZ Y SALVO TRABAJADORES RETIRADOS
- **ANEXO No. 7.** NOMINAS DEL PERSONAL.
- **ANEXO No. 8.** REGISTRO FOTOGRAFICO.
- **ANEXO No. 9.** COPIA DE LA BITACORA.
- **ANEXO No. 10.** APROBACIÓN CONTRATO FIDUCIA Y ORDENES DE OPERACIÓN DE INVERSION DEL ANTICIPO.
- **ANEXO No. 11.** ACTA DE VECINDAD

Atentamente,

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R.L. CONSORCIO ACUEDUCTOS AGUAS 2025
Contratista

ANEXO 1. CUADRO DE CANTIDADES AVANCE DE OBRA.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
RESGUARDO AWALIBA														
COMUNIDAD MAKAPAY (6000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO													
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO MAKAPAY	$ 138.430.780,00		$ 139.220,00		$ -		$ 139.220,00		$ 136.291.570,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	4.140,25	$ 4.314,00	$ 17.861.039,00	3.917,61	$ 16.900.570,00		$ -	3.917,61	$ 16.900.570,00	222,64	$ 960.469,00
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	1.035,06	$ 43.396,00	$ 44.919.534,00	932,50	$ 40.468.464,00		$ -	932,50	$ 40.468.464,00	102,56	$ 4.451.070,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	112,50	$ 98.753,00	$ 11.109.713,00	112,21	$ 11.081.189,00		$ -	112,21	$ 11.081.189,00	0,29	$ 28.524,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	931,56	$ 189.095,00	$ 176.153.338,00	645,52	$ 122.064.592,00		$ -	645,52	$ 122.064.592,00	286,04	$ 54.088.746,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1.204,58	$ 44.843,00	$ 54.016.981,00	1.203,57	$ 53.971.617,00		$ -	1.203,57	$ 53.971.617,00	1,01	$ 45.364,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	310,52	$ 78.793,00	$ 24.466.802,00	279,75	$ 22.042.249,00		$ -	279,75	$ 22.042.249,00	30,77	$ 2.424.554,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	327.182,73	$ 2.309,00	$ 755.464.921,00	173.661,49	$ 400.984.371,00		$ -	173.661,49	$ 400.984.371,00	153.521,24	$ 354.480.550,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	3.890,25	$ 23.403,00	$ 91.043.521,00	3.542,36	$ 82.901.851,00		$ -	3.542,36	$ 82.901.851,00	347,89	$ 8.141.670,00
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	1,00	$ 1.148.570,00	$ 1.148.570,00	1,00	$ 1.148.570,00		$ -	1,00	$ 1.148.570,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	4,00	$ 128.043,00	$ 512.172,00	4,00	$ 512.172,00		$ -	4,00	$ 512.172,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	10,00	$ 122.894,00	$ 1.228.940,00	6,00	$ 737.364,00		$ -	6,00	$ 737.364,00	4,00	$ 491.576,00
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	2,00	$ 140.168,00	$ 280.336,00	2,00	$ 280.336,00		$ -	2,00	$ 280.336,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	5,00	$ 94.930,00	$ 474.650,00	5,00	$ 474.650,00		$ -	5,00	$ 474.650,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	1,00	$ 4.065,00	$ 4.065,00	1,00	$ 4.065,00		$ -	1,00	$ 4.065,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	2.334,15	$ 52.355,00	$ 122.204.423,00	2.125,41	$ 111.276.060,00		$ -	2.125,41	$ 111.276.060,00	208,74	$ 10.928.363,00
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	25,00	$ 265.183,00	$ 6.629.575,00	25,00	$ 6.629.575,00		$ -	25,00	$ 6.629.575,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO MAKAPAY	$ 1.307.518.680,00		$ 871.477.695,00		$ -		$ 871.477.695,00		$ 435.040.986,00
6	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN												-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00		$ -	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00	4,28	$ 191.928,00		$ -	4,28	$ 191.928,00	0,62	$ 27.803,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.605,00	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00		$ -	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00	0,77	$ 1.733.743,00		$ -	0,77	$ 1.733.743,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00	269,29	$ 3.563.515,00		$ -	269,29	$ 3.563.515,00	192,27	$ 2.544.309,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,5 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00		$ -	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO MAKAPAY	$ 168.363.529,00		$ 10.203.118,00		$ -		$ 10.203.118,00		$ 158.160.412,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	45,50	$ 241.150,00		$ -	45,50	$ 241.150,00	2,70	$ 14.310,00
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	$ 98.753,00	$ 493.765,00	4,97	$ 490.802,00		$ -	4,97	$ 490.802,00	0,03	$ 2.963,00
6.3		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	$ 1.128.628,00	$ 4.627.375,00	3,92	$ 4.424.222,00		$ -	3,92	$ 4.424.222,00	0,18	$ 203.153,00
6.4		VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,28	$ 1.705.560,00	$ 3.888.677,00	2,18	$ 3.718.121,00		$ -	2,18	$ 3.718.121,00	0,10	$ 170.556,00
6.5		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,19	$ 2.251.614,00	$ 427.807,00	0,19	$ 427.807,00		$ -	0,19	$ 427.807,00	-	$ -
6.6		RELLENO CON GRAVILLA	M3	1,31	$ 169.936,00	$ 222.616,00	1,31	$ 222.616,00		$ -	1,31	$ 222.616,00	-	$ -
6.7		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	$ 1.591.605,00	$ 604.886,00	0,38	$ 604.886,00		$ -	0,38	$ 604.886,00	-	$ -
6.8		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	375,41	$ 13.233,00	$ 4.967.601,00	374,22	$ 4.952.053,00		$ -	374,22	$ 4.952.053,00	1,19	$ 15.747,00
6.9		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	1,00	$ 815.572,00	$ 815.572,00	1,00	$ 815.572,00		$ -	1,00	$ 815.572,00	-	$ -
6.10		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,44	$ 44.843,00	$ 19.731,00	0,44	$ 19.731,00		$ -	0,44	$ 19.731,00	-	$ -
6.11		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,5 Mpa (2000 PSI)	M3	0,06	$ 1.099.773,00	$ 65.986,00	0,06	$ 65.986,00		$ -	0,06	$ 65.986,00	-	$ -
6.12		TUBO GALVANIZADO DE 2" (L= 2 M, E = 1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	298,00	$ 122.681,00	$ 36.558.938,00	298,00	$ 36.558.938,00		$ -	298,00	$ 36.558.938,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL MAKAPAY	$ 56.244.622,00		$ 52.541.884,00		$ -		$ 52.541.884,00		$ 3.702.837,60
		TOTAL COMUNIDAD MAKAPAY				$ 1.895.553.028,00		$ 934.361.917,00		$ -		$ 934.361.917,00		$ 951.301.112,00
COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO													
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	102,00	$ 349.024,00	$ 35.600.448,00		$ -	102,00	$ 35.600.448,00	102,00	$ 35.600.448,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	102,00	$ 134.131,00	$ 13.681.362,00		$ -	102,00	$ 13.681.362,00	102,00	$ 13.681.362,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL ESPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	102,00	$ 502.845,00	$ 51.290.190,00		$ -	102,00	$ 51.290.190,00	102,00	$ 51.290.190,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	66,00	$ 320.453,00	$ 21.149.898,00		$ -	66,00	$ 21.149.898,00	66,00	$ 21.149.898,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	36,00	$ 239.462,00	$ 8.620.632,00		$ -	36,00	$ 8.620.632,00	36,00	$ 8.620.632,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	5,94	$ 562.175,00	$ 3.339.320,00		$ -	5,94	$ 3.339.320,00	5,94	$ 3.339.320,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	20,40	$ 42.479,00	$ 866.572,00		$ -	20,40	$ 866.572,00	20,40	$ 866.572,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 405.516,00
					TOTAL POZO PROFUNDO AWALIBA CENTRAL	$ 162.128.996,00		$ 139.220,00		$ 151.584.260,00		$ 151.723.480,00		$ 405.516,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.747,00	$ 4.314,00	$ 16.164.558,00	3.747,00	$ 16.164.558,00		$ -	3.747,00	$ 16.164.558,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	936,75	$ 43.398,00	$ 40.653.077,00	698,34	$ 30.306.559,00	149,66	$ 6.494.945,00	848,00	$ 36.801.504,00	88,75	$ 3.851.573,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	319,50	$ 98.753,00	$ 31.551.684,00	213,00	$ 21.034.389,00	18,30	$ 1.807.180,00	231,30	$ 22.841.569,00	88,20	$ 8.710.015,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	843,08	$ 189.095,00	$ 159.422.213,00	483,66	$ 91.457.688,00	43,82	$ 8.286.143,00	527,48	$ 99.743.831,00	315,60	$ 59.678.382,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1.017,60	$ 44.843,00	$ 45.632.237,00	977,67	$ 43.841.656,00	39,93	$ 1.790.581,00	1.017,60	$ 45.632.237,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	281,03	$ 78.793,00	$ 22.143.197,00	209,50	$ 16.507.134,00	40,90	$ 3.222.634,00	250,40	$ 19.729.767,00	30,63	$ 2.413.430,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	284.052,30	$ 2.309,00	$ 655.876.761,00	133.474,72	$ 308.193.132,00	14.963,14	$ 34.549.890,00	148.437,86	$ 342.743.023,00	135.614,44	$ 313.133.738,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	3.037,00	$ 23.403,00	$ 71.074.911,00	2.518,34	$ 58.936.711,00	518,66	$ 12.138.200,00	3.037,00	$ 71.074.911,00	-	$ -
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	1,00	$ 1.148.570,00	$ 1.148.570,00	-	$ -	1,00	$ 1.148.570,00	1,00	$ 1.148.570,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	5,00	$ 128.043,00	$ 640.215,00	-	$ -	5,00	$ 640.215,00	5,00	$ 640.215,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	10,00	$ 122.894,00	$ 1.228.940,00	-	$ -	7,00	$ 860.258,00	7,00	$ 860.258,00	3,00	$ 368.682,00
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	10,00	$ 140.168,00	$ 1.401.680,00	-	$ -	10,00	$ 1.401.680,00	10,00	$ 1.401.680,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	10,00	$ 94.930,00	$ 949.300,00	-	$ -	10,00	$ 949.300,00	10,00	$ 949.300,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 200 PSI (2")	UN	5,00	$ 4.065,00	$ 20.325,00	-	$ -	2,00	$ 8.130,00	2,00	$ 8.130,00	3,00	$ 12.195,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.822,20	$ 52.355,00	$ 95.401.281,00	1.511,00	$ 79.108.405,00	311,20	$ 16.292.876,00	1.822,20	$ 95.401.281,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	71,00	$ 265.183,00	$ 18.827.993,00	56,00	$ 14.850.248,00	15,00	$ 3.977.745,00	71,00	$ 18.827.993,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO AWALIBA CENTRAL	$ 1.182.138.842,00		$ 680.400.480,00		$ 93.568.347,00		$ 773.968.827,00		$ 388.168.015,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN										-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00		$ -	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00	4,28	$ 191.928,00		$ -	4,28	$ 191.928,00	0,62	$ 27.803,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.805,00	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00		$ -	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00	0,77	$ 1.733.743,00		$ -	0,77	$ 1.733.743,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00	361,38	$ 4.782.142,00		$ -	361,38	$ 4.782.142,00	100,18	$ 1.325.682,00
5.8		SOLADO LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00		$ -	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO AWALIBA CENTRAL	$ 207.356.301,00		$ 11.421.745,00		$ -		$ 11.421.745,00		$ 195.934.557,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	$ 98.753,00	$ 493.765,00		$ -	4,00	$ 395.012,00	4,00	$ 395.012,00	1,00	$ 98.753,00
6.3		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	$ 1.128.628,00	$ 4.627.375,00		$ -	3,50	$ 3.950.198,00	3,50	$ 3.950.198,00	0,60	$ 677.177,00
6.7		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	$ 1.591.805,00	$ 604.886,00		$ -	0,38	$ 604.886,00	0,38	$ 604.886,00	-	$ -
6.8		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	375,41	$ 13.233,00	$ 4.967.801,00		$ -	200,00	$ 2.646.600,00	200,00	$ 2.646.600,00	175,41	$ 2.321.201,00
6.9		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	1,00	$ 815.572,00	$ 815.572,00		$ -	1,00	$ 815.572,00	1,00	$ 815.572,00	-	$ -
6.10		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,44	$ 44.843,00	$ 19.731,00		$ -	0,40	$ 17.937,00	0,40	$ 17.937,00	0,04	$ 1.794,00
6.11		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,06	$ 1.099.773,00	$ 65.986,00		$ -	0,06	$ 65.986,00	0,06	$ 65.986,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO AWALIBA CENTRAL	$ 58.244.522,00		$ 255.460,00		$ 8.495.191,00		$ 8.751.651,00		$ 47.492.871,00
		TOTAL COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL				$ 1.795.001.801,00		$ 692.216.905,00		$ 253.648.798,00		$ 945.865.703,00		$ 849.136.099,00
COMUNIDAD PUERTO LOPEZ (6000 - 0.5L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO													
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO PTO LOPEZ	$ 144.117.911,00		$ 139.220,00		$ -		$ 139.220,00		$ 143.978.691,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	669,00	$ 4.314,00	$ 2.886.066,00	669,00	$ 2.886.066,00		$ -	669,00	$ 2.886.066,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	167,25	$ 43.398,00	$ 7.258.316,00		$ -	121,36	$ 5.267.432,00	121,36	$ 5.267.432,00	45,89	$ 1.990.883,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	54,00	$ 98.753,00	$ 5.332.662,00		$ -	39,30	$ 3.880.993,00	39,30	$ 3.880.993,00	14,70	$ 1.451.669,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	150,53	$ 189.095,00	$ 28.464.470,00		$ -	84,96	$ 16.065.511,00	84,96	$ 16.065.511,00	65,57	$ 12.398.959,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	182,70	$ 44.843,00	$ 8.192.816,00		$ -	96,43	$ 4.323.986,00	96,43	$ 4.323.986,00	86,28	$ 3.868.830,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	50,18	$ 78.793,00	$ 3.953.833,00		$ -	36,41	$ 2.869.050,00	36,41	$ 2.869.050,00	13,77	$ 1.084.783,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	57.770,11	$ 2.309,00	$ 133.391.184,00		$ -	30.206,99	$ 69.747.940,00	30.206,99	$ 69.747.940,00	27.563,12	$ 63.643.244,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	549,00	$ 23.403,00	$ 12.848.247,00		$ -	420,00	$ 9.829.260,00	420,00	$ 9.829.260,00	129,00	$ 3.018.987,00
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	4,00	$ 128.043,00	$ 512.172,00		$ -	1,00	$ 128.043,00	1,00	$ 128.043,00	3,00	$ 384.129,00

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	1,00	$ 122.894,00	$ 122.894,00		$ -	1,00	$ 122.894,00	1,00	$ 122.894,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	1,00	$ 140.168,00	$ 140.168,00		$ -	1,00	$ 140.168,00	1,00	$ 140.168,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	1,00	$ 94.930,00	$ 94.930,00		$ -	1,00	$ 94.930,00	1,00	$ 94.930,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	2,00	$ 4.065,00	$ 8.130,00		$ -	2,00	$ 8.130,00	2,00	$ 8.130,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	329,40	$ 52.355,00	$ 17.245.737,00		$ -	252,00	$ 13.193.460,00	252,00	$ 13.193.460,00	77,40	$ 4.052.277,00
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	12,00	$ 265.183,00	$ 3.182.196,00		$ -	9,00	$ 2.386.647,00	9,00	$ 2.386.647,00	3,00	$ 795.549,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PTO LOPEZ	$ 224.762.391,00		$ 2.888.066,00		$ 128.058.444,00		$ 130.944.510,00		$ 93.837.880,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN										-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00		$ -	7,44	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00		$ -	4,90	$ 219.731,00	4,90	$ 219.731,00	-	$ -
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.805,00	$ 3.231.364,00		$ -	2,03	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00		$ -	0,77	$ 1.733.743,00	0,77	$ 1.733.743,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00		$ -	180,00	$ 2.381.940,00	180,00	$ 2.381.940,00	281,56	$ 3.725.883,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00		$ -	0,68	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO PTO LOPEZ	$ 168.363.629,00		$ -		$ 9.049.346,00		$ 9.049.346,00		$ 159.314.183,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMEINTO PTO LOPEZ	$ 56.244.622,00		$ 255.460,00		$ -		$ 255.460,00		$ 55.989.062,00
		TOTAL COMUNIDAD PTO LOPEZ				$ 790.529.433,00		$ 3.280.746,00		$ 137.107.790,00		$ 140.388.536,00		$ 650.140.896,00
COMUNIDAD PUNTO GRILLO (6000 - 0.5L) (F.Z. 1,30)													-	
1	POZO PROFUNDO										-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	98,00	$ 349.024,00	$ 34.204.352,00		$ -	98,00	$ 34.204.352,00	98,00	$ 34.204.352,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	98,00	$ 134.131,00	$ 13.144.838,00		$ -	98,00	$ 13.144.838,00	98,00	$ 13.144.838,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	98,00	$ 502.845,00	$ 49.278.810,00		$ -	98,00	$ 49.278.810,00	98,00	$ 49.278.810,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	62,00	$ 320.453,00	$ 19.868.086,00		$ -	62,00	$ 19.868.086,00	62,00	$ 19.868.086,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	36,00	$ 239.462,00	$ 8.620.632,00		$ -	35,00	$ 8.381.170,00	35,00	$ 8.381.170,00	1,00	$ 239.462,00
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	5,70	$ 562.175,00	$ 3.204.398,00		$ -	5,70	$ 3.204.398,00	5,70	$ 3.204.398,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	19,60	$ 42.479,00	$ 832.588,00		$ -	19,60	$ 832.588,00	19,60	$ 832.588,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 405.516,00
					TOTAL POZO PROFUNDO PUNTO GRILLO	$ 146.734.278,00		$ 139.220,00		$ 145.950.080,00		$ 146.089.300,00		$ 644.978,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	782,00	$ 4.314,00	$ 3.373.548,00	782,00	$ 3.373.548,00		$ -	782,00	$ 3.373.548,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	195,50	$ 43.398,00	$ 8.484.309,00		$ -	181,75	$ 7.887.587,00	181,75	$ 7.887.587,00	13,75	$ 596.723,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	49,50	$ 98.753,00	$ 4.888.274,00		$ -	33,00	$ 3.258.849,00	33,00	$ 3.258.849,00	16,50	$ 1.629.425,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	175,95	$ 189.095,00	$ 33.271.265,00		$ -	127,23	$ 24.057.611,00	127,23	$ 24.057.611,00	48,73	$ 9.213.654,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	218,10	$ 44.843,00	$ 9.780.258,00		$ -	218,10	$ 9.780.258,00	218,10	$ 9.780.258,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	58,65	$ 78.793,00	$ 4.621.209,00		$ -	54,53	$ 4.296.188,00	54,53	$ 4.296.188,00	4,13	$ 325.021,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	67.300,88	$ 2.309,00	$ 155.397.732,00		$ -	42.291,05	$ 97.650.034,00	42.291,05	$ 97.650.034,00	25.009,83	$ 57.747.697,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	672,00	$ 23.403,00	$ 15.726.816,00		$ -	672,00	$ 15.726.816,00	672,00	$ 15.726.816,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	4,00	$ 128.043,00	$ 512.172,00		$ -	4,00	$ 512.172,00	4,00	$ 512.172,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	0,00	$ 122.894,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	2,00	$ 140.168,00	$ 280.336,00		$ -	2,00	$ 280.336,00	2,00	$ 280.336,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	2,00	$ 94.930,00	$ 189.860,00		$ -	2,00	$ 189.860,00	2,00	$ 189.860,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	1,00	$ 4.065,00	$ 4.065,00		$ -	1,00	$ 4.065,00	1,00	$ 4.065,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	403,20	$ 52.355,00	$ 21.109.536,00		$ -	403,20	$ 21.109.536,00	403,20	$ 21.109.536,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	11,00	$ 265.183,00	$ 2.917.013,00		$ -	11,00	$ 2.917.013,00	11,00	$ 2.917.013,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PUNTO GRILLO	$ 261.704.983,00		$ 3.373.548,00		$ 187.670.325,00		$ 191.043.873,00		$ 70.661.090,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN										-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00		$ -	7,44	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00		$ -	4,90	$ 219.731,00	4,90	$ 219.731,00	-	$ -
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.805,00	$ 3.231.364,00		$ -	2,03	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00		$ -	0,77	$ 1.733.743,00	0,77	$ 1.733.743,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00		$ -	180,00	$ 2.381.940,00	180,00	$ 2.381.940,00	281,56	$ 3.725.883,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00		$ -	0,68	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO PUNTO GRILLO	$ 168.363.629,00		$ -		$ 9.049.346,00		$ 9.049.346,00		$ 159.314.183,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO PUNTO GRILLO	$ 56.244.522,00		$ 255.460,00		$ -		$ 255.460,00		$ 55.989.062,00
		TOTAL COMUNIDAD PUNTO GRILLO				$ 830.068.372,00		$ 3.768.228,00		$ 342.669.751,00		$ 346.437.979,00		$ 483.630.393,00
COMUNIDAD SAN GIL (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)													-	
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO SAN GIL	$ 138.642.203,00		$ 139.220,00		$ -		$ 139.220,00		$ 138.502.983,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.218,00	$ 4.314,00	$ 13.882.452,00	3.218,00	$ 13.882.452,00		$ -	3.218,00	$ 13.882.452,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO SAN GIL	$ 1.026.730.240,00		$ 13.882.452,00		$ -		$ 13.882.452,00		$ 1.012.847.788,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO SAN GIL	$ 56.244.522,00		$ 255.460,00		$ -		$ 255.460,00		$ 55.989.062,00
		TOTAL COMUNIDAD SAN GIL				$ 1.646.095.154,00		$ 14.277.132,00		$ -		$ 14.277.132,00		$ 1.631.818.022,00
COMUNIDAD FACUNAE (6000 - 1L) (F.Z. 1,30)													-	
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	94,00	$ 349.024,00	$ 32.808.256,00		$ -	94,00	$ 32.808.256,00	94,00	$ 32.808.256,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	94,00	$ 134.131,00	$ 12.608.314,00		$ -	94,00	$ 12.608.314,00	94,00	$ 12.608.314,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	94,00	$ 502.845,00	$ 47.267.430,00		$ -	94,00	$ 47.267.430,00	94,00	$ 47.267.430,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO FACUNAE	$ 141.339.561,00		$ 139.220,00		$ 99.560.033,00		$ 99.699.253,00		$ 41.640.308,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	684,00	$ 4.314,00	$ 2.950.776,00	684,00	$ 2.950.776,00		$ -	684,00	$ 2.950.776,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	171,00	$ 43.398,00	$ 7.421.058,00		$ -	137,25	$ 5.956.376,00	137,25	$ 5.956.376,00	33,75	$ 1.464.683,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	103,50	$ 98.753,00	$ 10.220.936,00		$ -	57,00	$ 5.628.921,00	57,00	$ 5.628.921,00	46,50	$ 4.592.015,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	153,90	$ 189.095,00	$ 29.101.721,00		$ -	96,08	$ 18.167.302,00	96,08	$ 18.167.302,00	57,83	$ 10.934.418,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	170,70	$ 44.843,00	$ 7.654.700,00		$ -	170,70	$ 7.654.700,00	170,70	$ 7.654.700,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	51,30	$ 78.793,00	$ 4.042.081,00		$ -	41,18	$ 3.244.302,00	41,18	$ 3.244.302,00	10,13	$ 797.779,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	59.781,83	$ 2.309,00	$ 138.036.245,00		$ -	33.724,08	$ 77.868.901,00	33.724,08	$ 77.868.901,00	26.057,75	$ 60.167.345,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	454,00	$ 23.403,00	$ 10.624.962,00		$ -	454,00	$ 10.624.962,00	454,00	$ 10.624.962,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	3,00	$ 128.043,00	$ 384.129,00		$ -	3,00	$ 384.129,00	3,00	$ 384.129,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	1,00	$ 122.694,00	$ 122.694,00		$ -	1,00	$ 122.694,00	1,00	$ 122.694,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	2,00	$ 140.168,00	$ 280.336,00		$ -	2,00	$ 280.336,00	2,00	$ 280.336,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	2,00	$ 94.930,00	$ 189.860,00		$ -	2,00	$ 189.860,00	2,00	$ 189.860,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	3,00	$ 4.065,00	$ 12.195,00		$ -	3,00	$ 12.195,00	3,00	$ 12.195,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	272,40	$ 52.355,00	$ 14.261.502,00		$ -	272,40	$ 14.261.502,00	272,40	$ 14.261.502,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	23,00	$ 265.183,00	$ 6.099.209,00		$ -	19,00	$ 5.038.477,00	19,00	$ 5.038.477,00	4,00	$ 1.060.732,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO FACUNAE	$ 232.551.174,00		$ 2.950.776,00		$ 149.434.857,00		$ 152.385.633,00		$ 80.165.542,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN										-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.753,00	$ 734.722,00		$ -	7,44	$ 734.722,00	7,44	$ 734.722,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.843,00	$ 219.731,00		$ -	4,90	$ 219.731,00	4,90	$ 219.731,00	-	$ -
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.591.805,00	$ 3.231.364,00		$ -	2,03	$ 3.231.364,00	2,03	$ 3.231.364,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.251.614,00	$ 1.733.743,00		$ -	0,77	$ 1.733.743,00	0,77	$ 1.733.743,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 13.233,00	$ 6.107.823,00		$ -	180,00	$ 2.381.940,00	180,00	$ 2.381.940,00	281,56	$ 3.725.883,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.099.773,00	$ 747.846,00		$ -	0,68	$ 747.846,00	0,68	$ 747.846,00	-	$ -
					TOTAL TANQUE ELEVADO FACUNAE	$ 168.363.629,00		$ -		$ 9.049.346,00		$ 9.049.346,00		$ 159.314.183,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO FACUNAE	$ 56.244.522,00		$ 255.460,00		$ -		$ 255.460,00		$ 55.989.062,00
					TOTAL COMUNIDAD FACUNAE	$ 815.504.393,00		$ 3.345.458,00		$ 258.044.236,00		$ 261.389.692,00		$ 554.214.702,00
		TOTAL RESGUARDO AWALIBA				$ 7.787.592.161,00		$ 1.661.280.364,00		$ 991.470.676,00		$ 2.652.720.859,00		$ 5.110.241.224,00
RESGUARDO DOMOPLANAS														
COMUNIDAD OLIVOS (10.000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO OLIVOS	$ 154.397.738,00		$ 140.909,00		$ -		$ 140.909,00		$ 154.256.829,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.250,85	$ 4.347,00	$ 14.131.445,00	3.250,85	$ 14.131.445,00		$ -	3.250,85	$ 14.131.445,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO OLIVOS	$ 1.155.083.429,00		$ 14.131.445,00		$ -		$ 14.131.445,00		$ 1.140.951.984,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO OLIVOS	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD OLIVOS	$ 1.802.801.678,00		$ 14.530.561,00		$ -		$ 14.530.561,00		$ 1.788.271.117,00
COMUNIDAD PARAISO (6000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO PARAISO	$ 198.906.511,00		$ 140.909,00		$ -		$ 140.909,00		$ 198.765.602,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.606,01	$ 4.347,00	$ 11.328.325,00	2.606,01	$ 11.328.325,00		$ -	2.606,01	$ 11.328.325,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PARAISO	$ 912.843.267,00		$ 11.328.325,00		$ -		$ 11.328.325,00		$ 901.514.942,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO PARAISO	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD PARAISO	$ 1.583.569.293,00		$ 11.727.441,00		$ -		$ 11.727.441,00		$ 1.571.841.852,00
COMUNIDAD BUENAVISTA (6000 - 0,6L) (F.Z. 1,32)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.065,00	$ 140.065,00	1,00	$ 140.065,00		$ -	1,00	$ 140.065,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO BUENAVISTA	$ 154.677.969,00		$ 140.065,00		$ -		$ 140.065,00		$ 154.537.904,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	826,58	$ 4.347,00	$ 3.593.143,00	826,58	$ 3.593.143,00		$ -	826,58	$ 3.593.143,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO BUENAVISTA	$ 293.023.877,00		$ 3.593.143,00		$ -		$ 3.593.143,00		$ 289.430.734,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL							$ -					-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.328,00	$ 256.810,00	48,20	$ 256.810,00		$ -	48,20	$ 256.810,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO BUENAVISTA	$ 56.986.420,00		$ 256.810,00		$ -		$ 256.810,00		$ 56.649.610,00
					TOTAL COMUNIDAD BUENAVISTA	$ 874.933.725,00		$ 3.990.018,00		$ -		$ 3.990.018,00		$ 870.943.707,00
COMUNIDAD VILLAMARCIA (6000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00		$ -	1,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	141,00	$ 357.987,00	$ 50.476.167,00		$ -	50,00	$ 17.899.350,00	50,00	$ 17.899.350,00	91,00	$ 32.576.817,00
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	141,00	$ 136.935,00	$ 19.307.835,00		$ -	50,00	$ 6.846.750,00	50,00	$ 6.846.750,00	91,00	$ 12.461.085,00
1.5		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	141,00	$ 517.371,00	$ 72.949.311,00		$ -	50,00	$ 25.868.550,00	50,00	$ 25.868.550,00	91,00	$ 47.080.761,00
					TOTAL POZO PROFUNDO VILLAMARCIA	$ 209.336.132,00		$ 140.909,00		$ 53.574.491,00		$ 53.715.400,00		$ 155.620.732,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.225,57	$ 4.347,00	$ 9.674.553,00	2.225,57	$ 9.674.553,00		$ -	2.225,57	$ 9.674.553,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO VILLAMARCIA	$ 781.383.859,00		$ 9.674.553,00		$ -		$ 9.674.553,00		$ 771.709.306,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO VILLAMARCIA	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD VILLAMARCIA	$ 1.462.539.508,00		$ 10.073.669,00		$ 53.574.491,00		$ 63.648.160,00		$ 1.398.891.348,00
COMUNIDAD LAS BRISAS (6000 - 0,6L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO BRISAS	$ 206.070.223,00		$ 140.909,00		$ -		$ 140.909,00		$ 205.929.314,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	715,07	$ 4.347,00	$ 3.108.409,00	715,07	$ 3.108.409,00		$ -	715,07	$ 3.108.409,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO BRISAS	$ 264.195.916,00		$ 3.108.409,00		$ -		$ 3.108.409,00		$ 261.087.507,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO BRISAS	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD BRISAS	$ 902.860.144,00		$ 3.507.525,00		$ -		$ 3.507.525,00		$ 899.352.619,00
COMUNIDAD CUMARALITO (6000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO CUMARALITO	$ 213.484.201,00		$ 140.909,00		$ -		$ 140.909,00		$ 213.343.292,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.172,98	$ 4.347,00	$ 9.445.944,00	2.172,98	$ 9.445.944,00		$ -	2.172,98	$ 9.445.944,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CUMARALITO	$ 768.047.200,00		$ 9.445.944,00		$ -		$ 9.445.944,00		$ 758.601.256,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO CUMARALITO	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD CUMARALITO	$ 1.453.350.916,00		$ 9.845.060,00		$ -		$ 9.845.060,00		$ 1.443.505.856,00
COMUNIDAD YATORROBO (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO YATORROBO	$ 216.249.578,00		$ 140.909,00		$ -		$ 140.909,00		$ 216.108.669,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.846,90	$ 4.347,00	$ 8.028.474,00	1.846,90	$ 8.028.474,00		$ -	1.846,90	$ 8.028.474,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO YATORROBO	$ 659.972.629,00		$ 8.028.474,00		$ -		$ 8.028.474,00		$ 651.944.155,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO YATORROBO	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD YATORROBO	$ 1.308.816.212,00		$ 8.427.590,00		$ -		$ 8.427.590,00		$ 1.300.388.622,00

CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
N° ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMUNIDAD CERRITO (6000 - 0,6L) (F.Z. 1,34)													-	
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO CERRITO	$ 211.100.447,00		$ 140.909,00		$ -		$ 140.909,00		$ 210.959.538,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	522,06	$ 4.347,00	$ 2.269.395,00	522,06	$ 2.269.395,00		$ -	522,06	$ 2.269.395,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CERRITO	$ 201.835.702,00		$ 2.269.395,00		$ -		$ 2.269.395,00		$ 199.566.307,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO CERRITO	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD CERRITO	$ 845.530.154,00		$ 2.668.511,00		$ -		$ 2.668.511,00		$ 842.861.643,00
COMUNIDAD PUERTO GAVILAN (10.000 - 1L) (F.Z. 1,34)													-	
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
					TOTAL POZO PUERTP GAVILAN	$ 220.779.272,00		$ 140.909,00		$ -		$ 140.909,00		$ 220.638.363,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.414,74	$ 4.347,00	$ 14.843.875,00	3.414,74	$ 14.843.875,00		$ -	3.414,74	$ 14.843.875,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO GAVILAN	$ 1.207.272.924,00		$ 14.843.875,00		$ -		$ 14.843.875,00		$ 1.192.429.049,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO GAVILAN	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD GAVILAN	$ 1.921.372.707,00		$ 15.242.991,00		$ -		$ 15.242.991,00		$ 1.906.129.716,00
COMUNIDAD LAS DELICIAS (6000 - 0,6L) (F.Z. 1,34)													-	
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00		$ -	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	153,00	$ 357.987,00	$ 54.772.011,00	153,00	$ 54.772.011,00		$ -	153,00	$ 54.772.011,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	153,00	$ 136.935,00	$ 20.951.055,00	153,00	$ 20.951.055,00		$ -	153,00	$ 20.951.055,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL ESPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00		$ -	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	153,00	$ 517.371,00	$ 79.157.763,00	153,00	$ 79.157.763,00		$ -	153,00	$ 79.157.763,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	99,00	$ 327.083,00	$ 32.381.217,00	98,00	$ 32.054.134,00		$ -	98,00	$ 32.054.134,00	1,00	$ 327.083,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00	1,00	$ 3.853.671,00		$ -	1,00	$ 3.853.671,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00	1,00	$ 1.685.429,00		$ -	1,00	$ 1.685.429,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	54,00	$ 243.661,00	$ 13.157.694,00	54,00	$ 13.157.694,00		$ -	54,00	$ 13.157.694,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	9,00	$ 576.780,00	$ 5.191.020,00	8,37	$ 4.827.649,00		$ -	8,37	$ 4.827.649,00	0,63	$ 363.371,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	30,60	$ 43.532,00	$ 1.332.079,00	30,60	$ 1.332.079,00		$ -	30,60	$ 1.332.079,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00	1,00	$ 4.410.001,00		$ -	1,00	$ 4.410.001,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00	1,00	$ 452.051,00		$ -	1,00	$ 452.051,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00	1,00	$ 417.994,00		$ -	1,00	$ 417.994,00	-	$ -
					TOTAL POZO DELICIAS	$ 224.927.339,00		$ 224.236.885,00		$ -		$ 224.236.885,00		$ 690.454,00
4	REDES DE ACUEDUCTO												-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.493,19	$ 4.347,00	$ 6.490.897,00	1.493,19	$ 6.490.897,00		$ -	1.493,19	$ 6.490.897,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO DELICIAS	$ 541.649.978,00		$ 6.490.897,00		$ -		$ 6.490.897,00		$ 535.159.081,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL												-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO DELICIAS	$ 57.568.364,00		$ 258.207,00		$ -		$ 258.207,00		$ 57.310.157,00
					TOTAL COMUNIDAD DELICIAS	$ 1.199.171.322,00		$ 230.985.989,00		$ -		$ 230.985.989,00		$ 968.185.333,00
COMUNIDAD CACHAMITAS (6000 - 0,6L) (F.Z. 1,34)													-	
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 140.909,00	$ 140.909,00	1,00	$ 140.909,00		$ -	1,00	$ 140.909,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.959.841,00	$ 2.959.841,00	1,00	$ 2.959.841,00		$ -	1,00	$ 2.959.841,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	142,00	$ 357.987,00	$ 50.834.154,00	90,00	$ 32.218.830,00	52,00	$ 18.615.324,00	142,00	$ 50.834.154,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	142,00	$ 136.935,00	$ 19.444.770,00	-	$ -	142,00	$ 19.444.770,00	142,00	$ 19.444.770,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL ESPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 4.064.604,00	$ 4.064.604,00	-	$ -	1,00	$ 4.064.604,00	1,00	$ 4.064.604,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	142,00	$ 517.371,00	$ 73.466.682,00	90,00	$ 46.563.390,00	52,00	$ 26.903.292,00	142,00	$ 73.466.682,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	103,00	$ 327.083,00	$ 33.689.549,00		$ -	93,00	$ 30.418.719,00	93,00	$ 30.418.719,00	10,00	$ 3.270.830,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.853.671,00	$ 3.853.671,00		$ -	1,00	$ 3.853.671,00	1,00	$ 3.853.671,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.685.429,00	$ 1.685.429,00		$ -	1,00	$ 1.685.429,00	1,00	$ 1.685.429,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	39,00	$ 243.661,00	$ 9.502.779,00		$ -	39,00	$ 9.502.779,00	39,00	$ 9.502.779,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	8,34	$ 576.780,00	$ 4.810.345,00		$ -	8,34	$ 4.810.345,00	8,34	$ 4.810.345,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	28,40	$ 43.532,00	$ 1.236.309,00		$ -	28,40	$ 1.236.309,00	28,40	$ 1.236.309,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.410.001,00	$ 4.410.001,00		$ -	1,00	$ 4.410.001,00	1,00	$ 4.410.001,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 452.051,00	$ 452.051,00		$ -	1,00	$ 452.051,00	1,00	$ 452.051,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 417.994,00	$ 417.994,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 417.994,00

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		TOTAL POZO PROFUNDO CACHAMITAS				**$ 210.969.088,00**		**$ 81.882.970,00**		**$ 125.397.294,00**		**$ 207.280.264,00**		**$ 3.688.824,00**
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.169,03	$ 4.347,00	$ 5.081.773,00	1.169,03	$ 5.081.773,00		$ -	1.169,03	$ 5.081.773,00	-	$ -
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CACHAMITAS				**$ 429.157.409,00**		**$ 5.081.773,00**		**$ -**		**$ 5.081.773,00**		**$ 424.075.627,00**
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.357,00	$ 258.207,00	48,20	$ 258.207,00		$ -	48,20	$ 258.207,00	-	$ -
		TOTAL CERRAMIENTO CACHAMITAS				**$ 57.668.364,00**		**$ 258.207,00**		**$ -**		**$ 258.207,00**		**$ 57.310.157,00**
		TOTAL COMUNIDAD CACHAMITAS				**$ 1.072.720.493,00**		**$ 87.222.950,00**		**$ 125.397.294,00**		**$ 212.620.244,00**		**$ 860.100.249,00**
		TOTAL RESGUARDO DOMOPLANAS				**$ 14.427.666.169,00**		**$ 398.222.305,00**		**$ 178.971.788,00**		**$ 577.194.093,00**		**$ 13.850.472.080,00**
RESGUARDO WACOYO														
COMUNIDAD KALIWIRNAE (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO										-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
		TOTAL POZO PROFUNDO KALIWIRNAE				**$ 182.158.348,00**		**$ 135.845,00**		**$ -**		**$ 135.845,00**		**$ 182.022.503,00**
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	4.974,57	$ 4.250,00	$ 21.141.923,00	4.974,57	$ 21.141.923,00		$ -	4.974,57	$ 21.141.923,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	1.243,64	$ 40.727,00	$ 50.649.726,00	1.189,43	$ 48.441.916,00		$ -	1.189,43	$ 48.441.916,00	54,21	$ 2.207.811,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	193,50	$ 98.525,00	$ 19.064.588,00	128,10	$ 12.621.053,00		$ -	128,10	$ 12.621.053,00	65,40	$ 6.443.535,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	1.119,28	$ 180.167,00	$ 201.657.320,00	823,34	$ 148.338.698,00		$ -	823,34	$ 148.338.698,00	295,94	$ 53.318.622,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1.427,87	$ 44.004,00	$ 62.831.991,00	1.425,59	$ 62.731.662,00		$ -	1.425,59	$ 62.731.662,00	2,28	$ 100.329,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	373,09	$ 76.250,00	$ 28.448.113,00	356,83	$ 27.208.288,00		$ -	356,83	$ 27.208.288,00	16,26	$ 1.239.825,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	236.148,94	$ 2.309,00	$ 545.267.902,00	158.175,34	$ 365.226.869,00		$ -	158.175,34	$ 365.226.869,00	77.973,60	$ 180.041.034,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	4.544,57	$ 23.070,00	$ 104.843.230,00	4.544,22	$ 104.835.155,00		$ -	4.544,22	$ 104.835.155,00	0,35	$ 8.074,00
4.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D. 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	2,00	$ 1.077.889,00	$ 2.155.778,00	2,00	$ 2.155.778,00		$ -	2,00	$ 2.155.778,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	3,00	$ 120.164,00	$ 360.492,00	2,00	$ 240.328,00		$ -	2,00	$ 240.328,00	1,00	$ 120.164,00
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	6,00	$ 115.332,00	$ 691.992,00	6,00	$ 691.992,00		$ -	6,00	$ 691.992,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	5,00	$ 131.542,00	$ 657.710,00	5,00	$ 657.710,00		$ -	5,00	$ 657.710,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	5,00	$ 90.836,00	$ 454.180,00	5,00	$ 454.180,00		$ -	5,00	$ 454.180,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 200 PSI (2")	UN	6,00	$ 3.814,00	$ 22.884,00	5,00	$ 19.070,00		$ -	5,00	$ 19.070,00	1,00	$ 3.814,00
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	2.726,74	$ 58.518,00	$ 159.563.371,00	2.726,53	$ 159.551.083,00		$ -	2.726,53	$ 159.551.083,00	0,21	$ 12.289,00
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M. ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	43,00	$ 248.863,00	$ 10.701.109,00	43,00	$ 10.701.109,00		$ -	43,00	$ 10.701.109,00	-	$ -
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO KALIWIRNAE				**$ 1.208.512.309,00**		**$ 965.016.814,00**		**$ -**		**$ 965.016.814,00**		**$ 243.495.497,00**
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN										-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.525,00	$ 733.026,00	7,44	$ 733.026,00		$ -	7,44	$ 733.026,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	4,90	$ 44.004,00	$ 215.620,00	4,28	$ 188.337,00		$ -	4,28	$ 188.337,00	0,62	$ 27.282,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.506.465,00	$ 3.058.124,00	2,03	$ 3.058.124,00		$ -	2,03	$ 3.058.124,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.146.100,00	$ 1.652.497,00	0,77	$ 1.652.497,00		$ -	0,77	$ 1.652.497,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 12.584,00	$ 5.808.271,00	361,38	$ 4.547.606,00		$ -	361,38	$ 4.547.606,00	100,18	$ 1.260.665,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.040.548,00	$ 707.573,00	0,68	$ 707.573,00		$ -	0,68	$ 707.573,00	-	$ -
		TOTAL TANQUE ELEVADO KALIWIRNAE				**$ 197.295.146,00**		**$ 10.887.163,00**		**$ -**		**$ 10.887.163,00**		**$ 186.407.982,00**
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.186,00	$ 249.965,00	45,50	$ 235.963,00		$ -	45,50	$ 235.963,00	2,70	$ 14.002,00
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	5,00	$ 98.525,00	$ 492.625,00	4,97	$ 489.669,00		$ -	4,97	$ 489.669,00	0,03	$ 2.956,00
6.3		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20,7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60CM40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	$ 1.074.542,00	$ 4.405.622,00	3,92	$ 4.212.205,00		$ -	3,92	$ 4.212.205,00	0,18	$ 193.418,00
6.4		VIGA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,28	$ 1.614.244,00	$ 3.680.476,00	2,18	$ 3.519.052,00		$ -	2,18	$ 3.519.052,00	0,10	$ 161.424,00
6.5		COLUMNA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,19	$ 2.146.100,00	$ 407.759,00	0,19	$ 407.759,00		$ -	0,19	$ 407.759,00	-	$ -
6.6		RELLENO CON GRAVILLA	M3	1,31	$ 161.015,00	$ 210.930,00	1,31	$ 210.930,00		$ -	1,31	$ 210.930,00	-	$ -
6.7		ZAPATA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,38	$ 1.506.465,00	$ 572.457,00	0,38	$ 572.457,00		$ -	0,38	$ 572.457,00	-	$ -
6.8		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	375,41	$ 12.584,00	$ 4.724.159,00	374,22	$ 4.709.184,00		$ -	374,22	$ 4.709.184,00	1,19	$ 14.975,00
6.9		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	1,00	$ 780.751,00	$ 780.751,00	1,00	$ 780.751,00		$ -	1,00	$ 780.751,00	-	$ -
6.10		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,44	$ 44.004,00	$ 19.362,00	0,44	$ 19.362,00		$ -	0,44	$ 19.362,00	-	$ -
6.11		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,06	$ 1.004.548,00	$ 60.273,00	0,06	$ 60.273,00		$ -	0,06	$ 60.273,00	-	$ -
6.12		TUBO GALVANIZADO DE 2" (L= 2 M, E = 1,5 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	298,00	$ 116.767,00	$ 34.796.566,00	298,00	$ 34.796.566,00		$ -	298,00	$ 34.796.566,00	-	$ -
		TOTAL CERRAMIENTO KALIWIRNAE				**$ 53.593.681,00**		**$ 50.014.171,00**		**$ -**		**$ 50.014.171,00**		**$ 3.579.511,00**
		TOTAL COMUNIDAD KALIWIRNAE				**$ 1.846.191.004,00**		**$ 1.026.053.993,00**		**$ -**		**$ 1.026.053.993,00**		**$ 820.137.013,00**
COMUNIDAD ESMERALDA WALABO (20.000 - 2L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO										-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.729.257,00	$ 2.729.257,00	1,00	$ 2.729.257,00		$ -	1,00	$ 2.729.257,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	120,00	$ 331.099,00	$ 39.731.880,00	75,00	$ 24.832.425,00	45,00	$ 14.899.455,00	120,00	$ 39.731.880,00	-	$ -

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	120,00	$ 128.520,00	$ 15.422.400,00	-	$ -	120,00	$ 15.422.400,00	120,00	$ 15.422.400,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL ESPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.849.951,00	$ 3.849.951,00	-	$ -	1,00	$ 3.849.951,00	1,00	$ 3.849.951,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	120,00	$ 473.791,00	$ 56.854.920,00	75,00	$ 35.534.325,00	45,00	$ 21.320.595,00	120,00	$ 56.854.920,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.590.564,00	$ 3.590.564,00		$ -	1,00	$ 3.590.564,00	1,00	$ 3.590.564,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.633.978,00	$ 1.633.978,00		$ -	1,00	$ 1.633.978,00	1,00	$ 1.633.978,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	7,02	$ 532.866,00	$ 3.741.421,00		$ -	7,02	$ 3.741.421,00	7,02	$ 3.741.421,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	24,00	$ 40.372,00	$ 968.928,00		$ -	24,00	$ 968.928,00	24,00	$ 968.928,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.028.724,00	$ 4.028.724,00		$ -	1,00	$ 4.028.724,00	1,00	$ 4.028.724,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 423.843,00	$ 423.843,00		$ -	1,00	$ 423.843,00	1,00	$ 423.843,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 380.561,00	$ 380.561,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 380.561,00
		TOTAL POZO PROFUNDO ESMERALDA WALABO				$ 168.376.692,00		$ 63.231.852,00		$ 69.879.859,00		$ 133.111.711,00		$ 35.263.981,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.888,98	$ 4.250,00	$ 16.528.165,00	3.888,98	$ 16.526.165,00		$ -	3.888,98	$ 16.528.165,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	972,25	$ 40.727,00	$ 39.596.826,00	698,08	$ 28.430.704,00	148,92	$ 6.065.065,00	847,00	$ 34.495.769,00	125,25	$ 5.101.057,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	400,50	$ 98.525,00	$ 39.459.263,00	213,00	$ 20.985.825,00	21,00	$ 2.069.025,00	234,00	$ 23.054.850,00	166,50	$ 16.404.413,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	675,02	$ 180.167,00	$ 157.649.728,00	483,63	$ 87.134.166,00	109,44	$ 19.717.476,00	593,07	$ 106.851.643,00	281,95	$ 50.798.086,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1.033,19	$ 44.004,00	$ 45.464.493,00	977,32	$ 43.005.989,00	55,87	$ 2.458.503,00	1.033,19	$ 45.464.493,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	291,67	$ 76.250,00	$ 22.239.838,00	220,42	$ 16.807.025,00	33,75	$ 2.573.438,00	254,17	$ 19.380.463,00	37,50	$ 2.859.375,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	188.698,96	$ 2.309,00	$ 435.705.899,00	83.659,65	$ 193.170.135,00	19.054,57	$ 43.997.002,00	102.714,22	$ 237.167.137,00	85.984,74	$ 198.538.762,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	2.998,98	$ 23.070,00	$ 69.186.469,00	2.437,33	$ 56.229.203,00	561,65	$ 12.957.266,00	2.998,98	$ 69.186.469,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	3,00	$ 120.164,00	$ 360.492,00	-	$ -	3,00	$ 360.492,00	3,00	$ 360.492,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	5,00	$ 115.332,00	$ 576.660,00	-	$ -	5,00	$ 576.660,00	5,00	$ 576.660,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	14,00	$ 131.542,00	$ 1.841.588,00	-	$ -	14,00	$ 1.841.588,00	14,00	$ 1.841.588,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	15,00	$ 90.836,00	$ 1.362.540,00	-	$ -	15,00	$ 1.362.540,00	15,00	$ 1.362.540,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	3,00	$ 3.814,00	$ 11.442,00	-	$ -	3,00	$ 11.442,00	3,00	$ 11.442,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.799,39	$ 58.518,00	$ 105.296.704,00	1.462,40	$ 85.576.723,00	336,99	$ 19.719.981,00	1.799,39	$ 105.296.704,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	89,00	$ 248.863,00	$ 22.146.807,00	71,00	$ 17.669.273,00	7,00	$ 1.742.041,00	78,00	$ 19.411.314,00	11,00	$ 2.737.493,00
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO ESMERALDA WALABO				$ 963.896.248,00		$ 565.537.208,00		$ 115.452.619,00		$ 680.989.729,00		$ 282.906.520,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	54,20	$ 5.186,00	$ 281.081,00	54,20	$ 281.081,00		$ -	54,20	$ 281.081,00	-	$ -
		TOTAL CERRAMIENTO ESMERALDA WALABO				$ 69.938.842,00		$ 281.081,00		$ -		$ 281.081,00		$ 69.657.761,00
		TOTAL COMUNIDAD ESMERALDA WALABO				$ 1.762.980.235,00		$ 629.050.141,00		$ 185.332.378,00		$ 814.382.521,00		$ 948.597.715,00
COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO										-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
		TOTAL POZO PROFUNDO PALOGRANDE WALABO				$ 165.814.387,00		$ 135.845,00		$ -		$ 135.845,00		$ 165.678.542,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.709,38	$ 4.250,00	$ 11.514.865,00	2.709,38	$ 11.514.865,00		$ -	2.709,38	$ 11.514.865,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	677,35	$ 40.727,00	$ 27.588.433,00		$ -	571,10	$ 23.258.986,00	571,10	$ 23.258.986,00	106,26	$ 4.327.447,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	342,00	$ 98.525,00	$ 33.695.550,00		$ -	201,00	$ 19.803.525,00	201,00	$ 19.803.525,00	141,00	$ 13.892.025,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	609,61	$ 180.167,00	$ 109.831.605,00		$ -	399,77	$ 72.024.461,00	399,77	$ 72.024.461,00	209,85	$ 37.807.144,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	698,81	$ 44.004,00	$ 30.750.435,00		$ -	698,81	$ 30.750.435,00	698,81	$ 30.750.435,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	203,20	$ 76.250,00	$ 15.494.000,00		$ -	171,33	$ 13.063.798,00	171,33	$ 13.063.798,00	31,87	$ 2.430.202,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	132.936,32	$ 2.309,00	$ 306.949.963,00		$ -	70.819,80	$ 163.522.918,00	70.819,80	$ 163.522.918,00	62.116,52	$ 143.427.045,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	1.949,38	$ 23.070,00	$ 44.972.197,00		$ -	1.949,38	$ 44.972.197,00	1.949,38	$ 44.972.197,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	5,00	$ 120.164,00	$ 600.820,00		$ -	5,00	$ 600.820,00	5,00	$ 600.820,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	8,00	$ 115.332,00	$ 922.656,00		$ -	8,00	$ 922.656,00	8,00	$ 922.656,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	6,00	$ 131.542,00	$ 789.252,00		$ -	6,00	$ 789.252,00	6,00	$ 789.252,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	10,00	$ 90.836,00	$ 908.360,00		$ -	10,00	$ 908.360,00	10,00	$ 908.360,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	3,00	$ 3.814,00	$ 11.442,00		$ -	3,00	$ 11.442,00	3,00	$ 11.442,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.169,63	$ 58.518,00	$ 68.444.408,00		$ -	1.169,63	$ 68.444.291,00	1.169,63	$ 68.444.291,00	0,00	$ 117,00
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	76,00	$ 248.863,00	$ 18.913.588,00		$ -	67,00	$ 16.673.821,00	67,00	$ 16.673.821,00	9,00	$ 2.239.767,00
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PALOGRANDE WALABO				$ 676.776.019,00		$ 11.514.865,00		$ 455.746.982,00		$ 467.261.827,00		$ 209.513.192,00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN										-		-	
5.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE	M3	7,44	$ 98.525,00	$ 733.026,00	7,44	$ 733.026,00		$ -	7,44	$ 733.026,00	-	$ -
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	4,90	$ 44.004,00	$ 215.620,00	4,28	$ 188.337,00		$ -	4,28	$ 188.337,00	0,62	$ 27.282,00
5.5		ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,03	$ 1.506.465,00	$ 3.058.124,00	2,03	$ 3.058.124,00		$ -	2,03	$ 3.058.124,00	-	$ -
5.6		COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.146.100,00	$ 1.652.497,00	0,77	$ 1.652.497,00		$ -	0,77	$ 1.652.497,00	-	$ -
5.7		ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	M3	461,56	$ 12.584,00	$ 5.808.271,00	361,38	$ 4.547.606,00		$ -	361,38	$ 4.547.606,00	100,18	$ 1.260.665,00
5.8		SOLADO,LIMPIEZA CONCRETO 13,8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,68	$ 1.040.548,00	$ 707.573,00	0,68	$ 707.573,00		$ -	0,68	$ 707.573,00	-	$ -
		TOTAL TANQUE ELEVADO PALOGRANDE WALABO				$ 197.295.146,00		$ 10.887.163,00		$ -		$ 10.887.163,00		$ 186.407.982,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.186,00	$ 249.965,00	48,20	$ 249.965,00		$ -	48,20	$ 249.965,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO PALOGRANDE WALABO	$ 53.593.681,00		$ 249.965,00		$ -		$ 249.965,00		$ 53.343.716,00
					TOTAL COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO	$ 1.298.122.488,00		$ 22.787.838,00		$ 455.746.952,00		$ 478.534.800,00		$ 819.587.685,00
COMUNIDAD LA UNIÓN (6000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
					TOTALPOZO PROFUNDO LA UNIÓN	$ 193.608.090,00		$ 135.845,00		$ -		$ 135.845,00		$ 193.472.245,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.059,52	$ 4.250,00	$ 4.502.960,00	1.059,52	$ 4.502.960,00		$ -	1.059,52	$ 4.502.960,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	264,88	$ 40.727,00	$ 10.787.768,00		$ -	228,63	$ 9.311.414,00	228,63	$ 9.311.414,00	36,25	$ 1.476.354,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	126,00	$ 98.525,00	$ 12.414.150,00		$ -	81,00	$ 7.980.525,00	81,00	$ 7.980.525,00	45,00	$ 4.433.625,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	238,39	$ 180.167,00	$ 42.950.011,00		$ -	195,05	$ 35.140.673,00	195,05	$ 35.140.673,00	43,35	$ 7.809.339,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	275,86	$ 44.004,00	$ 12.138.943,00		$ -	275,86	$ 12.138.943,00	275,86	$ 12.138.943,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	79,46	$ 76.250,00	$ 6.058.825,00		$ -	68,59	$ 5.229.606,00	68,59	$ 5.229.606,00	10,88	$ 829.219,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	54.943,00	$ 2.309,00	$ 126.863.387,00		$ -	36.620,92	$ 84.557.704,00	36.620,92	$ 84.557.704,00	18.322,08	$ 42.305.683,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	779,52	$ 23.070,00	$ 17.983.526,00		$ -	779,52	$ 17.983.526,00	779,52	$ 17.983.526,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	1,00	$ 120.164,00	$ 120.164,00		$ -	1,00	$ 120.164,00	1,00	$ 120.164,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	0,00	$ 115.332,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	4,00	$ 131.542,00	$ 526.168,00		$ -	4,00	$ 526.168,00	4,00	$ 526.168,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	4,00	$ 90.836,00	$ 363.344,00		$ -	4,00	$ 363.344,00	4,00	$ 363.344,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	5,00	$ 3.814,00	$ 19.070,00		$ -	5,00	$ 19.070,00	5,00	$ 19.070,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	467,71	$ 58.518,00	$ 27.369.454,00		$ -	467,71	$ 27.369.454,00	467,71	$ 27.369.454,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	28,00	$ 248.863,00	$ 6.968.164,00		$ -	27,00	$ 6.719.301,00	27,00	$ 6.719.301,00	1,00	$ 248.863,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA UNIÓN	$ 271.221.712,00		$ 4.502.960,00		$ 207.459.892,00		$ 211.962.852,00		$ 59.258.861,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.186,00	$ 249.965,00	48,20	$ 249.965,00		$ -	48,20	$ 249.965,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO LA UNION	$ 53.593.681,00		$ 249.965,00		$ -		$ 249.965,00		$ 53.343.716,00
					TOTAL COMUNIDAD LA UNION	$ 883.474.081,00		$ 4.888.770,00		$ 207.459.892,00		$ 212.348.662,00		$ 671.125.420,00
COMUNIDAD PUNTO GRILLO (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO												-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO PUNTO GRILLO	$ 197.373.916,00		$ 135.845,00		$ -		$ 135.845,00		$ 197.238.071,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.951,87	$ 4.250,00	$ 8.295.448,00	1.951,87	$ 8.295.448,00		$ -	1.951,87	$ 8.295.448,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	487,97	$ 40.727,00	$ 19.873.554,00		$ -	386,72	$ 15.749.945,00	386,72	$ 15.749.945,00	101,25	$ 4.123.609,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	274,50	$ 98.525,00	$ 27.045.113,00		$ -	123,00	$ 12.118.575,00	123,00	$ 12.118.575,00	151,50	$ 14.926.538,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	439,17	$ 180.167,00	$ 79.123.941,00		$ -	234,83	$ 42.308.617,00	234,83	$ 42.308.617,00	204,34	$ 36.815.325,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	494,06	$ 44.004,00	$ 21.740.616,00		$ -	270,75	$ 11.913.863,00	270,75	$ 11.913.863,00	223,32	$ 9.826.753,00
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	146,39	$ 76.250,00	$ 11.162.238,00		$ -	116,02	$ 8.846.144,00	116,02	$ 8.846.144,00	30,38	$ 2.316.094,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	98.683,66	$ 2.309,00	$ 227.860.571,00		$ -	44.800,50	$ 103.444.355,00	44.800,50	$ 103.444.355,00	53.883,16	$ 124.416.216,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	1.341,87	$ 23.070,00	$ 30.956.941,00		$ -	1.341,87	$ 30.956.941,00	1.341,87	$ 30.956.941,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	4,00	$ 120.164,00	$ 480.656,00		$ -	4,00	$ 480.656,00	4,00	$ 480.656,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	1,00	$ 115.332,00	$ 115.332,00		$ -	1,00	$ 115.332,00	1,00	$ 115.332,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	5,00	$ 131.542,00	$ 657.710,00		$ -	5,00	$ 657.710,00	5,00	$ 657.710,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	5,00	$ 90.836,00	$ 454.180,00		$ -	5,00	$ 454.180,00	5,00	$ 454.180,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	2,00	$ 3.814,00	$ 7.628,00		$ -	2,00	$ 7.628,00	2,00	$ 7.628,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	61,00	$ 248.863,00	$ 15.180.643,00		$ -	41,00	$ 10.203.383,00	41,00	$ 10.203.383,00	20,00	$ 4.977.260,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PUNTO GRILLO	$ 492.224.351,00		$ 8.295.448,00		$ 237.257.329,00		$ 245.552.777,00		$ 246.671.585,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.186,00	$ 249.965,00	48,20	$ 249.965,00		$ -	48,20	$ 249.965,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO PUNTO GRILLO	$ 53.593.681,00		$ 249.965,00		$ -		$ 249.965,00		$ 53.343.716,00
					TOTAL COMUNIDAD PUNTO GRILLO	$ 1.145.118.624,00		$ 8.681.258,00		$ 237.257.329,00		$ 245.938.587,00		$ 899.180.038,00
COMUNIDAD ALGARROBO (6000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO										-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO ALGARROBO	$ 197.373.916,00		$ 135.845,00		$ -		$ 135.845,00		$ 197.238.071,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.362,75	$ 4.250,00	$ 10.041.688,00	2.362,75	$ 10.041.688,00		$ -	2.362,75	$ 10.041.688,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO ALGARROBO	$ 593.296.357,00		$ 10.041.688,00		$ -		$ 10.041.688,00		$ 583.254.669,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.186,00	$ 249.965,00	48,20	$ 249.965,00		$ -	48,20	$ 249.965,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO ALGARROBO	$ 53.593.681,00		$ 249.965,00		$ -		$ 249.965,00		$ 53.343.716,00
					TOTAL COMUNIDAD ALGARROBO	$ 1.226.615.087,00		$ 10.427.498,00		$ -		$ 10.427.498,00		$ 1.216.187.589,00
COMUNIDAD MATAPALITO (6000 - 1L) (F.Z. 1,24)														
1	POZO PROFUNDO										-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 136.689,00	$ 136.689,00	1,00	$ 136.689,00		$ -	1,00	$ 136.689,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO MATAPALITO	$ 185.770.710,00		$ 136.689,00		$ -		$ 136.689,00		$ 185.634.021,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.976,40	$ 4.266,00	$ 12.697.322,00	2.976,40	$ 12.697.322,00		$ -	2.976,40	$ 12.697.322,00	-	$ -
4.2		RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3	744,10	$ 41.395,00	$ 30.802.020,00		$ -	695,35	$ 28.784.013,00	695,35	$ 28.784.013,00	48,75	$ 2.018.006,00
4.3		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	144,00	$ 98.582,00	$ 14.195.808,00		$ -	75,00	$ 7.393.650,00	75,00	$ 7.393.650,00	69,00	$ 6.802.158,00
4.4		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	669,69	$ 182.399,00	$ 122.150.766,00		$ -	486,75	$ 88.781.801,00	486,75	$ 88.781.801,00	182,95	$ 33.368.965,00
4.5		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	844,92	$ 44.214,00	$ 37.357.293,00		$ -	844,92	$ 37.357.293,00	844,92	$ 37.357.293,00	-	$ -
4.6		RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	M3	223,23	$ 76.885,00	$ 17.163.039,00		$ -	208,61	$ 16.038.595,00	208,61	$ 16.038.595,00	14,63	$ 1.124.443,00
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	158.431,66	$ 2.309,00	$ 365.818.703,00		$ -	92.615,89	$ 213.850.090,00	92.615,89	$ 213.850.090,00	65.815,77	$ 151.968.613,00
4.8		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	ML	2.656,40	$ 23.153,00	$ 61.503.629,00		$ -	2.656,40	$ 61.503.629,00	2.656,40	$ 61.503.629,00	-	$ -
4.10		CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	3,00	$ 122.134,00	$ 366.402,00		$ -	3,00	$ 366.402,00	3,00	$ 366.402,00	-	$ -
4.11		CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UN	8,00	$ 117.223,00	$ 937.784,00		$ -	8,00	$ 937.784,00	8,00	$ 937.784,00	-	$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2)	UN	4,00	$ 133.698,00	$ 534.792,00		$ -	4,00	$ 534.792,00	4,00	$ 534.792,00	-	$ -
4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN	UN	6,00	$ 91.859,00	$ 551.154,00		$ -	6,00	$ 551.154,00	6,00	$ 551.154,00	-	$ -
4.14		TAPON EN PVC- PRESION TRABAJO 280 PSI (2")	UN	3,00	$ 3.877,00	$ 11.631,00		$ -	3,00	$ 11.631,00	3,00	$ 11.631,00	-	$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	1.593,84	$ 50.020,00	$ 79.723.877,00		$ -	1.593,84	$ 79.723.877,00	1.593,84	$ 79.723.877,00	-	$ -
4.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	32,00	$ 252.843,00	$ 8.090.176,00		$ -	25,00	$ 6.323.575,00	25,00	$ 6.323.575,00	7,00	$ 1.770.601,00
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO MATAPALITO	$ 754.099.534,00		$ 12.697.322,00		$ 542.158.286,00		$ 554.855.608,00		$ 199.243.924,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.214,00	$ 251.315,00	48,20	$ 251.315,00		$ -	48,20	$ 251.315,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO MATAPALITO	$ 64.257.743,00		$ 251.315,00		$ -		$ 251.315,00		$ 64.006.428,00
					TOTAL COMUNIDAD MATAPALITO	$ 1.364.283.515,00		$ 13.085.326,00		$ 542.158.286,00		$ 555.243.612,00		$ 809.038.901,00
COMUNIDAD LA PORFIA (10.000 - 1L) (F.Z. 1,24)														
1	POZO PROFUNDO										-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 136.689,00	$ 136.689,00	1,00	$ 136.689,00		$ -	1,00	$ 136.689,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.767.688,00	$ 2.767.688,00	1,00	$ 2.767.688,00		$ -	1,00	$ 2.767.688,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	100,00	$ 335.580,00	$ 33.558.000,00	100,00	$ 33.558.000,00		$ -	100,00	$ 33.558.000,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	100,00	$ 129.923,00	$ 12.992.300,00	100,00	$ 12.992.300,00		$ -	100,00	$ 12.992.300,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.885.726,00	$ 3.885.726,00	1,00	$ 3.885.726,00		$ -	1,00	$ 3.885.726,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	100,00	$ 481.054,00	$ 48.105.400,00	100,00	$ 48.105.400,00		$ -	100,00	$ 48.105.400,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	72,00	$ 310.506,00	$ 22.356.432,00	69,00	$ 21.424.914,00		$ -	69,00	$ 21.424.914,00	3,00	$ 931.518,00
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.634.415,00	$ 3.634.415,00	1,00	$ 3.634.415,00		$ -	1,00	$ 3.634.415,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.642.554,00	$ 1.642.554,00	1,00	$ 1.642.554,00		$ -	1,00	$ 1.642.554,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	28,00	$ 233.161,00	$ 6.528.508,00	28,00	$ 6.528.508,00		$ -	28,00	$ 6.528.508,00	-	$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS	M3	5,82	$ 540.267,00	$ 3.144.354,00	5,48	$ 2.960.663,00		$ -	5,48	$ 2.960.663,00	0,34	$ 183.691,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	20,00	$ 40.899,00	$ 817.980,00	20,00	$ 817.980,00		$ -	20,00	$ 817.980,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.092.271,00	$ 4.092.271,00	1,00	$ 4.092.271,00		$ -	1,00	$ 4.092.271,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 428.545,00	$ 428.545,00	1,00	$ 428.545,00		$ -	1,00	$ 428.545,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 386.800,00	$ 386.800,00	1,00	$ 386.800,00		$ -	1,00	$ 386.800,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO LA PORFIA	$ 144.477.662,00		$ 143.362.453,00		$ -		$ 143.362.453,00		$ 1.115.209,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.649,56	$ 4.266,00	$ 11.303.023,00	2.649,56	$ 11.303.023,00		$ -	2.649,56	$ 11.303.023,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA PORFIA	$ 677.757.897,00		$ 11.303.023,00		$ -		$ 11.303.023,00		$ 666.454.874,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.214,00	$ 251.315,00	48,20	$ 251.315,00		$ -	48,20	$ 251.315,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO PORFIA	$ 64.257.743,00		$ 251.315,00		$ -		$ 251.315,00		$ 64.006.428,00
					TOTAL COMUNIDAD PORFIA	$ 1.284.058.238,00		$ 154.916.791,00		$ -		$ 154.916.791,00		$ 1.129.141.445,00
COMUNIDAD LA CAIMANA (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
1	POZO PROFUNDO										-		-	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 135.845,00	$ 135.845,00	1,00	$ 135.845,00		$ -	1,00	$ 135.845,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.729.257,00	$ 2.729.257,00	1,00	$ 2.729.257,00		$ -	1,00	$ 2.729.257,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	137,00	$ 331.099,00	$ 45.360.563,00	137,00	$ 45.360.563,00		$ -	137,00	$ 45.360.563,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	137,00	$ 128.520,00	$ 17.607.240,00	15,27	$ 1.962.500,00		$ -	15,27	$ 1.962.500,00	121,73	$ 15.644.740,00
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	137,00	$ 473.791,00	$ 64.909.367,00	137,00	$ 64.909.367,00		$ -	137,00	$ 64.909.367,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO LA CAIMANA	$ 189.690.083,00		$ 115.097.532,00		$ -		$ 115.097.532,00		$ 74.592.471,00
4	REDES DE ACUEDUCTO										-		-	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.393,74	$ 4.250,00	$ 14.423.395,00	3.393,74	$ 14.423.395,00		$ -	3.393,74	$ 14.423.395,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA CAIMANA	$ 843.986.238,00		$ 14.423.395,00		$ -		$ 14.423.395,00		$ 829.562.843,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL										-		-	
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.166,00	$ 249.965,00	48,20	$ 249.965,00		$ -	48,20	$ 249.965,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO LA CAIMANA	$ 53.593.681,00		$ 249.965,00		$ -		$ 249.965,00		$ 53.343.716,00
					TOTAL COMUNIDAD LA CAIMANA	$ 1.489.198.588,00		$ 129.770.892,00		$ -		$ 129.770.892,00		$ 1.359.425.696,00
					TOTAL RESGUARDO WACOYO	$ 12.400.039.850,00		$ 1.999.852.607,00		$ 1.627.934.847,00		$ 3.627.617.356,00		$ 8.672.422.502,00
RESGUARDO ASEINPOME														
COMUNIDAD KEKO ASEINPOME (8.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO										-		-	

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	114,00	$ 349.024,00	$ 39.788.736,00	114,00	$ 39.788.736,00		$ -	114,00	$ 39.788.736,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	114,00	$ 134.131,00	$ 15.290.934,00	114,00	$ 15.290.934,00		$ -	114,00	$ 15.290.934,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	114,00	$ 502.845,00	$ 57.324.330,00	114,00	$ 57.324.330,00		$ -	114,00	$ 57.324.330,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	84,00	$ 320.453,00	$ 26.918.052,00	84,00	$ 26.918.052,00		$ -	84,00	$ 26.918.052,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	30,00	$ 239.462,00	$ 7.183.860,00	27,00	$ 6.465.474,00		$ -	27,00	$ 6.465.474,00	3,00	$ 718.386,00
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	6,66	$ 562.175,00	$ 3.744.086,00	6,24	$ 3.507.972,00		$ -	6,24	$ 3.507.972,00	0,42	$ 236.114,00
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	22,80	$ 42.479,00	$ 968.521,00	22,80	$ 968.521,00		$ -	22,80	$ 968.521,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00	1,00	$ 405.516,00		$ -	1,00	$ 405.516,00	-	$ -
					TOTAL POZO PROFUNDO KEKO A SEINPOME	$ 168.799.093,00		$ 167.844.593,00		$ -		$ 167.844.593,00		$ 954.500,00
4	REDES DE ACUEDUCTO													
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	4.808,36	$ 4.314,00	$ 20.743.265,00	4.808,36	$ 20.743.265,00		$ -	4.808,36	$ 20.743.265,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO KEKO A SEINPOME	$ 1.651.193.630,00		$ 20.743.265,00		$ -		$ 20.743.265,00		$ 1.630.450.365,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL													
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO KEKO A SEINPOME	$ 56.244.622,00		$ 255.460,00		$ -		$ 255.460,00		$ 55.989.062,00
					TOTAL COMUNIDADKEKO A SEINPOME	$ 2.279.965.059,00		$ 188.843.318,00		$ -		$ 188.843.318,00		$ 2.091.121.741,00
COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
1	POZO PROFUNDO													
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	$ 139.220,00	$ 139.220,00	1,00	$ 139.220,00		$ -	1,00	$ 139.220,00	-	$ -
1.2		INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	$ 2.882.980,00	$ 2.882.980,00		$ -	1,00	$ 2.882.980,00	1,00	$ 2.882.980,00	-	$ -
1.3		PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	118,00	$ 349.024,00	$ 41.184.832,00		$ -	118,00	$ 41.184.832,00	118,00	$ 41.184.832,00	-	$ -
1.4		ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	ML	118,00	$ 134.131,00	$ 15.827.458,00		$ -	118,00	$ 15.827.458,00	118,00	$ 15.827.458,00	-	$ -
1.5		EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	UND	1,00	$ 3.993.053,00	$ 3.993.053,00		$ -	1,00	$ 3.993.053,00	1,00	$ 3.993.053,00	-	$ -
1.6		AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	118,00	$ 502.845,00	$ 59.335.710,00		$ -	118,00	$ 59.335.710,00	118,00	$ 59.335.710,00	-	$ -
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	ML	83,00	$ 320.453,00	$ 26.597.599,00		$ -	83,00	$ 26.597.599,00	83,00	$ 26.597.599,00	-	$ -
1.8		AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1,00	$ 3.765.969,00	$ 3.765.969,00		$ -	1,00	$ 3.765.969,00	1,00	$ 3.765.969,00	-	$ -
1.9		CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	1,00	$ 1.668.279,00	$ 1.668.279,00		$ -	1,00	$ 1.668.279,00	1,00	$ 1.668.279,00	-	$ -
1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION	ML	35,00	$ 239.462,00	$ 8.381.170,00		$ -	31,00	$ 7.423.322,00	31,00	$ 7.423.322,00	4,00	$ 957.848,00
1.11		SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	M3	6,90	$ 562.175,00	$ 3.879.008,00		$ -	6,90	$ 3.879.008,00	6,90	$ 3.879.008,00	-	$ -
1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	23,60	$ 42.479,00	$ 1.002.504,00		$ -	23,60	$ 1.002.504,00	23,60	$ 1.002.504,00	-	$ -
1.13		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	1,00	$ 4.282.909,00	$ 4.282.909,00		$ -	1,00	$ 4.282.909,00	1,00	$ 4.282.909,00	-	$ -
1.14		DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	1,00	$ 442.648,00	$ 442.648,00		$ -	1,00	$ 442.648,00	1,00	$ 442.648,00	-	$ -
1.15		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA	UND	1,00	$ 405.516,00	$ 405.516,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 405.516,00
					TOTAL POZO PROFUNDO SIETE RODRIGUEZ	$ 173.788.855,00		$ 139.220,00		$ 172.286.271,00		$ 172.425.491,00		$ 1.363.364,00
4	REDES DE ACUEDUCTO													
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.833,86	$ 4.314,00	$ 7.911.272,00	1.833,86	$ 7.911.272,00		$ -	1.833,86	$ 7.911.272,00	-	$ -
					TOTAL REDES DE ACUEDUCTO SIETE RODRIGUEZ	$ 688.518.602,00		$ 7.911.272,00		$ -		$ 7.911.272,00		$ 680.607.330,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL													
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	48,20	$ 5.300,00	$ 255.460,00	48,20	$ 255.460,00		$ -	48,20	$ 255.460,00	-	$ -
					TOTAL CERRAMIENTO SIETE RODRIGUEZ	$ 56.244.622,00		$ 255.460,00		$ -		$ 255.460,00		$ 55.989.062,00
					TOTAL COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ	$ 1.243.139.969,00		$ 8.305.952,00		$ 172.286.271,00		$ 180.592.223,00		$ 1.062.548.746,00
					TOTAL RESGUARDO ASEINPOME	$ 3.523.104.028,00		$ 197.149.270,00		$ 172.286.271,00		$ 369.435.541,00		$ 3.153.668.487,00
					SUB TOTAL DE OBRA (INCLUYE AIU)	$ 38.013.772.215,00		$ 4.246.284.464,00		$ 2.970.883.478,00		$ 7.216.967.944,00		$ 30.796.804.273,00
					COSTOS DIRECTOS OBRA (SIN AIU)	$ 28.368.486.727,61		$ 3.188.869.002,88		$ 2.216.927.966,68		$ 5.385.796.973,13		$ 22.982.689.755,97
SUMINISTROS														
RESGUARDO AWALIBA														
COMUNIDAD MAKAPAY (6000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	3.890,25	$ 78.548,00	$ 305.571.357,00	3.542,36	$ 278.245.293,00		$ -	3.542,36	$ 278.245.293,00	347,89	$ 27.326.064,00
COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	3.037,00	$ 78.548,00	$ 238.550.276,00	2.518,34	$ 197.810.570,00	518,66	$ 40.739.706,00	3.037,00	$ 238.550.276,00	-	$ -
COMUNIDAD PUERTO LOPEZ (6000 - 0.5L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	549,00	$ 78.548,00	$ 43.122.852,00	274,50	$ 21.561.426,00	145,50	$ 11.428.734,00	420,00	$ 32.990.160,00	129,00	$ 10.132.692,00
COMUNIDAD PUNTO GRILLO (6000 - 0.5L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	672,00	$ 78.548,00	$ 52.784.256,00	336,00	$ 26.392.128,00	336,00	$ 26.392.128,00	672,00	$ 52.784.256,00	-	$ -
COMUNIDAD SAN GIL (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.908,00	$ 78.548,00	$ 228.417.584,00	1.134,00	$ 89.073.432,00		$ -	1.134,00	$ 89.073.432,00	1.774,00	$ 139.344.152,00
COMUNIDAD FACUNAE (6000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	454,00	$ 78.548,00	$ 35.660.792,00	227,00	$ 17.830.396,00	227,00	$ 17.830.396,00	454,00	$ 35.660.792,00	-	$ -
		TOTAL SUMINISTRO AWALIBA				$ 904.107.117,00		$ 630.913.245,00		$ 96.390.964,00		$ 727.304.209,00		$ 176.802.908,00

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO(01-12-2025 AL 31-12-2025)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
RESGUARDO DOMOPLANAS														
COMUNIDAD OLIVOS (10.000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.840,85	$ 80.965,00	$ 230.009.420,00	1.983,00	$ 160.553.190,00		$ -	1.983,00	$ 160.553.190,00	857,86	$ 69.456.230,00
COMUNIDAD PARAISO (6000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.296,01	$ 80.965,00	$ 185.896.450,00	1.577,14	$ 127.693.140,00		$ -	1.577,14	$ 127.693.140,00	718,87	$ 58.203.310,00
COMUNIDAD BUENAVISTA (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,32)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	676,58	$ 79.756,00	$ 53.961.314,00	407,84	$ 32.527.687,00		$ -	407,84	$ 32.527.687,00	268,74	$ 21.433.627,00
COMUNIDAD VILLAMARCIA (6000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.955,57	$ 80.965,00	$ 158.332.725,00	1.348,46	$ 109.178.064,00		$ -	1.348,46	$ 109.178.064,00	607,11	$ 49.154.661,00
COMUNIDAD LAS BRISAS (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	595,07	$ 80.965,00	$ 48.179.843,00	277,79	$ 22.491.267,00		$ -	277,79	$ 22.491.267,00	317,28	$ 25.688.575,00
COMUNIDAD CUMARALITO (6000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.892,98	$ 80.965,00	$ 153.265.126,00	1.374,21	$ 111.262.913,00		$ -	1.374,21	$ 111.262.913,00	518,77	$ 42.002.213,00
COMUNIDAD YATORROBO (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.686,90	$ 80.965,00	$ 136.579.859,00	1.094,37	$ 88.605.667,00		$ -	1.094,37	$ 88.605.667,00	592,53	$ 47.974.191,00
COMUNIDAD CERRITO (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	372,06	$ 80.965,00	$ 30.123.838,00	166,07	$ 13.445.858,00		$ -	166,07	$ 13.445.858,00	205,99	$ 16.677.980,00
COMUNIDAD PUERTO GAVILAN (10.000 - 1L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	3.024,74	$ 80.965,00	$ 244.898.074,00	2.320,64	$ 187.890.618,00		$ -	2.320,64	$ 187.890.618,00	704,10	$ 57.007.457,00
COMUNIDAD LAS DELICIAS (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.293,19	$ 80.965,00	$ 104.703.128,00	946,55	$ 76.637.421,00		$ -	946,55	$ 76.637.421,00	346,64	$ 28.065.708,00
COMUNIDAD CACHAMITAS (6000 - 0,5L) (F.Z. 1,34)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	979,03	$ 80.965,00	$ 79.267.164,00	652,87	$ 52.859.620,00		$ -	652,87	$ 52.859.620,00	326,16	$ 26.407.544,00
TOTAL SUMINISTRO DOMOPLANAS						**$ 1.425.218.941,00**		**$ 983.145.445,00**		**$ -**		**$ 983.145.445,00**		**$ 442.071.496,00**
RESGUARDO WACOYO														
COMUNIDAD KALEWIRHAE (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	4.544,57	$ 73.714,00	$ 334.998.433,00	4.544,22	$ 334.972.633,00	0,35	$ 25.800,00	4.544,57	$ 334.998.433,00	-	$ -
COMUNIDAD ESMERALDA WALABO (20.000 - 2L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.998,98	$ 73.714,00	$ 221.066.812,00	2.437,33	$ 179.665.344,00	561,65	$ 41.401.468,00	2.998,98	$ 221.066.812,00	-	$ -
COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.949,38	$ 73.714,00	$ 143.696.597,00	1.130,71	$ 83.349.157,00	818,67	$ 60.347.440,00	1.949,38	$ 143.696.597,00	-	$ -
COMUNIDAD LA UNIÓN (6000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	779,52	$ 73.714,00	$ 57.461.537,00	423,62	$ 31.226.725,00	355,90	$ 26.234.813,00	779,52	$ 57.461.537,00	-	$ -
COMUNIDAD PUNTO GRILLO (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.341,87	$ 73.714,00	$ 98.914.605,00	726,48	$ 53.551.747,00	615,39	$ 45.362.858,00	1.341,87	$ 98.914.605,00	-	$ -
COMUNIDAD ALGARROBO (6000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.112,75	$ 73.714,00	$ 155.739.254,00	1.297,53	$ 95.646.126,00		$ -	1.297,53	$ 95.646.126,00	815,22	$ 60.093.127,00
COMUNIDAD MATAPALITO (6000 - 1L) (F.Z. 1,24)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.656,40	$ 74.923,00	$ 199.025.457,00	1.540,51	$ 115.419.605,00	1.115,89	$ 83.605.826,00	2.656,40	$ 199.025.432,00	0,00	$ 25,00
COMUNIDAD LA PORFIA (10.000 - 1L) (F.Z. 1,24)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	2.249,56	$ 74.923,00	$ 168.543.784,00	1.446,37	$ 108.366.380,00	803,19	$ 60.177.404,00	2.249,56	$ 168.543.784,00	-	$ -
COMUNIDAD LA CAIMANA (10.000 - 1L) (F.Z. 1,22)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	3.053,74	$ 73.714,00	$ 225.103.390,00	1.816,97	$ 133.936.127,00		$ -	1.816,97	$ 133.936.127,00	1.236,77	$ 91.167.264,00
TOTAL SUMINISTRO WACOYO						**$ 1.604.549.869,00**		**$ 1.138.133.844,00**		**$ 317.155.609,00**		**$ 1.453.289.453,00**		**$ 151.260.416,00**
RESGUARDO ASEINPOME														
COMUNIDAD KEKO ASEINPOME (6.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	4.526,36	$ 78.548,00	$ 355.693.621,00	2.490,60	$ 195.631.649,00		$ -	2.490,60	$ 195.631.649,00	2.037,76	$ 160.061.972,00
COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ (10.000 - 1L) (F.Z. 1,30)														
4.17		TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO	ML	1.343,86	$ 78.548,00	$ 105.557.515,00	749,24	$ 58.851.304,00		$ -	749,24	$ 58.851.304,00	594,62	$ 46.706.212,00
TOTAL SUMINISTRO ASEINPOME						**$ 461.251.136,00**		**$ 254.482.953,00**		**$ -**		**$ 254.482.953,00**		**$ 206.768.184,00**
SUB TOTAL DE SUMINISTROS (INCLUYE AIU)						**$ 4.395.125.063,00**		**$ 3.004.675.486,00**		**$ 413.546.573,00**		**$ 3.418.222.059,00**		**$ 976.903.001,00**
COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS (SIN AIU)						**$ 3.407.073.692,25**		**$ 2.329.205.803,10**		**$ 320.678.738,76**		**$ 2.649.784.541,86**		**$ 757.289.148,08**

SUB TOTAL DE OBRA (INCLUYE AIU)	**$ 38.013.772.215,00**		**$ 4.240.284.464,00**	**$ 2.970.693.478,00**		**$ 7.210.957.944,00**		**$ 30.796.804.273,00**
SUB TOTAL DE SUMINISTROS (INCLUYE AIU)	**$ 4.395.125.063,00**	**17,10%**	**$ 3.004.675.486,00**	**7,98%**	**$ 413.546.573,00**	**25,09%**	**74,92%**	**$ 976.903.001,00**
VALOR TOTAL	**$ 42.408.897.278,00**		**$ 7.250.959.950,00**		**$ 3.384.230.051,00**			**$ 31.773.707.274,00**
VALOR TOTAL AJUSTADO ALPESO	**$ 42.408.897.278,00**		**$ 7.250.959.950,00**		**$ 3.384.230.051,00**			**$ 31.773.707.274,00**

ING. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

ANEXO 2. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de ensayos PVC Gerfor S.A.

Consecutivo: 1535
Fecha: 05-sept-25 **Referencia:** TUBO U.M. 2"
Norma: NTC-382 **Lote de fabricación:** 30000052516

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3578	60 - 60	60
OVALAMIENTO	mm	NTC-3578	<- 1,60	0,75
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3578	1,78 - 2,45	1,97
PORCENTAJE DE VARIACION DE PARED	%	NTC-3578	<- 12,00	8,62
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3578	6000 - 6012	6003,77

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-3578	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO.	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	68	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	70% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ROTULADO		NTC-382	LOGO IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE DIAMETRO PULG. - MM RDE PRESIÓN DE TRABAJO	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1 Vigente.

Ing. Yeimi Milena Franco
Directora Conformidad

Nit: 860 502 509 - 1
Autopista Medellín Km 2
600 m. vía parcelas, Cota
Cundinamarca, Colombia.
pbx: (1) 877 68 00 /20
fax: (1) 877 68 49
www.gerfor.com


Reporte de calidad

1/11/2025 | 30/11/2025 | Planta Sogamoso | Cemento Uso General

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
5260 cm2/g	5.1 %	162 min	265 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
6.7 MPa	14.7 MPa	18.5 MPa	(Blank) MPa

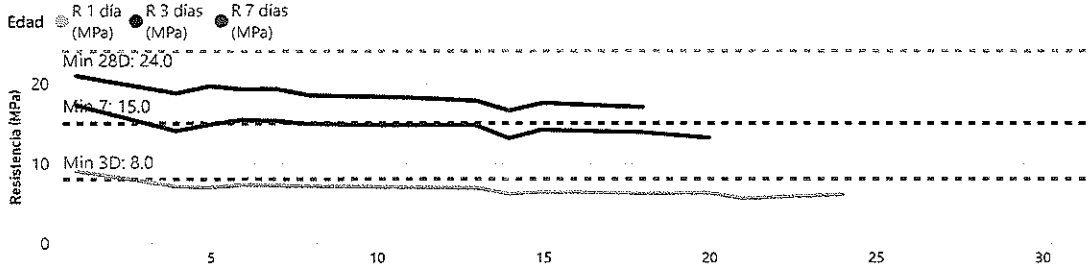


* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN

PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos



- Fe2O3(%)
- Al2O3(%)
- SiO2(%)
- CaO(%)

Perdidas por ignición	Equivalente alcalino	SO3
11.04 %	0.60 %	2.17 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/11/2025	5238	5.0	161	285	9.0	17.3	20.9	
4/11/2025	5100	4.7	150	255	7.1	14.1	18.8	
5/11/2025	5295	4.9	151	255	7.0	14.8	19.6	
6/11/2025	5270	4.0	152	255	7.3	15.5	19.2	
7/11/2025	5160	6.0	154	255	7.2	15.3	19.3	
8/11/2025	4883	4.9	155	255	7.2	14.9	18.5	
11/11/2025	5305	4.1	169	270	7.0	14.8	18.2	
13/11/2025	5223	4.9	175	270	6.9	14.8	17.8	
14/11/2025	5535	5.9	172	270	6.1	13.1	16.6	
15/11/2025	5260	5.1	172	270	6.4	14.2	17.5	
18/11/2025	5740	5.9	165	270	6.2	13.9	17.0	
20/11/2025	5153	5.5	166	270	6.2	13.2		
21/11/2025	5180	5.7	166	270	5.6			
22/11/2025	4973	5.3	171	270	5.7			
24/11/2025	5580	4.6	153	255	6.1			

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021

ANEXO 3. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INFORME MENSUAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-077 Versión: 01 Fecha: Agosto 2025

FECHA DE INFORME		
MM	DD	AAAA
DICIEMBRE	31	2025

CONTRATO N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
821	ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 (CAG)	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

MES AL QUE PERTENECE EL INFORME	OBJETO DEL CONTRATO	SEDE / PROYECTO
DICIEMBRE	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEIPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

1. Registro Semanal de Charlas / Capacitaciones SST

Ítem	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	No. HORAS	Fecha Programada	Indicador cobertura			Indicador eficacia			Responsable O Líder
				Total asistentes a la capacitación	Numero de trabajadores programados	% de Cumplimiento	Numero trabajadores evaluados	Numero de evaluaciones eficaces	% de Cumplimiento	
1	CALISTENIA - ESTIRAMIENTO MUSCULAR	0,15	2/12/2025	12	12	100%	12	12	100%	COORDINADOR SST
2	ENFERMEDADES VIRALES	0,15	5/12/2025	12	12	100%	12	12	100%	COORDINADOR SST
3	PELIGRO BIOMECÁNICO	0,15	10/12/2025	11	11	100%	11	11	100%	COORDINADOR SST
4	DISPOSICION CORRECTA DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00	12/12/2025	5	5	100%	5	5	100%	COORDINADOR SST
5	PROYECCIÓN DE PARTICULAS	0,15	15/12/2025	10	10	100%	10	10	100%	COORDINADOR SST
6	PROTECCIÓN DE LA PIEL	0,15	16/12/2025	10	10	100%	10	10	100%	COORDINADOR SST
7	IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN	0,15	17/12/2025	11	11	100%	11	11	100%	COORDINADOR SST
8	USO DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS	1,00	18/12/2025	5	5	100%	5	5	100%	COORDINADOR SST
9	DISTRACCIONES EN EL TRABAJO	0,15	29/12/2025	10	10	100%	10	10	100%	COORDINADOR SST

2. Programa de Inspecciones (Relacione las inspecciones ejecutadas durante la semana)

Ítem	Inspección Realizada	Fecha	Periodicidad	Descripción del hallazgo	Plan de acción	Fecha del Cierre	% de Cumplimiento
1	BOTIQUÍN WACOYO	16/12/2025	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
2	CAMILLA WACOYO	16/12/2025	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
3	EXTINTOR WACOYO	16/12/2025	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
4	HERRAMIENTAS MENORES	16/12/2025	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
5	BOTIQUÍN AWALIBA	17/12/2025	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
6	CAMILLA AWALIBA	17/12/2025	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
7	EXTINTOR AWALIBA	17/12/2025	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
8	LOCATIVA	17/12/2025	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
9	BOTIQUÍN ASEIPOME	18/12/2025	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
10	CAMILLA ASEIPOME	18/12/2025	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
11	EXTINTOR ASEIPOME	18/12/2025	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
12	HERRAMIENTAS MECÁNIZADAS	18/12/2025	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%
13	INSPECCIÓN DE EPP	19/12/2025	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%

3. Seguimiento Semanal a Actividades adelantadas relacionadas a la implementación y ejecución del SG-SST

Ítem	Descripción de Gestión SST y demás Actividades	Fecha	Observaciones
1	SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SE VALIDÓ DOCUMENTACIÓN DEL OPERADOR.	SEMANAL	NINGUNA
2	SE DA CUMPLIMIENTO A LAS INSPECCIONES PLANEADAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS.	MENSUAL	NINGUNA
3	SE REALIZAN CHARLAS PRE OPERACIONALES, SOCIALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EJECUTAR.	DIARIA	NINGUNA
4	SEGUIMIENTO AL USO DE EPP Y DOTACIÓN EN OBRA.	DIARIA	NINGUNA

4. Inventario de Maquinaria y Equipos

Ítem	Nombre del Equipo	Referencia	Propio o Alquilado	Nombre del Operador	Observaciones
1	EXCAVADORA	97165	PROPIO	YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES	NINGUNA

5. Seguimiento a hallazgos y Condiciones de Seguridad, Salud y Ambiente


Ítem	Descripción del hallazgo encontrado	Plan de Acción	Fecha	Se Notifico al Responsable		Fecha propuesta para el cierre	Estado
				SI	No		
1	NINGUNA	N/A	N/A			N/A	N/A

6. Seguimiento Ausentismo Laboral


Ítem	Fecha	Nombre del Trabajador	Cedula	Cargo	Periodo de ausentismo		Total Días de ausentismo	Descripción del ausentismo
					Fecha Inicial	Fecha final		

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INFORME MENSUAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-077 Versión: 01 Fecha: Agosto 2025

7. Seguimiento a Indicadores de Accidentalidad

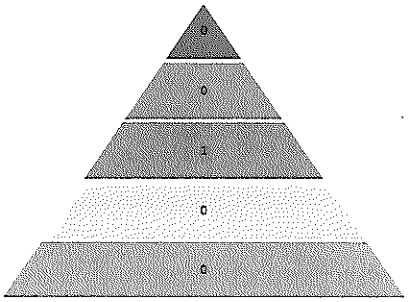

FATALIDAD
ACCIDENTE TRABAJO GRAVE
ACCIDENTE TRABAJO MODERADO
ACCIDENTE TRABAJO LEVE
INCIDENTES



Ítem	Obra / Proyecto (Empresa contratista)	Promedio Trabajadores en el Mes	Total días trabajados en el Mes	HHT	INCIDENTE	AT LEVE	AT MODERADO	AT GRAVE	FATALIDAD	TOTAL AT	TOTAL DÍAS INCAPACIDAD	TOTAS DÍAS CARGADOS	ÍNDICES					
													Mes	ÍNDICE DE FRECUENCIA	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE	TASA DE AUSENTISMO	TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES
1	CAG	11	31	1236	0	0	0	0	0	0	0	0	DICIEMBRE	0	0	0	0	0


8. Descripción de los Accidentes e Incidentes presentados durante la Semana

Fecha del AT	Nombre	# Cedula	Ubicación y tipo de lesión	Incapacidad	Avance incapacidad	At investigado	Descripción del accidente


9. Registro Fotográfico de Gestión SST



Ubicación:
OBRA
Descripción:
Inspección de botiquín, camilla y extintor.

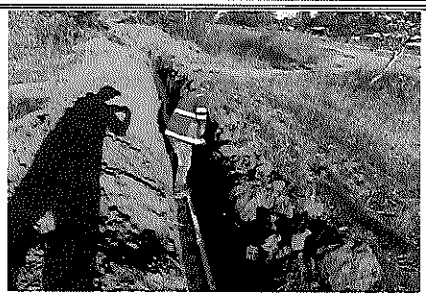

Ubicación:
OBRA
Descripción:
Uso de botas de seguirdad

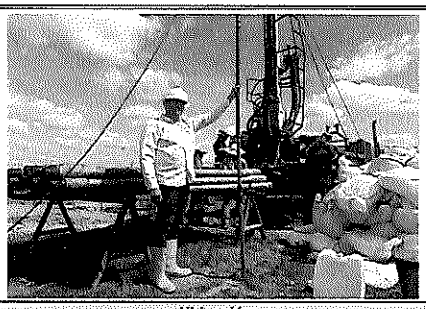


Ubicación:
OBRA
Descripción:
Uso adecuado de EPP en la actividad de registro



Ubicación:
OBRA
Descripción:
Uso adecuado de EPP en la actividad de registro




Ubicación:
OFICINA
Descripción:
Ubicación y señalización de botiquín




Ubicación:
OFICINA
Descripción:
Ubicación, señalización e inspección de extintores



Ubicación:
OFICINA
Descripción:
Inspección de botiquín

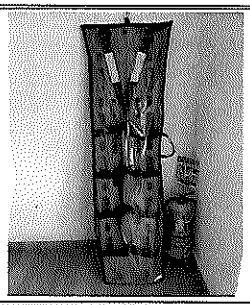

Ubicación:
OFICINA
Descripción:
Inspección de camilla

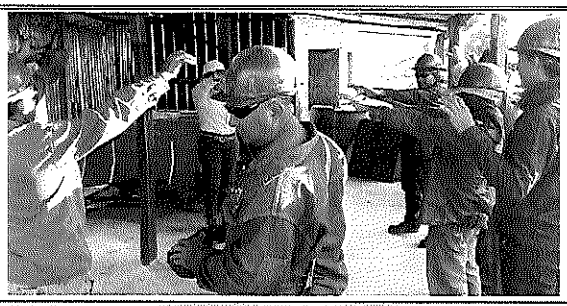

Ubicación:
Resguardo indígena: Awaliba
Descripción:
Se realizó capacitación de peligro Biomecánico

10. Comentarios generales SST	
1	Es importante destacar que se ejecutaron actividades de suministros de equipos, estructura y materiales para el desarrollo del proyecto, por lo tanto no se conto con personal operativo en el proyecto.
2	De acuerdo a lo anterior se realiza el presente informe teniendo en cuenta el personal independiente, que debido al desarrollo de proyecto solo se realizaron actividades de inspección.

FIRMA	
NOMBRE	GUSTAVO MEDINA
CARGO	RESPONSABLE SST

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	**CONTROL DE ASISTENCIA**	**Código:** SST-F-025
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 02 - 12 - 2025	**Hora:** 7:00	**Duración:** 15 minutos
Tema: CALISTENIA - ESTIRAMIENTO MUSCULAR.		**Lugar:** PUERTO GAITAN.

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Miguel Correa	1103 410 729	Oficial	Miguel Correa
2	BRISLEY RAMIREZ	1122 235 294	oficial	BRISLEY
3	Juan Romero	1014 819005	oficial	Juan R.
4	Yeferson Galvan	7864652	operador	Yeferson G.
5	Jose Javier N	1093921945	oficial	Jose J.
6	VANESA GARZÓN GARCIA	1121902403	ING. RESIDENTE	
7	Guillermo Osorio	1121834340	ING RESIDENTE	
8	Dora Yanira Machado	40395435	Contador	
9	Rosenbu	17497327	A. Operativo	
10	Lina Maria Gomez Jal	40.328.285	Aux. Contable	Lina Gomez
11	Francy Carolina Arévalo O.	40326478	Gerente Admyf	
12	Paola Pineda Martinez	1.092.394.700	Secretaria	Paola Pineda
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA
FIRMA:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	**CONTROL DE ASISTENCIA**	**Código:** SST-F-025
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 5 - DICIEMBRE - 25	**Hora:** 7:00	**Duración:** 15 MINUTOS
Tema: ENFERMEDADES VIRALES		**Lugar:** PUESTO GAITAN.

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	BRISEIDA RAMIREZ	1122385234	oficial	BRISEIDA
2	Yeferson Galvan	7864652	operador	Yeferson G
3	Jose Javier M.	1093921095	of.	Jose Javier
4	Miguel Correa	1103410729	oficial	Miguel C
5	Duvan ROMERO	1048979003	oficial	Duvan R
6	Dva Yaniza Machado	40395435	Contador	Dva
7	Paola Parada Martinez	1.092.894.700	Secretaria	Paola Parada
8	Rosem	1742732	Aoperativo	
9	YANEJA GARZON GARCIA	1121902403	ING RESIDENTE	
10	Guillermo Osorio	1121837340	ING RESIDENTE	
11	Francy Carolina Arevalo G.	40326478	Coord Admy F	
12	Lina Manuela Gomez Leal	40.328.285	Aux. Contable	Lina Gomez
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA
FIRMA:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	**CONTROL DE ASISTENCIA**	**Código:** SST-F-025 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 10-DICIEMBRE-25	**Hora:** 7:00	**Duración:** 15 MINUTOS
Tema: PELIGRO BIOMECÁNICO		**Lugar:** PUERTO GAITÁN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Jose Javier M	1 003 92 2945	oficial	Jose Javier
2	Yeferson Galvan	78646652	op.	Yeferson
3	Miguel Correa	1103 410 729	oficial	Miguel C.
4	BRISLEY RAMIREZ	1122236234	oficial	BRISLEY
5	Juan Romero	10 48 19005	of.	Juan.
6	Jina Maria Gomez Leal	40. 328. 285	Aux. contable	Jina Gomez
7	Joseph M	17 474 322	A. operativo	
8	Paola Parada Martinez	1.092.394.700	Secretaria	Paola Parada
9	Dora Yanna Machado A	40 395 435	Contador	Dora M
10	Guillermo osorio	1121834340	ING RESIDENTE	
11	YANCA GARZÓN GARCIA	1129024103	ING-RESIDENTE	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA
FIRMA:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	**CONTROL DE ASISTENCIA**	**Código:** SST-F-025
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación x Charla__ Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 12 - DICIEMBRE - 2025	**Hora:** 7:00 AM	**Duración:** 1 HORA
Tema: DISPOSICIÓN CORRECTA DE RESIDUOS SÓLIDOS		**Lugar:** PUERTO GAITÁN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Miguel Correa	1103470729	OF	Correa
2	BRISLEY RAMIREZ	1122362844	OF	BRISLEY
3	Duvan Romero	1104 819 005	OF	Duvan
4	Yeferson Galvan	78646542	OP	Yeferson
5	Jose Javier M	1093921945	OF	Jose
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA
FIRMA:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	**Código:** SST-F-078
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2025	**Cedula:** 1,103,470,729
Cargo: OFICIAL DE OBRA	**Puntaje Obtenido:** 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. ¿La disposición de residuos sólidos es el proceso de aislar y confinar de forma definitiva los desechos en lugares diseñados para evitar daños al ambiente y la salud, involucrando recolección, transporte, tratamiento y disposición final ?

a. X verdadero

b. falso

2. Selecione la jerarquía de las 3R.

a. Rehacer, Retomar, Rotar.	b. Reportar, Repartir, Regar.
c. Rápido, Robusto, Rodar.	d. X Reducir, Reutilizar, Reciclar.

3. ¿La Reducción es consumir responsablemente para generar menos residuos desde el inicio y la Reutilización es dar una segunda vida a los objetos.?

a. X Verdadero

b. Falso

4. ¿El Reciclaje consiste en separar materiales (plástico, papel, vidrio, metales) para reintroducirlos en ciclos productivos?

a. X Verdadero

b. Falso

5. Seleccione cuál es el Código de Colores para la Separación de residuos en colombia:

a. **Bolsa Blanca:** Plásticos, vidrios, metales, papel y cartón limpios y secos.

b. **Bolsa Negra:** No aprovechables (papel higiénico, servilletas sucias, cartones contaminados) y tapabocas.

c. **Bolsa Verde:** Orgánicos aprovechables (restos de comida, podas).

d. **Bolsa Roja:** Hospitalarios y similares (agujas, guantes, gasas contaminadas).

e. X Todas las anteriores

Firma del trabajador Miguel Correa **C.C.:** 1103 470729	**Responsable de la Inducción** GUSTAVO MEDINA **Cargo:** COORDINADOR SST

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	**Código:** SST-F-078
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: BRISLEY RAMIREZ JIMENEZ

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2025	**Cedula:** 1,122,236,284
Cargo: OFICIAL DE OBRA	**Puntaje Obtenido:** 100 %

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. ¿La disposición de residuos sólidos es el proceso de aislar y confinar de forma definitiva los desechos en lugares diseñados para evitar daños al ambiente y la salud, involucrando recolección, transporte, tratamiento y disposición final ?

- a. verdadero
- b. falso

2. Selecione la jerarquía de las 3R.

- a. Rehacer, Retomar, Rotar.
- b. Reportar, Repartir, Regar.
- c. Rápido, Robusto, Rodar.
- d. Reducir, Reutilizar, Reciclar.

3. ¿La Reducción es consumir responsablemente para generar menos residuos desde el inicio y la Reutilización es dar una segunda vida a los objetos.?

- a. Verdadero
- b. Falso

4. ¿El Reciclaje consiste en separar materiales (plástico, papel, vidrio, metales) para reintroducirlos en ciclos productivos?

- a. Verdadero
- b. Falso

5. Seleccione cuál es el Código de Colores para la Separación de residuos en colombia:

- a. **Bolsa Blanca:** Plásticos, vidrios, metales, papel y cartón limpios y secos.
- b. **Bolsa Negra:** No aprovechables (papel higiénico, servilletas sucias, cartones contaminados) y tapabocas.
- c. **Bolsa Verde:** Orgánicos aprovechables (restos de comida, podas).
- d. **Bolsa Roja:** Hospitalarios y similares (agujas, guantes, gasas contaminadas).
- e. Todas las anteriores

Firma del trabajador BRISLEY RAMIREZ **C.C.:** 1122236284	**Responsable de la Inducción** GUSTAVO MEDINA **Cargo:** COORDINADOR SST

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	**Código:** SST-F-078
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: DUVAN ARLEY ROMERO AREVALO

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2025	**Cedula:** 1,004,819,005
Cargo: OFICIAL DE TUBERIA	**Puntaje Obtenido:** 100 %

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. ¿La disposición de residuos sólidos es el proceso de aislar y confinar de forma definitiva los desechos en lugares diseñados para evitar daños al ambiente y la salud, involucrando recolección, transporte, tratamiento y disposición final ?

a. verdadero ✓

b. falso

2. Selecione la jerarquía de las 3R.

a. Rehacer, Retomar, Rotar.

b. Reportar, Repartir, Regar.

c. Rápido, Robusto, Rodar.

d. Reducir, Reutilizar, Reciclar. X

3. ¿La Reducción es consumir responsablemente para generar menos residuos desde el inicio y la Reutilización es dar una segunda vida a los objetos.?

a. Verdadero X

b. Falso

4. ¿El Reciclaje consiste en separar materiales (plástico, papel, vidrio, metales) para reintroducirlos en ciclos productivos?

a. Verdadero X

b. Falso

5. Seleccione cuál es el Código de Colores para la Separación de residuos en colombia:

a. **Bolsa Blanca:** Plásticos, vidrios, metales, papel y cartón limpios y secos.

b. **Bolsa Negra:** No aprovechables (papel higiénico, servilletas sucias, cartones contaminados) y tapabocas.

c. **Bolsa Verde:** Orgánicos aprovechables (restos de comida, podas).

d. **Bolsa Roja:** Hospitalarios y similares (agujas, guantes, gasas contaminadas).

e. Todas las anteriores X

Firma del trabajador Duvan Romero C.C.: 1004819005	**Responsable de la Inducción** GUSTAVO MEDINA **Cargo:** COORDINADOR SST

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025.	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	**Código:** SST-F-078
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2025	**Cedula:** 78,646,546
Cargo: OPERADOR DE MAQUINARIA	**Puntaje Obtenido:** 100 %

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. ¿La disposición de residuos sólidos es el proceso de aislar y confinar de forma definitiva los desechos en lugares diseñados para evitar daños al ambiente y la salud, involucrando recolección, transporte, tratamiento y disposición final ?

- [X] a. verdadero
- [ ] b. falso

2. Selecione la jerarquía de las 3R.

- a. Rehacer, Retomar, Rotar.
- b. Reportar, Repartir, Regar.
- c. Rápido, Robusto, Rodar.
- [X] d. Reducir, Reutilizar, Reciclar.

3. ¿La Reducción es consumir responsablemente para generar menos residuos desde el inicio y la Reutilización es dar una segunda vida a los objetos.?

- [X] a. Verdadero
- [ ] b. Falso

4. ¿El Reciclaje consiste en separar materiales (plástico, papel, vidrio, metales) para reintroducirlos en ciclos productivos?

- [X] a. Verdadero
- [ ] b. Falso

5. Seleccione cuál es el Código de Colores para la Separación de residuos en colombia:

- a. **Bolsa Blanca:** Plásticos, vidrios, metales, papel y cartón limpios y secos.
- b. **Bolsa Negra:** No aprovechables (papel higiénico, servilletas sucias, cartones contaminados) y tapabocas.
- c. **Bolsa Verde:** Orgánicos aprovechables (restos de comida, podas).
- d. **Bolsa Roja:** Hospitalarios y similares (agujas, guantes, gasas contaminadas).
- [X] e. Todas las anteriores

Firma del trabajador Yeferson Galvan C.C.: 78 646 546	**Responsable de la Inducción** GUSTAVO MEDINA **Cargo:** COORDINADOR SST

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	**Código:** SST-F-078
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: JOSE JAVIER MONCADA CANO

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2025	**Cedula:** 1,093,921,945
Cargo: OFICIAL DE TUBERIA	**Puntaje Obtenido:** 100 %

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. ¿La disposición de residuos sólidos es el proceso de aislar y confinar de forma definitiva los desechos en lugares diseñados para evitar daños al ambiente y la salud, involucrando recolección, transporte, tratamiento y disposición final ?

a. X verdadero

b. falso

2. Selecione la jerarquía de las 3R.

a. Rehacer, Retomar, Rotar.

b. Reportar, Repartir, Regar.

c. Rápido, Robusto, Rodar.

d. X Reducir, Reutilizar, Reciclar.

3. ¿La Reducción es consumir responsablemente para generar menos residuos desde el inicio y la Reutilización es dar una segunda vida a los objetos.?

a. X Verdadero

b. Falso

4. ¿El Reciclaje consiste en separar materiales (plástico, papel, vidrio, metales) para reintroducirlos en ciclos productivos?

a. X Verdadero

b. Falso

5. Seleccione cuál es el Código de Colores para la Separación de residuos en colombia:

a. **Bolsa Blanca:** Plásticos, vidrios, metales, papel y cartón limpios y secos.

b. **Bolsa Negra:** No aprovechables (papel higiénico, servilletas sucias, cartones contaminados) y tapabocas.

c. **Bolsa Verde:** Orgánicos aprovechables (restos de comida, podas).

d. **Bolsa Roja:** Hospitalarios y similares (agujas, guantes, gasas contaminadas).

e. X Todas las anteriores

Firma del trabajador	**Responsable de la Inducción**
Jose Javier M C.C.: 1093921945	Gustavo Mesa **Cargo:** Coordinador SST.

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	**CONTROL DE ASISTENCIA**	**Código:** SST-F-025
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 17-12-25	**Hora:** 7:00	**Duración:** 15 MINUTOS
Tema: IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN		**Lugar:** PUERTO GAITAN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Juan ROMERO	1048 19005	oficial	Juan
2	Yeferson Galvan	7864652	OP	Yeferson
3	BLASCO LAMILLA	1122235234	oficial	BLASCO
4	Jose Javier M	1093929145	OF	Jose Javier
5	Miguel Gomez	1103 410 729	OR	Miguel
6	Ana Yaneth Machado	40 395 435	Contadora	Ana
7	VANESA GARZON GARCIA	1127902403	ING. RESIDENTE	
8	Paola Parada Martinez	1.092394.700	Secretaria	Paola Parada
9	GUILLERMO OSORIO	1121037342	ING RESIDENTE	
10	[illegible]	17427322	A. Operativo	
11	Ana Maria Gomez Leal	40.328.285	AUX. Contable	Ana Gomez
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MARINA
FIRMA:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	**CONTROL DE ASISTENCIA**	**Código:** SST-F-025
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación_X_ Charla__ Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 18 - 12 - 2025	**Hora:** 7:00	**Duración:** 1 HORA
Tema: USO DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS.		**Lugar:** PUERTO GAITÁN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yeferson Galvan	78646546	OP	Yeferson
2	Jose Javier M	1093921995	OF	Jose
3	Julian Romero	1104 894005	OF	Julian R.
4	Miguel Correa	1 103 470 729	OF	Correa
5	BISLEY RAMIREZ	1122730784	OF	BISLEY
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	**Código:** SST-F-078
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA

Fecha: 18 DE DICIEMBRE DE 2025	**Cedula:** 1,103,470,729
Cargo: OFICIAL DE OBRA	**Puntaje Obtenido:** 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. ¿Una emergencia es una situación inesperada y grave que pone en peligro la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente, y que requiere una acción inmediata y urgente para mitigar el riesgo, como un accidente, un incendio, un desastre natural o un problema médico crítico, donde la falta de atención puede llevar a consecuencias fatales o daños mayores. ?

a. X verdadero

b. falso

2. Selecione algunos equipos de emergencias.

a. X Botiquín, camilla, extintores.

b. Escritorios, Sillas.

c. Pausas activas.

d. Atención médica.

3. ¿Una urgencia necesita atención médica pronta, pero no necesariamente inmediata para evitar la muerte?

a. X Verdadero

b. Falso

4. ¿Una emergencia implica un riesgo vital inminente (la muerte puede ocurrir en minutos si no hay atención)?

a. X Verdadero

b. Falso

5. Seleccione algunos ejemplos de emergencias:

a. **Médicas:** Atragantamientos, sangrados severos, pérdida de consciencia, problemas cardíacos, dificultad para respirar.

b. **Naturales/Catastróficas:** Terremotos, inundaciones, incendios forestales.

c. **Laborales:** Derrames químicos, explosiones, fallas de maquinaria.

d. **Personales/Sociales:** Accidentes, robos, detenciones.

e. X Todas las anteriores

Firma del trabajador Miguel Correa C.C.: # 1103 470 429	**Responsable de la Inducción** GUSTAVO MESA **Cargo:** COORDINADOR SST.

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	**Código:** SST-F-078
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES

Fecha: 18 DE DICIEMBRE DE 2025	**Cedula:** 78,646,546
Cargo: OPERADOR DE MAQUINARIA	**Puntaje Obtenido:** 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. ¿Una emergencia es una situación inesperada y grave que pone en peligro la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente, y que requiere una acción inmediata y urgente para mitigar el riesgo, como un accidente, un incendio, un desastre natural o un problema médico crítico, donde la falta de atención puede llevar a consecuencias fatales o daños mayores. ?

a. verdadero

b. falso

2. Selecione algunos equipos de emergencias.

a. Botiquín, camilla, extintores.

b. Escritorios, Sillas.

c. Pausas activas.

d. Atención médica.

3. ¿Una urgencia necesita atención médica pronta, pero no necesariamente inmediata para evitar la muerte?

a. Verdadero

b. Falso

4. ¿Una emergencia implica un riesgo vital inminente (la muerte puede ocurrir en minutos si no hay atención)?

a. Verdadero

b. Falso

5. Seleccione algunos ejemplos de emergencias:

a. **Médicas:** Atragantamientos, sangrados severos, pérdida de consciencia, problemas cardíacos, dificultad para respirar.

b. **Naturales/Catastróficas:** Terremotos, inundaciones, incendios forestales.

c. **Laborales:** Derrames químicos, explosiones, fallas de maquinaria.

d. **Personales/Sociales:** Accidentes, robos, detenciones.

e. Todas las anteriores

Firma del trabajador Yeferson Galvan C.C.: 78-646-546	**Responsable de la Inducción** GUSTAVO MEDINA **Cargo:** COORDINADOR SST.

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	**Código:** SST-F-078
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: JOSE JAVIER MONCADA CANO

Fecha: 18 DE DICIEMBRE DE 2025	**Cedula:** 1,093,921,945
Cargo: OFICIAL DE TUBERIA	**Puntaje Obtenido:** 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. ¿Una emergencia es una situación inesperada y grave que pone en peligro la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente, y que requiere una acción inmediata y urgente para mitigar el riesgo, como un accidente, un incendio, un desastre natural o un problema médico crítico, donde la falta de atención puede llevar a consecuencias fatales o daños mayores. ?

a. X verdadero

b. falso

2. Selecione algunos equipos de emergencias.

a. X Botiquín, camilla, extintores.
b. Escritorios, Sillas.
c. Pausas activas.
d. Atención médica.

3. ¿Una urgencia necesita atención médica pronta, pero no necesariamente inmediata para evitar la muerte?

a. X Verdadero

b. Falso

4. ¿Una emergencia implica un riesgo vital inminente (la muerte puede ocurrir en minutos si no hay atención)?

a. X Verdadero

b. Falso

5. Seleccione algunos ejemplos de emergencias:

a. **Médicas:** Atragantamientos, sangrados severos, pérdida de consciencia, problemas cardíacos, dificultad para respirar.
b. **Naturales/Catastróficas:** Terremotos, inundaciones, incendios forestales.
c. **Laborales:** Derrames químicos, explosiones, fallas de maquinaria.
d. **Personales/Sociales:** Accidentes, robos, detenciones.
e. X Todas las anteriores

Firma del trabajador Jose Javier M. C.C.: 1093921945	**Responsable de la Inducción** GUSTAVO MEDINA **Cargo:** COORDINADOR SST.

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	**Código:** SST-F-078
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: DUVAN ARLEY ROMERO AREVALO

Fecha: 18 DE DICIEMBRE DE 2025	**Cedula:** 1,004,819,005
Cargo: OFICIAL DE TUBERIA	**Puntaje Obtenido:** 100 %

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. ¿Una emergencia es una situación inesperada y grave que pone en peligro la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente, y que requiere una acción inmediata y urgente para mitigar el riesgo, como un accidente, un incendio, un desastre natural o un problema médico crítico, donde la falta de atención puede llevar a consecuencias fatales o daños mayores. ?

a. verdadero X

b. falso

2. Selecione algunos equipos de emergencias.

a. Botiquín, camilla, extintores. X

b. Escritorios, Sillas.

c. Pausas activas.

d. Atención médica.

3. ¿Una urgencia necesita atención médica pronta, pero no necesariamente inmediata para evitar la muerte?

a. Verdadero X

b. Falso

4. ¿Una emergencia implica un riesgo vital inminente (la muerte puede ocurrir en minutos si no hay atención)?

a. Verdadero X

b. Falso

5. Seleccione algunos ejemplos de emergencias:

a. **Médicas:** Atragantamientos, sangrados severos, pérdida de consciencia, problemas cardíacos, dificultad para respirar.

b. **Naturales/Catastróficas:** Terremotos, inundaciones, incendios forestales.

c. **Laborales:** Derrames químicos, explosiones, fallas de maquinaria.

d. **Personales/Sociales:** Accidentes, robos, detenciones.

e. Todas las anteriores X

Firma del trabajador Duvan Romero C.C.: 1004819005	**Responsable de la Inducción** GUSTAVO MEDINA **Cargo:** COORDINADOR SST.

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	**Código:** SST-F-078
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: BRISLEY RAMIREZ JIMENEZ

Fecha: 18 DE DICIEMBRE DE 2025	**Cedula:** 1,122,236,284
Cargo: OFICIAL DE OBRA	**Puntaje Obtenido:** 100 %

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. ¿Una emergencia es una situación inesperada y grave que pone en peligro la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente, y que requiere una acción inmediata y urgente para mitigar el riesgo, como un accidente, un incendio, un desastre natural o un problema médico crítico, donde la falta de atención puede llevar a consecuencias fatales o daños mayores. ?

x a. verdadero

b. falso

2. Selecione algunos equipos de emergencias.

x a. Botiquín, camilla, extintores. b. Escritorios, Sillas.

c. Pausas activas. d. Atención médica.

3. ¿Una urgencia necesita atención médica pronta, pero no necesariamente inmediata para evitar la muerte?

x a. Verdadero

b. Falso

4. ¿Una emergencia implica un riesgo vital inminente (la muerte puede ocurrir en minutos si no hay atención)?

x a. Verdadero

b. Falso

5. Seleccione algunos ejemplos de emergencias:

a. **Médicas:** Atragantamientos, sangrados severos, pérdida de consciencia, problemas cardíacos, dificultad para respirar.

b. **Naturales/Catastróficas:** Terremotos, inundaciones, incendios forestales.

c. **Laborales:** Derrames químicos, explosiones, fallas de maquinaria.

d. **Personales/Sociales:** Accidentes, robos, detenciones.

x e. Todas las anteriores

Firma del trabajador BRISLEY RAMIREZ **C.C.:** 1122236284	**Responsable de la Inducción** GUSTAVO MEDINA **Cargo:** COORDINADOR SST

¡¡Gracias por su participación!!

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	**CONTROL DE ASISTENCIA**	**Código:** SST-F-025 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra _____

Fecha de actividad: 29-12-25	**Hora:** 7:00	**Duración:** 15 MINUTOS
Tema: DISTRACCIONES EN EL TRABAJO.		**Lugar:** PUESTO GAITAN

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Miguel Gonzalez	1103410729	oficial	Miguel G
2	JUAN ROLERO	1048129005	ok	Juan
3	Yeferson Galvan	78064652	op	Yeferson
4	BRIGEN RAMIREZ	1122385234	ok	Brigen
5	Jose Javier M	1093921945	op	Jose Javier
6	VANESA GARZON GARCIA	1121402403	TRABAJADORA SOCIAL	
7	Paola Parada Martinez	1.092.394.700	Secretaria	paolaparada
8	Jina Marcela Gomez Jal	40.328.285	Aux. Contable	
9	Guillermo osorio	1121837340	ING RESIDENTE	
10	Dava Yamira Machado	40395935	Contratista	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA
FIRMA:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A	**Código:** SST-F-085 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Lugar:	PUERTO GAITÁN	Fecha de inspección:	16	12	2025
Ubicación del botiquín	RESGUARDO WACOYO				

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?	Si	X	No		Localizado en lugar visible?	Si	X	No	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	Si	X	No		El botiquín se encuentra señalizado?	Si	X	No	

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20 UND	4-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1 UND	4-30	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20 UND	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	50 PARES	12-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1 UND	9-27	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2 UND	7-27	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1 UND	NA	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1 UND	9-27	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1 JUEGO	NA	6 PIEZAS
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				

Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:	GUSTAVO MEDINA	Firmas:	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA	**Código:** SST-F-021
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Codigo: N/A	**Fecha de Inspeccion:** 16 DICIEMBRE 2025
Responsable de la Inspección: GUSTAVO MEDINA	**Cargo:** COORDINADOR SST
Lugar: PUERTO GAITÁN	**Ubicación de la camilla:** WACOMO

DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA

	Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2	Estado del soporte	X				
3	Sugetadores o Manijas de agarre	X				
4	Correas de amarre o seguridad	X				
5	Lugar visible y fácil acceso	X				
6	Rotulada / Señalización	X				
7	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				

OBSERVACIONES:

Firma

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: SST-F-020 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN: 16- DICIEMBRE - 2025

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: GUSTAVO MEDINA

LUGAR: RELLENO WACOMO

CARGO: COORDINADOR SST

Bueno: B Regular: R Malo: M No Tiene: N.T No aplica: N.A

N°.	Ubicación	Identificación	Capacidad	Clase	Agente	Fecha de ultima recarga	Acceso	Visibilidad	Señalización	Pintura	Cilindro	Etiqueta (instructivo)	Aro de seguridad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Manija de transporte	Manija de disparo	OBSERVACIONES
1	WACOMO	N/A	30 LBS	ABC	POS	NOV - 25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	SST-F-066
		Versión: 01
		Fecha: Agosto 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

OBRA: RESGUARDOS WOUGUAS PUERTO GAITÁN FECHA: 16-12-2025

ITEM	ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	**Herramientas**				
1,1	Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS	X			
1,2	Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos)	X			
1,3	Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas)	X			
1,4	Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados	X			
1,5	Se usan prensas de banco para sujetar	X			
1,6	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	X			
2	**Herramientas de corte**				
2,1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X	
2,2	Los cinceles se encuentran afiliados			X	
2,3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			X	
2,4	Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos	X			
2,5	Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	X			
2,6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos	X			
2,7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X			
3	**Herramientas manuales y de golpe**				
3,1	Se emplea el martillo adecuado según labor	X			
3,2	Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos)	X			
3,3	Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo	X			
3,4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos	X			
4	**Herramientas de torsion-llaves**				
4,1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas	X			
4,2	Se observan en la llave huellas de palancas	X			
4,3	Se disponen de llaves para golpear	X			
4,4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X			
4,5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X			
4,6	La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos	X			
4,7	Se disponen de herramientas que no produzcan chispas	X			
5	**Herramientas electricas**				
5,1	Estan limpias y lubricadas	X			
5,2	Tiene sus guardas	X			
5,3	Posee aislameinto doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
5,4	El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con proteccion contra el riesgo mecanico)	X			
5,5	En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes			X	
5,6	Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequeños			X	
5,7	Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes	X			
5,8	Los collarines coinciden en diametro y estan instalados según el relieve	X			
5,9	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas	X			
6	**Herramienta neumática**				
6,1	Las magueras y acoples se encuentran en buen estado (sin fugas, añadiduras, desperfectos)			X	
6,2	Se trabaja a las presiones indicadas			X	
6,3	La herramienta es descargada al terminar			X	
7	**Herramienta por detonación**				
7,1	El personal se encuentra autorizado	X			
7,2	Se descarga y es almacenada	X			
7,3	Su sistema de disparo es bajo presión	X			

ACCIONES DE MEJORA

Item	Accion	Responsable	Fecha de reinspeccion

RESPONSABLE SST

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A	**Código:** SST-F-085 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Lugar:	PUERTO GAITAN	Fecha de inspección:	17	12	25
Ubicación del botiquín	RESGUARDO AGUALIBA				

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?	Si	X	No		Localizado en lugar visible?	Si	X	No	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	Si	X	No		El botiquín se encuentra señalizado?	Si	X	No	

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20 UND	4-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1 UND	4-30	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20 UND	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	50 PARES	12-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1 UND	9-27	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2 UND	9-27	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1 UND	NA	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1 UND	9-27	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1 JUEGO	NA	5 PIEZAS.
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				

Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:	GUSTAVO MEDINA	Firmas:	

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA	**Código:** SST-F-021 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Codigo: N/A	**Fecha de Inspeccion:** 17 DICIEMBRE - 2025
Responsable de la Inspección: GUSTAVO MEDINA	**Cargo:** COORDINADOR SST
Lugar: PUERTO GAITÁN	**Ubicación de la camilla:** RESGUARDO AWA/IBA

DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA

	Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2	Estado del soporte	X				
3	Sugetadores o Manijas de agarre	X				
4	Correas de amarre o seguridad	X				
5	Lugar visible y fácil acceso	X				
6	Rotulada / Señalización	X				
7	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				

OBSERVACIONES:

Firma

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: SST-F-020 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN: 17 - DICIEMBRE - 25

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: GUSTAVO MEDINA

LUGAR: PUERTO GAITÁN

CARGO: COORDINADOR SST

Bueno: B Regular: R Malo: M No Tiene: N.T No aplica: N.A

Nº.	Ubicación	Identificación	Capacidad	Clase	Agente	Fecha de ultima recarga	Acceso	Visibilidad	Señalización	Pintura	Cilindro	Etiqueta (instructivo)	Aro de seguridad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Manija de transporte	Manija de disparo	OBSERVACIONES
1	AVALIBA	N/A	30 LBS	ABC	POS	NOV-25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Código: SST-F-023
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Fecha de inspección: 17 - DICIEMBRE - 2025	Lugar: RESGUARDO INDIGENAS PUERTO GAITÁN
Inspección realizada por: GUSTAVO MEDINA	Cargo: COORDINADOR EST

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
	PELIGROS FISICOS				
1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
2	Las luminarias están en buen estado.			X	
3	Hay buena ventilación en el área.	X			
4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores	X			
5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de	X			
6	La temperatura es confortable.	X			
	PELIGROS ELÉCTRICOS				
7	Instalaciones eléctricas bien aisladas, con conexiones a tierra,	X			
8	Instalaciones eléctricas señaladas	X			
9	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
10	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
11	Tomas e interruptores en buen estado	X			
12	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
13	Cables en buen estado.	X			
14	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.			X	
15	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.			X	
16	Existe señalización de peligros.			X	
	PELIGROS DE SEGURIDAD				
17	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
18	Extintores de carga vigente.	X			
19	Extintores libre de obstaculos.	X			
20	Existe señalización de extintores.	X			
21	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
22	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
23	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
24	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
25	Cuentan con Inmovilizador cervical	X			
26	Hay botiquín y control de consumo.	X			
27	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
28	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
	PELIGROS BIOLOGICOS				
29	Se realizan controles a los Factores que puedan generar Accidentes por contacto con Animales, y plantas.	X			
	PELIGROS BIOMECANICO				
30	Las sillas / puestos de las maquinas cumplen, teniendo en cuenta el tiempo de exposición y postura del operador.	X			
31	Las condiciones del puesto de trabajo, (escritorio) son las adecuadas a nivel Ergonomico. Teniendo en cuenta que se trabajaría 1/2 jornada en este sitio.			X	
32	Cuentan con las especificaciones del peso de las cargas que manejan en obra.	X			

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Código: SST-F-023 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

ORDEN Y ASEO					
33	El área se encuentra organizada.	X			
34	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X			
35	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X			
36	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
SERVICIOS SANITARIOS Y LIMPIEZA GENERAL					
37	Baños con canecas			X	
38	Con jabón liquido, con toallas desechables			X	
39	Limpios			X	
40	Escaleras portátiles			X	
41	Sanitarios			X	
42	Lavamanos			X	
43	Orinales			X	
44	Duchas			X	
45	Espejo			X	
46	Acometida Hidrosanitaria			X	
47	Pintura			X	
PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA)					
48	Se aplican los preoperacionales y listas de chequeo a la maquinaria en sitio	X			
49	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinas y herramientas.	X			
PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)					
50	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
51	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
52	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
53	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
54	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			

	MEDIO AMBIENTE	B.E	RE	MAL	OBSERVACIONES
55	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)				
	Computador. (Si aplica)				
	Otro.				
56	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				
	Otro.				

NOMBRE GUSTAVO MEDINA	NOMBRE
CARGO/ FIRMA COORDINADOR SST	CARGO/FIRMA

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S	Descripcion	Responsable	Firma

* Escriba toda especificacion que requiera aclarar en el espacio Observaciones

* Para ser diligenciado por el competente mecanico o encargado de mantenimiento

No deje ningun espacio en blanco, diligencie el formato en su totalidad.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A	**Código:** SST-F-085 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Lugar:	PUERTO GAITÁN	Fecha de inspección:	18	12	25
Ubicación del botiquín	RESGUARDO ASEIPOME				

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?	Si	X	No		Localizado en lugar visible?	Si	X	No	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	Si	X	No		El botiquín se encuentra señalizado?	Si	X	No	

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20 UND	04-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1 UND	04-30	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20 UND	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	50 PARES	12-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1 UND	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1 UND	9-27	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2 UND	7-27	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1 UND	NA	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1 UND	9-27	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1 JUEGO	NA	5 PIEZAS
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				

Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:	GUSTAVO MEDINA	Firmas:	


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA	**Código:** SST-F-021 **Versión:** 01 **Fecha:** agosto 2025

Codigo: NA	**Fecha de Inspeccion:** 18 - DICIEMBRE - 2025
Responsable de la Inspección: GUSTAVO MEDINA	**Cargo:** COORDINADOR SST
Lugar: PUERTO GAITÁN	**Ubicación de la camilla:** ASEIPOME

DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA

	Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2	Estado del soporte	X				
3	Sugetadores o Manijas de agarre	X				
4	Correas de amarre o seguridad	X				
5	Lugar visible y fácil acceso	X				
6	Rotulada / Señalización	X				
7	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				

OBSERVACIONES:



Firma

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: SST-F-020 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN: 18 - DICIEMBRE - 2025 LUGAR: PUERTO GAITÁN

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: GUSTAVO MEDINA CARGO: COORDINADOR SST

Bueno: B Regular: R Malo: M No Tiene: N.T No aplica: N.A

N°.	Ubicación	Identificación	Capacidad	Clase	Agente	Fecha de ultima recarga	Acceso	Visibilidad	Señalización	Pintura	Cilindro	Etiqueta (instructivo)	Aro de seguridad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Manija de transporte	Manija de disparo	OBSERVACIONES
1	ASEIPOME	NA	30/65	ABC	POS	NOV-25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNIZADAS

SST-F-073
VERSIÓN: 01
FECHA: AGOSTO 2025

FECHA DE INSPECCIÓN	DÍA	MES	AÑO	HERRAMIENTAS PROPIAS	CONTRATISTA RESPONSABLE	PROYECTO
	18	DICIEMBRE	2025	SI / NO		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS - CAG 2025

ÍTEM	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD HERRAMIENTAS MECANIZADAS	INDIVIDUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA INSPECCIONADA (Nombre de la herramienta a inspeccionar)																										
		1 MEZCLADORA			2 MEZCLADORA			3 MEZCLADORA			4 COMPACTADORA TIPO RANA			5 COMPACTADORA TIPO RANA			6 COMPACTADOR CANGURO			7 COMPACTADOR CANGURO			8 VIBRO DE CONCRETO			9 VIBRO DE CONCRETO		
	NOTA: Marque según corresponda:	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Los equipos poseen aislamiento dieléctrico y su clavija se encuentra en buen estado.			X			X			X			X			X			X			X	X			X		
2	Antes de realizar el cambio de discos, brocas, puntas o cuchillas, se apaga el equipo.	X			X			X			X			X			X			X			X			X		
3	Se hace uso de las llaves adecuadas para realizar el cambio de discos, brocas y cuchillas.	X			X			X			X			X			X			X			X			X		
4	El almacenamiento de las herramientas eléctricas se hace en sitios adecuados, aislados de la humedad.			X			X			X			X			X			X			X	X			X		
5	Los discos, brocas, puntas, cuchillas y piezas clave se encuentran en buen estado	X			X			X			X			X			X			X					X			X
6	Las rpm (revoluciones por minuto) de la pulidora, no son superiores a la capacidad del disco empleado.			X			X			X			X			X			X			X			X			X
7	Los cables poseen aislamiento doble, polo a tierra y se encuentren libres de daño.			X			X			X			X			X			X			X	X			X		
8	Las conexiones de las mangueras neumáticas, cuentan con mecanismos de seguridad como pines "r" y/o sistema anti látigo.			X			X			X			X			X			X			X			X			X
9	Las mangueras de los equipos neumáticos, se encuentran en buen estado y no presentan fugas de aire.			X			X			X			X			X			X			X			X			X
10	Cuentan con todas sus piezas bien ajustadas (guardas de seguridad, manijas de sujeción, resguardos, carcasas, etc...)	X			X			X			X			X			X			X			X			X		
11	Las mangueras hidráulicas se encuentran en buen estado			X			X			X			X			X			X			X			X			X
12	Los equipos hidráulicos tienen instalada la manquera de retorno			X			X			X			X			X			X			X			X			X
13	El equipo inspeccionado no presenta fugas (aceite, gasolina, refrigerante...)	X			X			X			X			X			X			X			X			X		
14	El depósito de combustible, aceites y refrigerantes, están en buen estado y no permiten fugas ni derrames.	X			X			X			X			X			X			X			X			X		
15	El tubo de escape cuenta con guarda y silenciador	X			X			X			X			X			X			X			X			X		
16	La motosierra cuenta con capuchones o protector para cubrir la cadena dentada.			X			X			X			X			X			X			X			X			X
17	La cadena dentada de la motosierra se encuentra correctamente tensionada y afilada.			X			X			X			X			X			X			X			X			X
18	Al soltar el gatillo de aceleración de la motosierra, la cadena se detiene.			X			X			X			X			X			X			X			X			X
19	Los operarios hacen uso de los epp aplicables (casco, guantes, botas de seguridad, protección visual, facial, auditiva y respiratoria...).	X			X			X			X			X			X			X			X			X		
20	Los operarios conocen las normas de seguridad para el uso seguro de herramientas accionados por motor.	X			X			X			X			X			X			X			X			X		
21	Se inspecciona el área y se remueven los obstáculos antes de dar inicio a la actividad	X			X			X			X			X			X			X			X			X		

HERRAMIENTA RELACIONADA EN LA INSPECCIÓN	ÍTEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN						ESTADO DEL HALLAZGO	
		ACCIONES PROPUESTAS EN RELACIÓN A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	CARGO	FIRMA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE VERIFICACIÓN	ABIERTO	CERRADO

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE: GUSTAVO MEDINA

CARGO: COORDINADOR SST

FIRMA:

PARTICIPACIÓN COPASST NOMBRE: FIRMA

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	Código: SST-F-056 Versión: 01 Fecha: agosto 2025

Proyecto:	Construcción sistemas de acueductos para los resguardos indígenas del municipio de Puerto Gaitán (Wacoyo – Domoplanas – Awaliba – Aseinpome).
Convenciones:	(E)ESTADO: (B) Bueno (M) Malo (NA) No Aplica - (U) USO: (A) Adecuado (I) Inadecuada

Nombres y Apellidos:	Cédula	Cargo	Dotación					Elementos de Protección Personal															Firma
									Protector Auditivo		Protector Respiratorio		Guantes										
			Overol	Camisa	Pantalón	Bota de cuero	Bota de Caucho	Casco	Inserción	Copa	Vapores	Material Particulado	Carnaza	Vaqueta	Caucho	Kevlar	Nitrilo	Poliuretano	Gafas de seguridad	Impermeable	Otros	Observaciones	
Miguel Correa	1103410729	oficial	NA	B	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	B	B	NA			Miguel Correa
BRISLEY RAMIREZ	1122236284	oficial	NA	B	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	B	B	NA			BRISLEY
Juan Romero	1047819005	oficial	NA	B	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	B	B	NA			Juan
Yeferson Gaitan	786486542	oficial	NA	B	B	B	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B	NA			Yeferson
Jose Javier M	1093929945	oficial	NA	B	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	B	B	NA			Jose Javier M

Plan de acción:	

OBSERVACIONES: EN EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE EVIDENCIAN LOS EPP EN BUEN ESTADO.

ANEXO 4. DISEÑO DE MEZCLA.

NHSQ SAS INGENIERIA HACEMOS LO CORRECTO. CORRECTAMENTE Nit: 901047361-5	**CONSECUTIVO:** DM-025-V0762-25 **PAGINAS:** 1 DE 30	

DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (140 kg/cm²-2000 PSI;210 kg/cm²-3000 PSI)

Este documento no debe ser modificado, copiado o difundido por ningún medio a persona alguna no autorizada sin el permiso o aprobación del propietario. El solicitante o usuario será responsable por cualquier uso indebido. Este documento no es válido sin la firma y sello en original.

DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	FECHA DE ENTREGA:
META	PUERTO GAITÁN	14/NOVIEMBRE/2025

SOLICITANTE:	PROYECTO:
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT: 901965630-1	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META.

ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
ING. ANA LILIANA PAN U. Analista Especialista Especialista en Vías y Transporte	**ING. HAIVER DAVID OLIVO M.** Coord. de ingeniería y laboratorio Especialista en Estructuras	**ING. HAIVER DAVID OLIVO M.** Coord. de ingeniería y laboratorio Especialista en Estructuras

CONTENIDO

1 GENERALIDADES 3

2 OBJETIVO GENERAL 3

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3

4 DATOS DE INICIO 4

5 ENSAYOS DE LABORATORIO 4

6 DISEÑO DE MEZCLA, 140 KG/CM²-2000 PSI 7

7 DISEÑO DE MEZCLA, 210KG/CM²-3000 PSI 13

8 CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO EN OBRA 17

9 PASOS PARA EL MEZCLADO MECÁNICO 17

10 PASOS PARA EL MEZCLADO MANUAL 18

11 OTROS MÉTODOS DE CURADO 18

12 RECOMENDACIONES 19

1 GENERALIDADES

Consorcio Aguas Gaitán 2025; Remitió a NHSQ Ingeniería S.A.S muestras de agregados fino y grueso proveniente de la planta la Esmeralda cuya fuente de explotación es el rio Guayuriba, junto con el cemento Argos de uso General con el propósito de realizar la dosificación de mezcla para concreto de resistencia a la compresión de (140 kg/cm^2-2000 PSI; 210 kg/cm^2-3000 PSI).

La dosificación planteada en este informe es de tipo convencional, no contienen ningún aditivo, el proporcionamiento para la mezcla (cemento, agregados y agua). Todas las dosificaciones buscan producir un concreto de trabajabilidad, durabilidad y resistencia exigida; tan económicamente como sea posible.

El éxito de llegar a las resistencias requeridas depende del proceso de la elaboración de la mezcla en obra y su control de calidad.

2 OBJETIVO GENERAL

Determinar la cantidad de materiales para la elaboración del diseño de mezcla de un concreto que satisfaga los requerimientos de uso, teniendo en cuenta la economía y que cumpla con las especificaciones requeridas en el contrato de obra.

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Efectuar los ensayos correspondientes al material para la elaboración de concreto exigidos en la Normas Técnica Colombiana (NTC) y el Instituto Nacional de Vías (Invias-2022).
- Realizar un diseño de mezcla para resistencias a la compresión de (140 kg/cm^2-2000 PSI; 210 kg/cm^2-3000 PSI).
- Optimizar la mezcla para que sea la más apropiada tanta como en estado fresco como endurecido.
- Efectuar las recomendaciones necesarias para el control de calidad.

4 DATOS DE INICIO

La muestra fue recolectada y remitida por el interesado a nuestro laboratorio, los datos que se relacionan a continuación son suministrados por el cliente:

Tabla 1 Datos de Inicio

Fecha de Recepción	05 de noviembre de 2025
Nombre del Interesado:	Consorcio Aguas Gaitán 2025
Procedencia Agregado grueso	Planta la Esmeralda- Rio Guayuriba
Procedencia Agregado Fino	Planta la Esmeralda- Rio Guayuriba
Tamaño máximo del triturado	37.5 mm (1 1/2")
Tamaño máximo nominal del triturado	25.0 mm (1")
Cemento	Argos Uso General

Resistencia de diseño	(140 kg/cm^2-2000 PSI; 210 kg/cm^2-3000 PSI).
Tipo de obra (Elemento)	---

5 ENSAYOS DE LABORATORIO

A continuación, se indican los ensayos efectuados al agregado fino y grueso. (Ver anexos)

NORMA	ENSAYO
INV-E 213-13 (Ac)	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO
INV-E-214-13(Ac)	DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No. 200)
INV-E-122-13(Ac)	DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO
INV-E-217-13 (N^A)	MASAS UNITARIA SUELTA Y APISONADA DE LOS AGREGADOS
INV-E-212-13 (N^A)	CONTENIDO DE MATERIA ÓRGANICA POR COLORIMETRIA
INV-E-222-13 (N^A	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS

Las notas y convenciones registradas en los informes de resultados son párrafos escritos los cuales realizan una aclaración sobre algún aspecto especifico.

Convenciones:

(A$_C$): Ensayo acreditado.
(N^A): Ensayo no acreditado.
(S$_B$): Ensayo subcontratado.

Nota 1: El material fue identificado, recolectado y transportado a nuestras instalaciones por el cliente.

➢ AGREGADO FINO

MODULO DE FINURA	3.0
PESO ESPECIFICO APARENTE (gr/cm^3)	2.511
PESO UNITARIO SUELTO (gr/cm^3)	1.614
PESO UNITARIO COMPACTO (gr/cm^3)	1.775
ABSORCIÓN (%)	0.87
HUMEDAD NATURAL (%)	0.5
PASA TAMIZ N° 200 (%)	2.72
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA (N°)	2

➢ AGREGADO GRUESO

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL (mm)	25.00
PESO ESPECIFICO APARENTE (gr/cm^3)	2.623
PESO UNITARIO SUELTO (gr/cm^3)	1.497
PESO UNITARIO COMPACTO (gr/cm^3)	1.608
ABSORCIÓN (%)	0.82
HUMEDAD NATURAL (%)	0.5
PASA TAMIZ N° 200 (%)	0.01

➢ CEMENTO

CEMENTO ARGOS DE USO GENERAL	
PESO ESPECIFICO APARENTE (Kg/m^3)	3100

DISEÑO DE MEZCLA
140 kg/cm²-2000 PSI

6 DISEÑO DE MEZCLA, 140 kg/cm²-2000 PSI

6.1 Elección del tamaño agregado

➢ Tamaño máximo

El tamaño máximo del agregado grueso según granulometría Tmax: 37.5 mm

➢ Tamaño máximo Nominal

El tamaño máximo nominal según granulometría TMN: 25.0 mm

6.2 Asentamiento

[1]Se debe tener en cuenta que los valores de asentamiento indicados se usan cuando el método de compactación utilizando es la vibración. Cuando se empleen otros métodos diferentes a los datos de la tabla 4, se debe aumentar en 2.5 cm.

Tabla 2 Valores de asentamiento recomendados para diversas clases de construcción

ASENTAMIENTO (cm)	CONSISTENCIA	GRADO DE TRABAJABILIDAD	TIPO DE ESTRUCTURA Y CONDICIONES DE COLOCACIÓN
0.0-2.0	Muy seca	Muy pequeño	Vigas y pilotes de alta resistencia con vibraciones de formaleta
2.0-3.5	Seca	Pequeña	Pavimentos Vibrados con maquina mecánica
3.5-5.0	Semi-seca	Pequeño	Construcciones en masas voluminosas. Losas medianamente reforzadas con vibración. Fundaciones en concreto simple. Pavimentos con vibraciones normales
5.0-10.0	**Media**	**Medio**	**Losas medianamente reforzadas y pavimentos, compactados a mano. Columnas, Vigas, Fundaciones y Muros, con vibración**
10.0-15.0	Húmeda	Alto	Secciones con mucho refuerzo. Trabajos donde la colocación sea difícil. Revestimiento de túneles. No recomendable para compactarlo con demasiada vibración.

Adoptamos el valor de asentamiento de 4 pulgadas.

[1] Asocreto, Libro de Tecnología del Concreto

6.3 Contenido de aire

AGREGADO GRUESO		% PROMEDIO APROX. DE AIRE ATRAPADO
Pulg.	mm.	
3/8"	9,51	2,7
1/2"	12,5	2,5
3/4"	19,1	2,0
1"	**25,4**	**1,7**
1 1/2"	38,1	1,5
2"	50,8	1,0
3"	76,1	0,3
6"	152,4	0,2

% DE AIRE= **1.7%**

6.4 Requerimientos aproximados para calcular el agua de mezclado

	ASENTAMIENTO (mm)	AGUA EN Kg/m³ DE CONCRETO PARA TMN DEL AGREGADO INDICADOS							
		9.51	12.5	19.1	25.4	38.1	50.8	76.1	152.4
CONCRETO SIN AIRE INCLUIDO	30 A 50	205	200	185	180	160	155	145	125
	80 A 100	225	215	200	195	175	170	160	140
	150 A 180	240	230	210	205	185	180	170	----
	% APROX DE AIRE	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
CONCRETO CON AIRE INCLUIDO	30 A 50	180	175	165	160	145	140	135	120
	80 A 100	200	190	175	175	160	155	150	135
	150 A 180	215	205	185	185	170	165	160	----
	% APROX DE AIRE	8	7	6	5	4.5	4	3.5	3

CANTIDAD DE AGUA= **195.0 Kg**

NOTA: La dosificación del total de agua de mezclado, depende de saber con exactitud, la cantidad y variación de humedad en los agregados (particularmente en la arena), en el momento mismo de la dosificación.

Por ello, deben hacerse las correcciones por humedad y absorción de los agregados, para determinar el faltante o sobrante de agua de mezclado con respecto a la condición de saturado o superficialmente seco.

6.5 Relación agua-cemento a/c

RESISTENCIA ESTIMADA A 28 DÍAS	RELACIÓN A/C POR PESO
140 kg/cm²-2000 PSI	**0.65**

Cuando una instalación productora de concreto no tenga registros de ensayos de resistencia en obra para el cálculo de la desviación estándar, la resistencia promedio requerida a la compresión (fc'r) debe determinarse de la tabla C.5.3.2.2.[2]

Resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay datos disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra.

Resistencia especificada a la compresión, MPa	Resistencia promedio requerida a la compresión, MPa
$f'c < 21$	$f'cr = f'c + 7.0$
$21 \leq f'c \leq 35$	$f'cr = f'c + 8.3$
$f'c > 35$	$f'cr = 1.10f'c + 5.0$

** Se recomienda leer el capítulo C.5 de la norma colombiana de construcción sismo resistente NSR-10, (Calidad del concreto, mezclado y colocación).

6.6 Estimación de la cantidad de cemento portland (kg)

$$0.65 = \frac{\text{AGUA}}{\text{CEMENTO}} \Rightarrow \text{CEMENTO} = \frac{195.0}{0.65} = \boxed{300.0\ \text{Kg}}$$

6.7 Estimación de cemento en un metro cubico de concreto (m^3)

VOLUMEN DE CEMENTO= **0.0968 m^3**

6.8 Dosificación

Después de realizar el análisis de la cantidad de agregado que se necesitan para obtener una resistencia a la compresión de 140 kg/cm²-2000 PSI, se determinó la siguiente relación:

➢ Relación, peso seco y volumen suelto por metro cubico de concreto

RELACIÓN, PESO SECO Y VOLUMEN SUELTO DE LOS INGREDIENTES POR METRO CUBICO DE CONCRETO				
MATERIAL	**PESO SECO (Kg/m^3)***	**PESO ESPECIFICO (Kg/m^3)***	**VOLUMEN (a^3/m^3)***	**RELACIÓN**
CEMENTO	300.0	3100	0.097	1.0
AIRE	0.0	0	0.017	
AGUA	195.0	1000	0.195	
GRAVA	851.0	2623	0.324	2.8
ARENA	921.9	2511	0.367	3.1
TOTAL	2268.0		1.000	
* EL COCIENTE m^3 SIGNIFICA QUE ESTA CALCULADO PARA 1 m3 DE CONCRETO				

[2] NSR-10 – Capítulo C.5.3.2.2 – Resistencia promedio requerida.

Dosificación de material por bulto de cemento y por metro cubico en baldes de 7 lt para resistencia a la compresión de 140 kg/cm²-2000 PSI

DOSIFICACIÓN DE MATERIAL EN BALDES DE **7 LITROS** POR BULTO DE CEMENTO Y POR METRO CUBICO CONCRETO					
MATERIAL	PESO SECO Kg	MASA UNITARIA SUELTA (Kg/m³)	VOLUMEN m³	**BALDES DE 7 LITROS**	BALDES PARA 1 m³ DE CONCRETO
CEMENTO USO GENERAL	50.00			**1 BULTO**	6.0 SACOS
AIRE					
AGUA	32.50	1000.0	0.0325	**4.6 BALDES**	27.9 BALDES
GRAVA	141.84	1497.1	0.0947	**13.5 BALDES**	81.2 BALDES
ARENA	153.66	1613.7	0.0952	**13.6 BALDES**	81.6 BALDES
TOTAL	378.00				

Dosificación de material por bulto de cemento y por metro cubico en baldes de 8 lt para resistencia a la compresión de 140 kg/cm²2000 PSI

DOSIFICACIÓN DE MATERIAL EN BALDES DE **8 LITROS** POR BULTO DE CEMENTO Y POR METRO CUBICO CONCRETO					
MATERIAL	PESO SECO Kg	MASA UNITARIA SUELTA (Kg/m³)	VOLUMEN m³	**BALDES DE 8 LITROS**	BALDES PARA 1 m³ DE CONCRETO
CEMENTO USO GENERAL	50.00			**1 BULTO**	6.0 SACOS
AIRE					
AGUA	32.50	1000.0	0.0325	**4.1 BALDES**	24.4 BALDES
GRAVA	141.84	1497.1	0.0947	**11.8 BALDES**	71.1 BALDES
ARENA	153.66	1613.7	0.0952	**11.9 BALDES**	71.4 BALDES
TOTAL	378.00				

Dosificación de material por bulto de cemento y por metro cubico en baldes de 10 lt para resistencia a la compresión de 140 kg/cm²-2000 PSI

DOSIFICACIÓN DE MATERIAL EN BALDES DE **10 LITROS** POR BULTO DE CEMENTO Y POR METRO CUBICO CONCRETO					
MATERIAL	PESO SECO Kg	MASA UNITARIA SUELTA (Kg/m³)	VOLUMEN m³	**BALDES DE 10 LITROS**	BALDES PARA 1 m³ DE CONCRETO
CEMENTO USO GENERAL	50.00			**1 BULTO**	6.0 SACOS
AIRE					
AGUA	32.50	1000.0	0.0325	**3.3 BALDES**	19.5 BALDES
GRAVA	141.84	1497.1	0.0947	**9.5 BALDES**	56.8 BALDES
ARENA	153.66	1613.7	0.0952	**9.5 BALDES**	57.1 BALDES
TOTAL	378.00				

Esta dosificación es para solamente baldes con capacidad de 7, 8 y 10 lt Cualquier cambio en el recipiente se debe hacer el nuevo cálculo.

Dosificación para un metro cubico (1 m³) de concreto

CANTIDAD DE MATERIAL SUELTO EN 1 m³ CUBICO DE CONCRETO					
CEMENTO USO GENERAL	300.0 Kg	/	50.0	=	6.0 SACOS
AGUA	195 LITROS			=	195 Lt
GRAVA	851.0 Kg	/	1497.1	=	0.57 m3 X m3
ARENA	921.9 Kg	/	1613.7	=	0.57 m3 X m3

La tabla anterior le servirá para calcular la cantidad de metros cúbicos de material suelto "como lo entregan las plantas trituradoras" de cada uno de los agregados y la cantidad de bultos de cemento.

DISEÑO DE MEZCLA
210 kg/cm²-3000 PSI

7 DISEÑO DE MEZCLA, 210kg/cm²-3000 PSI

7.1 Elección del tamaño agregado

➢ Tamaño máximo

El tamaño máximo del agregado grueso según granulometría Tmax: 37.5 mm

➢ Tamaño máximo Nominal

El tamaño máximo nominal según granulometría TMN: 25.0 mm

7.2 Asentamiento

[3]Se debe tener en cuenta que los valores de asentamiento indicados se usan cuando el método de compactación utilizando es la vibración. Cuando se empleen otros métodos diferentes a los datos de la tabla 4, se debe aumentar en 2.5 cm.

Tabla 3 Valores de asentamiento recomendados para diversas clases de construcción

ASENTAMIENTO (cm)	CONSISTENCIA	GRADO DE TRABAJABILIDAD	TIPO DE ESTRUCTURA Y CONDICIONES DE COLOCACIÓN
0.0-2.0	Muy seca	Muy pequeño	Vigas y pilotes de alta resistencia con vibraciones de formaleta
2.0-3.5	Seca	Pequeña	Pavimentos Vibrados con maquina mecánica
3.5-5.0	Semi-seca	Pequeño	Construcciones en masas voluminosas. Losas medianamente reforzadas con vibración. Fundaciones en concreto simple. Pavimentos con vibraciones normales
5.0-10.0	**Media**	**Medio**	**Losas medianamente reforzadas y pavimentos, compactados a mano. Columnas, Vigas, Fundaciones y Muros, con vibración**
10.0-15.0	Húmeda	Alto	Secciones con mucho refuerzo. Trabajos donde la colocación sea difícil. Revestimiento de túneles. No recomendable para compactarlo con demasiada vibración.

Adoptamos el valor de asentamiento de 4 pulgadas.

[3] Asocreto, Libro de Tecnología del Concreto

7.3 Contenido de aire

AGREGADO GRUESO		% PROMEDIO APROX. DE AIRE ATRAPADO
Pulg.	mm.	
3/8"	9,51	2,7
1/2"	12,5	2,5
3/4"	19,1	2,0
1"	25,4	1,7
1 1/2"	38,1	1,5
2"	50,8	1,0
3"	76,1	0,3
6"	152,4	0,2

% DE AIRE= **1.7%**

7.4 Requerimientos aproximados para calcular el agua de mezclado

	ASENTAMIENTO (mm)	AGUA EN Kg/m³ DE CONCRETO PARA TMN DEL AGREGADO INDICADOS							
		9.51	12.5	19.1	25.4	38.1	50.8	76.1	152.4
CONCRETO SIN AIRE INCLUIDO	30 A 50	205	200	185	180	160	155	145	125
	80 A 100	225	215	200	195	175	170	160	140
	150 A 180	240	230	210	205	185	180	170	----
	% APROX DE AIRE	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
CONCRETO CON AIRE INCLUIDO	30 A 50	180	175	165	160	145	140	135	120
	80 A 100	200	190	175	175	160	155	150	135
	150 A 180	215	205	185	185	170	165	160	----
	% APROX DE AIRE	8	7	6	5	4.5	4	3.5	3

CANTIDAD DE AGUA= **195.0 Kg**

NOTA: La dosificación del total de agua de mezclado, depende de saber con exactitud, la cantidad y variación de humedad en los agregados (particularmente en la arena), en el momento mismo de la dosificación.

Por ello, deben hacerse las correcciones por humedad y absorción de los agregados, para determinar el faltante o sobrante de agua de mezclado con respecto a la condición de saturado o superficialmente seco.

7.5 Relación agua-cemento a/c

RESISTENCIA ESTIMADA A 28 DÍAS	RELACIÓN A/C POR PESO
210 kg/cm²-3000 PSI	0.54

Cuando una instalación productora de concreto no tenga registros de ensayos de resistencia en obra para el cálculo de la desviación estándar, la resistencia promedio requerida a la compresión (fc'r) debe determinarse de la tabla C.5.3.2.2.[4]

Resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay datos disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra.

Resistencia especificada a la compresión, MPa	Resistencia promedio requerida a la compresión, MPa
$fc' < 21$	$fc'r = fc' + 7.0$
$21 \leq fc' \leq 35$	$fc'r = fc' + 8.3$
$fc' > 35$	$fc'r = 1.10fc' + 5.0$

** Se recomienda leer el capítulo C.5 de la norma colombiana de construcción sismo resistente NSR-10, (Calidad del concreto, mezclado y colocación).

7.6 Estimación de la cantidad de cemento portland (kg)

$$0.54 = \frac{\text{AGUA}}{\text{CEMENTO}} \Rightarrow \text{CEMENTO} = \frac{195.0}{0.54} = \boxed{361.1\ \text{Kg}}$$

7.7 Estimación de cemento en un metro cubico de concreto (m^3)

VOLUMEN DE CEMENTO= **0.1165 m^3**

7.8 Dosificación

Después de realizar el análisis de la cantidad de agregado que se necesitan para obtener una resistencia a la compresión de 210 kg/cm^2-3000 PSI, se determinó la siguiente relación:

➢ **Relación, peso seco y volumen suelto por metro cubico de concreto**

RELACIÓN, PESO SECO Y VOLUMEN SUELTO DE LOS INGREDIENTES POR METRO CUBICO DE CONCRETO				
MATERIAL	**PESO SECO (Kg/m³)***	**PESO ESPECIFICO (Kg/m³)***	**VOLUMEN (a³/m³)***	**RELACIÓN**
CEMENTO	361.1	3100	0.116	1.0
AIRE	0.0	0	0.017	
AGUA	195.0	1000	0.195	
GRAVA	826.8	2623	0.315	2.3
ARENA	895.7	2511	0.357	2.5
TOTAL	2278.5		1.000	
* EL COCIENTE m³ SIGNIFICA QUE ESTA CALCULADO PARA 1 m3 DE CONCRETO				

[4] NSR-10 – Capítulo C.5.3.2.2 – Resistencia promedio requerida.

Dosificación de material por bulto de cemento y por metro cubico en baldes de 7 lt para resistencia a la compresión de 210 kg/cm²-3000 PSI

DOSIFICACIÓN DE MATERIAL EN BALDES DE **7 LITROS** POR BULTO DE CEMENTO Y POR METRO CUBICO CONCRETO					
MATERIAL	PESO SECO Kg	MASA UNITARIA SUELTA (Kg/m³)	VOLUMEN m³	**BALDES DE 7 LITROS**	BALDES PARA 1 m³ DE CONCRETO
CEMENTO USO GENERAL	50.00			**1 BULTO**	7.2 SACOS
AIRE					
AGUA	27.00	1000.0	0.0270	**3.9 BALDES**	27.9 BALDES
GRAVA	114.47	1497.1	0.0765	**10.9 BALDES**	78.9 BALDES
ARENA	124.01	1613.7	0.0769	**11.0 BALDES**	79.3 BALDES
TOTAL	315.49				

Dosificación de material por bulto de cemento y por metro cubico en baldes de 8 lt para resistencia a la compresión de 210 kg/cm²3000 PSI

DOSIFICACIÓN DE MATERIAL EN BALDES DE **8 LITROS** POR BULTO DE CEMENTO Y POR METRO CUBICO CONCRETO					
MATERIAL	PESO SECO Kg	MASA UNITARIA SUELTA (Kg/m³)	VOLUMEN m³	**BALDES DE 8 LITROS**	BALDES PARA 1 m³ DE CONCRETO
CEMENTO USO GENERAL	50.00			**1 BULTO**	7.2 SACOS
AIRE					
AGUA	27.00	1000.0	0.0270	**3.4 BALDES**	24.4 BALDES
GRAVA	114.47	1497.1	0.0765	**9.6 BALDES**	69.0 BALDES
ARENA	124.01	1613.7	0.0769	**9.6 BALDES**	69.4 BALDES
TOTAL	315.49				

Dosificación de material por bulto de cemento y por metro cubico en baldes de 10 lt para resistencia a la compresión de 210 kg/cm²-3000 PSI

DOSIFICACIÓN DE MATERIAL EN BALDES DE **10 LITROS** POR BULTO DE CEMENTO Y POR METRO CUBICO CONCRETO					
MATERIAL	PESO SECO Kg	MASA UNITARIA SUELTA (Kg/m³)	VOLUMEN m³	**BALDES DE 10 LITROS**	BALDES PARA 1 m³ DE CONCRETO
CEMENTO USO GENERAL	50.00			**1 BULTO**	7.2 SACOS
AIRE					
AGUA	27.00	1000.0	0.0270	**2.7 BALDES**	19.5 BALDES
GRAVA	114.47	1497.1	0.0765	**7.6 BALDES**	55.2 BALDES
ARENA	124.01	1613.7	0.0769	**7.7 BALDES**	55.5 BALDES
TOTAL	315.49				

Esta dosificación es para solamente baldes con capacidad de 7, 8 y 10 lt Cualquier cambio en el recipiente se debe hacer el nuevo cálculo.

Dosificación para un metro cubico (1 m³) de concreto

CANTIDAD DE MATERIAL SUELTO EN 1 m³ CUBICO DE CONCRETO					
CEMENTO USO GENERAL	361.1 Kg	/	50.0	=	7.2 SACOS
AGUA	195 LITROS			=	195 Lt
GRAVA	826.8 Kg	/	1497.1	=	0.55 m3 X m3
ARENA	895.7 Kg	/	1613.7	=	0.56 m3 X m3

La tabla anterior le servirá para calcular la cantidad de metros cúbicos de material suelto "como lo entregan las plantas trituradoras" de cada uno de los agregados y la cantidad de bultos de cemento.

8 CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO EN OBRA

- El uso del vibrador debe hacerse con cuidado y previa capacitación.
- Realiza el mezclado óptimo por medios mecánicos (uso de mezcladora). El mezclado manual (a pala) NO alcanza la calidad del mezclado mecánico.
- En la mezcla, a menor consumo de agua mayor resistencia del concreto, por lo que es indispensable que evite el abuso del agua.
- El mezclado mecánico (mezcladora) permite emplear hasta 10% menos de agua que el mezclado manual.

9 PASOS PARA EL MEZCLADO MECÁNICO

- ✓ Con la revolvedora en movimiento, vacía el 80% del agua
- ✓ Enseguida, agrega la grava
- ✓ Después, la arena
- ✓ Después, el cemento
- ✓ Al final, agrega el 20% restante del agua.
- ✓ Mezcla como mínimo de 60 a 90 segundos.

- ✓ Si es mezclado manual, se puede obtener hasta 25% menos de resistencia respecto al mezclado mecánico.

10 PASOS PARA EL MEZCLADO MANUAL

- ✓ Evitar la elaboración sobre terreno natural o contaminado; de preferencia, usa una placa metálica o de madera.
- ✓ Mezcla en seco la arena y el cemento.
- ✓ Después, mezcla el resto de los materiales el tiempo suficiente hasta obtener uniformidad en apariencia y color.
- ✓ Llena y enrasa los baldes para que efectivamente se dosifiquen las cantidades especificadas.
- ✓ El Transporte se debe hacer adecuadamente mediante cubetas o carretillas.
- ✓ Un buen curado es indispensable para alcanzar la resistencia deseada y para reducir el agrietamiento a edades tempranas. Si no se realiza adecuadamente, el concreto se encoge y agrieta desde recién endurecido, y su resistencia puede ser 30% menor.
- ✓ Existen varios sistemas para curar, procura emplear el más eficiente: Inunda el elemento totalmente con agua limpia. Importante: Mantén el concreto saturado de agua; riega constantemente durante 7 días posteriores a su colocación. No son suficientes 2 ó 3 riegos por día.

11 OTROS MÉTODOS DE CURADO

- Coloca material absorbente (arena, tela de yute, cartón o papel) y mantenlo húmedo. Es útil para losas inclinadas.
- Humedece la superficie del concreto y luego coloca plásticos en buen estado sobre dicha superficie.
- Aplica membranas de curado que son productos químicos base cera o acrílico. Se colocan con aspersor o rodillo.

NOTA: El concreto hecho en obra es el material de construcción de mayor empleo en las obras civiles ¡Muchos fabrican concreto, sin embargo, pocos cuidan el proceso para asegurar la calidad! La descarga del concreto debe ser tan cerca como sea posible a su posición final, teniendo en cuenta que la caída libre máxima permisible es de 1,20 m.

Cuando se supere esta distancia debe proveerse algún mecanismo que atenúe la caída libre y la segregación del concreto.

12 RECOMENDACIONES

- Controlar la cantidad de agua de la mezcla, cuidando que no se exceda la relación agua/cemento determinada en el diseño.
- Realizar la corrección al agua de mezclado para mantener las proporciones de mezcla correctas, cuando los agregados se encuentren húmedos. A mayor humedad de los agregados, debe ser dosificada menor cantidad de agua.
- Se debe realizar la prueba del slump para verificar la consistencia del concreto y calcular el asentamiento de la mezcla.
- Para verificar que el concreto mezclado en obra cumple con la dosificación y resistencia de diseño, se recomienda la toma de cilindros para luego ser falladas y conocer la resistencia a los días de curado de la siguiente manera 2 a los 7 días, 2 a los 14, 2 a los 28, y 2 testigos.
- Tomar precauciones durante la toma de muestras para evitar la segregación de los componentes.
- Los resultados implícitos en el presente diseño están sujetos a cambios, cabe resaltar que la mezcla se hizo en condiciones ideales en laboratorio y a la hora de realizar la mezcla en obra las condiciones pueden cambiar.

Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Especialista en Estructuras
Coord. de ingenieria y laboratorio

a. Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo en el laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S. sede Villavicencio.
b. La toma de muestras y los datos correspondientes a la identificación de esta fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S. no asume ninguna responsabilidad sobre la validez de la información dada por el cliente en este informe y no se responsabiliza por el muestreo y/o daños que se puedan presentar en el transcurso del mismo.
c. Este informe no puede ser reproducido parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite.
d. Este informe no es válido sin la firma original del coordinador de ingeniería y el sello original del laboratorio NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
e. El laboratorio NHSQ INGENIERÍA S.A.S. no brinda opiniones ni interpretaciones en sus informes.

Anexo 1 Resultados de laboratorio

NHSQ S.A.S. INGENIERIA

Nit: 901047361-5

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
23-LAB-069

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE ENSAYO ACREDITADO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS FINOS

ESPECIFICACION / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CODIGO
INV. E 213 - 13	10/03/2025	F-LAB-265-V1


PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	FUENTE DE MATERIAL:	PLANTA LA ESMERALDA
DIRIGIDO A:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	DESTINO:	CONCRETO
NIT:	901965630-1	CONSEC. DE INFORME:	DM-025-V0762-25
MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	FECHA DE RECEPCIÓN:	5-nov-25
DEPARTAMENTO:	META	FECHA DE ENSAYO:	6-nov-25
TIPO DE MATERIAL:	ARENA DE PLANTA (MUESTRA 1)	FECHA DE EMISIÓN:	14-nov-25


CONDICIONES AMBIENTALES:				EQUIPOS UTILIZADOS:			
TEMPERATURA °C:	28.7	HUMEDAD RELATIVA %:	72	HORNO Nº:	EQ-001	BALANZA Nº	EQ-192

Nº DE RECIPIENTE:	200
MASA DEL RECIPIENTE	226.8 g
MASA INICIAL SECA + RECIPIENTE	3308.1 g
MASA INICIAL SECA	3081.3 g
MASA FINAL SECA	3080.5 g

RESULTADOS						
NORMA		MODULO DE FINURA		TAMAÑO MAXIMO DEL MATERIAL		CALCULO ERROR
ART-630-2						0.03%
BANDA GRANULOMETRICA		3.0		Pulg	mm	GRADO DE ACEPTACIÓN
UNICA				3/8"	9.5	< 0.3%

TAMIZ		MASA RETENIDA (g)	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE RETENIDO ACUMULADO (%)	PORCENTAJE PASA (%)	PARAMETROS DE LA NORMA	
Pulgadas	mm					INFERIOR	SUPERIOR
2"	50.0	0.0	0.00%	0.00	100%	100%	100%
1 -1/2"	37.5	0.0	0.00%	0.00	100%	100%	100%
1"	25.0	0.0	0.00%	0.00	100%	100%	100%
3/4"	19.0	0.0	0.00%	0.00	100%	100%	100%
1/2"	12.5	0.0	0.00%	0.00	100%	100%	100%
3/8"	9.5	13.7	0.44%	0.44	100%	100%	100%
Nº4	4.75	195.8	6.36%	6.80	93%	95%	100%
Nº8	2.36	541.4	17.58%	24.38	76%	80%	100%
Nº16	1.18	350.0	11.36%	35.74	64%	50%	85%
Nº30	0.60	609.0	19.77%	55.51	44%	25%	60%
Nº50	0.30	744.8	24.18%	79.69	20%	5%	30%
Nº100	0.15	459.0	14.90%	94.59	5%	0%	10%
Nº200	0.075	156.6	5.08%	99.67	0%	0%	5%
	FONDO	10.2	0.33%	100.00	0%		
	TOTAL	3080.5	100.00%				

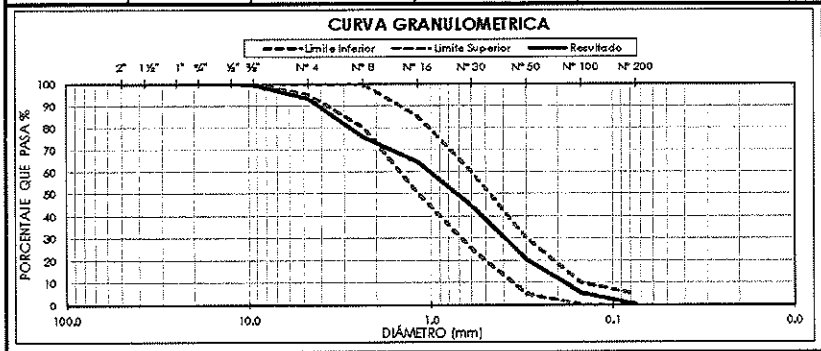

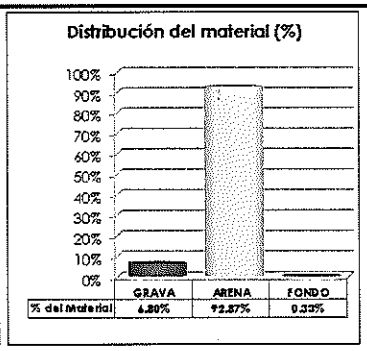

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Analista Especialista	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. SEDE VILLAVICENCIO.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACION DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

NHSQ SAS INGENIERIA

NIT: 901047361-5

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE ENSAYO ACREDITADO

DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No. 200) EN LOS AGREGADOS PÉTREOS MEDIANTE LAVADO

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 214 - 13	10/03/2025	F-LAB-269-V1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**FUENTE DE MATERIAL:**	PLANTA LA ESMERALDA
DIRIGIDO A:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**DESTINO:**	CONCRETO
NIT:	901965630-1	**CONSEC. DE INFORME:**	DM-025-V0762-25
MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	5-nov-25
DEPARTAMENTO:	META	**FECHA DE ENSAYO:**	6-nov-25
TIPO DE MATERIAL:	ARENA DE PLANTA (MUESTRA 1)	**FECHA DE EMISIÓN:**	14-nov-25

CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No. 200)		
MASA DEL RECIPIENTE	(g)	226.80
MASA SECA ANTES DE LAVADO + RECIPIENTE	(g)	3394.30
MASA SECA DESPUES DE LAVADO + RECIPIENTE	(g)	3308.10
PASA 200	(g)	86.20
PASA 200	(%)	2.72

CONDICIONES AMBIENTALES					
TEMPERATURA °C:	28.7	**HUMEDAD RELATIVA:**	62.0		
EQUIPOS UTILIZADOS:					
BALANZA:	EQ-031	**HORNO:**	EQ-001		
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO:	**A**	X	**B**		

OBSERVACIONES: _____

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA	**Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO**
Analista Especialista	Coordinador de Ingeniería

' LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. SEDE VILLAVICENCIO.

' LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S, NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.

' ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.

' ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.

' EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

NHSQ SAS INGENIERIA
NIT: 901047361-5

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
23-LAB-069

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE ENSAYO ACREDITADO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESOS

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 213 - 13	10/03/2025	F-LAB-266-V1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	FUENTE DE MATERIAL:	PLANTA LA ESMERALDA
DIRIGIDO A:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	DESTINO:	CONCRETO
NIT:	901965630-1	CONSEC. DE INFORME:	DM-025-V0762-25
MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	FECHA DE RECEPCIÓN:	5-nov-25
DEPARTAMENTO:	META	FECHA DE ENSAYO:	6-nov-25
TIPO DE MATERIAL:	GRAVA Tmax N 1" (MUESTRA 2)	FECHA DE EMISIÓN:	14-nov-25


CONDICIONES AMBIENTALES:				EQUIPOS UTILIZADOS:			
TEMPERATURA °C:	27.3	HUMEDAD RELATIVA %:	73	HORNO N°:	EQ-001	BALANZA N°	EQ-192


N° DE RECIPIENTE:	92
MASA DEL RECIPIENTE	226.8 g
MASA INICIAL SECA + RECIPIENTE	6896.0 g
MASA INICIAL SECA	6669.2 g
MASA FINAL SECA	6667.6 g

RESULTADOS

NORMA	MODULO DE FINURA	TAMAÑO MAXIMO DEL MATERIAL		TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL MATERIAL		CALCULO ERROR
ART-630-22						0.02%
BANDA GRANULOMETRICA	8.3	Pulg	mm	Pulg	mm	GRADO DE ACEPTACIÓN
AG-38 (56)		1 -1/2"	37.5	1"	25.0	< 0.3%

TAMIZ		MASA RETENIDA (g)	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE RETENIDO ACUMULADO (%)	PORCENTAJE PASA (%)	PARAMETROS DE LA NORMA	
Pulgadas	mm					INFERIOR	SUPERIOR
2"	50.0	0.0	0.00%	0.00	100%	100%	100%
1 -1/2"	37.5	0.0	0.00%	0.00	100%	100%	100%
1"	25.0	49.8	0.75%	0.75	99%	90%	100%
3/4"	19.0	2210.3	33.15%	33.90	66%	40%	85%
1/2"	12.5	4156.7	62.34%	96.24	4%	10%	40%
3/8"	9.5	230.6	3.46%	99.70	0%	0%	15%
N°4	4.75	15.7	0.24%	99.93	0%	0%	5%
N°8	2.36	0.0	0.00%	99.93	0%	0%	3%
N°16	1.18	1.2	0.02%	99.95	0%	0%	1%
N°30	0.60	0.7	0.01%	99.96	0%	0%	0%
N°50	0.30	0.6	0.01%	99.97	0%	0%	0%
N°100	0.15	0.4	0.01%	99.98	0%	0%	0%
N°200	0.075	1.2	0.02%	99.99	0%	0%	0%
	FONDO	0.4	0.01%	100.00	0%		
	TOTAL	6667.6	100.00%				

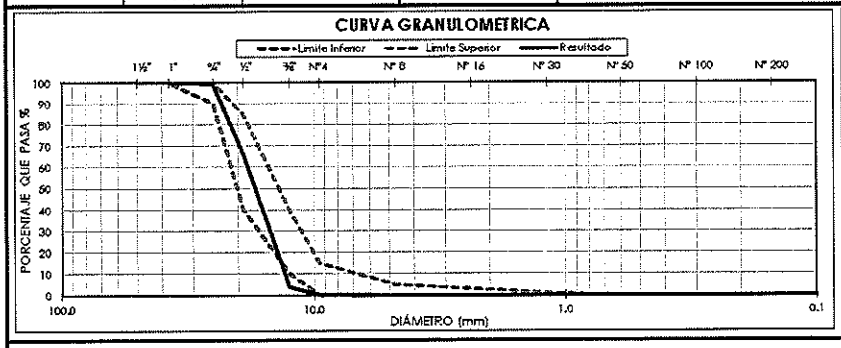

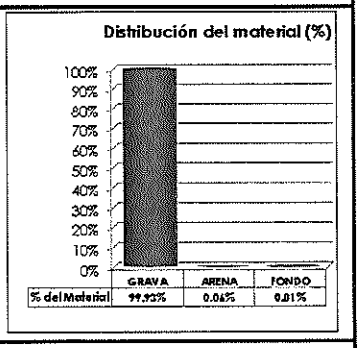

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Analista Especialista	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. SEDE VILLAVICENCIO.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

NHSQ S.A.S. INGENIERIA

NIT: 901047361-5

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE ENSAYO ACREDITADO

DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No. 200) EN LOS AGREGADOS PÉTREOS MEDIANTE LAVADO

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 214 - 13	10/03/2025	F-LAB-269-V1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**FUENTE DE MATERIAL:**	PLANTA LA ESMERALDA
DIRIGIDO A:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**DESTINO:**	CONCRETO
NIT:	901965630-1	**CONSEC. DE INFORME:**	DM-025-V0762-25
MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	5-nov-25
DEPARTAMENTO:	META	**FECHA DE ENSAYO:**	6-nov-25
TIPO DE MATERIAL:	GRAVA Tmax N 1" (MUESTRA 2)	**FECHA DE EMISIÓN:**	14-nov-25

CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No. 200)		
MASA DEL RECIPIENTE	(g)	227.00
MASA SECA ANTES DE LAVADO + RECIPIENTE	(g)	6896.80
MASA SECA DESPUES DE LAVADO + RECIPIENTE	(g)	6896.00
PASA 200	(g)	0.80
PASA 200	(%)	0.01

CONDICIONES AMBIENTALES					
TEMPERATURA °C:	28.7	**HUMEDAD RELATIVA:**	72.0		
EQUIPOS UTILIZADOS:					
BALANZA:	EQ-192	**HORNO:**	EQ-001		
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO:	**A**	X	**B**		

OBSERVACIONES: _____

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA	**Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO**
Analista Especialista	Coordinador de Ingeniería

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. SEDE VILLAVICENCIO.

* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S, NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.

* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.

* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.

* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

NHSQ INGENIERIA S.A.S. — NIT: 901047361-5

ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17025:2017

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE ENSAYO ACREDITADO

DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO - AGREGADO

ESPECIFICACIÓN/NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 122 - 13	10/03/2025	F-LAB-270-V1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS IND	**FUENTE DE MATERIAL:**	PLANTA LA ESMERALDA
DIRIGIDO A:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**CONSEC. DE INFORME:**	DM-025-V0762-25
NIT:	901965630-1	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	5-nov-25
MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	**FECHA DE ENSAYO:**	6-nov-25
DEPARTAMENTO:	META	**FECHA DE EMISIÓN:**	14-nov-25

CONDICIONES AMBIENTALES:	**TEMPERATURA °C:**	30	**HUMEDAD RELATIVA %:**	60	
EQUIPOS USADOS:	**BALANZA N°:**	EQ-192	**HORNO N°:**	EQ-001	
DESCRIPCIÓN Y/O TIPO DE MATERIAL:	ARENA DE PLANTA (MUESTRA 1)				
SONDEO:	N.A.	**MUESTRA:**	N.A.	**PROFUNDIDAD (m):**	N.A.

N° DE RECIPIENTE		M11
MASA DEL RECIPIENTE CON LA MUESTRA HÚMEDA (g)	**W1**	3411.20
MASA DEL RECIPIENTE CON LA MUESTRA SECA (g)	**W2**	3394.30
MASA DEL RECIPIENTE (g)	**Wc**	226.80
CONTENIDO DE AGUA (%)	**w**	**0.53**
TIEMPO DE SECADO (horas:min)		6.00
TEMPERATURA DE SECADO 110 ± 5°C (°C)		110.2

REQUISITOS NORMATIVOS	SI:	NO:	COMENTARIOS
MASA MENOR QUE LA MÍNIMA ESPECIFICADA EN EL NUMERAL 7.2. DE LA NORMA DE REFERENCIA:		✓	
EL ESPÉCIMEN DE MUESTRA CONTENÍA MÁS DE UN TIPO DE SUELO (ESTRATIFICADO, ETC.):		✓	
ALGÚN MATERIAL (TAMAÑO Y CANTIDAD) FUE EXCLUIDO DEL ESPÉCIMEN DE PRUEBA:		✓	

OBSERVACIONES:

CONDICIONES AMBIENTALES:	**TEMPERATURA °C:**	28.7	**HUMEDAD RELATIVA %:**	72	
EQUIPOS USADOS:	**BALANZA N°:**	EQ-031	**HORNO N°:**	EQ-001	
DESCRIPCIÓN Y/O TIPO DE MATERIAL:	GRAVA Tmax N 1" (MUESTRA 2)				
SONDEO:	N.A.	**MUESTRA:**	N.A.	**PROFUNDIDAD (m):**	N.A.

N° DE RECIPIENTE		200
MASA DEL RECIPIENTE CON LA MUESTRA HÚMEDA (g)	**W1**	3411.20
MASA DEL RECIPIENTE CON LA MUESTRA SECA (g)	**W2**	3394.30
MASA DEL RECIPIENTE (g)	**Wc**	226.80
CONTENIDO DE AGUA (%)	**w**	**0.53**
TIEMPO DE SECADO (horas:min)		6:00
TEMPERATURA DE SECADO 110 ± 5°C (°C)		110

REQUISITOS NORMATIVOS	SI:	NO:	COMENTARIOS
MASA MENOR QUE LA MÍNIMA ESPECIFICADA EN EL NUMERAL 7.2. DE LA NORMA DE REFERENCIA:		✓	
EL ESPÉCIMEN DE MUESTRA CONTENÍA MÁS DE UN TIPO DE SUELO (ESTRATIFICADO, ETC.):		✓	
ALGÚN MATERIAL (TAMAÑO Y CANTIDAD) FUE EXCLUIDO DEL ESPÉCIMEN DE PRUEBA:		✓	

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	**Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO**
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
Analista Especialista	

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. SEDE VILLAVICENCIO.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

NHSQ SAS INGENIERIA
Nit: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE RESULTADOS

DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 217 - 13	10/03/2025	F-LAB-024-V8

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**FUENTE DE MATERIAL:**	PLANTA LA ESMERALDA
DIRIGIDO A:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**DESTINO:**	CONCRETO
NIT:	901965630-1	**CONSEC. DE INFORME:**	DM-025-V0762-25
MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	5-nov-25
DEPARTAMENTO:	META	**FECHA DE ENSAYO:**	6-nov-25
TIPO DE MATERIAL:	ARENA DE PLANTA (MUESTRA 1) Y GRAVA Tmax N 1" (MUESTRA 2)	**FECHA DE EMISIÓN:**	14-nov-25

CONDICIONES AMBIENTALES:				EQUIPOS UTILIZADOS:			
TEMPERATURA °C:	28.5	**HUMEDAD RELATIVA %:**	72	**HORNO Nº:**	EQ-001	**BALANZA Nº:**	EQ-192

MASA UNITARIA SUELTA — **ARENA DE PLANTA (MUESTRA 1)**

Nº DE RECIPIENTE	3
MASA DEL RECIPIENTE (g)	1831
VOLUMEN DEL RECIPIENTE (cm^3)	2830
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	6423
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	6380
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	6390
MASA PROMEDIO DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	6398
MASA UNITARIA SUELTA (g/cm^3):	**1.614**
MASA UNITARIA SUELTA (kg/m^3):	**1613.7**

MASA UNITARIA COMPACTA — **ARENA DE PLANTA (MUESTRA 1)**

Nº DE RECIPIENTE	3
MASA DEL RECIPIENTE (g)	1831
VOLUMEN DEL RECIPIENTE (cm^3)	2830
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	6846
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	6830
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	6890
MASA PROMEDIO DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	6855
MASA UNITARIA COMPACTA (g/cm^3):	**1.775**
MASA UNITARIA COMPACTA (kg/m^3):	**1775.4**

MASA UNITARIA SUELTA — **GRAVA Tmax N 1" (MUESTRA 2)**

Nº DE RECIPIENTE	2
MASA DEL RECIPIENTE (g)	4550
VOLUMEN DEL RECIPIENTE (cm^3)	9661
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	19011
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	19030
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	19000
MASA PROMEDIO DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	19014
MASA UNITARIA SUELTA (g/cm^3):	**1.497**
MASA UNITARIA SUELTA (kg/m^3):	**1497.1**

MASA UNITARIA COMPACTA — **GRAVA Tmax N 1" (MUESTRA 2)**

Nº DE RECIPIENTE	2
MASA DEL RECIPIENTE (g)	4550
VOLUMEN DEL RECIPIENTE (cm^3)	9661
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	20077
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	20090
MASA DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	20100
MASA PROMEDIO DEL AGREGADO + RECIPIENTE (g):	20089
MASA UNITARIA COMPACTA (g/cm^3):	**1.608**
MASA UNITARIA COMPACTA (kg/m^3):	**1608.4**

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Analista Especialista	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. SEDE VILLAVICENCIO.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

NHSQ S.A.S. INGENIERIA

NIT: 901047361-6

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE RESULTADOS

PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGÁNICAS EN ARENAS USADAS PARA LA PREPARACIÓN DE MORTEROS O CONCRETOS / DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN.

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 212, INV. E 121 - 13	10/03/2025	F-LAB-043-VB

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA. DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**FUENTE DE MATERIAL:**	PLANTA LA ESMERALDA
DIRIGIDO A:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**DESTINO:**	CONCRETO
NIT:	901965630-1	**CONSEC. DE INFORME:**	DM-025-V0762-25
MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	5-nov-25
DEPARTAMENTO:	META	**FECHA DE ENSAYO:**	6-nov-25
TIPO DE MATERIAL:	ARENA DE PLANTA (MUESTRA 1)	**FECHA DE EMISIÓN:**	14-nov-25

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA POR COLORIMETRIA

CONDICIONES AMBIENTALES:				EQUIPOS UTILIZADOS:			
TEMPERATURA °C:	26.4	**HUMEDAD RELATIVA %:**	62	**COLORES DE REF. N°:**	--	**RECIPIENTE N°:**	--

COLOR GARDEN DE REFERENCIA N°	PLACA ORGÁNICA N°	COLOR APROXIMADO	RESULTADO DEL ENSAYO
5	1		X
8	2		---
11	3 (referencia)		---
14	4		---
16	5		---

NOTA: Si el color del líquido sobrenadante es más oscuro que el de la solución de color estándar o del vidrio de color estandar de la placa orgánica No. 3 (Color Gardner estándar No. 11), se debe considerar que el agregado fino sometido a ensayo, posiblemente contiene compuestos orgánicos perjudiciales, entonces se deben realizar otros ensayos antes de aprobar la arena para su uso en el concreto.

OBSERVACIONES:

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA POR IGNICIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES:				EQUIPOS UTILIZADOS:			
TEMPERATURA °C:	N.A.	**HUMEDAD RELATIVA %:**	N.A.	**MUFLA N°:**	N.A.	**BALANZA N°:**	N.A.

MASA DEL CRISOL Y DEL SUELO SECO ANTES DE IGNICIÓN, A (g)	-----
MASA DEL CRISOL Y SUELO SECO DESPUÉS DE IGNICIÓN, B (g)	-----
MASA DEL CRISOL, C (g)	-----
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA POR IGNICIÓN (%)	-----

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
Analista Especialista	

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. SEDE VILLAVICENCIO.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

NHSQ S.A.S. INGENIERÍA

NIT: 901047361-6

LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE RESULTADOS

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 222 Y INV. E 223 - 13	10/03/2025	F-LAB-001-V8

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**FUENTE DE MATERIAL:**	PLANTA LA ESMERALDA
DIRIGIDO A:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	**DESTINO:**	CONCRETO
NIT:	901965630-1	**CONSEC. DE INFORME:**	DM-025-V0782-25
MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	5-nov-25
DEPARTAMENTO:	META	**FECHA DE ENSAYO:**	6-nov-25
TIPO DE MATERIAL:	ARENA DE PLANTA (MUESTRA 1) Y GRAVA Tmax N 1" (MUESTRA 2)	**FECHA DE EMISIÓN:**	14-nov-25

CONDICIONES AMBIENTALES:				EQUIPOS UTILIZADOS:			
TEMPERATURA °C:	28.6	**HUMEDAD RELATIVA %:**	71	**HORNO Nº:**	EQ-001	**BALANZA Nº:**	EQ-192

DESCRIPCIÓN Y/O TIPO DE MUESTRA:			ARENA DE PLANTA (MUESTRA 1)	
MUESTRA No.			1	2
1	MASA DEL RECIPIENTE, g.		160.3	—
2	MASA DEL RECIPIENTE + MUESTRA SECA AL HORNO, g		656.0	—
A	MASA AL AIRE DE LA MUESTRA SECA, g.		495.7	—
3	MASA DEL RECIPIENTE, g. (Picnometro)		201.9	—
S	MASA DE LA MUESTRA SATURADA Y SUPERFICIALMETE SECA,g		500.0	—
B	MASA DEL RECIPIENTE AFORADO LLENO DE AGUA, g.		880.0	—
C	MASA DEL RECIPIENTE AFORADO CON LA MUESTRA Y LLENO DE AGUA, g.		1182.6	—
PESO ESPECÍFICO APARENTE		A / (B+S-C)	2.511	—
PESO ESPECÍFICO APARENTE S.S.S.		S / (B+S-C)	2.533	—
PESO ESPECÍFICO NOMINAL		A / (B+A-C)	2.567	—
ABSORCIÓN, %		100*(S - A) / A	0.87	—
OBSERVACIONES:				

CONDICIONES AMBIENTALES:				EQUIPOS UTILIZADOS:			
TEMPERATURA °C:	28.6	**HUMEDAD RELATIVA %:**	71	**HORNO Nº:**	EQ-001	**BALANZA Nº:**	EQ-192

DESCRIPCIÓN Y/O TIPO DE MUESTRA:			GRAVA Tmax N 1" (MUESTRA 2)	
MUESTRA No.			1	2
1	MASA DEL RECIPIENTE, g.		537.5	—
B	MASA DE LA MUESTRA SATURADA Y SUPERFICIALMETE SECA,g		5218.0	—
C	MASA DE LA MUESTRA SUMERGIDA EN AGUA, g.		3245.1	—
2	MASA AL AIRE DE LA MUESTRA SECA + RECIPIENTE, g.		5713.0	—
A	MASA AL AIRE DE LA MUESTRA SECA, g.		5175.5	—
PESO ESPECÍFICO APARENTE		A / (B - C)	2.623	—
PESO ESPECÍFICO APARENTE S.S.S.		B / (B - C)	2.645	—
PESO ESPECÍFICO NOMINAL		A / (A - C)	2.681	—
ABSORCIÓN, %		100*(B - A) / A	0.82	—
OBSERVACIONES:				

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Analista Especialista	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. SEDE VILLAVICENCIO.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

NHSQ INGENIERÍA

NIT: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE RESULTADOS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESOS


ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
CONTROL INTERNO	10/03/2025	F-LAB-044-V8

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	FUENTE DE MATERIAL:	PLANTA LA ESMERALDA
DIRIGIDO A:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	DESTINO:	CONCRETO
NIT:	901965630-1	CONSEC. DE INFORME:	DM-025-V0762-25
MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	FECHA DE RECEPCIÓN:	5-nov-25
DEPARTAMENTO:	META	FECHA DE ENSAYO:	6-nov-25
TIPO DE MATERIAL:	ARENA DE PLANTA (MUESTRA 1) Y GRAVA Tmax N 1" (MUESTRA 2)	FECHA DE EMISIÓN:	14-nov-25

BANDA GRANULOMETRICA	25.4

TAMIZ		ARENA	GRAVA	COMBINACIÓN	PARAMETROS DE LA NORMA	
Pulgadas	mm				INFERIOR	SUPERIOR
2"	50.8	100%	100%	100%	100%	100%
1 -1/2"	38.1	100%	100%	100%	100%	100%
1"	25.4	100%	99%	100%	100%	100%
3/4"	19.0	100%	66%	84%	90%	85%
1/2"	12.7	100%	4%	54%	78%	68%
3/8"	9.5	100%	0%	52%	71%	58%
N°4	4.76	93%	0%	48%	56%	40%
N°8	2.36	76%	0%	39%	44%	27%
N°16	1.18	64%	0%	33%	34%	18%
N°30	0.60	44%	0%	23%	27%	13%
N°50	0.30	20%	0%	11%	21%	9%
N°100	0.15	5%	0%	3%	17%	6%
N°200	0.075	0%	0%	0%	13%	5%

CURVA GRANULOMETRICA

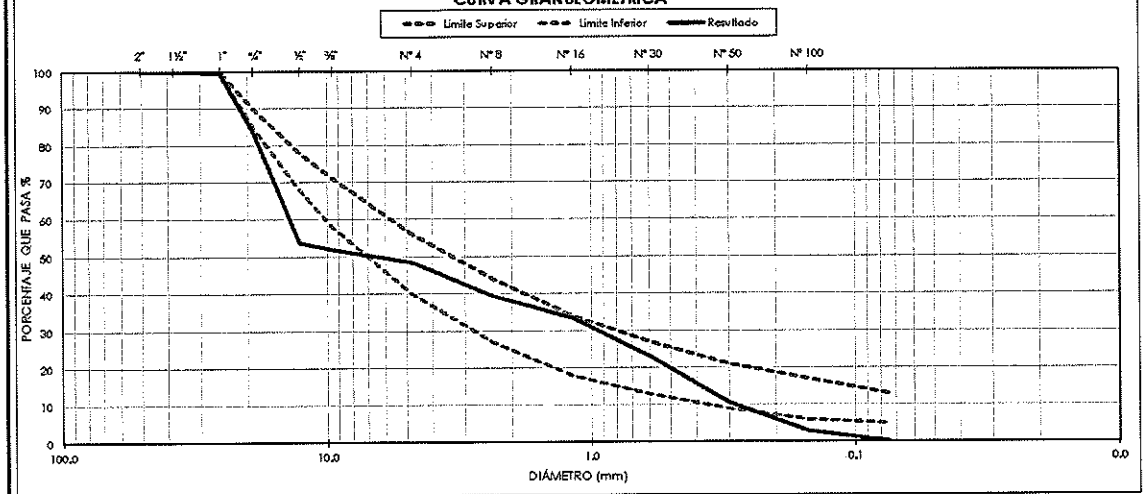


OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Analista Especialista	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

NHSQ SAS INGENIERIA	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS	
901047361-5	INFORME DE RESULTADOS	
	METODO ROAD NOTE LABORATORY "RNL"	
ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
CONTROL INTERNO	10/03/2025	F-LAB-025-V8

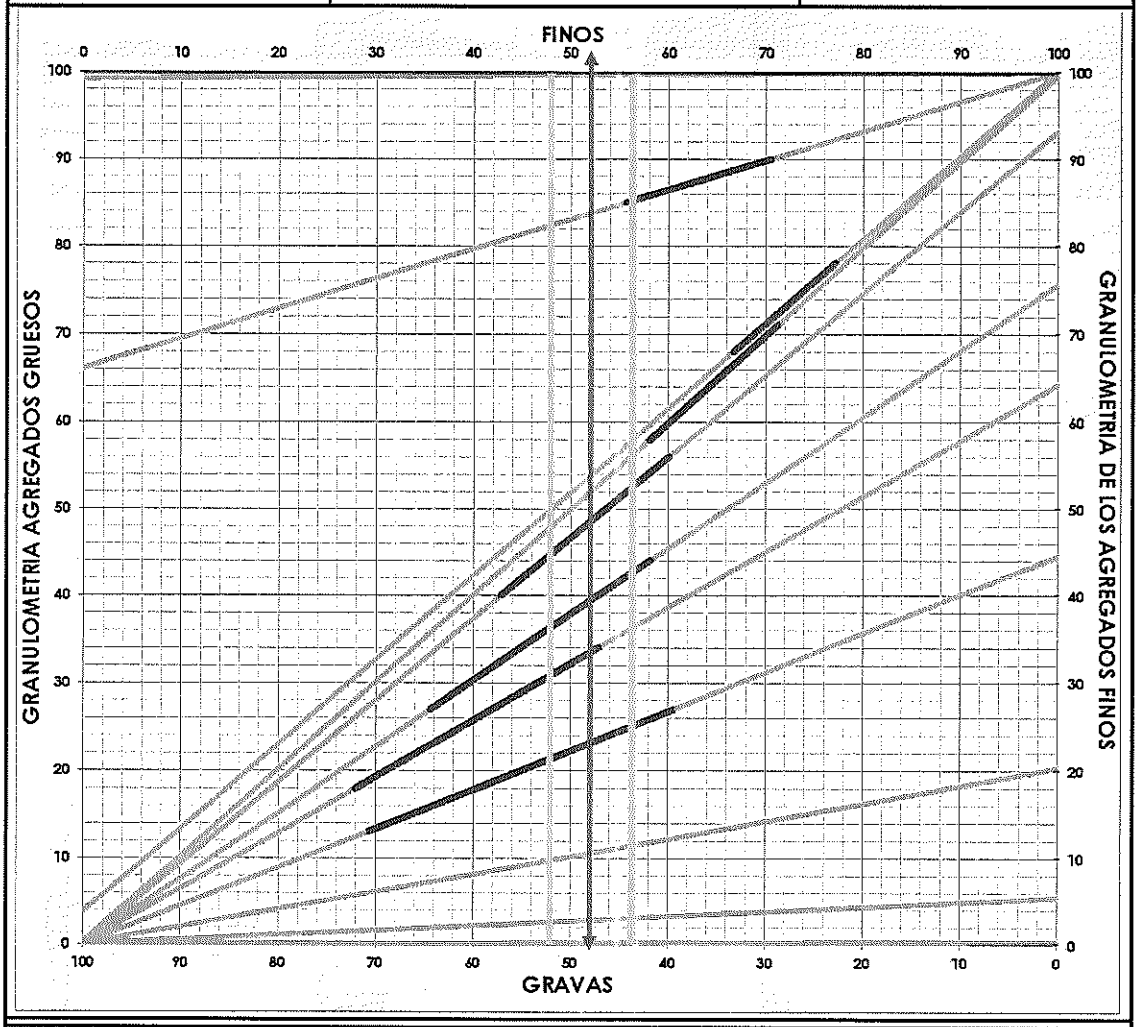

TAMIZ	ABERTURA (mm)	GRAVA	ARENA	PARAMETROS		MEZCLADO
1-1/2"	37.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1"	25	99.3	100.0	100.0	100.0	99.6
3/4"	19	66.1	100.0	85.0	90.0	83.7
1/2"	12.5	3.8	100.0	68.0	78.0	53.8
3/8"	9.5	0.3	99.6	58.0	71.0	51.9
N°4	4.76	0.1	93.2	40.0	56.0	48.5
N°8	2.36	0.1	75.6	27.0	44.0	39.4
No. 16	1.18	0.0	64.3	18.0	34.0	33.4
No. 30	0.60	0.0	44.5	13.0	27.0	23.2
No. 50	0.30	0.0	20.3	9.0	21.0	10.6
No. 100	0.15	0.0	5.4	6.0	17.0	2.8
No. 200	0.08	0.0	0.3	5.0	13.0	0.2

PORCENTAJES DE AGREGADOS	
FINOS	52
GRAVAS	48

"FIN DEL INFORME"

ANEXO 5. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2063008266	9497602330	E	2026/01/09	2026/01/06	BANCOLOMBIA	0	$7,646,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (1 Afiliados)																						$11,000,000	$1,870,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000		$57,500		$0	$0		$2,807,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																						$11,000,000	$1,870,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000		$57,500		$0	$0		$2,807,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$11,000,000	$1,870,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000		$57,500		$0	$0		$2,807,500
1	CC	86051533	MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO																	230301	30	$11,000,000	$1,870,000	EPS005	30	$11,000,000	$440,000	CCF34	30	$11,000,000	$440,000	14-11	30	$11,000,000	0.522%	$57,500	30	$0	$0	SI	$2,807,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (10 Afiliados)																						$15,867,753	$2,539,600			$15,867,753	$635,300			$16,483,749	$659,900			$15,867,753		$1,004,100		$0	$0		$4,838,900
Centro de Trabajo: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (10 Afiliados)																						$15,867,753	$2,539,600			$15,867,753	$635,300			$16,483,749	$659,900			$15,867,753		$1,004,100		$0	$0		$4,838,900
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (10 Afiliados)																						$15,867,753	$2,539,600			$15,867,753	$635,300			$16,483,749	$659,900			$15,867,753		$1,004,100		$0	$0		$4,838,900
2	CC	40326478	AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1103470729	CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID		X														X	230301	21	$1,066,450	$170,700	CCFC55	21	$1,066,450	$42,700	CCF34	21	$1,189,176	$47,600	14-11	21	$1,066,450	6.960%	$74,300	21	$0	$0	SI	$335,300
4	CC	78646546	GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE		X														X	231001	21	$1,066,450	$170,700	EPS037	21	$1,066,450	$42,700	CCF34	21	$1,189,176	$47,600	14-11	21	$1,066,450	6.960%	$74,300	21	$0	$0	SI	$335,300
5	CC	1121902403	GARZON GARCIA WENDY VANESA																	230201	23	$1,763,334	$282,200	EPS005	23	$1,763,334	$70,600	CCF34	23	$1,763,334	$70,600	14-11	23	$1,763,334	6.960%	$122,800	23	$0	$0	SI	$546,200
6	CC	1121902403	GARZON GARCIA WENDY VANESA												X					230201	7	$536,667	$85,900	EPS005	7	$536,667	$21,500	CCF34	7	$536,667	$21,500	14-11	7	$536,667	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$128,900
7	CC	1121869998	MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO																	230301	23	$1,993,334	$319,000	EPS005	23	$1,993,334	$79,800	CCF34	23	$1,993,334	$79,800	14-11	23	$1,993,334	6.960%	$138,800	23	$0	$0	SI	$617,400
8	CC	1121869998	MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO												X					230301	7	$606,667	$97,100	EPS005	7	$606,667	$24,300	CCF34	7	$606,667	$24,300	14-11	7	$606,667	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$145,700
9	CC	1093921945	MONCADA CANO JOSE JAVIER		X														X	230301	21	$1,066,450	$170,700	EPS041	21	$1,066,450	$42,700	CCF34	21	$1,189,176	$47,600	14-11	21	$1,066,450	6.960%	$74,300	21	$0	$0	SI	$335,300
10	CC	17497322	MURCIA JOJOA ROSEMBERG																	230301	30	$1,912,000	$306,000	EPS005	30	$1,912,000	$76,500	CCF34	30	$1,912,000	$76,500	14-11	30	$1,912,000	6.960%	$133,100	30	$0	$0	SI	$592,100
11	CC	1121834340	OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO																	25-14	26	$1,993,334	$319,000	EPS037	26	$1,993,334	$79,800	CCF34	26	$1,993,334	$79,800	14-11	26	$1,993,334	6.960%	$138,800	26	$0	$0	SI	$617,400
12	CC	1121834340	OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO												X					25-14	4	$306,667	$49,100	EPS037	4	$306,667	$12,300	CCF34	4	$306,667	$12,300	14-11	4	$306,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$73,700
13	CC	1122236284	RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY		X														X	230301	21	$1,066,450	$170,700	EPS041	21	$1,066,450	$42,700	CCF34	21	$1,191,542	$47,700	14-11	21	$1,066,450	6.960%	$74,300	21	$0	$0	SI	$335,400
14	CC	1004819005	ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY		X														X	230301	21	$1,066,450	$170,700	EPS041	21	$1,066,450	$42,700	CCF34	21	$1,189,176	$47,600	14-11	21	$1,066,450	6.960%	$74,300	21	$0	$0	SI	$335,300
Total		**Afiliados(11)**																				$26,867,753	$4,409,600			$26,867,753	$1,075,300			$27,483,749	$1,099,900			$26,867,753		$1,061,600		$0	$0		$7,646,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,409,600	$0	$0	$4,409,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$170,700	$0	$0	$170,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$595,900	$0	$0	$595,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,274,900	$0	$0	$3,274,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$368,100	$0	$0	$368,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,061,600	$0	$0	$1,061,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,061,600	$0	$0	$1,061,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,099,900	$0	$0	$1,099,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,099,900	$0	$0	$1,099,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$1,075,300	$0	$0	$1,075,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$134,800	$0	$0	$134,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$128,100	$0	$0	$128,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$769,700	$0	$0	$769,700
TOTAL				11	$7,646,400	$0	$0	$7,646,400

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751966	6	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVO	primavera urbana ofc 826	VILLAVICENCIO-META	6849992	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2063091817	9497604877	E	2026/01/19	2026/01/06	BANCOLOMBIA	0	$3,332,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVO (6 Afiliados)																							$12,719,100	$2,035,500			$12,719,100	$509,200			$12,719,100	$509,200			$12,719,100		$278,300		$0	$0		$3,332,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																							$9,256,100	$1,481,300			$9,256,100	$370,600			$9,256,100	$370,600			$9,256,100		$37,200		$0	$0		$2,259,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																							$9,256,100	$1,481,300			$9,256,100	$370,600			$9,256,100	$370,600			$9,256,100		$37,200		$0	$0		$2,259,700
1	CC	40326478	AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA																		25-14	23	$2,592,407	$414,800	EPS005	23	$2,592,407	$103,700	CCF34	23	$2,592,407	$103,700	14-11	23	$2,592,407	0.522%	$13,600	23	$0	$0	SI	$635,800
2	CC	40326478	AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA													X					25-14	7	$788,993	$126,300	EPS005	7	$788,993	$31,600	CCF34	7	$788,993	$31,600	14-11	7	$788,993	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$189,500
3	CC	40328285	GOMEZ LEAL LINA MARCELA																		230301	23	$1,340,900	$214,600	EPS005	23	$1,340,900	$53,700	CCF34	23	$1,340,900	$53,700	14-11	23	$1,340,900	0.522%	$7,000	23	$0	$0	SI	$329,000
4	CC	40328285	GOMEZ LEAL LINA MARCELA													X					230301	7	$408,100	$65,300	EPS005	7	$408,100	$16,400	CCF34	7	$408,100	$16,400	14-11	7	$408,100	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$98,100
5	CC	40395435	MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA																		25-14	23	$2,071,687	$331,500	EPS005	23	$2,071,687	$82,900	CCF34	23	$2,071,687	$82,900	14-11	23	$2,071,687	0.522%	$10,900	23	$0	$0	SI	$508,200
6	CC	40395435	MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA													X					25-14	7	$630,513	$100,900	EPS005	7	$630,513	$25,300	CCF34	7	$630,513	$25,300	14-11	7	$630,513	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$151,500
7	CC	1092394700	PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA																		230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF34	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	0.522%	$5,700	23	$0	$0	SI	$267,800
8	CC	1092394700	PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA													X					230301	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF34	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$79,800
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)																							$3,463,000	$554,200			$3,463,000	$138,600			$3,463,000	$138,600			$3,463,000		$241,100		$0	$0		$1,072,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$3,463,000	$554,200			$3,463,000	$138,600			$3,463,000	$138,600			$3,463,000		$241,100		$0	$0		$1,072,500
9	CC	80013513	MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO																		230301	30	$2,039,500	$326,400	EPS005	30	$2,039,500	$81,600	CCF34	30	$2,039,500	$81,600	14-11	30	$2,039,500	6.960%	$142,000	30	$0	$0	SI	$631,600
10	CC	96193788	PEREZ PEREZ OBER ASMED																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(6)																							$12,719,100	$2,035,500			$12,719,100	$509,200			$12,719,100	$509,200			$12,719,100		$278,300		$0	$0		$3,332,200

en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$2,035,500	$0	$0	$2,035,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,201,300	$0	$0	$1,201,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$834,200	$0	$0	$834,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$278,300	$0	$0	$278,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$278,300	$0	$0	$278,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$509,200	$0	$0	$509,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	$509,200	$0	$0	$509,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$509,200	$0	$0	$509,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$509,200	$0	$0	$509,200
TOTAL				6	$3,332,200	$0	$0	$3,332,200

Villavicencio, 05 de enero de 2026

C E R T I F I C A C I Ó N:

Yo, **DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO**, identificada con Cédula de ciudadanía. No. 40.395.435 de Villavicencio y TP 227117 -T, designada como Contadora del **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con **NIT. 901.965.630-1**, certifico que en la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025, CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META" la entidad cumplió del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, y en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicios Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, por lo tanto la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de enero del año 2026.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO
R.L. CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
C.C. 40.395.435 DE VILLAVICENCIO
CONTADORA PUBLICA
TP 227117-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.395.435
MACHADO TEJEIRO
APELLIDOS
DIVA YANIRA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1972
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-SEP-1990 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5200100-00126010-F-0040395435-20081106 0005570114A 1 6720006039

PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
COMO CONTADOR DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

227117-T

DIVA YANIRA
MACHADO TEJEIRO
C.C. 40395435
RES. INSCRIPCION 297 DEL 31/03/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231570 244684

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

ANEXO 6. PAZ Y SALVO PERSONAL RETIRADO

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

PAZ Y SALVO

Yo. **JEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 78.646.546** expedida **Tierra Alta (Córdoba),** hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificada con **NIT 901.965.630-1**, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados se establecieron, en el desarrollo de las actividades como **OPERADOR DE MAQUINARIA** desempeñadas desde el **24 de octubre de 2025** al **21 de diciembre del 2025**; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821 de 2025** suscrito con el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN con objeto **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"**, y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

El presente documento se firma en Puerto Gaitán - Meta, el día 24 de diciembre del año 2.025.

Jeferson G

FIRMA
NOMBRE: **JEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES**
C.C. No. 78.646.546 de Tierra Alta (Córdoba)

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

PAZ Y SALVO

Yo. **JOSE JAVIER MONCADA CANO,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.093.921.945** de **Tibú (Nte de Sder),** hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificada con **NIT 901.965.630-1**, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados se establecieron, en el desarrollo de las actividades como **OFICIAL DE TUBERIA** desempeñadas desde el **24 de octubre de 2025** al **21** de **diciembre del 2025**; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821 de 2025** suscrito con el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN con objeto **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"**, y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

Para constancia de lo anterior se firma en Villavicencio a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del dos mil **veinticinco** (2.025).

Jose JrMC

FIRMA
NOMBRE: **JOSE JAVIER MONCADA CANO**
C.C. No. 1.093.921.945 de **Tibú** (Nte de Sder)

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

PAZ Y SALVO

Yo **MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.103.470.729** expedida en **Santa Helena del Opón (Santander),** hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificada con **NIT 901.965.630-1**, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados se establecieron, en el desarrollo de las actividades como **OFICIAL DE OBRA** desempeñadas desde el **24 de octubre de 2025** al **21 de diciembre del 2025**; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821 de 2025** suscrito con el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN con objeto **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"**, y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

El presente documento se firma en Puerto Gaitán - Meta, el día 24 de diciembre del año 2.025.

Correa Miguel. 1103470729

FIRMA
NOMBRE: **MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA**
C.C. No. 1.103.470.729 de **Santa Helena del Opón (Santander)**

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

PAZ Y SALVO

Yo **DUVAN ARLEY ROMERO AREVALO,** identificado con cédula de ciudadanía **No.** 1.004.819.005 de **Ocaña** (Nte de Sder), hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificada con **NIT 901.965.630-1**, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados se establecieron, en el desarrollo de las actividades como **OFICIAL DE TUBERIA** desempeñadas desde el **24 de octubre de 2025** al **21** de **diciembre del 2025**; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821 de 2025** suscrito con el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN con objeto **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"**, y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

Para constancia de lo anterior se firma en Villavicencio a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del dos mil **veinticinco** (2.025).

Duvan Romero

FIRMA
NOMBRE: **DUVAN ARLEY ROMERO AREVALO**
C.C. No. 1.004.819.005 de **Ocaña** (Nte de Sder)

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

PAZ Y SALVO

Yo **BRISLEY RAMIREZ JIMENEZ,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.122.236.284** de San José del Guaviare (Guaviare)**,** hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025,** identificada con **NIT 901.965.630-1**, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados se establecieron, en el desarrollo de las actividades como **OFICIAL DE OBRA** desempeñadas desde el **24 de octubre de 2025** al **21 de diciembre del 2025**; en la ejecución del Contrato Obra **No. 0821 de 2025** suscrito con el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN con objeto **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"**, y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

El presente documento se firma en Puerto Gaitán - Meta, el día 24 de diciembre del año 2.025.

BRISLEY RAMIREZ

FIRMA
NOMBRE: **BRISLEY RAMIREZ JIMENEZ**
C.C. No. 1.122.236.284 de San José del Guaviare (Guaviare)

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.680 – 1

ANEXO 7. NOMINAS DEL PERSONAL.

CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.955.630-1

Nomina del día 01 al 15 de Noviembre de 2.025

				DEVENGADO								DEDUCCIONES						
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	RIESGO	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte	Licencia Remunerada	Incapacidad (EPS/ARL)	Pacto No Salarial	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo Solidaridad Pensional	Retefuente Laborales	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.328.478	DIRECTOR DE OBRA	5	$ 1.423.500	15	$ 711.750	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ 811.750	$ 28.500	$ 28.500	$ -	$ -	$ 57.000	$ 754.750	Se envia desprendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	$ 2.300.000	15	$ 1.150.000	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.250.000	$ 46.000	$ 46.000	$ -	$ -	$ 92.000	$ 1.158.000	Se envia desprendible de nómina al correo: Ing.wvg2@gmail.com
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.869.998	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	5	$ 2.600.000	15	$ 1.300.000	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ 52.000	$ 52.000	$ -	$ -	$ 104.000	$ 1.296.000	Se envia desprendible de nómina al correo: g.pardo09@gmail.com
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	$ 11.000.000	15	$ 5.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 55.000	$ -	$ 495.000	$ 5.005.000	Se envia desprendible de nómina al correo: Inglulsfernandom@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	5	$ 1.912.000	15	$ 956.000	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.056.000	$ 38.200	$ 38.200	$ -	$ -	$ 76.400	$ 979.600	Se envia desprendible de nómina al correo: asesoriasfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	$ 2.300.000	15	$ 1.150.000	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.250.000	$ 46.000	$ 46.000	$ -	$ -	$ 92.000	$ 1.158.000	Se envia desprendible de nómina al correo: eskp87@hotmail.com
TOTALES						$ 10.767.750	$ 500.000	$ -		$ -	$ 11.267.750	$ 430.700	$ 430.700	$ 55.000	$ -	$ 916.400	$ 10.351.350	

A cargo del empleador							
Seguridad Social			%	Valor	Provisiones Prest. Soc y Vac.	%	Valor
Salud			0,0%	$ 0	Cesantías	8,330%	$ 938.604
Fondo de Pensiones			12%	$ 1.292.130	Intereses sobre cesantías	1%	$ 112.678
ARL (riesgos laborales)	Seleccione la tarifa:	I	0,522%	$ 28.710	Prima	8,330%	$ 938.604
		IV	4,350%	$ 0	Vacaciones	4,170%	$ 449.015
		V	6,960%	$ 366.635			
Total Seguridad Social				$ 1.687.475	Total prestaciones sociales		$ 2.438.900

Parafiscales			%	Valor
Caja Compensación Familiar			4%	$ 430.710
ICBF			0%	$ 0
SENA			0%	$ 0
Total Parafiscales				$ 430.710

Total a cargo del empleador	$ 4.557.085

Dias de la nomina	30
Horas trabaladas en el dia	7,33

IMPORTANTE!	
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?	
marque con una "X" si es asi.	
SI	X

Salario Minimo Legal Vigente 202	$ 1.423.500
Auxilio de transporte	$ 200.000

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

NOVEDAD	
INGRESO	
OTROS!	
VACACIONES	

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Basico	Valor Hora Ordinaria DIURNA/LABORAL	Cant. Horas EXTRA Ordinarias E EXTRAS DIURNAS	Valor hora extra o. EXTRA DIURNA	Cant. hora extra nocturna	Valor hora extra nocturna	Cant. hora extra dom. festivo diurno	Valor hora extra dom. festivo	Cant. hora extra dom. festivo nocturno	Valor hora extra dom. festivo nocturno	TOTAL HORAS EXTRAS
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.328.478	$ 1.423.500	9.473	0	-	0	-	0	-	0	-	-
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	$ 2.300.000	10.459	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO	1.121.869.998	$ 2.600.000	11.824	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	$ 11.000.000	50.023	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	$ 1.912.000	8.695	0	-	0	-	0	-	0	-	-
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO		$ 2.300.000	10.459	0	-	0	-	0	-	0	-	-
TOTALES				0	-	0	-	0	-	0	-	-

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
"B" CONTADORA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA01AL15_DIC
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 15-12-2025 **Hora:** 16:57:31
Fecha de Generación: 15-12-2025

Fecha de envío del pago: 15-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $10,351,350.00	**Valor Registros Procesados:** $4,591,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,759,750.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000489190405	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	754,750.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	15-12-2025
84488944231	Ahorros	1121902403	WENDY VANESA GARZO	1,158,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025
00000003125364066	Ahorros	1121869998	GUSTAVO ADOLFO MED	1,296,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025
00000097070052234	Ahorros	86051533	LUIS FERNANDO MU O	5,005,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	15-12-2025
84400006251	Ahorros	17497322	ROSEMBERG MURCIA	979,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025
84968486569	Ahorros	1121834340	GUILLERMO ALBERTO	1,158,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025

CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.965.630-1

Nomina del día 16 al 31 de Diciembre de 2.025

				DEVENGADO								DEDUCCIONES						
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Riesgo	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte	Vacaciones	Incapacidad (EPS/ARL)	Pacto No Salarial	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo Solidaridad Pensional	Retefuente Laborales	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	DIRECTOR DE OBRA	5	$ 1.423.500	15	$ 711.750	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ 811.750	$ 28.500	$ 28.500	$ -	$ -	$ 57.000	$ 754.750	Se envia desprendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
GARZO GARCIA WENDY VANESA (VAC)	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	$ 2.300.000	8	$ 613.333	$ 53.333	$ 536.667	$ -	$ -	$ 1.203.333	$ 46.000	$ 46.000	$ -	$ -	$ 92.000	$ 1.111.333	Se envia desprendible de nómina al correo: ing.wvg2@gmail.com
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO (VAC)	1.121.869.998	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	5	$ 2.600.000	8	$ 693.333	$ 53.333	$ 606.667	$ -	$ -	$ 1.353.333	$ 52.000	$ 52.000	$ -	$ -	$ 104.000	$ 1.249.333	Se envia desprendible de nómina al correo: g.pardo09@gmail.com
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	$ 11.000.000	15	$ 5.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 55.000	$ 242.000	$ 737.000	$ 4.763.000	Se envia desprendible de nómina al correo: lngluisfernandom@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	5	$ 1.912.000	15	$ 956.000	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.056.000	$ 38.200	$ 38.200	$ -	$ -	$ 76.400	$ 979.600	Se envia desprendible de nómina al correo: asesoriasfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO (VAC)	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	$ 2.300.000	11	$ 843.333	$ 73.333	$ 306.667	$ -	$ -	$ 1.223.333	$ 46.000	$ 46.000	$ -	$ -	$ 92.000	$ 1.131.333	Se envia desprendible de nómina al correo: eskp87@hotmail.com
TOTALES						$ 9.317.750	$ 380.000	$ 1.450.000		$ -	$ 11.147.750	$ 430.700	$ 430.700	$ 55.000	$ 242.000	$ 1.158.400	$ 9.989.350	

A cargo del empleador							
Seguridad Social			%	Valor	Provisiones Prest. Soc y Vac.	%	Valor
Salud			0,0%	$ 0	Cesantías	8,330%	$ 928.608
Fondo de Pensiones			12%	$ 1.292.130	Intereses sobre cesantías	1%	$ 111.478
ARL (riesgos laborales)	Seleccione la tarifa:	I	0,522%	$ 28.710	Prima	8,330%	$ 928.608
		IV	4,350%	$ 0	Vacaciones	4,170%	$ 449.015
		V	6,960%	$ 265.715			
Total Seguridad Social				$ 1.586.555	Total prestaciones sociales		$ 2.417.708

Parafiscales				%	Valor
Caja Compensación Familiar				4%	$ 430.710
ICBF				0%	$ 0
SENA				0%	$ 0
Total Parafiscales					$ 430.710

Total a cargo del empleador	$ 4.434.973

Dias de la nomina	30
Horas trabaladas en el dia	7,33

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Basico	Valor hora ordinaria	Cant hora extra ordinaria	Valor hora extra ord.	Cant hora extra recargo	Valor hora extra recargo	Cant hora extra dominical	Valor hora extra dom.	Cant hora extra nocturna	Valor hora extra noct.	Cant hora extra dom. nocturna	Valor hora extra dom. nocturna	TOTAL HORAS EXTRAS
			DIURNA	NOCTURNA DIURNA	EXTRA DIURNA									
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	$ 1.423.500	6.473	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
GARZO GARCIA WENDY VANESA (VAC)	1.121.902.403	$ 2.300.000	10.459	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO (VAC)	1.121.869.998	$ 2.600.000	11.824	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	$ 11.000.000	50.023	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	$ 1.912.000	8.695	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO (VAC)	1.121.834.340	$ 2.300.000	10.459	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
TOTALES				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-

IMPORTANTE!
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?
marque con una "X" si es asi.
SI X

alario Minimo Legal Vigente 202	$ 1.423.500
Auxilio de transporte	$ 200.000

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

NOVEDAD	
DIA DE LA FAMILIA	
VACACIONES	
GARZO GARCIA WENDY VANESA (VAC)	VACACIONES 8 DIAS HABILES EN DICIEMBRE
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO (VAC)	
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO (VAC)	VACACIONES 4 DIAS HABILES

DIVA YAMIRA MACHADO TEJEIRO
V°B° CONTADORA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA16AL31_DIC
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 06-01-2026 **Hora:** 10:46:23
Fecha de Generación: 06-01-2026

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,497,350.00	**Valor Registros Procesados:** $6,497,350.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000489190405	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	754,750.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000097070052234	Ahorros	86051533	LUIS FERNANDO MU O	4,763,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
84400006251	Ahorros	17497322	ROSEMBERG MURCIA	979,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.965.630-1

Nomina del día 01 al 31 de Diciembre de 2.025

NOMINA MENSUAL

				DEVENGADO								DEDUCCIONES						
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	RH500	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte	Horas Extras / Recargos	Incapacidad (EPS/ARL)	Pacto No Salarial	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo Solidaridad Pensional	Retefuente Laborales	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIONES
CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID (R)	1.103.470.729	OFICIAL DE OBRA	5	$ 1.523.500	21	$ 1.066.450	$ 140.000	$ -	$ -	$ 403.550	$ 1.610.000	$ 42.700	$ 42.700	$ -	$ -	$ 85.400	$ 1.524.600	Se envia desprendible de nómina al correo: taniaarianlscorreasuarez@gmail.com
GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE (R)	78.646.546	OPERADOR DE MAQUINARIA	5	$ 1.523.500	21	$ 1.066.450	$ 140.000	$ -	$ -	$ 333.550	$ 1.540.000	$ 42.700	$ 42.700	$ -	$ -	$ 85.400	$ 1.454.600	Se envia desprendible de nómina al correo: jeffersong1984@gmail.com
MONCADA CANO JOSE JAVIER (R)	1.093.921.945	OFICIAL DE TUBERIA	5	$ 1.523.500	21	$ 1.066.450	$ 140.000	$ -	$ -	$ 123.550	$ 1.330.000	$ 42.700	$ 42.700	$ -	$ -	$ 85.400	$ 1.244.600	Se envia desprendible de nómina al correo: javier030695@gmail.com
RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY (R)	1.122.236.284	OFICIAL DE OBRA	5	$ 1.523.500	21	$ 1.066.450	$ 140.000	$ -	$ -	$ 403.550	$ 1.610.000	$ 42.700	$ 42.700	$ -	$ -	$ 85.400	$ 1.524.600	Se envia desprendible de nómina al correo: brisleyramirez5@hotmail.com
ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY (R)	1.004.819.005	OFICIAL DE TUBERIA	5	$ 1.523.500	21	$ 1.066.450	$ 140.000	$ -	$ -	$ 263.550	$ 1.470.000	$ 42.700	$ 42.700	$ -	$ -	$ 85.400	$ 1.384.600	Se envia desprendible de nómina al correo: duvan260425@hotmail.com
TOTALES						$ 5.332.250	$ 700.000	$ -		$ 1.527.750	$ 7.560.000	$ 213.500	$ 213.500	$ -	$ -	$ 427.000	$ 7.133.000	

A cargo del empleador								
Seguridad Social			%	Valor	Provisiones Prest. Soc y Vac.	%		Valor
Salud			0,0%	$ 0	Cesantías	8,330%		$ 502.486
Fondo de Pensiones			12%	$ 639.870	Intereses sobre cesantías	1%		$ 60.323
ARL (riesgos laborales)	Seleccione la tarifa:	I	0,522%	$ 0	Prima	8,330%		$ 502.486
		IV	4,350%	$ 0	Vacaciones	4,170%		$ 222.355
		V	6,960%	$ 371.125				
Total Seguridad Social				$ 1.010.995	Total prestaciones sociales			$ 1.287.650

Parafiscales			%	Valor
Caja Compensación Familiar			4%	$ 213.290
ICBF			0%	$ 0
SENA			0%	$ 0
Total Parafiscales				$ 213.290

IMPORTANTE!	
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 20122	
marque con una "X" si es asi.	
SI	X

Total a cargo del empleador	$ 2.511.935
Días de la nomina	30
Horas trabajadas en el día	7,33

	SI	NO
SE INDICA SI HUBO HORAS EXTRAS PARA UNO O VARIOS TRABAJADORS	X	

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Sueldo	Valor hora ordinaria	Cant hora extra nocturna / Valor hora extra nocturna	Cant hora extra diurna / Valor hora extra diurna	Cant hora recargo nocturno / Valor hora recargo nocturno	Cant hora recargo diurno / Valor hora recargo diurno	Cant hora extra dom. festiva / Valor hora extra dom. festiva	Cant hora extra dom. festiva diurna / Valor hora extra dom. festiva diurna	TOTAL HORAS EXTRAS
			ORDINARIA	H EXTRAS NUMUN	EXTRA NUMUN					
CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID (R)	1.103.470.729	$ 1.523.500	6.928	0	-	0	-	0	-	-
GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE (R)	78.646.546	$ 1.523.500	6.928	0	-	0	-	0	-	-
MONCADA CANO JOSE JAVIER (R)	1.093.921.945	$ 1.523.500	6.928	0	-	0	-	0	-	-
RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY (R)	1.122.236.284	$ 1.523.500	6.928	0	-	0	-	0	-	-
ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY (R)	1.004.819.005	$ 1.523.500	6.928	0	-	0	-	0	-	-
TOTALES				0	-	0	-	0	-	-

Salario Minimo Legal Vigente 202	$ 1.423.500
Auxilio de transporte	$ 200.000

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

NOVEDAD
RETIRO 21.12.2025
CORREA OJEDA MIGUEL DIOSID (R)
GALVAN MONTES YEFERSON ENRIQUE (R)
MONCADA CANO JOSE JAVIER (R)
RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY (R)
ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY (R)

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
V°B° CONTADORA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA01AL31_DIC
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 22-12-2025 **Hora:** 15:58:42
Fecha de Generación: 22-12-2025

Fecha de envío del pago: 22-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,133,000.00	**Valor Registros Procesados:** $7,133,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003183993083	Ahorros	1103470729	MIGUEL DOISID CORR	1,524,600.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
84959547491	Ahorros	78646546	YEFERSON ENRIQUE G	1,454,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000003124865277	Ahorros	1093921945	JOSE JAVIER MONCAD	1,244,600.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
28900043629	Ahorros	1122236284	BRISLEY RAMIREZ JI	1,524,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
00000003114981893	Ahorros	1004819005	DUVAN ARLEY ROMERO	1,384,600.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025

MUÑOZAREVALO
INGENIERIA SAS

MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.751.966-6

Nomina del día 01 al 15 de Diciembre de 2.025

NOMINA PERSONA CAG 2025

				DEVENGADO									DEDUCCIONES								
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	RIESGO	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte	INCAPACIDAD EGIARL	Licencia Remunerada / Calamidad Domestica	Anticipo Nomina 30 sept	Otro concepto	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo de Solidaridad Pensional	Retencion en la Fuente	Aportes SS pendiente de vacaciones	Otras Deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIÓN
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	ASISTENTE CONTABLE	1	$ 1.749.000	15	$ 874.500	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 974.500	$ 35.000	$ 35.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.000	$ 904.500	Se envia desprendible de nómina al correo: marce.g83@hotmail.com
MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA	40.395.435	CONTADOR	1	$ 2.702.200	15	$ 1.351.100	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.451.100	$ 54.000	$ 54.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 108.000	$ 1.343.100	Se envia desprendible de nómina al correo: divaya_2005@hotmail.com
MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO	80.013.513	CONDUCTOR	5	$ 2.039.500	15	$ 1.019.750	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.119.750	$ 40.800	$ 40.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.600	$ 1.038.150	Se envia desprendible de nómina al correo: alejandromunoz0221@gmail.com
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA	1.092.394.700	SECRETARIA	1	$ 1.423.500	15	$ 711.750	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 811.750	$ 28.500	$ 28.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.000	$ 754.750	Se envia desprendible de nómina al correo: paradapaola181@gmail.com
PEREZ PEREZ OBER ASMED	96.193.788	ALMACENISTA	5	$ 1.423.500	15	$ 711.750	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 811.750	$ 28.500	$ 28.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.000	$ 754.750	Se envia desprendible de nómina al correo: oberperez1979@gmail.com
				$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES						$ 4.668.850	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.168.850	$ 186.800	$ 186.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 373.600	$ 4.795.250	

A cargo del empleador

SEGURIDAD SOCIAL		%	VALOR
Salud		0,0%	$ 0
Fondo de Pensiones		12%	$ 560.262
ARL (riesgos laborales)	I	0,52%	$ 15.333
Seleccione la tarifa:	IV	4,35%	$ 0
	V	6,96%	$ 120.612
Total Seguridad Social			$ 696.107

Parafiscales	%	Valor
Caja Compensación Familiar	4%	$ 186.754
ICBF	0%	$ 0
SENA	0%	$ 0
Total Parafiscales		$ 186.754

Provisiones Prest. Soc y Vac	%	VALOR
Cesantias	8,330%	$ 430.565
Intereses sobre cesantias	1%	$ 51.669
Prima	8,330%	$ 430.565
Vacaciones	4,170%	$ 194.691
Total prestaciones sociales		$ 1.107.610

Total a cargo del empleador	$ 1.990.371

Dias de la nomina	30
Horas trabajadas en el dia	7,33

Salario Minimo Legal Vigente 2026	$ 1.423.500
Auxilio de transporte	$ 200.000

IMPORTANTE!
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 20127
marque con una "X" si es asi.
SI X

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

NOVEDAD	
INCAPACIDAD	
LICENCIA REMUNERADA / CALAMIDAD DOMESTICA	
VACACIONES	

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Basico		Valor Hora Ordinaria	Cant hora extra ordinaria	Valor hora extra n.	Cant hora extra nocturna	Valor hora extra nocturna	Cant hora extra dia festivo	Valor hora extra dia festivo	Cant hora extra noche festiva	Valor hora extra noche festiva	TOTAL HORAS EXTRAS
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	$ 1.749.000		7.954	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA	40.395.435	$ 2.702.200		12.288	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO	80.013.513	$ 2.039.500		9.275	0	-	0	-	0	-	0	-	-
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA	1.092.394.700	$ 1.423.500		6.473	0	-	0	-	0	-	0	-	-
PEREZ PEREZ OBER ASMED	96.193.788	$ 1.423.500		6.473	0	-	0	-	0	-	0	-	-
0	-	$ -		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
TOTALES					0		0		0		0		-

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
Vita CONTADORA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNOZ AREVALO
NIT: 900751966
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA01AL15_DIC
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 05700001408

Fecha: 15-12-2025 **Hora:** 14:10:14
Fecha de Generación: 15-12-2025

Fecha de envío del pago: 15-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2025

Impreso por: pagos826

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $6,350,750.00	**Valor Registros Procesados:** $5,596,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $754,750.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84441009223	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	1,555,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025
84100000320	Ahorros	40328285	LINA MARCELA GOMEZ	904,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025
84424812683	Ahorros	40395435	DIVA MACHADO	1,343,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025
84424840296	Ahorros	80013513	ALEJANDRO MU OZ	1,038,150.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025
58600019048	Ahorros	1092394700	GENESIS PAOLA PARA	754,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025
00000003136184167	Ahorros	96193788	OBER ASMED PEREZ	754,750.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	15-12-2025

MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.751.966-6

Nomina del día 16 al 31 de Diciembre de 2.025

NOMINA PERSONA CAG 2025

				DEVENGADO									DEDUCCIONES								
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	RIESGO	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte	INCAPACIDAD EG/ARL	Licencia Remunerada / Calamidad Domestica	Vacaciones	Otro concepto	Total Devengado	Salud	Pension	Fondo de Solidaridad Pensional	Retencion en la Fuente	Aportes SS pendiente de vacaciones	Otras Deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado	OBSERVACIÓN
GOMEZ LEAL LINA MARCELA (Vac)	40.328.285	ASISTENTE CONTABLE	1	$ 1.749.000	8	$ 466.400	$ 53.333	$ -	$ -	$ 408.100	$ -	$ 927.833	$ 35.000	$ 35.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.000	$ 857.833	Se envia desprendible de nómina al correo: marce.g83@hotmail.com
MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA (Vac)	40.395.435	CONTADOR	1	$ 2.702.200	8	$ 720.587	$ 53.333	$ -	$ -	$ 630.513	$ -	$ 1.404.433	$ 54.000	$ 54.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 108.000	$ 1.296.433	Se envia desprendible de nómina al correo: divaya_2005@hotmail.com
MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO	80.013.513	CONDUCTOR	5	$ 2.039.500	15	$ 1.019.750	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.119.750	$ 40.800	$ 40.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.600	$ 1.038.150	Se envia desprendible de nómina al correo: alejandromunoz0221@gmail.com
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA (Vac)	1.092.394.700	SECRETARIA	1	$ 1.423.500	8	$ 379.600	$ 53.333	$ -	$ -	$ 332.150	$ -	$ 765.083	$ 28.500	$ 28.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.000	$ 708.083	Se envia desprendible de nómina al correo: paradapaola181@gmail.com
PEREZ PEREZ OBER ASMED	96.193.788	ALMACENISTA	5	$ 1.423.500	15	$ 711.750	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 811.750	$ 28.500	$ 28.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.000	$ 754.750	Se envia desprendible de nómina al correo: oberperez1979@gmail.com
				$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES						$ 3.239.087	$ 360.000	$ -	$ -	$ 1.370.763	$ -	$ 5.028.850	$ 186.800	$ 186.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 373.600	$ 4.655.250	

A cargo del empleador						
SEGURIDAD SOCIAL		%	VALOR	Provisiones Prest. Soc y Vac	%	VALOR
Salud		0,0%	$ 0	Cesantías	8,330%	$ 304.719
Fondo de Pensiones		12%	$ 395.770	Intereses sobre cesantías	1%	$ 36.581
ARL (riesgos laborales)	I	0,52%	$ 8.178	Prima	8,330%	$ 304.719
Seleccione la tarifa:	IV	4,35%	$ 0	Vacaciones	4,170%	$ 137.530
	V	6,96%	$ 120.512	Total prestaciones sociales		$ 783.549
Total Seguridad Social			$ 524.460			
Parafiscales		%	Valor			
Caja Compensación Familiar		4%	$ 131.923			
ICBF		0%	$ 0			
SENA		0%	$ 0			
Total Parafiscales			$ 131.923			

Total a cargo del empleador	$ 1.439.932
Dias de la nomina	30
Horas trabajadas en el dia	7,33

IMPORTANTE!
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?
marque con una "x" si es así.
SI	X

Salario Minimo Legal Vigente 2025	$ 1.423.500
Auxilio de transporte	$ 200.000

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Basico		Valor Hora Ordinaria	Cant hora extra ordinaria	Valor hora extra n.	Cant hora extra nocturna	Valor hora extra nocturna	Cant hora extra dia festivo	Valor hora extra dia festivo	Cant hora extra noche festivo	Valor hora extra noche festivo	TOTAL HORAS EXTRAS
GOMEZ LEAL LINA MARCELA (Vac)	40.328.285	$ 1.749.000		7.954	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA (Vac)	40.395.435	$ 2.702.200		12.288	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO	80.013.513	$ 2.039.500		9.275	0	-	0	-	0	-	0	-	-
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA (Vac)	1.092.394.700	$ 1.423.500		6.473	0	-	0	-	0	-	0	-	-
PEREZ PEREZ OBER ASMED	96.193.788	$ 1.423.500		6.473	0	-	0	-	0	-	0	-	-
0	-	$ -		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
TOTALES					0		0		0		0		-

NOVEDAD	
INCAPACIDAD	
LICENCIA REMUNERADA / CALAMIDAD DOMESTICA	
VACACIONES	
GOMEZ LEAL LINA MARCELA (Vac)	Vacaciones 5 DIA HÁBILES
MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA (Vac)	
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA (Vac)	

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO

T.P CONTADORA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNOZ AREVALO **Nombre del pago:** NOMINA16AL31_DIC **Fecha:** 06-01-2026 **Hora:** 10:15:57 **Fecha de envío del pago:** 29-12-2025

NIT: 900751966 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 06-01-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2025

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 05700001408

Impreso por: pagos826

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,792,900.00	**Valor Registros Procesados:** $1,792,900.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00





NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84424840296	Ahorros	80013513	ALEJANDRO MU OZ	1,038,150.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003136184167	Ahorros	96193788	OBER ASMED PEREZ	754,750.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

ANEXO 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO AWALIBA



POZO PROFUNDO

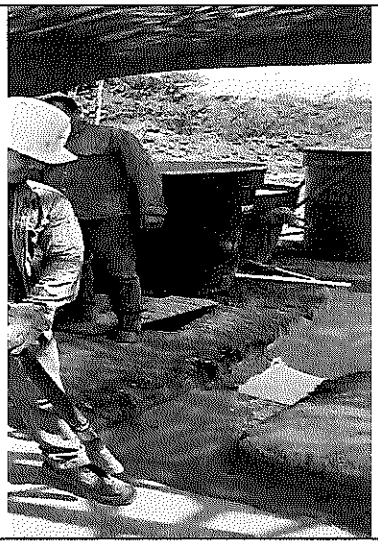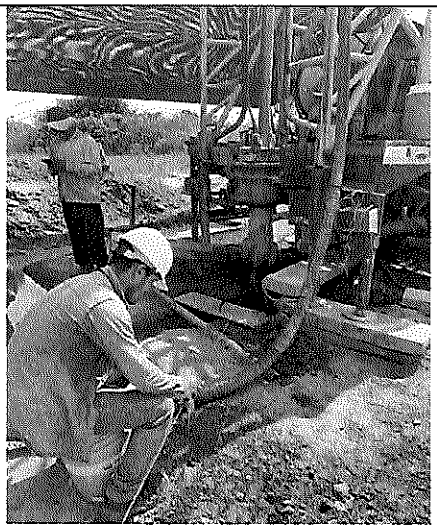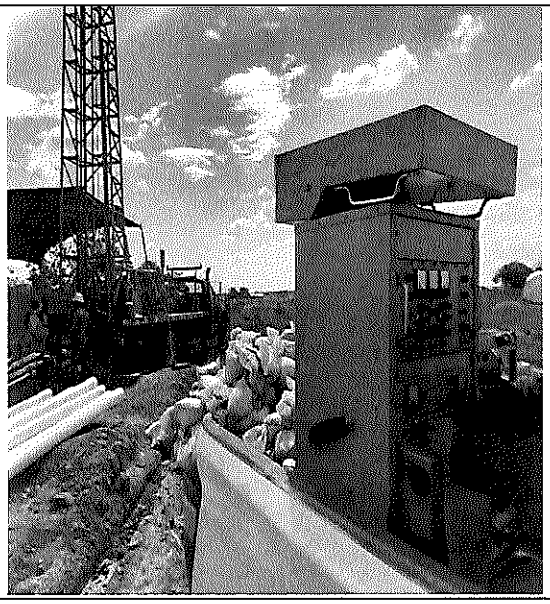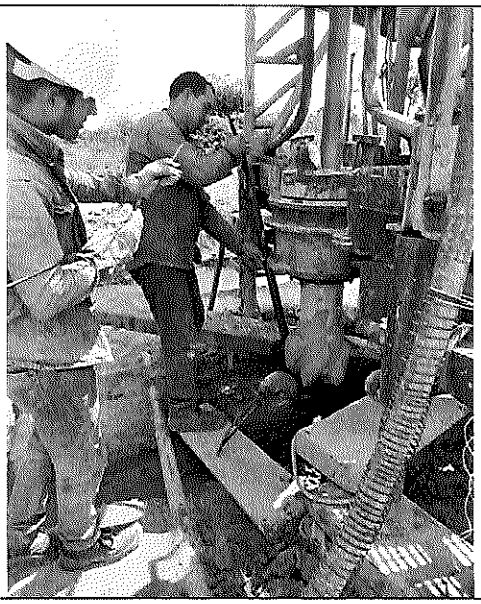COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	**Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.
	
Construcción piscina de lodos	***perforación de prueba***
Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	**Ítem 1,6** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"
	
Registro Eléctrico	***Ampliación perforación***




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	**Ítem 1,10** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION
	
Instalación tubería pvc 6"	*Instalación filtro tubería*

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

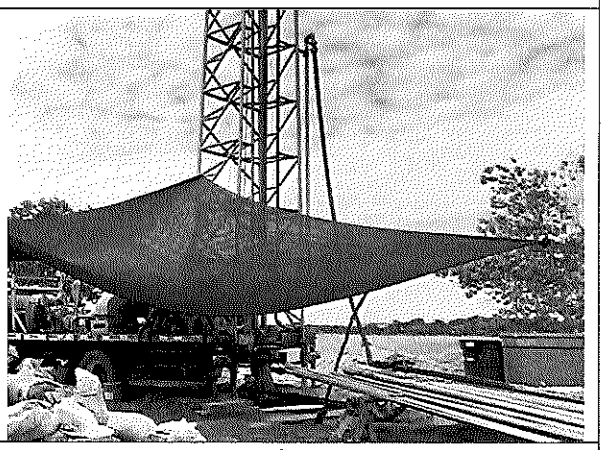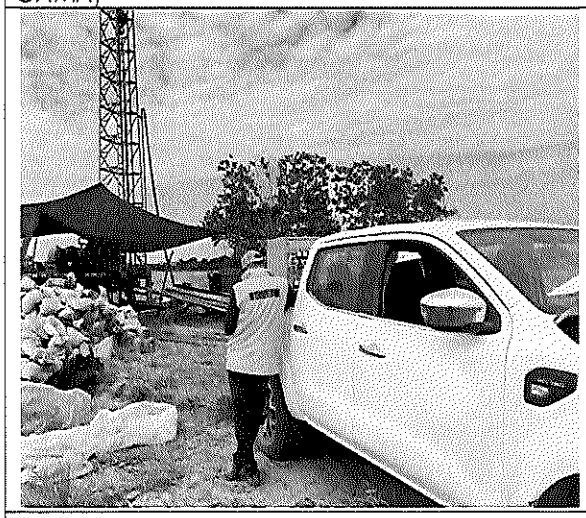COMUNIDAD PUNTO GRILLO	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	**Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.
	
Construcción piscina de lodos	***perforación de prueba***
Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	**Ítem 1,7** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M
	
Registro Eléctrico	***Instalación tubería pvc 6"***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

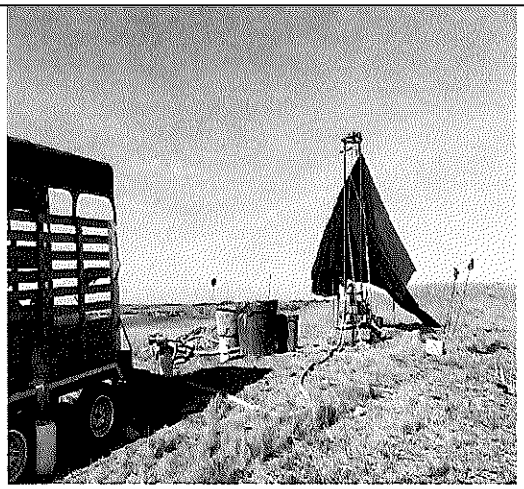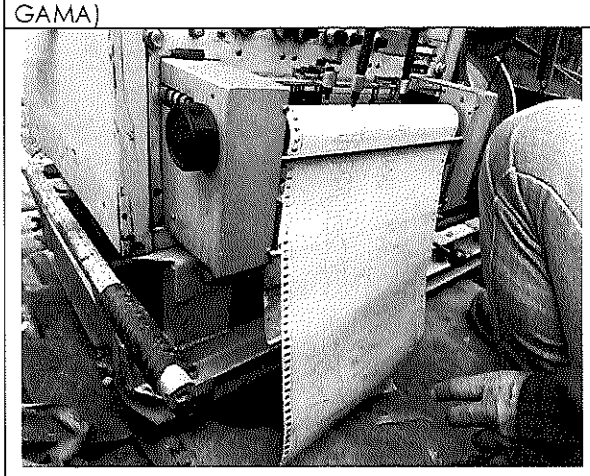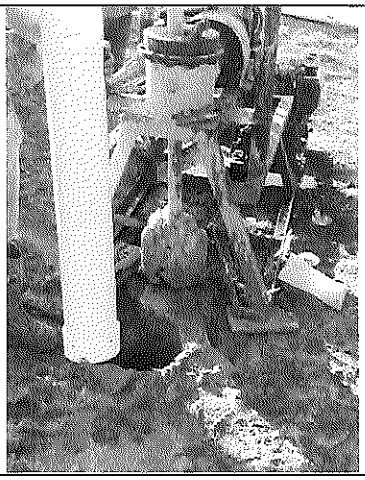
COMUNIDAD FACUNAE	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	**Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.
	
Construcción piscina de lodos	***perforación de prueba***
Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	**Ítem 1,6** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"
	
Registro Eléctrico	***Ampliación perforación***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1





REDES DE ACUEDUCTO

COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,5** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.
	
Camada de arena	***Relleno proveniente de la excavación***
Ítem 4,7) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	**Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE
	
Transporte material pétreo	***Excavación Mecánica***



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

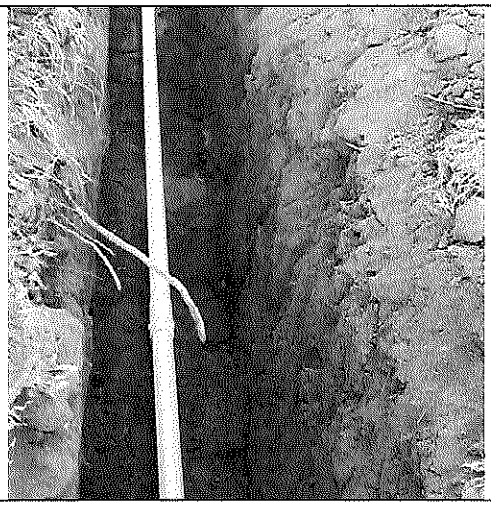COMUNIDAD PUERTO LOPEZ	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,5** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.
	
Camada de arena	***Relleno proveniente de la excavación***
Ítem 4,7) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	**Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE
	
Transporte material pétreo	***Excavación Mecánica***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

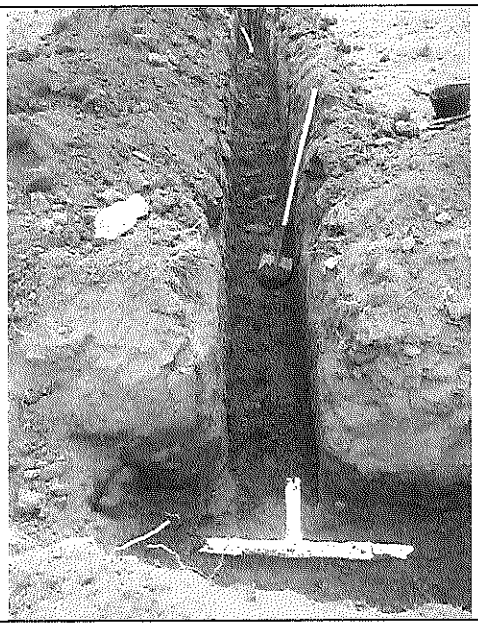
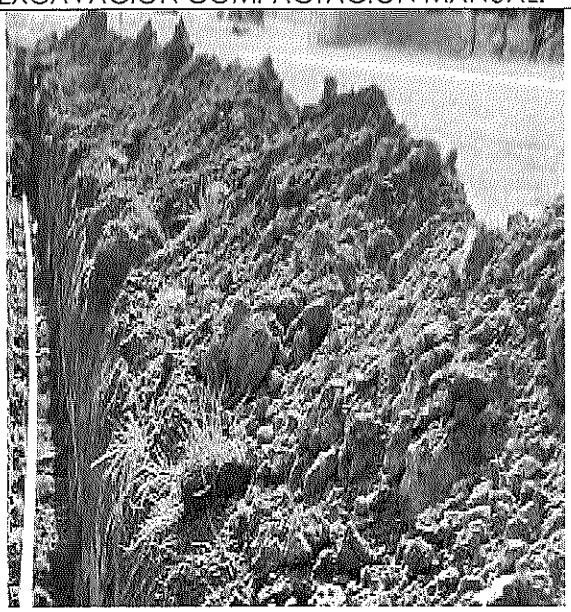
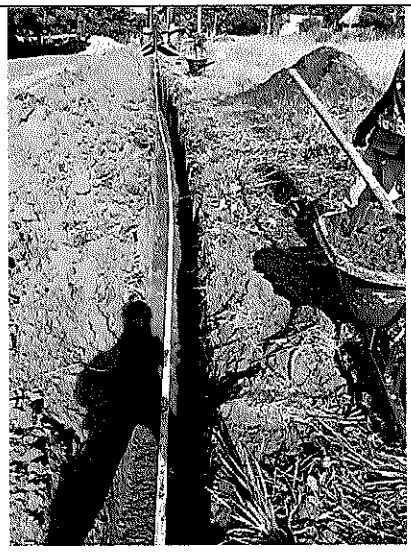
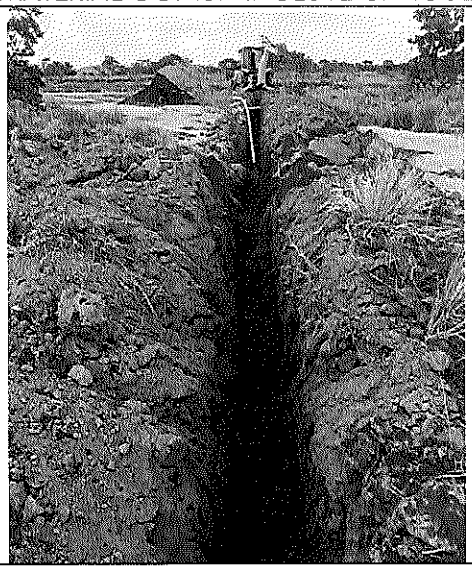
COMUNIDAD PUNTO GRILLO	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,5** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.
	
Camada de arena	***Relleno proveniente de la excavación***
Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	**Ítem 4,15)** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE
	
Instalación tubería 2"	***Excavación Mecánica***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1


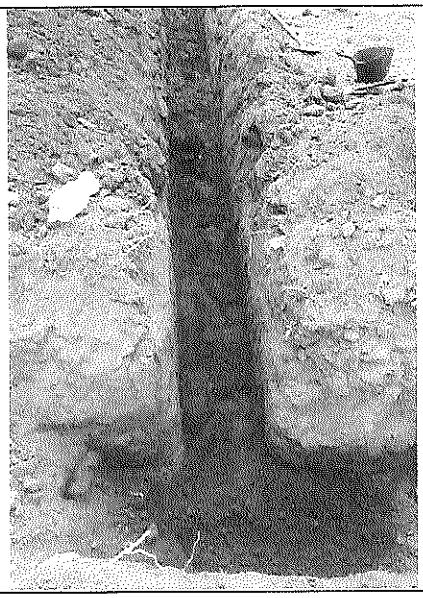
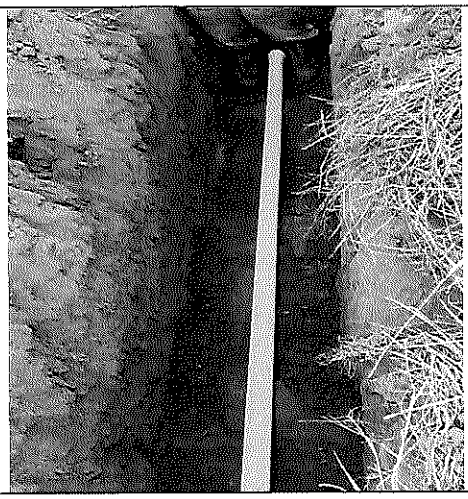
COMUNIDAD FACUNAE	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,5** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.
	
Camada de arena	***Relleno proveniente de la excavación***
Ítem 4,7) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	**Ítem 4,8** TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN
	
Transporte material pétreo	***Instalación tubería 2"***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1



TANQUE ELEVADO

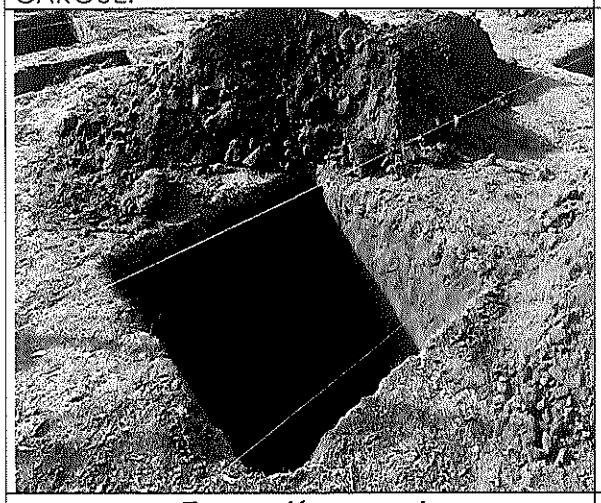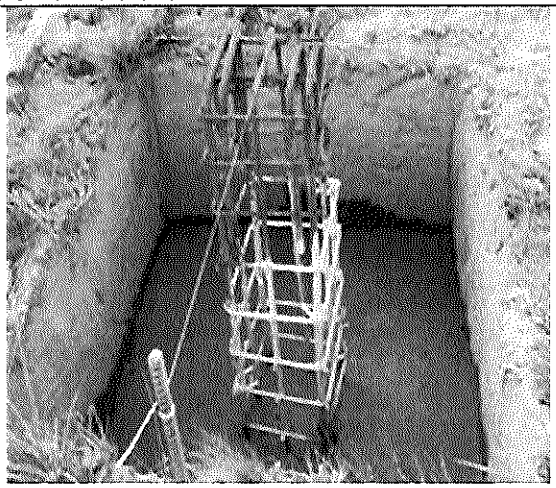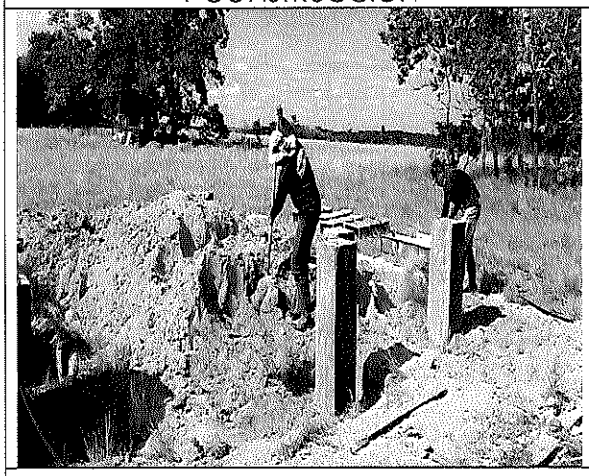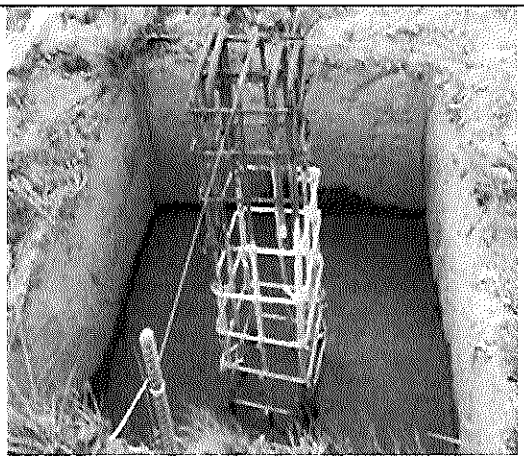COMUNIDAD PUERTO LOPEZ	
Ítem 5,3 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 – 2,00m INCLUYE CARGUE.	**Ítem 5,5** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
	
Excavación manual	***Zapata en concreto***
Ítem 5,6) COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	**Ítem 5,7** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE
	
Columna en concreto	***Acero de refuerzo***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

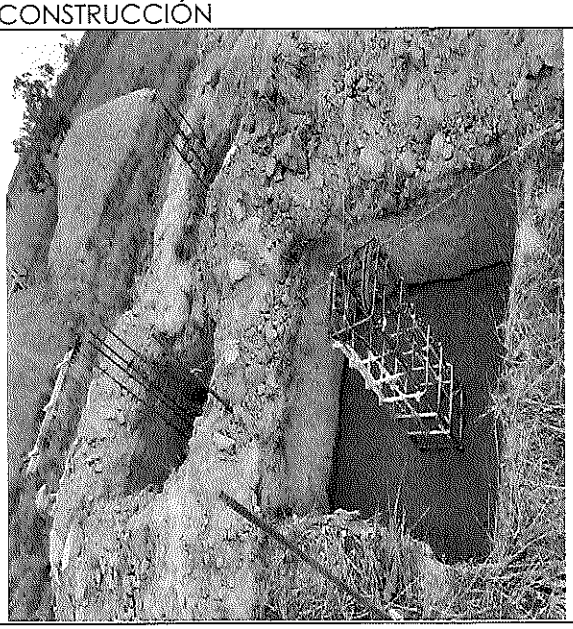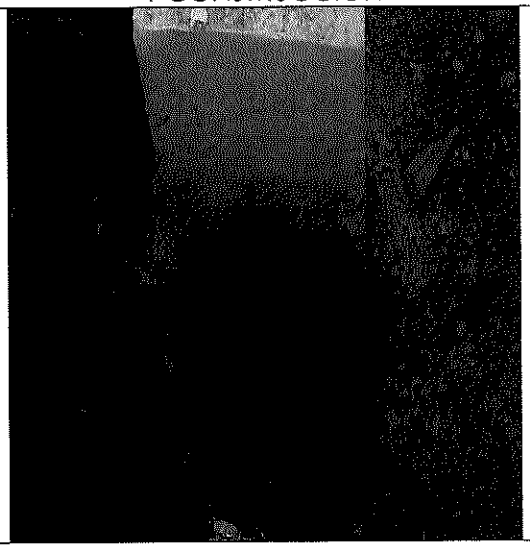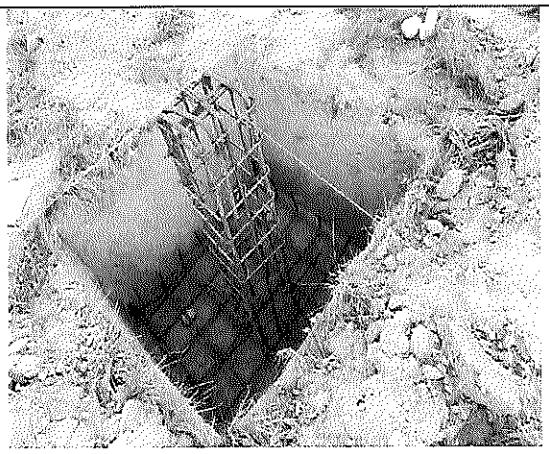
COMUNIDAD PUNTO GRILLO	
Ítem 5,3 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 – 2,00m INCLUYE CARGUE.	**Ítem 5,5** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
	
Excavación manual	***Zapata en concreto***
Ítem 5,6) COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	**Ítem 5,7** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE
	
Columna en concreto	***Acero de refuerzo***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

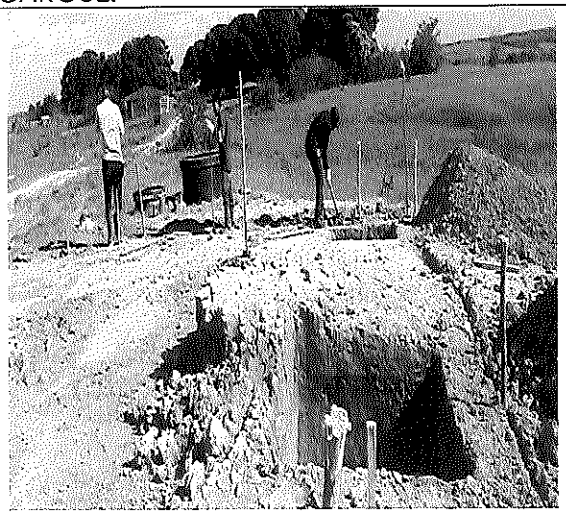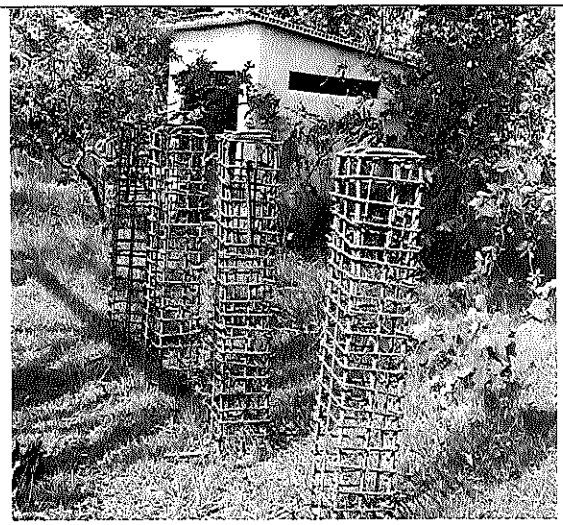COMUNIDAD FACUNAE	
Ítem 5,3 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 – 2,00m INCLUYE CARGUE.	**Ítem 5,5** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
	
Excavación manual	***Zapata en concreto***
Ítem 5,6) COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	**Ítem 5,7** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE
	
Columna en concreto	***Acero de refuerzo***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1




CERRAMIENTO PERIMETRAL

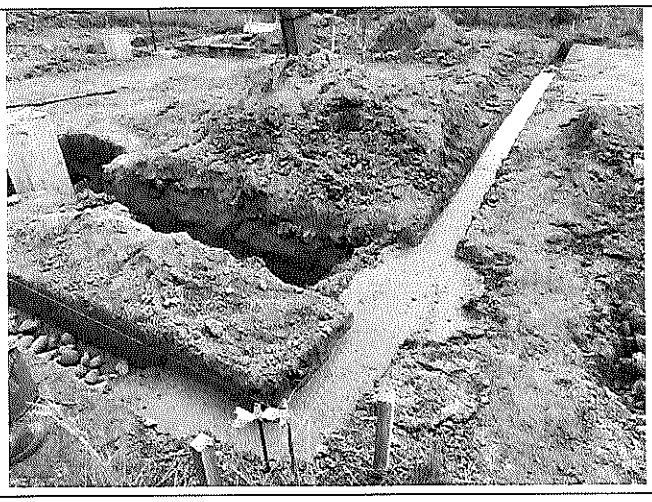COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL	
Ítem 6,1) LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	**Ítem 6,2)** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE
	
Localización y replanteo	***Excavación manual***
Ítem 6,3) CONCRETO CICLOPEO***pla*** 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	**Ítem 6,4)** VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
	
Concreto ciclopeo	***Viga en concreto***




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO DOMOPLANAS

POZO PROFUNDO

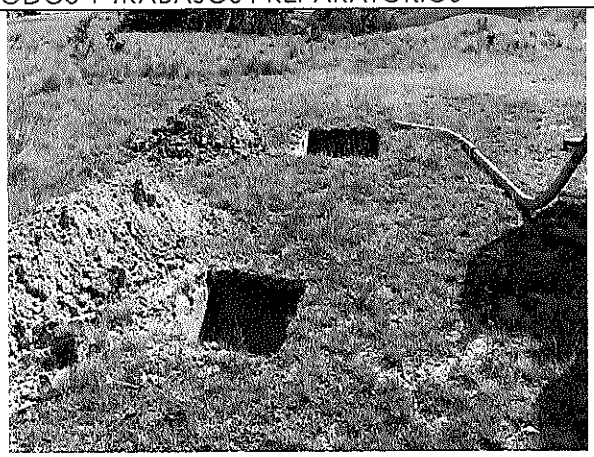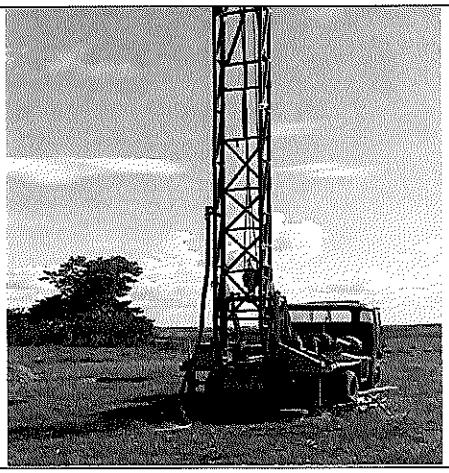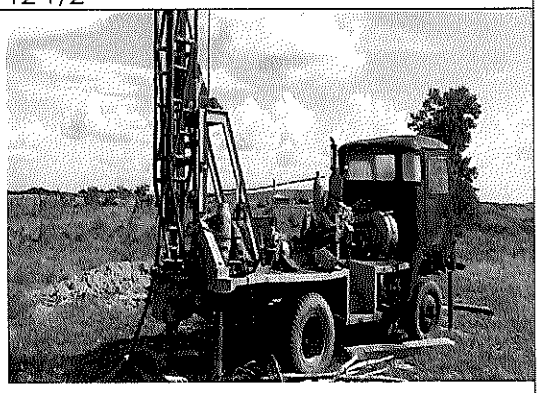COMUNIDAD VILLAMARCIA	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	**Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.
	
Construcción piscina de lodos	***perforación de prueba***
Ítem 1,4 ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	**Ítem 1,6** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"
	
Análisis litológico	***Ampliación perforación***




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

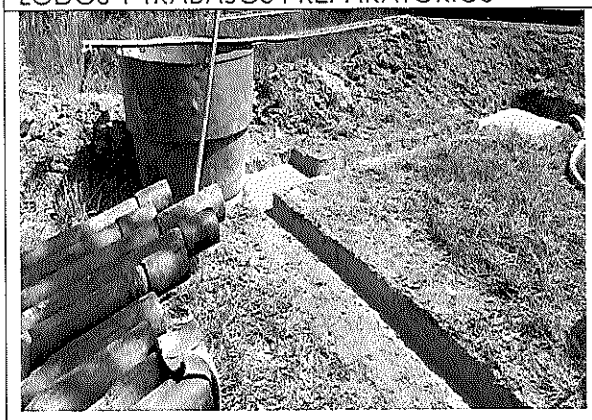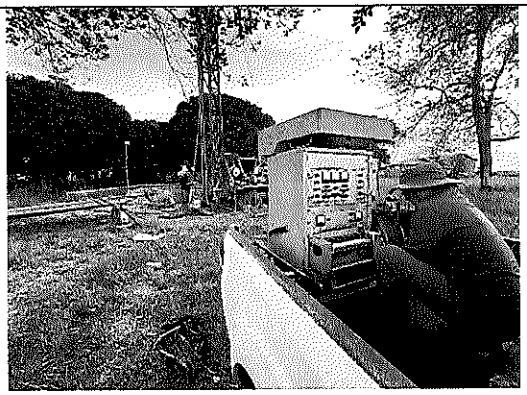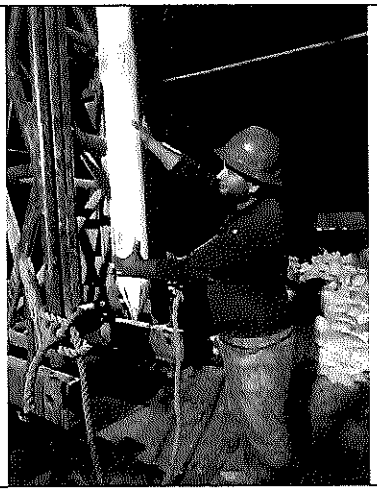COMUNIDAD CACHAMITAS	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	**Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.
	
Construcción piscina de lodos	***perforación de prueba***
Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	**Ítem 1,7** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M
	
Registro Electrico	***Instalación Tubería 6"***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1


RESGUARDO WACOYO

POZO PROFUNDO

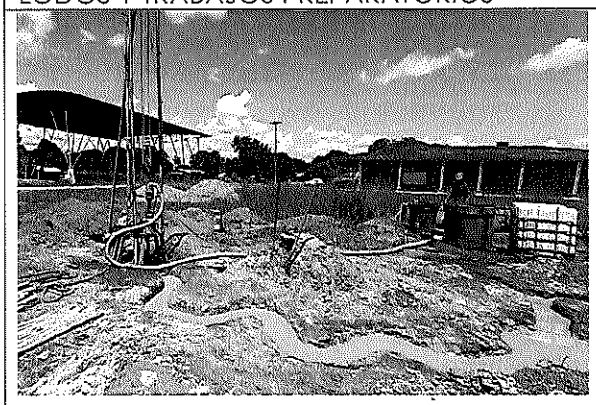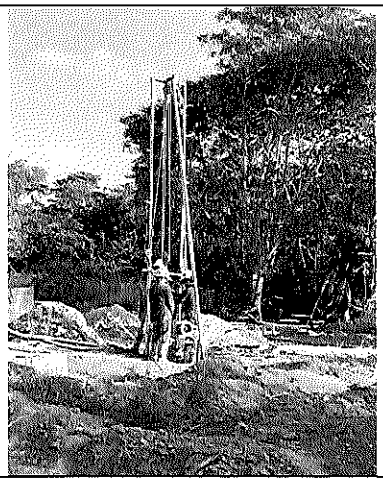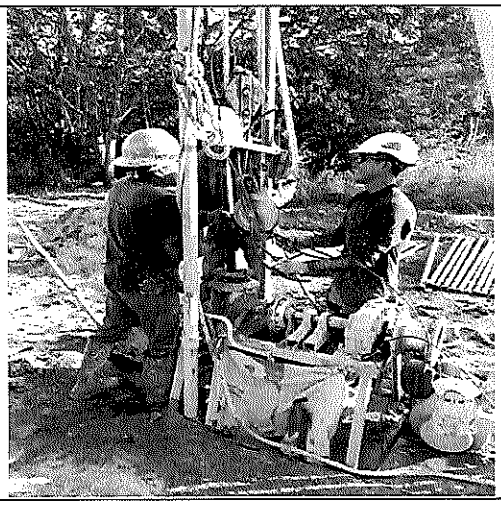COMUNIDAD ESMERALDA WALABO	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	**Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.
	
Construcción piscina de lodos	***perforación de prueba***
Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	**Ítem 1,6** AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"
	
Registro Electrico	***Ampliación perforación***


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

REDES DE ACUEDUCTO

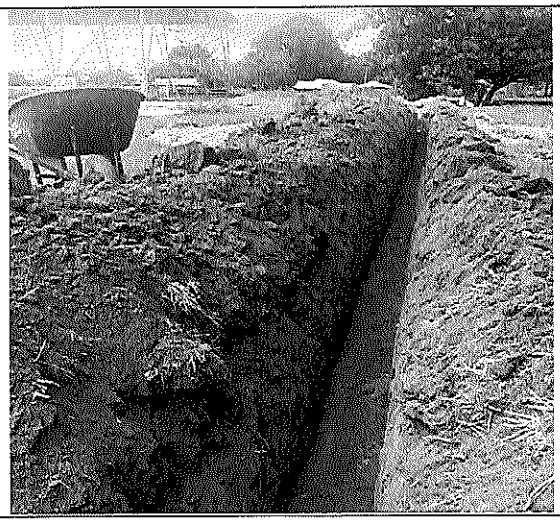
COMUNIDAD ESMERALDA WALABO	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,5** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.
	
Camada de arena	*Relleno proveniente de la excavación*
Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	**Ítem 4,15** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.
	
Instalación tubería 2"	*Excavación mecanica*

COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

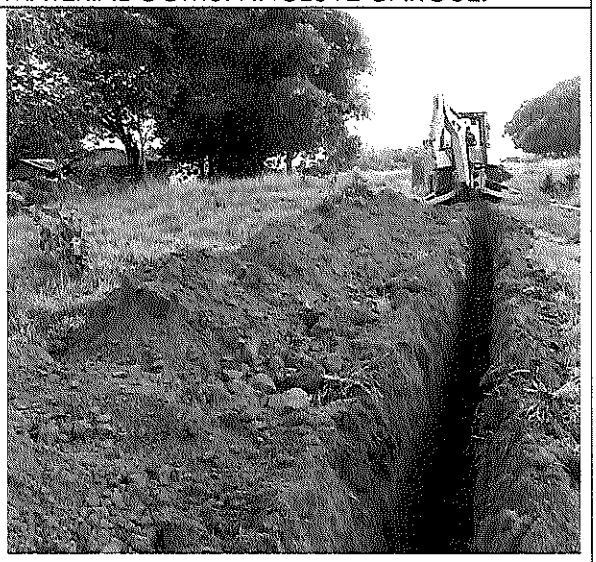Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,5** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.
	
Camada de arena	***Relleno proveniente de la excavación***
Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	**Ítem 4,15** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.
	
Instalación tubería 2"	***Excavación mecánica***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

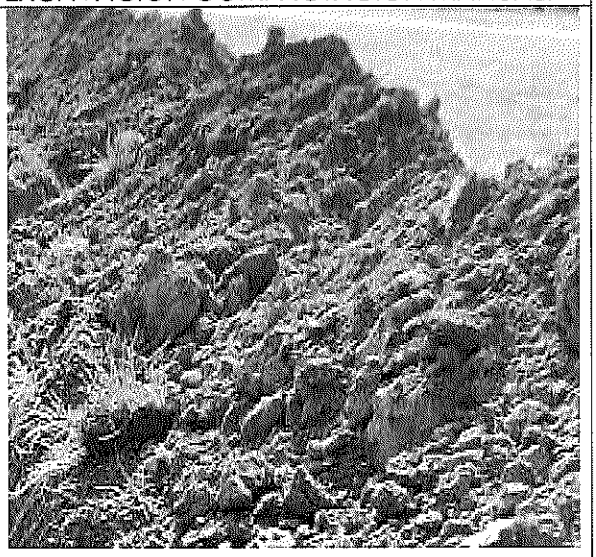COMUNIDAD LA UNIÓN	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	**Ítem 4,5** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.
	
Camada de arena	***Relleno proveniente de la excavación***
Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	**Ítem 4,15** EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.
	
Instalación tubería 2"	***Excavación mecánica***





TANQUE ELEVADO

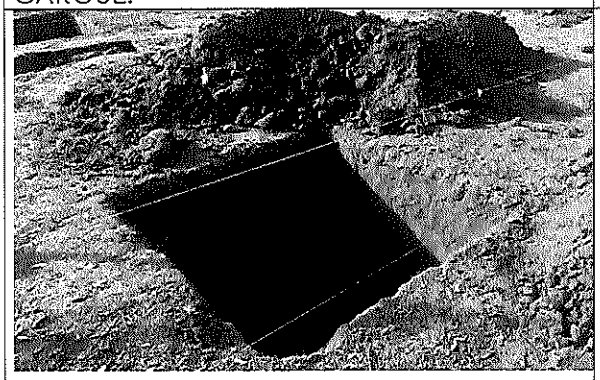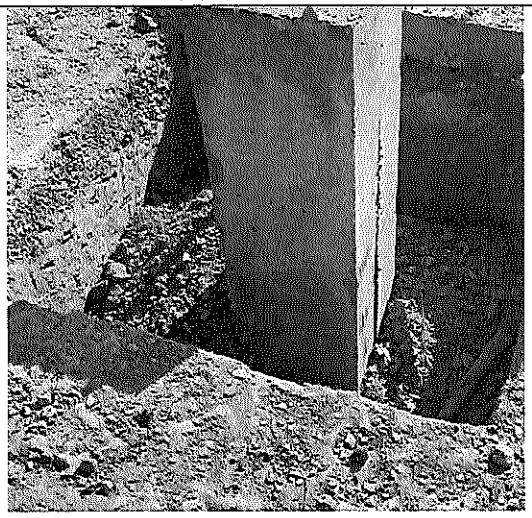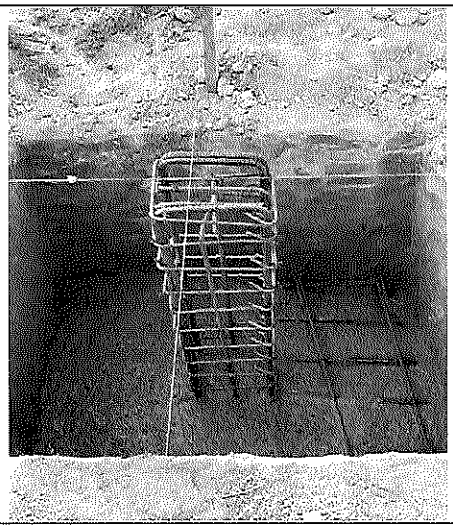COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO	
Ítem 5,3 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 – 2,00m INCLUYE CARGUE.	**Ítem 5,5** ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
	
Excavación manual	***Zapata en concreto***
Ítem 5,6) COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	**Ítem 5,7** ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE
	
Columna en concreto	***Acero de refuerzo***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO ASEINPOME

POZO PROFUNDO

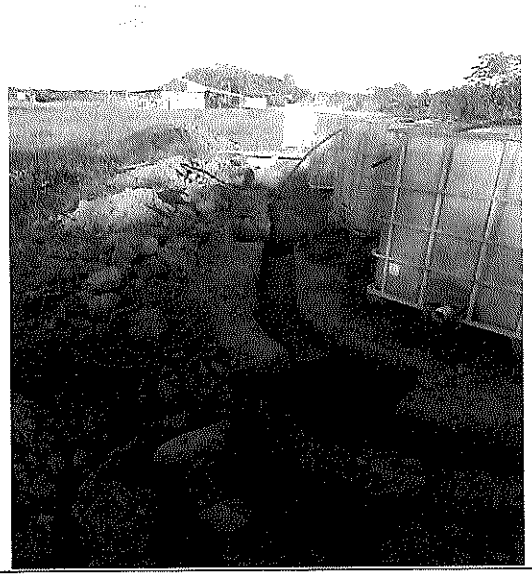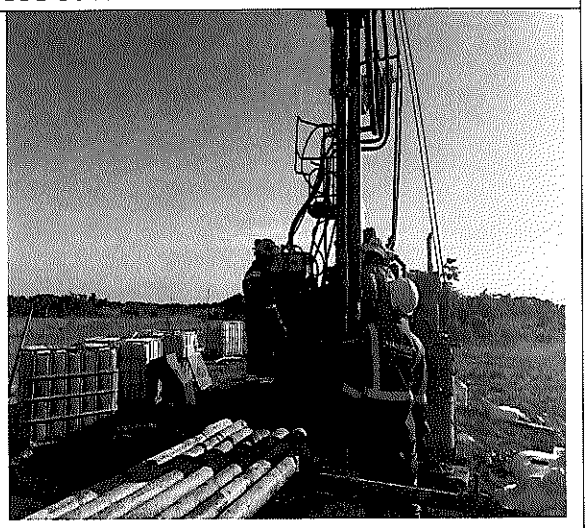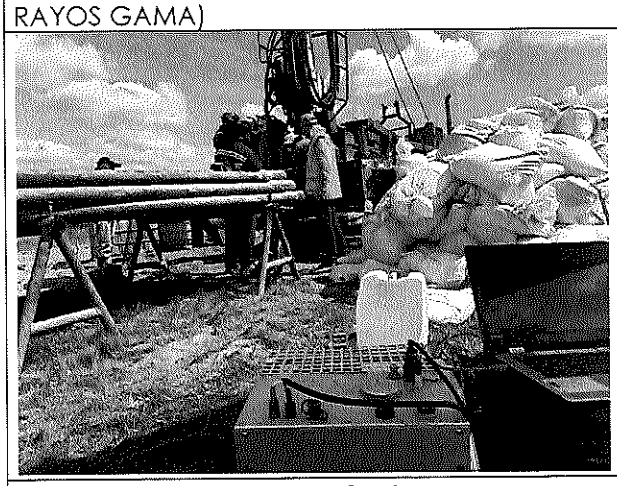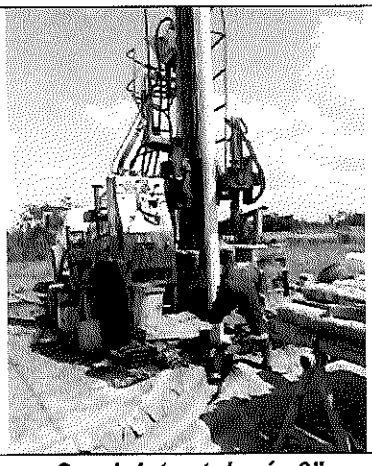COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	**Ítem 1,3** PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.
	
Construcción piscina de lodos	***perforación de prueba***
Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	**Ítem 1,7** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M
	
Registro eléctrico	***Suministro tubería 6”***

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA



Valla informativa

ANEXO 9. COPIA DE LA BITACORA.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Lunes 01 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	95	DIAS PENDIENTES		361

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

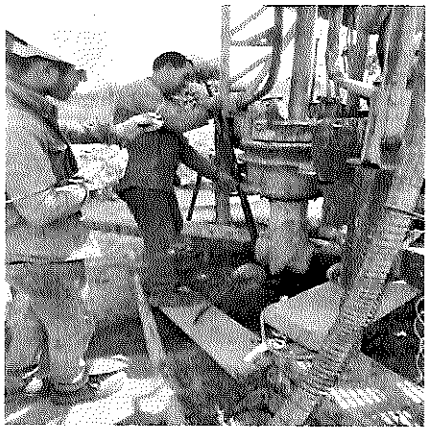

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Martes 02 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	96	DIAS PENDIENTES		360

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
ANALISIS LITOLOGICO Y GRANULOMETRICO DEL POZO	ML	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

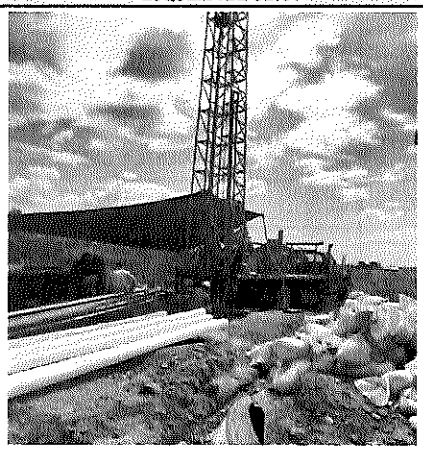

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Miercoles 03 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	97	DIAS PENDIENTES		359

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	COMUNIDAD PUNTO GRILLO		
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD PUNTO GRILLO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

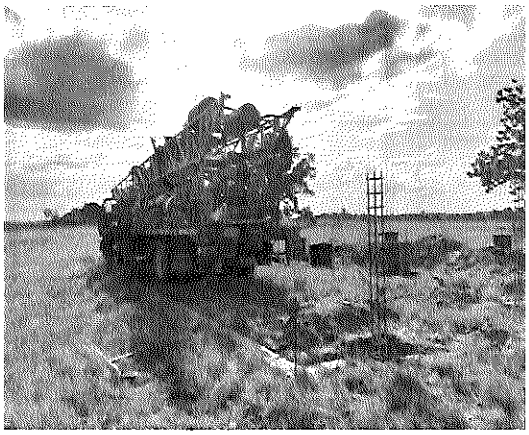

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Jueves 04 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	98	DIAS PENDIENTES		358

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	COMUNIDAD PUNTO GRILLO		
AMPLIACION DE LA PERFORACION EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	COMUNIDAD PUNTO GRILLO		
ANALISIS LITOLOGICO Y GRANULOMETRICO DEL POZO	ML	COMUNIDAD PUNTO GRILLO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

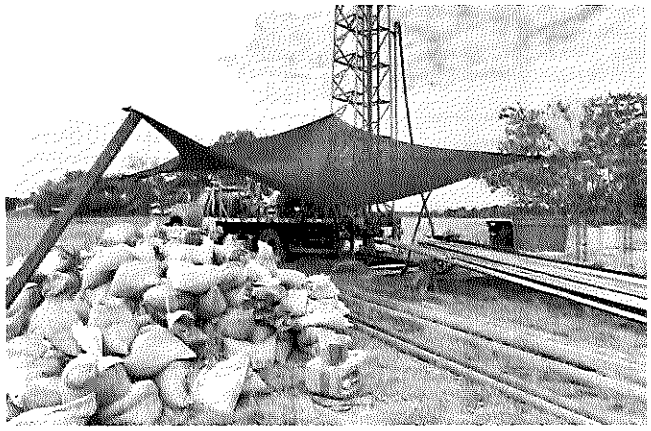

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Viernes 05 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	99	DIAS PENDIENTES		357

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO		CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
					Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800					Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60					Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX		1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET		1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN		3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA		1			Alcohol		X
AYUDANTE									
TOPOGRAFO									
ALMACENISTA	1								
CONDUCTOR	2								
CONTADOR	2								
SECRETARIA	1								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INICIO EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 2"	ML	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA


NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

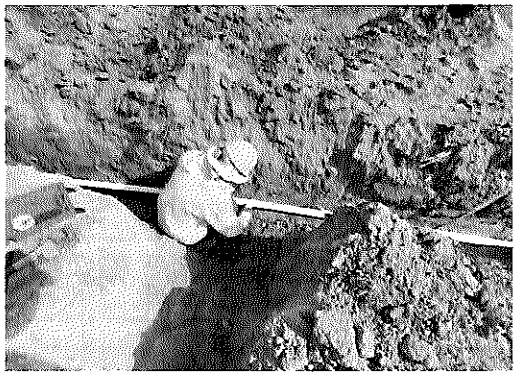

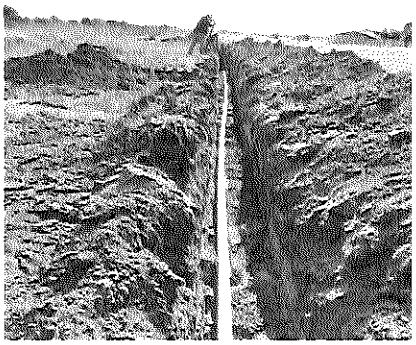

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Sabado 06 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	100	DIAS PENDIENTES		356

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE	ML	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		Puerto Gaitán
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Domingo 07 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	101	DIAS PENDIENTES		355

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Lunes 08 de diciembre 2025 (festivo)	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	102	DIAS PENDIENTES		354

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		Puerto Gaitán
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Martes 09 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	103	DIAS PENDIENTES		353

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INCIA EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL	M3	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Miercoles 10 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	104	DIAS PENDIENTES		352

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE PARA TANQUE ELEVADO	M3	COMUNIDAD PUNTO GRILLO Y FACUNAE		
ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	COMUNIDAD PUNTO GRILLO Y FACUNAE		
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	COMUNIDAD PUNTO GRILLO Y FACUNAE		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

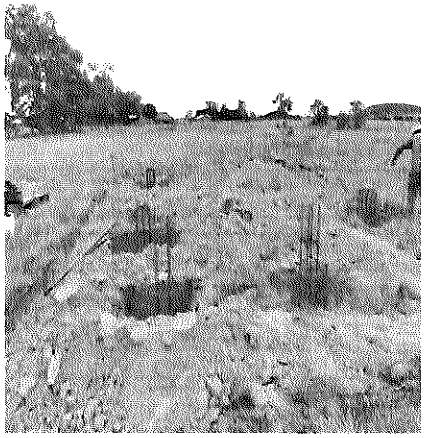



OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	**RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA**
FECHA: Jueves 11 de diciembre 2025	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	105	DIAS PENDIENTES		351

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		
ANALISIS LITOLOGICO Y GRANULOMETRICO DEL POZO	ML	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		Puerto Gaitán
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

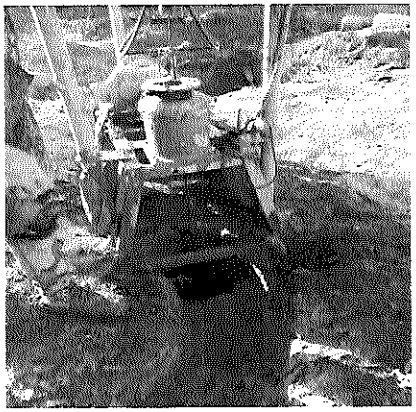



OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Viernes 12 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	106	DIAS PENDIENTES	350

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN PERFORACION DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	ML	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		
AMPLIACION DE LA PERFORACION EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		
ANALISIS LITOLOGICO Y GRANULOMETRICO DEL POZO	ML	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

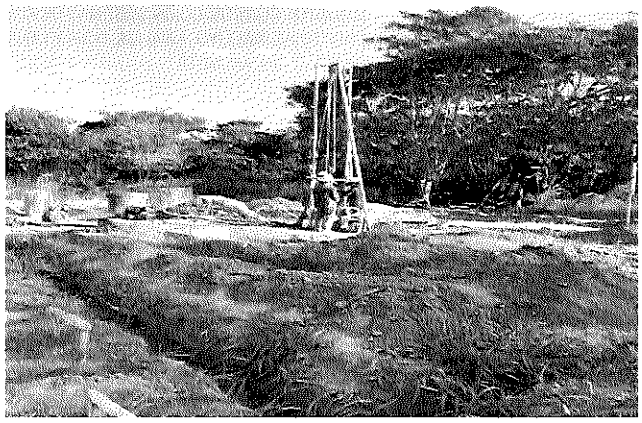

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Sabado 13 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	107	DIAS PENDIENTES		349

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INICIO EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		
INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 2"	ML	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		
INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA


NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



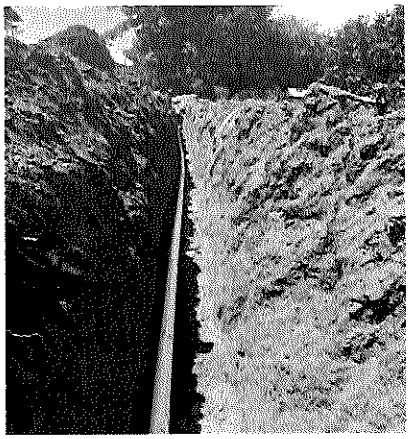

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Domingo 14 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	108	DIAS PENDIENTES		348

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Lunes 15 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	109	DIAS PENDIENTES		347

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE	ML	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		Puerto Gaitán
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Martes 16 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	110	DIAS PENDIENTES		346

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACIÓN Y ADECUACION DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	COMUNIDAD FACUNAE		
PERFORACION DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD FACUNAE		
ANALISIS LITOLOGICO Y GRANULOMETRICO DEL POZO	ML	COMUNIDAD FACUNAE		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA


NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

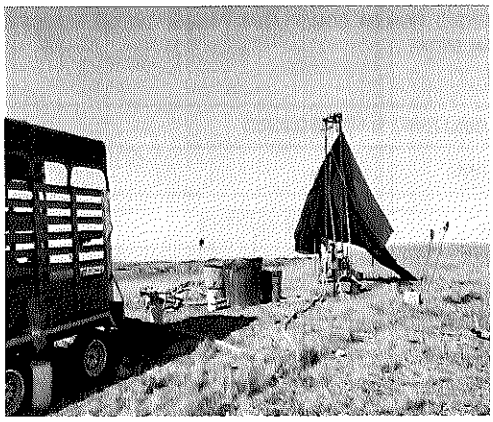

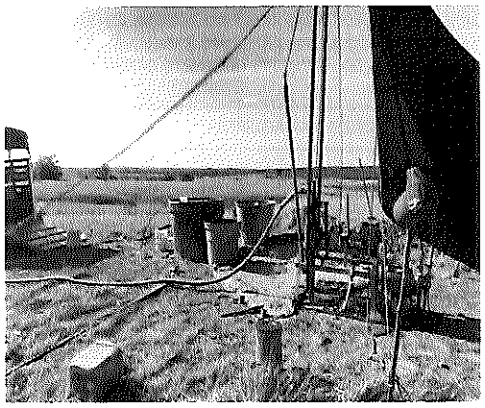

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Miercoles 17 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	111	DIAS PENDIENTES		345

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INICIO EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		
INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 2"	ML	COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		
INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA


NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

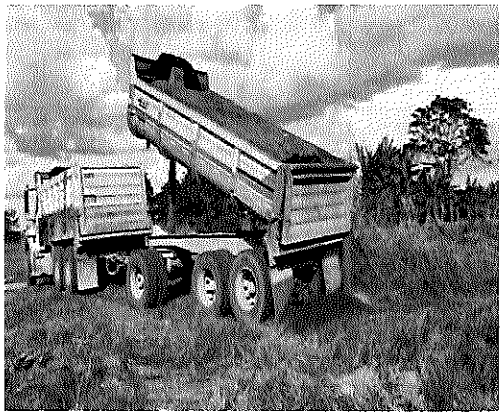

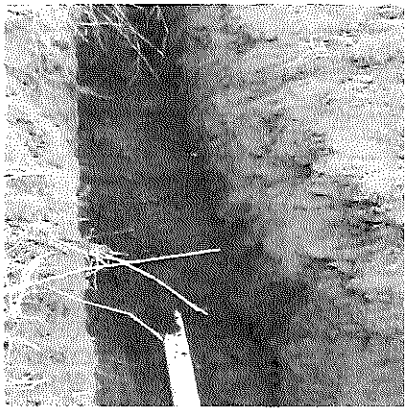

OBSERVACIONES:

C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Jueves 18 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	112	DIAS PENDIENTES		344

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE	ML	COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

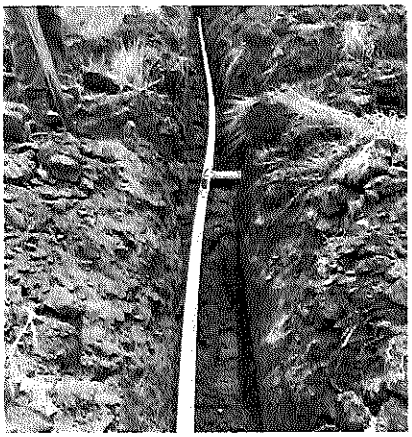

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	**RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA**
FECHA: Viernes 19 de diciembre 2025	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	113	DIAS PENDIENTES		343

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INICIO EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD LA UNIÓN		
INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 2"	ML	COMUNIDAD LA UNIÓN		
INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD LA UNIÓN		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA


NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO CAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



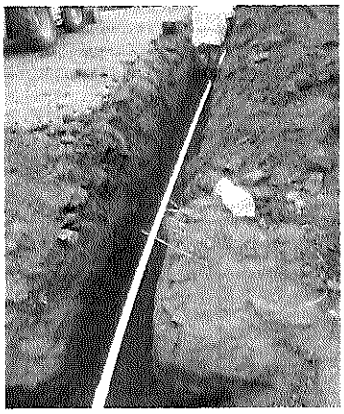

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Sabado 20 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	114	DIAS PENDIENTES		342

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD LA UNIÓN		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE	ML	COMUNIDAD LA UNIÓN		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD LA UNIÓN		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

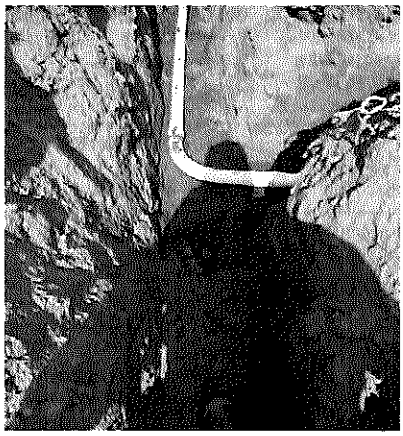

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Domingo 21 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	115	DIAS PENDIENTES		341

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Lunes 22 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	116	DIAS PENDIENTES		340

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M,INCLUYE CARGUE PARA TANQUE ELEVADO	M3	COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		
ACERO REFUERZO FY= 4200 Mpa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO ARMADO.	KG	COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Martes 23 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	117	DIAS PENDIENTES		339

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACION Y ADECUACION DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		
PERFORACION DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA


NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



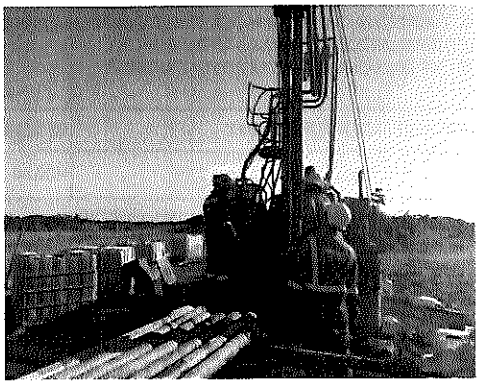

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Miercoles 24 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	118	DIAS PENDIENTES		338

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
DIRECTOR: JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO	RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA
FECHA: Jueves 25 de diciembre 2025 (festivo)	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	119	DIAS PENDIENTES		337

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA
ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Viernes 26 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	120	DIAS PENDIENTES		336

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACIÓN Y ADECUACION DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	COMUNIDAD VILLAMARCIA		
PERFORACION DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD VILLAMARCIA		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA


NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA


SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

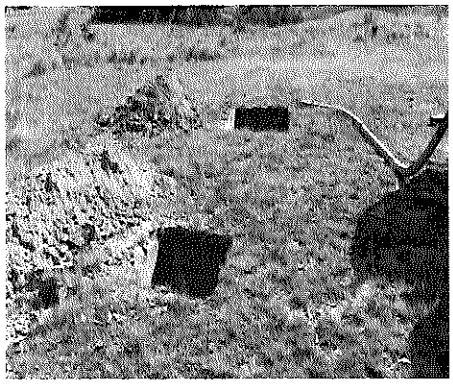

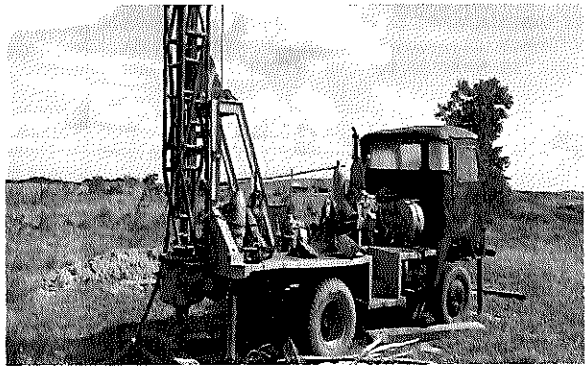

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Sabado 27 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	121	DIAS PENDIENTES		335

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	COMUNIDAD CACHAMITAS		
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD CACHAMITAS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

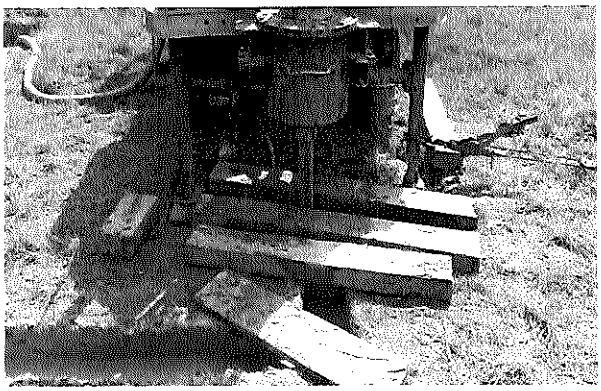

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Domingo 28 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	122	DIAS PENDIENTES		334

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	**RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO**
FECHA: Lunes 29 de diciembre 2025	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	123	DIAS PENDIENTES		333

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD VILLAMARCIA Y CACHAMITAS		
ANALISIS LITOLOGICO Y GRANULOMETRICO DEL POZO	ML	COMUNIDAD VILLAMARCIA Y CACHAMITAS		
AMPLIACION DE LA PERFORACION EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	COMUNIDAD VILLAMARCIA Y CACHAMITAS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

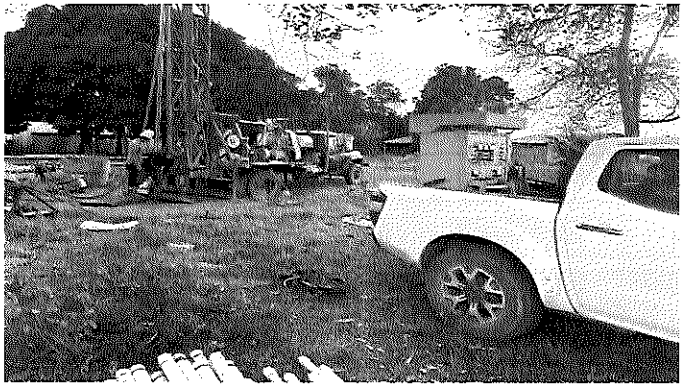

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Martes 30 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	124	DIAS PENDIENTES		332

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FECHA: Miercoles 31 de diciembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	125	DÍAS PENDIENTES		331

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	2							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ANEXO 10. APROBACIÓN CONTRATO FIDUCIA Y ORDENES DE OPERACIÓN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Puerto Gaitán, 27 de agosto de 2025

Señores
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT 800.079.035-1 R/L LUIS FERNNDO MUÑOZ MURCIA
C.C. 86.051.533 de Villavicencio
Calle 15 No. 40-01 Centro Comercial Primavera Urbana
Celular 3123143658
Consorcioaguasgaitan2025@gmail.com
Villavicencio Meta

Asunto: ACEPTACION DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y PAGO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TITULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 (CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025).

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que ustedes atendieron cabalmente los requerimientos que le hiciere la Administración Municipal contenidos en el parágrafo de la cláusula cuarta del contrato de Obra No. 0821 de 2025, cuyo objeto es " **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META** " y de conformidad al Art. 91 de la Ley 1474 de 2011, "En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista" y que, frente a nuestro deber legal de pronunciamos como entidad contratante, debemos indicar que el Municipio de Puerto Gaitán (Meta) por medio la Secretaria de Contratación, responde POSITIVAMENTE a la aceptación del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de administración y pagos, para la Administración de los recursos entregados como anticipo, celebrado entre FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025.

La mencionada aceptación, se efectúa de conformidad con el Decreto Administrativo No. 001 del siete (07) de enero de 2025, por medio del cual se deroga el Decreto No. 0180 del tres (3) de julio de 2024, y se delegan unas facultades en materia de contratación pública y ordenación del gasto en el municipio de Puerto Gaitán - Meta

Con todo respeto,

ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
Secretaria de Contratación

Elaboró: Herder Fabian Burgos Garcia	Revisó: Alejandra Castillo Blandón	Aprobó: Alejandra Castillo Blandón
Cargo: CPS SC	Cargo: Secretaria de Contratación	Cargo: Secretaria de Contratación

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-11-2025 hasta 30-11-2025

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 316331 P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banc	Banco Destino Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
10/11/2025	EF	2	500807651648	901965630 CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	7	84400008225	30.192.533,00	0,00	30.192.533,00	PAGADA	REEMBOLSO-Mano de obra, prestacion de servicios y pagos del personal ofertado y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones) ($29.930.033). Compra de materiales y accesorios ($262.500)	PAGOS CON IMPUESTOS	10/11/2025	27
10/11/2025	EF	2	500807651648	9620227 PIÑEROS CASTRO GILBERTO	40	44524009718	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	PAGADA	CTA N°175-Mano de obra ($1.980.000) Compra de Materiales y Accesorios ($11.055.000) Transporte de materiales ($3.465.000)	PAGOS CON IMPUESTOS	10/11/2025	28
10/11/2025	PT	2	500807651648	900517804 SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			11.419.620,63	0,00	11.419.620,63	PAGADA	Pago de rendimientos de Octubre del 2025 ENTIDAD TERRITORIAL DPTO DE NARIÑO NIT 891,280,000	DEVOLUCIONES	10/11/2025	29
11/11/2025	EF	2	500807651648	17414465 PEREZ SANCHEZ EDUAR BENJAMIN	7	89000027015	49.700.000,00	0,00	49.700.000,00	PAGADA	CTA N°008-01-Mano de obra ($5.964.000) Compra de Materiales y Accesorios ($33.299.000) Transporte de materiales ($10.437.000)	PAGOS CON IMPUESTOS	11/11/2025	30
13/11/2025	EF	2	500807651648	17414465 PEREZ SANCHEZ EDUAR BENJAMIN	7	89000027015	53.550.000,00	0,00	53.550.000,00	PAGADA	CTA N°010-01-Mano de obra ($6.426.000) Compra de Materiales y Accesorios ($35.878.500) Transporte de materiales ($11.245.500)	PAGOS CON IMPUESTOS	13/11/2025	31
13/11/2025	EF	2	500807651648	17321114 LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	13	0742008840	29.782.060,00	0,00	29.782.060,00	PAGADA	PROF N°002-COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PAGOS CON IMPUESTOS	13/11/2025	32
13/11/2025	EF	2	500807651648	93297709 HENAO GONZALEZ EMER YOHAN	7	05764806532	4.403.688,00	0,00	4.403.688,00	PAGADA	FACT.EYH 3-COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PAGOS CON IMPUESTOS	13/11/2025	33
18/11/2025	EF	2	500807651648	41871552 SANCHEZ FORERO MARIA DEL CARMEN	7	28907307583	2.266.144,00	0,00	2.266.144,00	PAGADA	PROF 002-COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PAGOS CON IMPUESTOS	18/11/2025	34
18/11/2025	EF	2	500807651648	1006799413 GUALTEROS ROJAS JULIAN ANDRES	7	36453633301	50.258.560,00	0,00	50.258.560,00	PAGADA	FACT. FEV2-COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PAGOS CON IMPUESTOS	18/11/2025	35
20/11/2025	EF	2	500807651648	901658784 GEODELTA SAS	7	39500005121	31.850.000,00	0,00	31.850.000,00	PAGADA	CTA N°001-Mano de obra (3.822.000) Compra de Materiales y Accesorios (21.339.500) Transporte de materiales (6.688.500)	PAGOS CON IMPUESTOS	21/11/2025	36
20/11/2025	EF	2	500807651648	86049229 LOZANO GUTIERREZ JULIAN HERNEY	7	05707417431	14.471.294,00	0,00	14.471.294,00	PAGADA	PROF 003-COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PAGOS CON IMPUESTOS	21/11/2025	37
25/11/2025	EF	2	500807651648	900974864 M&G INGENIERIA S.AS	51	09847002201	80.199.244,20	0,00	80.199.244,20	PAGADA	FACT MYGN35-Mano de obra (9.623.909,31) Materiales (53.733.493,61) Transporte (16.841.841,28)	PAGOS CON IMPUESTOS	25/11/2025	38
28/11/2025	EF	2	500807651648	901658784 GEODELTA SAS	7	39500005121	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00	PAGADA	CTA N°001-Mano de obra (4.956.000) Compra de Materiales y Accesorios (27.671.000) Transporte de materiales (8.673.000)	PAGOS CON IMPUESTOS	28/11/2025	39
28/11/2025	EF	2	500807651648	901975926 SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	7	84400008288	100.884.695,10	0,00	100.884.695,10	PAGADA	CTA N° 1-Transporte de materiales	PAGOS CON IMPUESTOS	01/12/2025	40
28/11/2025	EF	2	500807651648	9620227 PIÑEROS CASTRO GILBERTO	40	44524009718	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	PAGADA	CTA N°02-Mano de obra ($2.376.000) Compra de Materiales y Accesorios ($13.266.000) Transporte de materiales ($4.158.000)	PAGOS CON IMPUESTOS	01/12/2025	41

Nro. de Operaciones: 15 **TOTAL** 536.577.838,93 0,00 536.577.838,93

Formas de Pago **Bancos**

EF	PAGO ELECTRONICO ACH
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS BANCO POPULAR
CF	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
TW	TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

67	MIBANCO S.A.
1	BANCO DE BOGOTA
6	BANCO CORPBANCA-ITAU
9	CITIBANK
12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA
14	HELM BANK-ITAU
23	BANCO DE OCCIDENTE
37	ADMINISTRADORA COUNTRY
51	BANCO DAVIVIENDA
60	BANCO PICHINCHA
531	FIDUCOLOMBIA
58	BANCO CREDIFINANCIERA S.A.
63	BANCO FINANDINA S.A.
59	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN
64	BANCO MULTIBANK S.A
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
292	CONFIAR COOPERATIVA FNANCIERA
108	IRIS CF-COMPAÑIA DE FINANCI
46	COLTEFINANCIERA S.A.
286	JKF COOPERATIVA FINANCIERA
25	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD
128	NU COLOMBIA COMPAÑIA DE FINANC
551	DAVIPLATA

0	BANCO DE LA REPUBLICA
2	BANCO POPULAR S.A.
7	BANCOLOMBIA
10	HSBC COLOMBIA
13	BBVA COLOMBIA
19	BANCO COLPATRIA
32	BANCO CAJA SOCIAL
40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
52	BANCO AV VILLAS
147	BANCO ALIADAS
8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT
61	BANCO COOMEVA S.A.
62	BANCO FALABELLA S.A.
53	BANCO WWB S.A..
66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
69	BANCO SERFINANZA S.A
68	BANCO MUNDO MUJER S.A.
70	LULO BANK S.A.
289	COTRAFA FINANCIERA
130	BANCO UNION S.A.
507	NEQUI
124	RAPPIPAY

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**14,567,032,075.04**	**10,603,256.01**	**433,500,721.52**	**14,144,134,609.53**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**14,565,019,009.79**	**10,594,619.28**	**433,499,332.13**	**14,142,114,296.94**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**14,565,019,009.79**	**10,594,619.28**	**433,499,332.13**	**14,142,114,296.94**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**14,565,019,009.79**	**10,594,619.28**	**433,499,332.13**	**14,142,114,296.94**
11150501		**CUENTA AHORROS**	**NAPL**	**14,565,019,009.79**	**10,594,619.28**	**433,499,332.13**	**14,142,114,296.94**
1115050101		BANCO POPULAR- AHORROS	NAPL	14,565,019,009.79	10,594,619.28	433,499,332.13	14,142,114,296.94
	500807651648	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025	NAPL	14,565,019,009.79	10,594,619.28	433,499,332.13	14,142,114,296.94
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**2,013,065.25**	**8,636.73**	**1,389.39**	**2,020,312.59**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**2,013,065.25**	**8,636.73**	**1,389.39**	**2,020,312.59**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**2,013,065.25**	**8,636.73**	**1,389.39**	**2,020,312.59**
13020501		**PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**2,013,065.25**	**8,636.73**	**1,389.39**	**2,020,312.59**
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	2,013,065.25	8,636.73	1,389.39	2,020,312.59
	70083606070	ENCARGO FIDUCIARIO 70083606070	NAPL	2,013,065.25	8,636.73	1,389.39	2,020,312.59
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-174,369,544.30**	**451,910,660.13**	**566,468,786.21**	**-288,927,670.38**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-174,369,544.30**	**451,910,660.13**	**566,468,786.21**	**-288,927,670.38**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**2,540,947.50**	**2,540,947.50**	**.00**
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**2,540,947.50**	**2,540,947.50**	**.00**
25011501		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**2,540,947.50**	**2,540,947.50**	**.00**
2501150101		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	2,540,947.50	2,540,947.50	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	2,540,947.50	2,540,947.50	.00
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**15,870,380.50**	**26,464,999.78**	**-10,594,619.28**
257000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**15,870,380.50**	**26,464,999.78**	**-10,594,619.28**
25700000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**15,870,380.50**	**26,464,999.78**	**-10,594,619.28**
2570000001		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	15,870,380.50	26,464,999.78	-10,594,619.28
	900517804	SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	15,870,380.50	26,464,999.78	-10,594,619.28
2590		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-174,369,544.30**	**433,499,332.13**	**537,462,838.93**	**-278,333,051.10**
259095		**OTROS**	**NAPL**	**-174,369,544.30**	**433,499,332.13**	**537,462,838.93**	**-278,333,051.10**
25909501		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-174,369,544.30**	**433,499,332.13**	**537,462,838.93**	**-278,333,051.10**
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	-174,369,544.30	433,499,332.13	537,462,838.93	-278,333,051.10
	9620227	PIÑEROS CASTRO GILBERTO	NAPL	.00	16,500,000.00	36,300,000.00	-19,800,000.00
	17321114	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	NAPL	.00	29,782,060.00	29,782,060.00	.00
	17414465	PEREZ SANCHEZ EDUAR BENJAMIN	NAPL	.00	103,250,000.00	103,250,000.00	.00
	41871552	SANCHEZ FORERO MARIA DEL CARMEN	NAPL	.00	2,266,144.00	2,266,144.00	.00
	86049229	LOZANO GUTIERREZ JULIAN HERNEY	NAPL	.00	14,471,294.00	14,471,294.00	.00
	93297709	HENAO GONZALEZ EMER YOHAN	NAPL	.00	4,403,688.00	4,403,688.00	.00
	900517804	SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	11,419,620.63	11,419,620.63	.00
	900974864	M&G INGENIERIA S.AS	NAPL	-19,006,188.30	99,205,432.50	80,199,244.20	.00
	901658784	GEODELTA SAS	NAPL	-39,900,000.00	71,750,000.00	73,150,000.00	-41,300,000.00
	901965630	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NAPL	-115,463,356.00	30,192,533.00	30,192,533.00	-115,463,356.00
	901975926	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	NAPL	.00	.00	100,884,695.10	-100,884,695.10
	1006799413	GUALTEROS ROJAS JULIAN ANDRES	NAPL	.00	50,258,560.00	50,258,560.00	.00
	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY XIMENA	NAPL	.00	.00	885,000.00	-885,000.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-14,392,662,530.74**	**537,455,591.59**	**.00**	**-13,855,206,939.15**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-14,381,229,844.86**	**526,043,218.30**	**.00**	**-13,855,186,626.56**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-20,146,226,208.00**	**.00**	**.00**	**-20,146,226,208.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-20,146,226,208.00**	**.00**	**.00**	**-20,146,226,208.00**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-20,146,226,208.00**	**.00**	**.00**	**-20,146,226,208.00**
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-20,146,226,208.00	.00	.00	-20,146,226,208.00
	79846131	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	NAPL	-100,721,131.04	.00	.00	-100,721,131.04
	900751966	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS	NAPL	-20,045,505,076.96	.00	.00	-20,045,505,076.96
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**5,764,996,363.14**	**526,043,218.30**	**.00**	**6,291,039,581.44**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**5,764,996,363.14**	**526,043,218.30**	**.00**	**6,291,039,581.44**
35101000		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**5,764,996,363.14**	**526,043,218.30**	**.00**	**6,291,039,581.44**
3510100095		OTROS	NAPL	5,764,996,363.14	526,043,218.30	.00	6,291,039,581.44
	9620227	PIÑEROS CASTRO GILBERTO	NAPL	.00	36,300,000.00	.00	36,300,000.00
	17321114	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	NAPL	32,717,860.00	29,782,060.00	.00	62,499,920.00
	17414465	PEREZ SANCHEZ EDUAR BENJAMIN	NAPL	.00	103,250,000.00	.00	103,250,000.00
	17627950	ORLANDO BONILLA CASTELLANO	NAPL	34,630,723.00	.00	.00	34,630,723.00
	41871552	SANCHEZ FORERO MARIA DEL CARMEN	NAPL	14,722,394.00	2,266,144.00	.00	16,988,538.00
	86049229	LOZANO GUTIERREZ JULIAN HERNEY	NAPL	6,865,773.00	14,471,294.00	.00	21,337,067.00
	93297709	HENAO GONZALEZ EMER YOHAN	NAPL	4,588,112.00	4,403,688.00	.00	8,991,800.00
	800216499	AGOFER LTDA	NAPL	329,829,140.00	.00	.00	329,829,140.00
	900740652	CONSTRUCIVIL M&A SAS	NAPL	3,954,010,079.94	.00	.00	3,954,010,079.94
	900751966	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS	NAPL	125,285,927.68	.00	.00	125,285,927.68
	900777214	LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.	NAPL	462,554,100.00	.00	.00	462,554,100.00
	900783521	ARCOE SAS	NAPL	208,006,283.00	.00	.00	208,006,283.00
	900974864	M&G INGENIERIA S.AS	NAPL	164,637,645.52	80,199,244.20	.00	244,836,889.72
	901085904	OVITA ASOCIADOS S.A.S.	NAPL	115,463,356.00	.00	.00	115,463,356.00
	901658784	GEODELTA SAS	NAPL	87,850,000.00	73,150,000.00	.00	161,000,000.00
	901965630	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NAPL	140,594,969.00	30,192,533.00	.00	170,787,502.00
	901975926	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	NAPL	30,000,000.00	100,884,695.10	.00	130,884,695.10
	1006799413	GUALTEROS ROJAS JULIAN ANDRES	NAPL	53,240,000.00	50,258,560.00	.00	103,498,560.00
	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY XIMENA	NAPL	.00	885,000.00	.00	885,000.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-11,432,685.88**	**11,412,373.29**	**.00**	**-20,312.59**
3915		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-11,432,685.88**	**.00**	**.00**	**-11,432,685.88**
391501		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-11,432,685.88**	**.00**	**.00**	**-11,432,685.88**
39150101		**GANANCIAS DEL EJECICIO**	**NAPL**	**-11,432,685.88**	**.00**	**.00**	**-11,432,685.88**
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	-11,432,685.88	.00	.00	-11,432,685.88
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-11,432,685.88	.00	.00	-11,432,685.88
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**11,412,373.29**	**.00**	**11,412,373.29**
392001		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**11,412,373.29**	**.00**	**11,412,373.29**
39200101		**PÉRDIDA DEL EJECICIO**	**NAPL**	**.00**	**11,412,373.29**	**.00**	**11,412,373.29**
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	11,412,373.29	.00	11,412,373.29
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	.00	11,412,373.29	.00	11,412,373.29
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-15,883,445.75**	**26,464,999.78**	**10,603,256.01**	**-21,701.98**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-15,883,445.75**	**26,464,999.78**	**10,603,256.01**	**-21,701.98**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-15,870,380.50**	**26,464,999.78**	**10,594,619.28**	**.00**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-15,870,380.50**	**26,464,999.78**	**10,594,619.28**	**.00**
41039501		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-15,870,380.50**	**26,464,999.78**	**10,594,619.28**	**.00**
4103950101		OTROS INTERESES	NAPL	-15,870,380.50	26,464,999.78	10,594,619.28	.00
	860007738	BANCO POPULAR S.A.	NAPL	-15,870,380.50	26,464,999.78	10,594,619.28	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-13,065.25**	**.00**	**8,636.73**	**-21,701.98**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-13,065.25**	**.00**	**8,636.73**	**-21,701.98**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)**	**NAPL**	**-13,065.25**	**.00**	**8,636.73**	**-21,701.98**
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-13,065.25	.00	8,636.73	-21,701.98
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	-13,065.25	.00	8,636.73	-21,701.98
5		**GASTOS**	**NAPL**	**15,883,445.75**	**12,267,992.52**	**28,129,736.29**	**21,701.98**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**4,450,759.87**	**12,267,992.52**	**16,717,363.00**	**1,389.39**
5108		**VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.**	**NAPL**	**.00**	**1,389.39**	**.00**	**1,389.39**
510805		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**.00**	**1,389.39**	**.00**	**1,389.39**
51080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)**	**NAPL**	**.00**	**1,389.39**	**.00**	**1,389.39**
5108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	.00	1,389.39	.00	1,389.39
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	.00	1,389.39	.00	1,389.39
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**846,982.50**	**846,982.50**	**.00**
511518		**NEGOCIOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**846,982.50**	**846,982.50**	**.00**
51151801		**NEGOCIOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**846,982.50**	**846,982.50**	**.00**
5115180101		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	846,982.50	846,982.50	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	846,982.50	846,982.50	.00
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**4,450,759.87**	**11,419,620.63**	**15,870,380.50**	**.00**
516701		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**4,450,759.87**	**11,419,620.63**	**15,870,380.50**	**.00**
51670101		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**4,450,759.87**	**11,419,620.63**	**15,870,380.50**	**.00**
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	4,450,759.87	11,419,620.63	15,870,380.50	.00
	900517804	SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	4,450,759.87	11,419,620.63	15,870,380.50	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**11,432,685.88**	**.00**	**11,412,373.29**	**20,312.59**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**11,432,685.88**	**.00**	**11,412,373.29**	**20,312.59**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**11,432,685.88**	**.00**	**11,412,373.29**	**20,312.59**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**11,432,685.88**	**.00**	**11,412,373.29**	**20,312.59**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	11,432,685.88	.00	11,412,373.29	20,312.59
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	11,432,685.88	.00	11,412,373.29	20,312.59
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**2,540,947.50**	**2,540,947.50**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,693,965.00**	**1,693,965.00**	**.00**	**.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,693,965.00**	**1,693,965.00**	**.00**	**.00**
829501		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,693,965.00**	**1,693,965.00**	**.00**	**.00**
82950101		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,693,965.00**	**1,693,965.00**	**.00**	**.00**
8295010101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-1,693,965.00	1,693,965.00	.00	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	-1,693,965.00	1,693,965.00	.00	.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**1,693,965.00**	**846,982.50**	**2,540,947.50**	**.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**1,693,965.00**	**846,982.50**	**2,540,947.50**	**.00**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**1,693,965.00**	**846,982.50**	**2,540,947.50**	**.00**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**1,693,965.00**	**846,982.50**	**2,540,947.50**	**.00**
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	1,693,965.00	846,982.50	2,540,947.50	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	1,693,965.00	846,982.50	2,540,947.50	.00

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	315331	No. Orden	CAG032
CUENTA BANCARIA A DEBITAR	900307651648	BANCO	Banco Popular		
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR		GMF (4*1000)	Exenta		
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?	SI				

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura? SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO FINAL PAGO								CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	REEMBOLSO	NIT	901965630	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				Mano de obra, prestacion de servicios y pagos del personal ofertado y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones) ($31,167,771). Compra de materiales y accesorios ($620,606)	31,788,377.00							31,788,377.00	ACH	Bancolombia	84400008225	CH	SI	NIT	901965630	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				Mano de obra, prestacion de servicios y pagos del personal ofertado y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones) ($31,167,771). Compra de materiales y accesorios ($620,606)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 31,788,377.00

VALOR NETO OPERACIONES $ 31,788,377.00

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AG WIDGENAS 2025
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ

fiduciaria popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025						
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden		CAG033	
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			900807691648	BANCO		Banco Popular	
FONDO DE INVERSION A DEBITAR				GMF (4*1000)		Exenta	
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?						SI	

Instructivo de Pago | Proceso Operativo | Impresión | Consultas Financiera

CAUSAR Y PAGAR | ¿La orden contiene numeros de [illegible]? | SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO					BENEFICIARIO FINAL PAGO					CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE	NIT NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARI	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	NHMR 26	CEDULA	17335397	NELSON	HERNAN	MORALES	ROJAS	Compra de materiales y accesorios	$ 26,823,312.00							26,823,312.00	ACH	Bancolombia	84439574890	CH	SI	CEDULA	17335397	NELSON	HERNAN	MORALES	ROJAS	Compra de materiales y accesorios

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 26,823,312.00

VALOR NETO OPERACIONES $ 26,823,312.00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2026	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAG034
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		900807651648	BANCO		Banco Popular
FONDO DE INVERSION A DEBITAR			GMF (4*1000)		Exenta
¿La Liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura? SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO								BENEFICIARIO FINAL PAGO				CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	CTA 001-2025	NIT	900769044	TERRACQUA S.A.S				Mano de obra ($4.284.000) Compra de Materiales y Accesorios ($23.919.000) Transporte de materiales ($7.497.000)	35,700,000,00							35,700,000,00	ACH	Banco Davivienda S.A.	055010890051534	CH	SI	NIT	900769044	TERRACQUA S.A.S				Mano de obra ($4.284.000) Compra de Materiales y Accesorios ($23.919.000) Transporte de materiales ($7.497.000)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 35,700,000,00

VALOR NETO OPERACIONES $ 35,700,000,00

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE
CARGO
ELABORÓ

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE
CARGO
REVISÓ

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
APROBÓ

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
APROBÓ

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAGD35
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		600807651648		BANCO	Banco Popular
FONDO DE INVERSION A DEBITAR				GMF (4X1000)	Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Instructivo de Pago | Proceso Operativo | Impresión | Plantillas Referencia

CAUSAR Y PAGAR		¿La orden contiene numeros de factura?	SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Rgmto Causado	BENEFICIARIO FINAL PAGO					CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS							TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENERCIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FACTJFEVT7	CEDULA	1006875279	BRAYAM	FELIPE	GOMEZ	ARIAS	Transporte De Materiales	$ 27,670,566,00							27,670,566,00	ACH	Banco Davivienda S.A.	091700088239	CH	SI	CEDULA	1006875279	BRAYAM	FELIPE	GOMEZ	ARIAS	Transporte De Materiales

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 27,670,566,00 VALOR NETO OPERACIONES $ 27,670,566,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO CRUZ PIMIENTO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAG036
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		600807651948		BANCO	Banco Popular
BANCO DE INTERSUCURSAL A DEBITAR				CUT AC10001	Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Inicializar Pago | Traer Operación | Imprimir | Buscar Archivo

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura?: SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	INFORMACIÓN DE PAGO					BENEFICIARIO FINAL PAGO					CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FACT FEV 480	CEDULA	1032410751	MARLON	STEVEN	MURCIA	TOBON	Transporte De Materiales	$ 23.968.693,00							23.968.693,00	ACH	Banco Davivienda S.A.	091760000348	CC	SI	CEDULA	1032410751	MARLON	STEVEN	MURCIA	TOBON	Transporte De Materiales

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 23.968.693,00 | VALOR NETO OPERACIONES $ 23.968.693,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ GARMENTO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

fiducia popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025					
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE UBICACION	316331	No. Orden	CAG037	
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			500807651648	BANCO	Banco Popular	
FONDO DE INVERSION A DEBITAR				GMF (4*1000)	Exenta	
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI	

Instructivo de Pago | Procesar Operación | Impresión | Archivo Plano

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura? SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO FINAL PAGO									CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT						VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2																					
1	FACT FEV 293	CEDULA	40333384	ELIZABETH		ARIAS	PARRA	Transporte De Materiales	$ 31.695.936,00							31.695.936,00	ACH	Banco Davivienda S.A.	458424102165	CH	SI	CEDULA	40333384	ELIZABETH		ARIAS	PARRA	Transporte De Materiales

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 31.695.936,00

VALOR NETO OPERACIONES $ 31.695.936,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAG03B
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			600807651648	BANCO	Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				GMF (4*1000)	Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Instructivo de Pago | Procesar Operación | Impresión | Descargar Plantilla

CAUSAR Y PAGAR | ¿La orden contiene numeros de factura? | SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO FINAL PAGO								CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT		APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FACT FEV 458	CEDULA	1121886701	BRAYAN	SNEIDER	MURCIA	TOBON	Transporte De Materiales	$ 30,848,941.00							30,848,941.00	ACH	Bancolombia	28919617371	CC	SI	CEDULA	1121886701	BRAYAN	SNEIDER	MURCIA	TOBON	Transporte De Materiales

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 30,848,941.00

VALOR NETO OPERACIONES $ 30,848,941.00

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
CARGO	CARGO	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ

fiducia popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025					
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden		OAG039
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			600807651648	BANCO		Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				GMF (4*1000)		Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?						SI

Simulador de Pago | Probar Operación | Impresión | Cargue Masivo de Pagos

CAUSAR Y PAGAR | ¿La orden contiene numeros de factura? | SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO				CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NIT NOMBRE 2	NIT APELLIDO 1	NIT APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS										NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FACT FEV 1	CEDULA	9620227	GILBERTO		PIÑEROS	CASTRO	Mano de obra ($3.299.999,96) Compra de Materiales y Accesorios ($16.424.999,79) Transporte de materiales ($5.774.999,93)	$ 27.499.999,68							27.499.999,68	ACH	Banco Agrario	445240097166	CH	SI	CEDULA	9620227	GILBERTO		PIÑEROS	CASTRO	Mano de obra ($3.299.999,96) Compra de Materiales y Accesorios ($16.424.999,79) Transporte de materiales ($5.774.999,93)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 27.499.999,68 | VALOR NETO OPERACIONES $ 27.499.999,68

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ ARMENTO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT, CONS, AGUAS GAITAN 2025					
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden		CAG040
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			600807651648	BANCO		Banco Popular
FONDO DE INVERSION A DEBITAR				GMF ($1000)		Exenta
¿La Equidación y declaración de Impuestos esta a cargo del fideicomitente?						SI

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura? SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO										CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NIT NOMBRE 2	NIT APELLIDO 1	NIT APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FACT FE 256	CEDULA	17414485	EDUAR	BENJAMIN	PEREZ	SANCHEZ	Mano de obra ($3,569,964,04) Compra de Materiales y Accesorios ($19,930,065,89) Transporte de materiales ($6,246,737,07)	$ 29,746,367,00							29,746,367,00	ACH	Bancolombia	69000027015	CH	SI	CEDULA	17414485	EDUAR	BENJAMIN	PEREZ	SANCHEZ	Mano de obra ($3,569,964,04) Compra de Materiales y Accesorios ($19,930,065,89) Transporte de materiales ($6,246,737,07)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 29,746,367,00

VALOR NETO OPERACIONES $ 29,746,367,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ GRANADOS
CARGO	CARGO	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

fiduciaria popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

A	NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025				
B	CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAG041
C	CUENTA BANCARIA A DEBITAR			600807651648	BANCO	Banco Popular
D	FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				GMF (4*1000)	Exenta
	¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Instructivo de Pago | Procesar Operación | Impresión | Duplicado del Archivo

CAUSAR Y PAGAR		¿La orden contiene numeros de factura?	SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO PAGO									CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE	NIT NOMBRE 1	NIT NOMBRE 2	NIT APELLIDO 1	NIT APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARI	BENEFICIARIO FINAL PAGO NOMBRE 1 Ó NIT	BENEFICIARIO FINAL PAGO NOMBRE 2	BENEFICIARIO FINAL PAGO APELLIDO 1	BENEFICIARIO FINAL PAGO APELLIDO 2	
1	PROF Nº003	CEDULA	17321114	LUIS	BELTRAN	SUA	VELANDIA	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 30.597.560,00							30.597.560,00	ACH	BBVA	0742006840	CC	SI	CEDULA	17321114	LUIS	BELTRAN	SUA	VELANDIA	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 30.597.560,00

VALOR NETO OPERACIONES $ 30.597.560,00

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURGA	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ GUTIERREZ
CARGO	CARGO	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ

fiducia popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAG042
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		509807651648	BANCO		Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR			GMF (4x1000)		Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura? SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DE PAGO: TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT: NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS: VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO: NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	CONCEPTO DE PAGO
1	FE 12612	CEDULA	37832768	LUZ	DARY	CASTELLANOS	PAEZ	Mano de obra, prestacion de servicios y pagos del personal ofertado y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones)	$ 1.409.730,00							1.409.730,00	ACH	Banco Davivienda S.A.	095009170002846 6	CH	SI	CEDULA	37832768	LUZ	DARY	CASTELLANOS	PAEZ	Mano de obra, prestacion de servicios y pagos del personal ofertado y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 1.409.730,00

VALOR NETO OPERACIONES $ 1.409.730,00

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ FERMIENTO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

0	NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025			
A	CIUDAD	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAG043
B No.	CUENTA BANCARIA A DEBITAR	600807651648	BANCO	Banco Popular
C No.	FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR		GMF (4*1000)	Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?				SI

Instructivo de Pago | Procesar Operación | Imprimir | Auditoría Operativa

CAUSAR Y PAGAR		¿La orden contiene numeros de factura?	SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Rapidi Causante	BENEFICIARIO FINAL PAGO					CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NIT NOMBRE 2	NIT APELLIDO 1	NIT APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS							TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	REEMBOLSO	NIT	901965630	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				Mano de obra, prestacion de servicios y pagos del personal ofertado y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones) ($10.682.220), Compra de materiales y accesorios ($517.400)	11.199.620,00							11.199.620,00	ACH	Bancolombia	84400008225	CH	SI	NIT	901965630	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			Mano de obra, prestacion de servicios y pagos del personal ofertado y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones) ($10.682.220), Compra de materiales y accesorios ($517.400)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 11.199.620,00 | VALOR NETO OPERACIONES $ 11.199.620,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE JORGE ADELMO LOPEZ CARMIENTO
CARGO	CARGO	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AG INDIGENAS 2025

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025					
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAG044	
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		600807651649		BANCO	Banco Popular	
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				GMF (4*1000)	Exenta	
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI	

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura? SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO FINAL PAGO								CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Reporte Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FACT TRQ 1	NIT	900769044	TERRACQUA S.A.S				Mano de obra ($2.379.584,28) Compra de Materiales y Accesorios ($13.286.012,24) Transporte de materiales ($4.164.272,49)	$ 19.829.869,01							19.829.869,01	ACH	Banco Davivienda S.A.	055010890005534	CH	SI	NIT	900769044	TERRACQUA S.A.S				Mano de obra ($2.379.584,28) Compra de Materiales y Accesorios ($13.286.012,24) Transporte de materiales ($4.164.272,49)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 19.829.869,01

VALOR NETO OPERACIONES $ 19.829.869,01

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
CARGO	CARGO	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	PA ANT. CONS AGUAS GAITAN 2025					
CIUDAD	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	516331	No. Orden		CAG045
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		900807651648		BANCO		Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				GMF (4*1000)		Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?						SI

CAUSAR Y PAGAR | ¿La orden contiene otros de | SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO FINAL PAGO								CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NIT NOMBRE 2	NIT APELLIDO 1	NIT APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FACT.GEO 94	NIT	901658784	GEODELTA SAS				Mano de obra (3,402,000) Compra de Materiales y Accesorios (18,994,500,01) Transporte de materiales (5,953,500)	$ 28,350,000,01							28,350,000,01	ACH	Bancolombia	39500005121	CH	SI	NIT	901658784	GEODELTA SAS				Mano de obra (3,402,000) Compra de Materiales y Accesorios (18,994,500,01) Transporte de materiales (5,953,500)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 28,350,000,01

VALOR NETO OPERACIONES $ 28,350,000,01

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ GARMIENTO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ

fiducia popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A ANT. CONS AGUAS DAITAN 2025					
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden		CAG46
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			600807551648	BANCO		Banco Popular
FONDO DE INVERSION A DEBITAR				CMF (Método)		Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?						SI

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura?: SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Caurante	BENEFICIARIO FINAL PAGO					CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE	NIT NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS							TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARI	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FACTJMAR 72	NIT	900751966	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS				Mano de obra (7,181,780,13) Compra de Materiales y Accesorios (40,098,272,42) Transporte de materiales (12,568,115,24)	$ 59.848.167,79							59.848.167,79	ACH	Bancolombia	05700001408	CH	SI	NIT	900751966	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS				Mano de obra (7,181,780,13) Compra de Materiales y Accesorios (40,098,272,42) Transporte de materiales (12,568,115,24)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 59.848.167,79

VALOR NETO OPERACIONES $ 59.848.167,79

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS DAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ BARRIENTO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

fiducia popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A ANT. CONS.AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAG047
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		600807651649	BANCO		Banco Popular
FONDO DE INVERSION A DEBITAR			CMF (1-1000)		Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Instrucción de Pago | Procesar Operación | Impresión | Descargar Plantilla

CAUSAR Y PAGAR | ¿La orden contiene numeros de factura? | SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	BENEFICIARIO FINAL PAGO						CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NIT NOMBRE 2	NIT APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS							TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	MYAC 419	NIT	900740652	CONSTRUCIVIL MSA S.A.S				Mano de obra (27,656,916.94) Compra de materiales y accesorios (154,417,756.28) Transporte de materiales (48,399,604.65)	$ 230,474,307.87							230,474,307.87	ACH	Bancolombia	05700001847	CH	SI	NIT	900740652	CONSTRUCIVIL MSA S.A.S				Mano de obra (27,656,916.94) Compra de materiales y accesorios (154,417,756.28) Transporte de materiales (48,399,604.65)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES | VALOR BRUTO OPERACIONES $ 230,474,307.87 | VALOR NETO OPERACIONES $ 230,474,307.87

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ GUARNIENTO
CARGO	CARGO	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE AGENCIA	316331	No. Orden	CAG048
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			600807691648	BANCO	Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				GMF (4x1000)	Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura? Si

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO														CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION CAUSANTE PAGO	NIT						VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACION BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO						
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2																	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2		
1	GTA N°14-001	CEDULA	17414465	EDUAR	BENJAMIN	PEREZ	SANCHEZ	Mano de obra ($5.922.000) Compra de Materiales y Accesorios ($33.064.500) Transporte de materiales ($10.363.500)	$ 49.350.000,00							49.350.000,00	ACH	Bancolombia	89000027015	CH	SI	CEDULA	17414465	EDUAR	BENJAMIN	PEREZ	SANCHEZ	Mano de obra ($5.922.000) Compra de Materiales y Accesorios ($33.064.500) Transporte de materiales ($10.363.500)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 49.350.000,00

VALOR NETO OPERACIONES $ 49.350.000,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO CUBILLOS OVIEDO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

Advisory popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

STEP-POTASS

Proceso: Gestión de pagos Negocios Fiduciarios	Procedimiento: Gestión de pagos Negocios Fiduciarios
Elaborado por: Negocios Fiduciarios	Fecha de elaboración: 25/10/2024

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	318331	No. Orden	CAGOAS
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			000007651648	BANCO	Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				GMF (4*1.000)	Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Instrucciones Pago | Procesar Operación | Impresión | Descarga Plantilla

CAUSAR Y PAGAR | ¿La orden contiene numeros de factura? | SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DE PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO FINAL PAGO									CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Registr. Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	CTA N°001	CEDULA	17416479	ANCIZAR	GUILLERMO	ARREDONDO	ARBOLEDA	Mano de obra ($1.861.200) Compra de Materiales y Accesorios ($10.391.700) Transporte de materiales ($3.257.100)	15.510.000,00							15.510.000,00	ACH	Bancolombia	28995117209	CH	SI	CEDULA	17416479	ANCIZAR	GUILLERMO	ARREDONDO	ARBOLEDA	Mano de obra ($1.861.200) Compra de Materiales y Accesorios ($10.391.700) Transporte de materiales ($3.257.100)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 15.510.000,00

VALOR NETO OPERACIONES $ 15.510.000,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE JORGE ADELMO [illegible]
CARGO:	CARGO:	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

fiduciaria popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A ANT. CONS.AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	Cod. de Negocio	316331	No. Orden	CAG050
CUENTA BANCARIA A DEBITAR	600807651648			BANCO	Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				CIIF (41000)	Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Instructivo de Pago | Proceso Operación | Impresión | Cumplido Digital

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura? SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	INFORMACIÓN BANCARIA					BENEFICIARIO FINAL PAGO					CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FACT_FEV1322	NIT	900777214	LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S				Compra de Materiales y Accesorios	$ 886,147.00							886,147.00	ACH	Bancolombia	36432082096	CH	SI	NIT	900777214	LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S				Compra de Materiales y Accesorios

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 886,147.00

VALOR NETO OPERACIONES $ 886,147.00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE JORGE ADELMO CHAVARRIAGA
CARGO	CARGO	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2026

Fiduciaria popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2026				
CIUDAD	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAG051
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			500907651648	BANCO	Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				GMF (4*1000)	Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomiso?					SI

Instructivo de Pago | Procesar Operación | Impresión | Definición Archivo

CAUSAR Y PAGAR | ¿La orden contiene numeros de factura? | SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO FINAL PAGO									CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	NHNR 30	CEDULA	17335397	NELSON	HERNAN	MORALES	ROJAS	Compra de materiales y accesorios	23,328,000.00							23,328,000.00	ACH	Bancolombia	84439574880	CH	SI	CEDULA	17335397	NELSON	HERNAN	MORALES	ROJAS	Compra de materiales y accesorios

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 23,328,000.00 | VALOR NETO OPERACIONES $ 23,328,000.00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2026	NOMBRE JORGE ADELMO DUQUE BAMENTO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2026

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A ANT, CONS,AGUAS GAITAN 2025						
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CA0852		
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		500807651649		BANCO	Banco Popular		
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				CIIF (Fondos)	Exenta		
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI		

CAUSAR Y PAGAR

¿La o/orn contiene numeros de factura?: SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DE PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO FINAL PAGO								CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARI	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	CTA Nº 004	CEDULA	1121932438	ANGY	XIMENA	CASTILLO	BLANDON	Mano de obra, prestación de servicios y pagos del personal ofertado y operativo	885.000,00							885.000,00	ACH	Bancolombia	39586743477	CH	SI	CEDULA	1121932438	ANGY	XIMENA	CASTILLO	BLANDON	Mano de obra, prestación de servicios y pagos del personal ofertado y operativo

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 885.000,00

VALOR NETO OPERACIONES $ 885.000,00

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO [illegible] CARGO R/L CONSORCIO [illegible] AC INDIGENAS 2025
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ

Banco popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025					
CIUDAD	Bogotá	CONCEPTO DE PAGO	316351	No. Orden	CAG053	
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			800807651648	BANCO	Banco Popular	
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				GMF (4x1000)	Exenta	
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI	

Instructivo de Pago | Procesar Operación | Impresión | Instructivo Planilla

CAUSAR Y PAGAR | ¿La orden contiene numeros de factura? | SI

ITEM	NO. FACTURA	GAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO						BENEFICIARIO FINAL PAGO					CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETECA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Registr. Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	PV/1610764	NIT	800216499	AGOFER SAS				COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 17.732.659,00							17.732.659,00	ACH	Bancolombia	20575557415	CH	SI	NIT	800216499	AGOFER SAS				COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 17.732.659,00

VALOR NETO OPERACIONES $ 17.732.659,00

ELABORÒ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MUÑOZ	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ HERMIENTO
CARGO	CARGO	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

fiducia popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A ANT. CONS.AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAG054
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		500807551648	BANCO		Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR			OMC (+/- 000)		Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Instrucción Pago | Proceso Operación | Impresión | Cumplido Radicado

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura? SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DE PAGO NIT TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	BENEFICIARIO FINAL PAGO NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	CONCEPTO DE PAGO
1	FACT_FE 6	NIT	901975926	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS				Mano de obra ($11.112.093) Compra de Materiales y Accesorios ($62.042.519,25) Transporta de materiales ($19.446.162,75)	$ 92.600.775,00							92.600.775,00	ACH	Bancolombia	64400008288	CH	SI	NIT	901975926	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS				Mano de obra ($11.112.093) Compra de Materiales y Accesorios ($62.042.519,25) Transporta de materiales ($19.446.162,75)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 92.600.775,00

VALOR NETO OPERACIONES $ 92.600.775,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURILLA	NOMBRE JORGE ADELMO [illegible]
CARGO	CARGO	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A ANT. CONS.AGUAS GAITAN 2025						
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden		CAG056	
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			600807651848	BANCO		Banco Popular	
FONDO DE INVERSION A DEBITAR				GMF (4*1000)		Exenta	
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?						SI	

Instrucción de pago | Procesar Operación | Impresión | Duplicar o Eliminar

CAUSAR Y PAGAR | ¿La orden contiene numeros de factura? | SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO FINAL PAGO									CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NIT NOMBRE 2	NIT APELLIDO 1	NIT APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	PROF Nº002	NIT	901975926	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS				Transporte de materiales	$ 101.487.194,70							101.487.194,70	ACH	Bancolombia	84400000288	CH	SI	NIT	901975926	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS				Transporte de materiales

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 101.487.194,70 | VALOR NETO OPERACIONES $ 101.487.194,70

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE JORGE ADELMO [illegible]
CARGO	CARGO	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AG INDIGENAS 2025
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ

fiducia popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden	CAG056
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		600807651648		BANCO	Banco Popular
FONDO DE INVERSION A DEBITAR				GMF (4*1000)	Exenta
¿La Equidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Instrucción de Pago | Proceso Operación | Impresión | Impuesto GMF (4*1000)

CAUSAR Y PAGAR | ¿La orden contiene numeros de factura? | SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	DATOS BANCARIOS DEL BENEFICIARIO					BENEFICIARIO FINAL PAGO					CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT		APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
				NOMBRE 1	NOMBRE 2																							
1	CTA 002-2025	NIT	900769044	TERRACQUA S.A.S				Mano de obra ($4.116.000) Compra de Materiales y Accesorios ($22.981.000) Transporte de materiales ($7.203.000)	$ 34.300.000,00							34.300.000,00	ACH	Banco Davivienda S.A.	065010890051534	CH	SI	NIT	900769044	TERRACQUA S.A.S				Mano de obra ($4,116,000) Compra de Materiales y Accesorios ($22.981.000) Transporte de materiales ($7.203.000)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 34.300.000,00 | VALOR NETO OPERACIONES $ 34.300.000,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE JORGE ADELMO [illegible]
CARGO	CARGO	CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

fiducia popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

SIF-SP-FOT-025

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A ANT. CONS.AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE CIUDAD	31331	No. Orden	CAG057
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		900807851648	BANCO		Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR			BANCO (+1000)		Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Instructivo de Pago | Procesar Operación | Impresión | Guardar en PDF

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura? SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BANCO	N° CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO				CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NIT NOMBRE 2	NIT APELLIDO 1	NIT APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS									NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FACT,GEO 95	NIT	901658784	GEODELTA SAS				Mano de obra ($2,940,000,04) Compra de Materiales y Accesorios ($16,415,000,23) Transporte de materiales ($5,145,000,07)	$ 24,500,000,34							24,500,000,34	ACH	Bancolombia	39500005121	CH	SI	NT	901658784	GEODELTA SAS				Mano de obra ($2,940,000,04) Compra de Materiales y Accesorios ($16,415,000,23) Transporte de materiales ($5,145,000,07)

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 24,500,000.34

VALOR NETO OPERACIONES $ 24,500,000.34

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO [illegible] CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025				
CIUDAD	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	318331	No. Orden	CAG059
CUENTA BANCARIA A DEBITAR		800807651648	BANCO		Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR			CMF (si/no)		Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Instructivo de Pago | Procesar Operación | Impresión | Guardar y Cerrar

CAUSAR Y PAGAR

¿La orden contiene numeros de factura? SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTES DE PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO PAGO								BENEFICIARIO FINAL PAGO				CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FACT 1030283	CEDULA	17627950	ORLANDO		BONILLA	CASTELLANO	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 2.202.365,00							2.202.365,00	ACH	Bancolombia	28976311823	CC	SI	CEDULA	17627950	ORLANDO		BONILLA	CASTELLANO	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 2.202.365,00

VALOR NETO OPERACIONES $ 2.202.365,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NOMBRE JORGE ADELMO [illegible] CARGO R/L CONSORCIO [illegible] AC INDIGENAS 2025

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A ANT. CONS.AGUAS GAITAN 2026						
CIUDAD	Bogotá	CODIGO DE NEGOCIO	316331	No. Orden		CAG059	
CUENTA BANCARIA A DEBITAR			600807651648	BANCO		Banco Popular	
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR				GMF (4X1000)		Exenta	
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?						SI	

Instrucción de Pago | Proceso Operación | Impresión | Carta de Pago

CAUSAR Y PAGAR

¿El archivo contiene numeros de [illegible]: SI

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO NIT					CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	BENEFICIARIO FINAL PAGO						CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS						TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	PROF 101714	NIT	900783521	ARCOE S.A.S				COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 49,764,361,29							49,764,361,29	ACH	Bancolombia	36452637120	CC	SI	NIT	900783521	ARCOE S.A.S				COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 49,764,361,29

VALOR NETO OPERACIONES $ 49,764,361,29

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA CARGO R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2026	NOMBRE JORGE ADELMO DUARTE MONTO CARGO R/L CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ

ANEXO 11. ACTA DE VECINDAD.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO ACTA DE VECINDAD			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-04	Version:03	Vigencia:10-01-2025	

ACTA DE VECINDAD N° ____

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

CONTRATO/CONVENIO No. 821 DE 2025 (ESCRIBA EL NÚMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META. (TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)


CONTRATISTA CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA)


INTERVENTOR CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR)

SUPERVISOR: ING. JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)

TIPO DE ACTA PREDIO [ ] FINCA [ ] VIAS [ ] SISTEMA [X] HOJA ____ DE ____

REGISTRO FOTOGRAFICO:

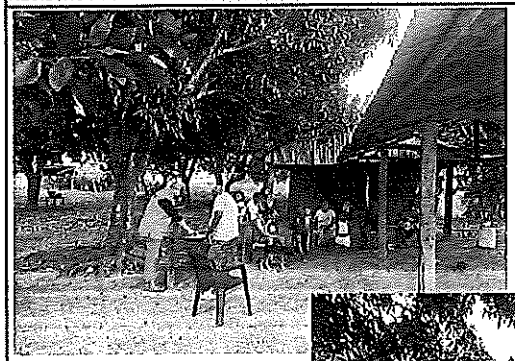

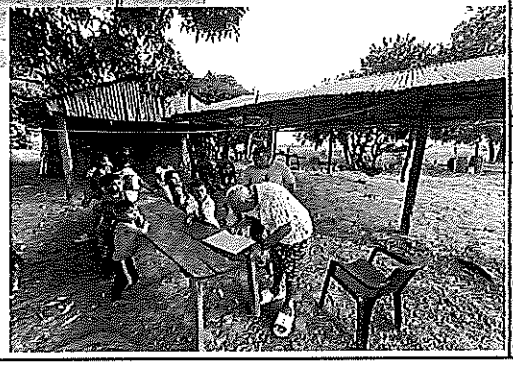

DATOS

Nombre del Propietario / Tenedor, Responsable del Predio: PEDRO A GAITAN

Tipo de Tenencia: Propietario [ ] Arrendatario [ ] Poseedor: [ ]

Otro, Cual?:

N° de Identificación: Direccion COMUNIDAD CACHIMAN

Localizacion: RESGUARDO DOMOPLANAS

Teléfonos: Abscisas:

Long. de Intervención (m):

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía			
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión Cable		X	

USO ACTUAL								ACCESOS VEHICULAR
1. Agropecuario	X	1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	X	
2. Residencial	X	1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		Parqueadero
3. Comercial		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		SI [ ] No [ ]
4. Institucional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		
5. Deshabitado		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		Cuantos: ____
6. Parqueadero		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		Uso actual del Parqueadero
7. Recreacional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		
8. Inst. educativa		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		
9. Otros	Cual:							

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

(FAVOR DETALLAR EXISTENCIA DE HUNDIMIENTOS, GRIETAS, ZONAS INUNDABLES, DEMAS ASPECTOS RELEVANTES). SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ANEXA.

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS HOJA DE

(FAVOR DETALLAR EXISTENCIA DE HUNDIMIENTOS, GRIETAS, ZONAS INUNDABLES, DEMAS ASPECTOS RELEVANTES). SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ANEXA.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO ACTA DE VECINDAD			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-04	Version:03	Vigencia:10-01-2025	

ACTA DE VECINDAD N° 06

ANEXOS DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO [X] REGISTRO FILMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA		FIRMA	FIRMA
NOMBRE	Pedro A Gaitán	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
C. c. N°	8192468	C. c. N° 86051533 De Villavicencio	C. c. N° 79134525 De Fontibon
PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

CERTIFICADOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL.

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de diciembre de 2025, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de los materiales de excavación generados en los diferentes frentes de obra del proyecto, para los cuales el contratista adelantó acciones orientadas al manejo adecuado de los materiales provenientes de excavaciones y descapote, priorizando su reutilización en sitio para actividades de relleno, reconformación y nivelación de las áreas intervenidas.

En aquellos casos donde no es posible su aprovechamiento inmediato, se ha observado su acopio temporal en condiciones controladas y autorizadas por la comunidad. Así mismo, la disposición final de estos materiales se realiza en sitios definidos dentro del área de intervención, asegurando que no se generen afectaciones a drenajes naturales, fuentes hídricas o zonas ambientalmente sensibles.

A la fecha del presente certificado, estas actividades se desarrollan en el marco de las condiciones propias del proyecto, caracterizado por la ejecución en múltiples frentes de trabajo en zonas rurales dispersas. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento al manejo y disposición de los materiales de excavación, con el fin de garantizar la adecuada reconformación de las áreas intervenidas y la prevención de

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual asignadas a la interventoría, y en mi calidad de **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 1004 DE 2025,**

CERTIFICO QUE:

El **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"**, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2025, fue objeto de seguimiento integral por parte de la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, respecto de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció que el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y lineamientos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, considerando su desarrollo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

De igual manera, se constató el avance de las actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión en los diferentes componentes objeto de interventoría, necesarios para la correcta ejecución del contrato. En este sentido, la Interventoría continuará realizando el seguimiento integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la finalización del proyecto.

El presente certificado se expide a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

El suscrito, certifica el actual estado de la obra que a continuación se especifica:

CONTRATO DE OBRA No.: No. 821 DE 2025
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"
CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS GAITÁN 202
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025
FECHA DE CORTE: 30 de diciembre de 2025
PERIODO EVALUADO: Del 01 al 31 de diciembre de 2025

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual, la interventoría certifica el avance financiero del contrato, con base en la programación aprobada y la inversión física ejecutada durante el periodo evaluado.

1. AVANCE FINANCIERO (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

AVANCE CON RESPECTO A VALOR DEL CONTRATO	SEGUN PROGRAMACION	SEGUN AVANCE FISICO
INVERSION AL 31 DIC 2025	$ 3,182,797,359	$ 3,384,230,051
INVERSION ACUMULADA	$ 8,602,601,926	$ 10,635,190,003
ADELANTO EN PROGRAMACION	$	2,032,588,077

2. CONCEPTO DE INTERVENTORÍA

Para la fecha de corte del presente informe, se evidencia un avance de obra física ejecutada por un valor de $ $ 10,635,190,003, frente a un avance programado de $ 8,602,601,926. Este resultado refleja un adelanto financiero del 0,2363%, equivalente a $ 2,032,588,077. Este valor representa en el replanteo de las comunidades indígenas, lo cual fue la actividad que se desarrolló durante el cuarto mes de ejecución y se realizó en los tiempos establecidos.

El presente certificado se expide a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES Y PREDIALES PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO Y SU VIGENCIA

Teniendo en cuenta las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"**, particularmente la establecida en la *CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA*, numeral 34. *"EL CONTRATISTA debe realizar los trámites y atender los requerimientos que le realice la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial "La Macarena"-CORMACARENA y las entidades y/o autoridades con las que se tengan permisos, licencias o autorizaciones";* en mi calidad de Interventor del contrato mencionado, para el periodo comprendido desde el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, me permito CERTIFICAR el cumplimiento de esta obligación en relación a los permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA, los cuales se encuentran vigentes y amparan las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, conforme a la siguiente relación:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	VIGENCIA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	WACOYO	KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ

Así mismo, se verificó que las actividades ejecutadas en obra se desarrollan dentro del alcance de los permisos otorgados y conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2025, para los fines pertinentes,

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de diciembre de 2025, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Como resultado de las verificaciones, se evidenció que el contratista viene adelantó acciones orientadas a la separación en la fuente y al acopio temporal de los residuos generados según sus características, en condiciones que permiten su manejo controlado, considerando la ejecución de múltiples frentes de trabajo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

A la fecha de corte del presente certificado, el contratista de obra prevé su entrega a gestores o empresas autorizadas una vez se consoliden volúmenes representativos o se finalicen las actividades en cada frente de trabajo. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento a la gestión integral de los residuos, incluyendo la verificación de los respectivos soportes de disposición final.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL

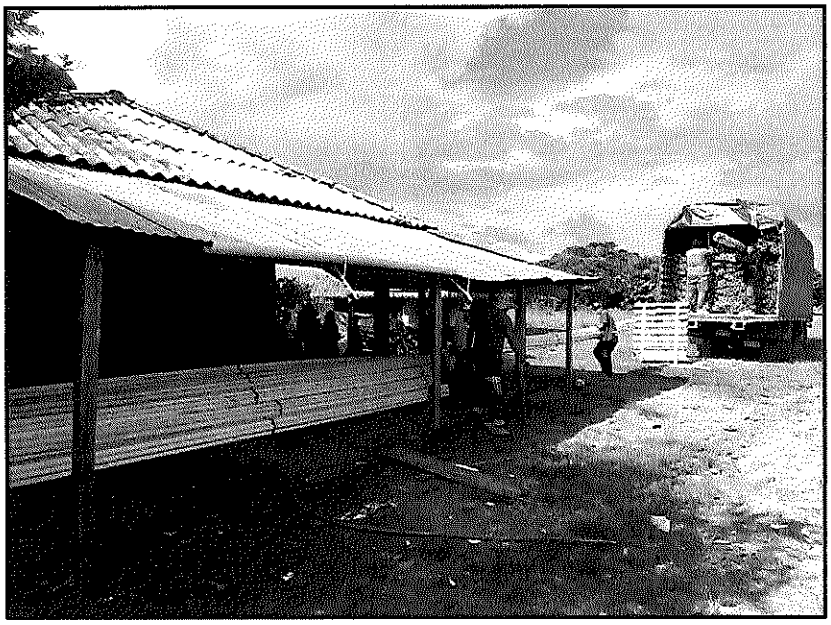


Imagen 1 Acopio de materiales en cubierta

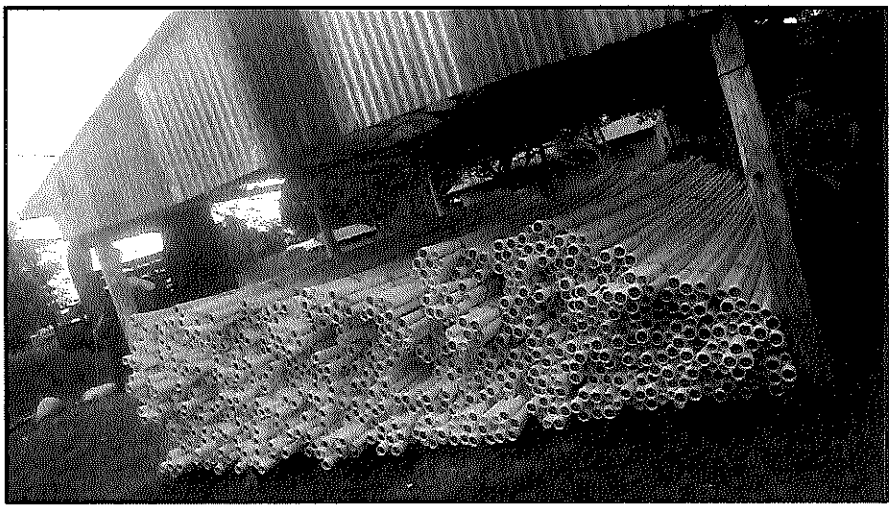


Imagen 2 Acopio de materiales en cubierta

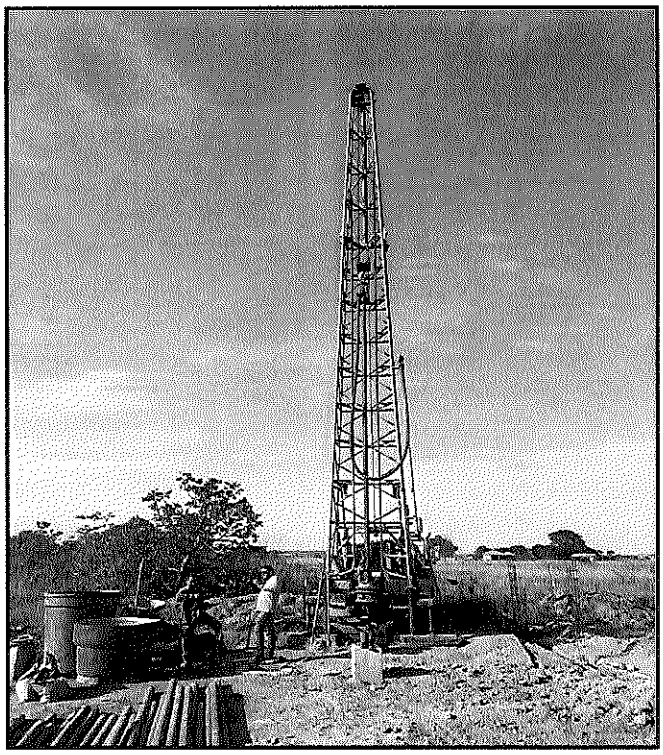


Imagen 3 Frente de trabajo libre de residuos, sin afectación
A bosques (comunidad Awaliba central)

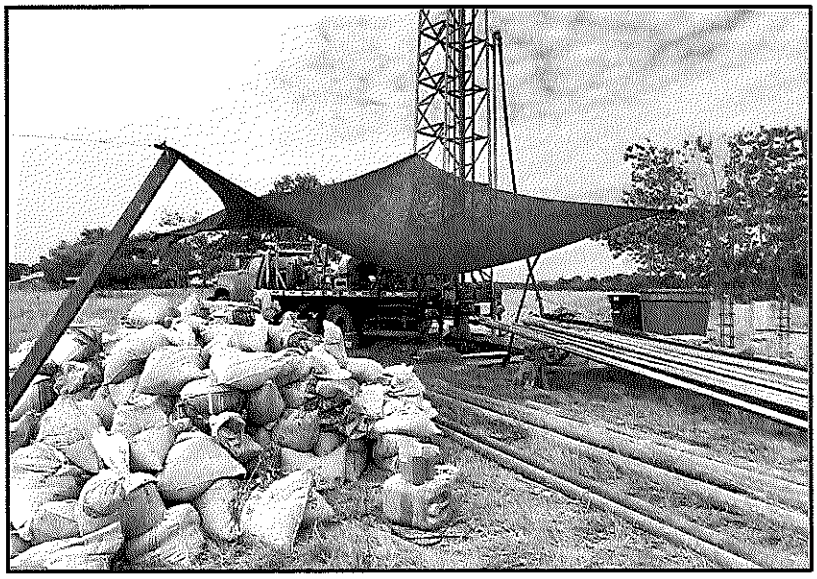


Imagen 4 Frente de trabajo libre de residuos, sin afectación
A bosques (comunidad Punto grillo)

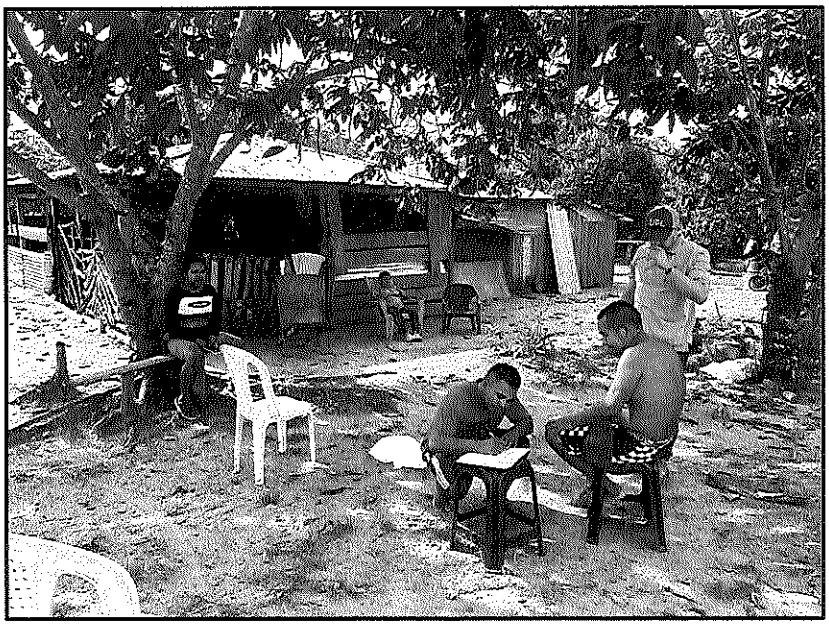


Imagen 5 Gestión social

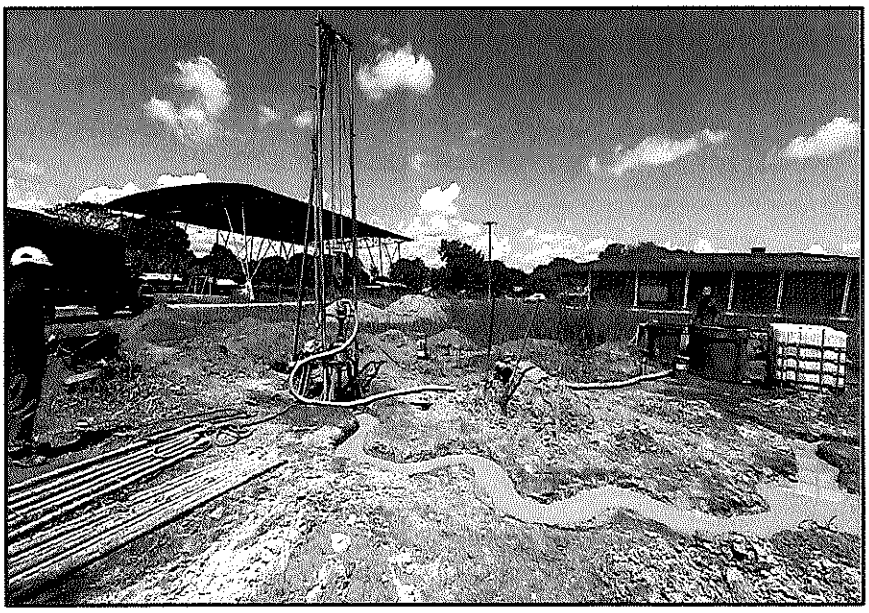


Imagen 6 Manejo y secado de lodos

CERTIFICACION

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA

Durante el mes de diciembre de 2025, una vez analizada y verificada en campo la información y la documentación presentada por el contratista **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** frente a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el anexo técnico del proceso de licitación pública No. LP-SIP-005-2025, el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con NIT. 901.965.630 - 1 representado legalmente por **LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.051.533, certificamos que se **CUMPLIO** con los requisitos exigidos respecto a la maquinaria y equipos establecidos durante el mes de diciembre de 2025. Así las cosas, a continuación, enumeramos uno a uno la maquinaria y equipos colocados en la obra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Maquinaria y equipo dispuesto por el Consorcio Agua Gaitan 2025.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1
CAMION ESTACAS	CHEVROLET	1
EQUIPO DE PERFORACION	PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8	1
EQUIPO DE PERFORACION	DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
EQUIPO DE PERFORACIÓN	REO, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
RETROEXCAVADORA	HITACHI	1
RETROEXCAVADORA	CARTERPILLA	1

Fuente: Elaboración propio Consorcio Interventoría AC Indígenas 2025.

El presente certificado se expide a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025
