
INFORME DE SUPERVISIÓN AÑO 2022
PROYECTO RAMPA COLEGIO LA CONCORDIA CPF 1703
Agosto 2022

RENDER

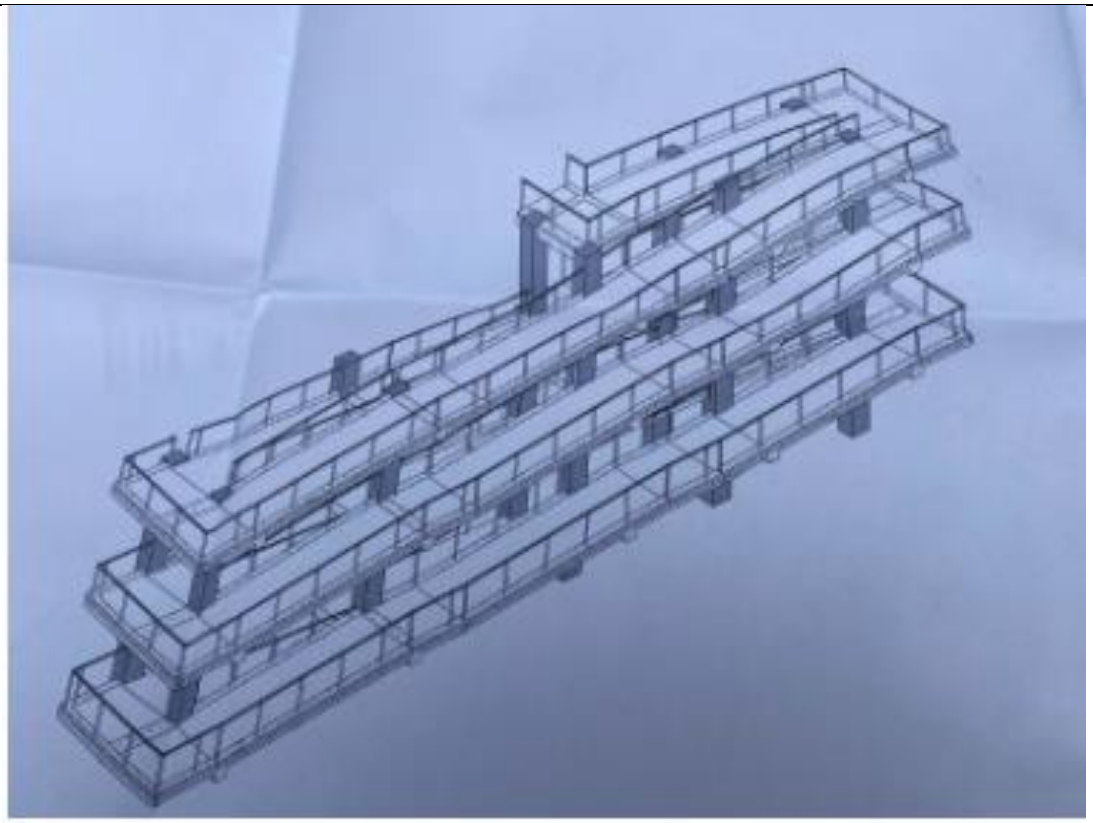

ELABORÓ:

EDGARD MAURICIO CARVAJAL RONDEROS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION DCCEE-SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación	**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE CONTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**					
	INFORME DE SUPERVISIÓN PROYECTO RAMPA LA CONCORDIA					
	CPF	1703	**FECHA**	31/08/2022	**HOJA**	1 DE 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Colegio:	**COLEGIO LA CONCORDIA**		
Sede:	Sede A La Concordia		
Localidad:	17 – La Candelaria	UPZ:	94 – La Candelaria
Barrio	La Concordia	Dirección:	Carrera 2 No. 14 - 90
Tipo de Proyecto:	Cumplimiento norma accesibilidad		
Alumnos Beneficiados:			
Área Lote:	4.175,23 M2	Área Diseñada:	
Licencia de Construcción:		Fecha de Vencimiento:	
Espacios del proyecto: Rampa			

1. Información general Contratos de Diseño e Intervenoría

Tipo de Contrato	**Contrato de Diseño**	**Contrato de Interventoría**
No: Contrato	**CO1.PCCNTR.3117368 22 de diciembre de 2021**	**CO1.PCCNTR. 3129706 -2021 del 27 de diciembre de 2021**
Nombre Contratista:	**INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S**	**RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE**
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA REGLAMENTACIÓN DE PATRIMONIO EN EL COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA SEDE A - LA CONCORDIA, CPF 1703, UBICADO EN LA LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA.	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA REGLAMENTACION DE PATRIMONIO EN EL COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA SEDE A - LA CONCORDIA, CPF 1703, UBICADO EN LA LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA..
Proceso Licitatorio	SED-CM-A-DCCEE-066-2019	SED-MC-DCCEE-101-2021
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES	CUATRO (4) MESES
Fecha de Inicio:	28 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022
Fecha de terminación inicial	27 de junio de 2022	27 de junio de 2022
Fecha Estimada Terminación (1):	15 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022
Suspensiones:	Suspensión 1 del 4 de mayo al 3 de junio Prórroga 1 a la suspensión 1 hasta el 23 de junio. Reinicio anticipado a la suspensión 1 el 23 de junio de 2022	Suspensión 1 del 4 de mayo al 3 de junio Prórroga 1 a la suspensión 1 hasta el 23 de junio. Reinicio anticipado a la suspensión 1 el 23 de junio de 2022

	Suspensión 2, del 8 de julio al 8 de agosto de 2022. Reinicio a la suspensión 2 8 de agosto. Suspensión 3 del 22 de agosto al 21 de octubre de 2022.	Suspensión 2, del 8 de julio al 8 de agosto de 2022. Reinicio a la suspensión 2 8 de agosto. Suspensión 3 del 22 de agosto al 21 de octubre de 2022.
Plazo adicional:		
Plazo total:	Cuatro (4) meses	Cuatro (4) meses
Resumen MODIFICACIONES	N/A	N/A
Porcentaje de Avance Técnico (2):	50%	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA No	42-44-101137051	380-47-994000120442
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	Suspendido	Suspendido

2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

Tipo de Contrato	**Contrato de Diseño**	**Contrato de Interventoría**
No: contrato	**CO1.PCCNTR.3117368 del 22 de diciembre de 2021**	**CO1.PCCNTR. 3129706 -2021 del 27 de diciembre de 2021**
Valor inicial:	$ 126’527.703 (INC. I.V.A. 19%)	$ 27’750,000 (INC. I.V.A. 19%)
Adición 01 (AD1)	N. A.	N. A.
Adición 02 (AD2)	N. A.	N. A.
Valor total (AD1 +AD2)	$ 126’527.703 (INC. I.V.A. 19%)	$ 27’750,000 (INC. I.V.A. 19%)
Numero de actas parciales tramitadas	0	
Valor facturado a la fecha	0	
% de avance financiero	0	
Anticipo	N. A.	
Amortización del anticipo a la fecha	N. A.	

3. ARCHIVO FÍSICO E INFORMACION SECOP Y SHARE-POINT

Tipo de Contrato	**Contrato de Diseño**	**Contrato de Interventoría**
No: contrato	**CO1.PCCNTR.3117368 22 de diciembre de 2021**	**CO1.PCCNTR. 3129706 -2021 del 27 de diciembre de 2021**

Información Publicada en SECOP	Acta de inicio, póliza, suspensiones, reinicios	Acta de inicio, póliza, suspensiones, reinicios
Información publicada en SHAREPOINT	Acta de inicio, póliza, suspensiones, reinicios	Acta de inicio, póliza, suspensiones, reinicios

- Archivo físico de los contratos.

Tipo de Contrato	**Contrato de Diseño**	**Contrato de Interventoría**
No: contrato	**CO1.PCCNTR.3117368 22 de diciembre de 2021**	**CO1.PCCNTR. 3129706 -2021 del 27 de diciembre de 2021**
No. de Carpetas		
No. de folios		
Entregas realizadas al archivo de la oficina de contratos		
Entregas pendientes por realizar		

4. SERVICIOS PÚBLICOS DEFINITIVOS

A continuación, se presenta el estado de conexiones de servicios públicos definitivos


	Estado técnico (número y fecha)	Proyecto de conexión aprobado (número y fecha)	¿ya se realizó la obra civil?	Observaciones / Dificultades
ENERGIA				
ACUEDUCTO				
ALCANTARILLADO				
GAS NATURAL				

5. Dificultades – soluciones

No.	Dificultad	Incidencia en el desarrollo del proyecto	Estado actual
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
7			
8			

Estado trámites de servicios públicos

6. Registro fotográfico

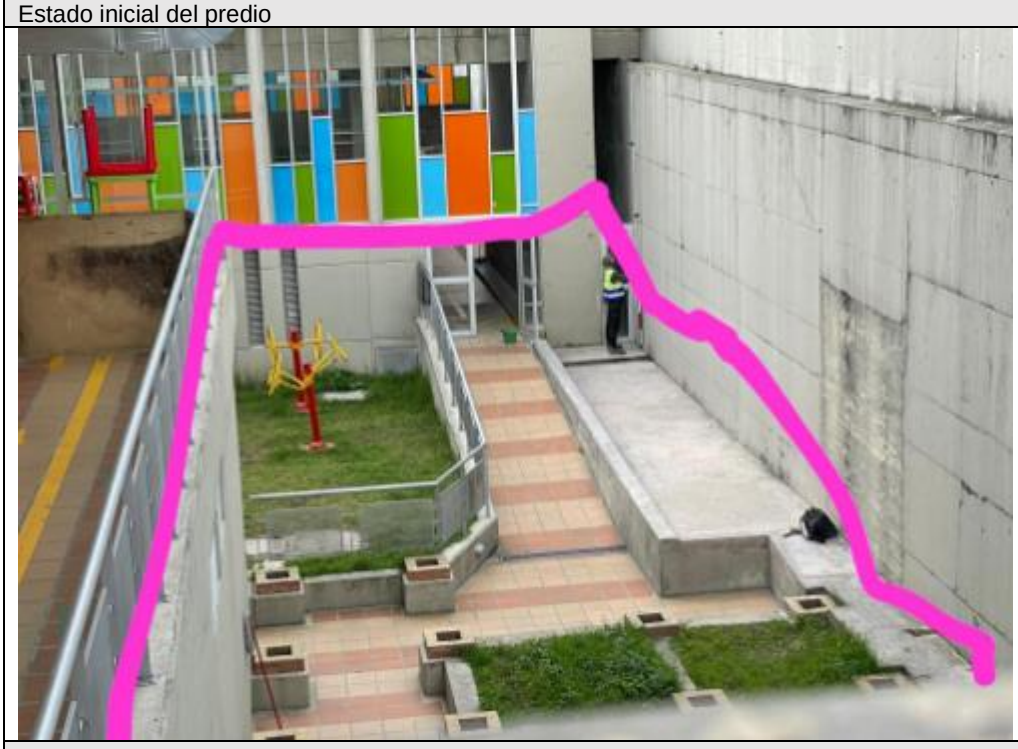Estado inicial del predio

En la semana del 8 de agosto se radicará el proyecto en el DADEP

7. Conclusiones y recomendaciones de la supervisión de la DCCEE-SED

El rector solicitará se incluya en el contrato el diseño de un aula para prácticas de turismo.
