EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-0039-2026**

CONTRATO:	MALLA VIAL MEDELLÍN 2025		
CLIENTE:	CONSORCIO VIALMED 2025		
FECHA DE MUESTREO:	18 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**LUGAR Y HORA DE ENSAYO:**	Planta / 5:05 pm
FECHA DE ENSAYO:	18 de diciembre de 2025	**LUGAR DE ENSAYO**	Laboratorio planta de producción
RECEPCIÓN No.:	804-25	**MUESTRA No.:**	1

CONTENIDO DE ASFALTO

CONTENIDO DE ASFALTO DE MEZCLAS EN CALIENTE POR IGNICIÓN (MUFLA) INV E-729-13 MÉTODO A


Masa inicial de la muestra, g	2009,7	Pérdida, g	110,0	Factor de correción	0,55	**% DE ASFALTO**
Masa del agregado despues de ignición, g		1899,7				**4,92%**
Equipo utilizado:	Mufla - Fabricante: Controls ELC - 017 Horno industrial - Fabricante: Humboltd ELC-046					

GRADACIÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200	Pasa No.200
	mm	19,0	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075	
Masa retenida, g		0,0	253,3	204,8	512,3	320,6	313	130,1	74,2	91,4
% agregado retenido		0,0	13,3	10,8	27,0	16,9	16,5	6,8	3,9	4,8
% agregado retenido acumulado		0,0	13,3	24,1	51,1	68,0	84,4	91,3	95,2	100,0
% que pasa		**100**	**87**	**76**	**49**	**32**	**16**	**9**	**4,8**	**-**
Fórmula de trabajo		100,0	87,0	75,6	45,8	29,9	14,9	8,3	4,9	-
Especificación INV 450 MSC-19 Mín.		100	80	65	40	24	9	6	3,0	-
Especificación INV 450 MSC-19 Máx.		100	95	80	55	38	20	12	7,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		100	83	72	42	27	12	6	3,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		100	91	80	50	33	18	11	6,9	-
Equipo utilizado:	Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080									

Distribución granulométrica **Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP** **18 de diciembre de 2025**

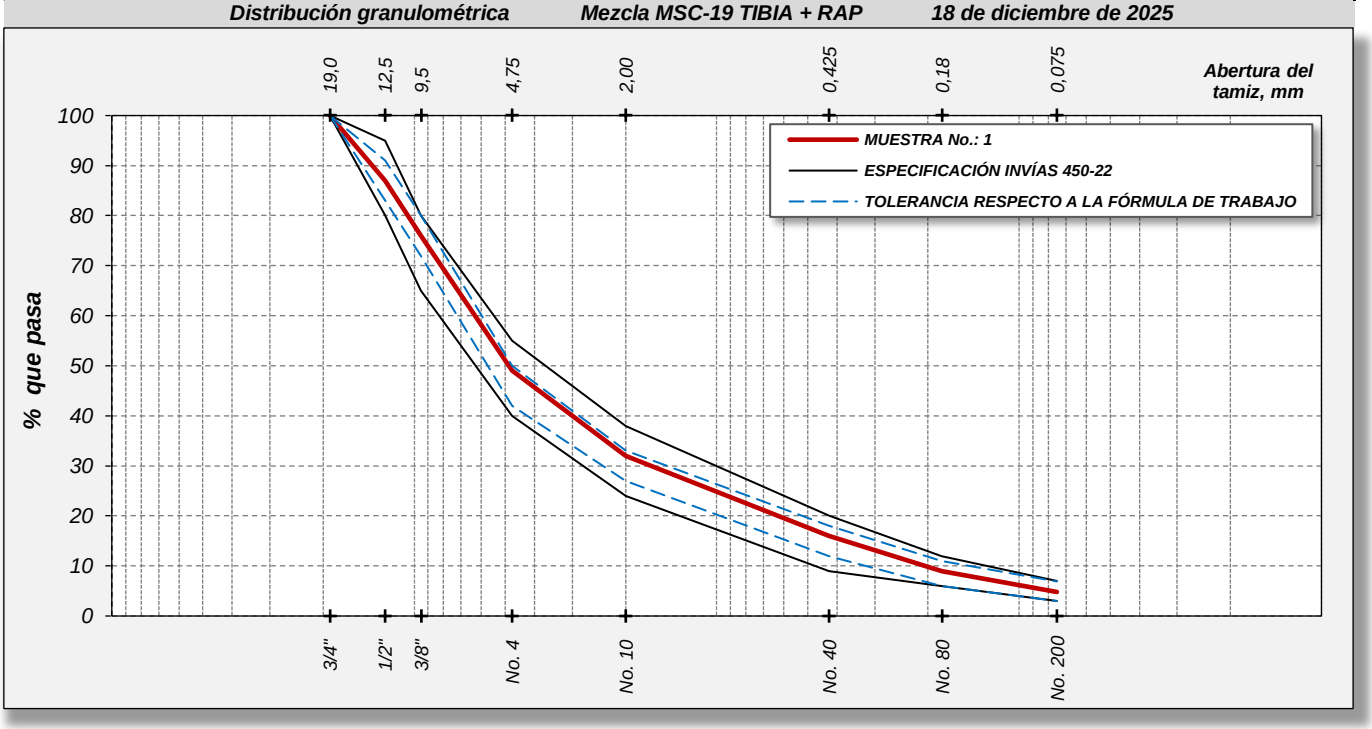

OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	**Revisó**	**Aprobó**
Pablo Tejada	Maylen Martínez	Ing. Jorge A. Tobón García
18 de diciembre de 2025	Aux. Ing. Maylen Martinez 20 de enero de 2026	20 de enero de 2026

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	CONSORCIO VIALMED 2025
Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP	***Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025***	***Informe PE-AP-9539-0039-2026***

CONTRATO:	*MALLA VIAL MEDELLÍN 2025*		
CLIENTE:	*CONSORCIO VIALMED 2025*		
FECHA DE MUESTREO:	*18 de diciembre de 2025*	***PLANTA PRODUCTORA:***	*PAVIMENTAR S.A.*
LUGAR DE MUESTREO:	*Planta de producción*	***LUGAR Y HORA DE ENSAYO:***	*Planta / 5:42 pm*
FECHA DE ENSAYO:	*18 de diciembre de 2025*	***LUGAR DE ENSAYO***	*Laboratorio planta de producción*
RECEPCIÓN No.:	*804-25*	***MUESTRA No.:***	*2*

CONTENIDO DE ASFALTO

CONTENIDO DE ASFALTO DE MEZCLAS EN CALIENTE POR IGNICIÓN (MUFLA) INV E-729-13 MÉTODO A

Masa inicial de la muestra, g	*2009,4*	*Pérdida, g*	*111,1*	*Factor de correción*	*0,55*	***% DE ASFALTO***
Masa del agregado despues de ignición, g		*1898,3*				***4,98%***

Equipo utilizado: *Mufla - Fabricante: Controls ELC - 017*
Horno industrial - Fabricante: Humboltd ELC-046


GRADACIÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	***Tamiz***	***3/4"***	***1/2"***	***3/8"***	***No. 4***	***No. 10***	***No. 40***	***No. 80***	***No. 200***	***Pasa No.200***
	mm	***19,0***	***12,5***	***9,5***	***4,75***	***2,00***	***0,425***	***0,18***	***0,075***	
Masa retenida, g		*0,0*	*249,8*	*224,5*	*516,6*	*315,8*	*310,2*	*119,8*	*68,1*	*93,5*
% agregado retenido		*0,0*	*13,2*	*11,8*	*27,2*	*16,6*	*16,3*	*6,3*	*3,6*	*4,9*
% agregado retenido acumulado		*0,0*	*13,2*	*25,0*	*52,2*	*68,8*	*85,2*	*91,5*	*95,1*	*100,0*
% que pasa		***100***	***87***	***75***	***48***	***31***	***15***	***9***	***4,9***	***-***
Fórmula de trabajo		*100,0*	*87,0*	*75,6*	*45,8*	*29,9*	*14,9*	*8,3*	*4,9*	*-*
Especificación INV 450 MSC-19 Mín.		*100*	*80*	*65*	*40*	*24*	*9*	*6*	*3,0*	*-*
Especificación INV 450 MSC-19 Máx.		*100*	*95*	*80*	*55*	*38*	*20*	*12*	*7,0*	*-*
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		*100*	*83*	*72*	*42*	*27*	*12*	*6*	*3,0*	*-*
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		*100*	*91*	*80*	*50*	*33*	*18*	*11*	*6,9*	*-*

Equipo utilizado: *Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080*

Distribución granulométrica ***Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP*** ***18 de diciembre de 2025***

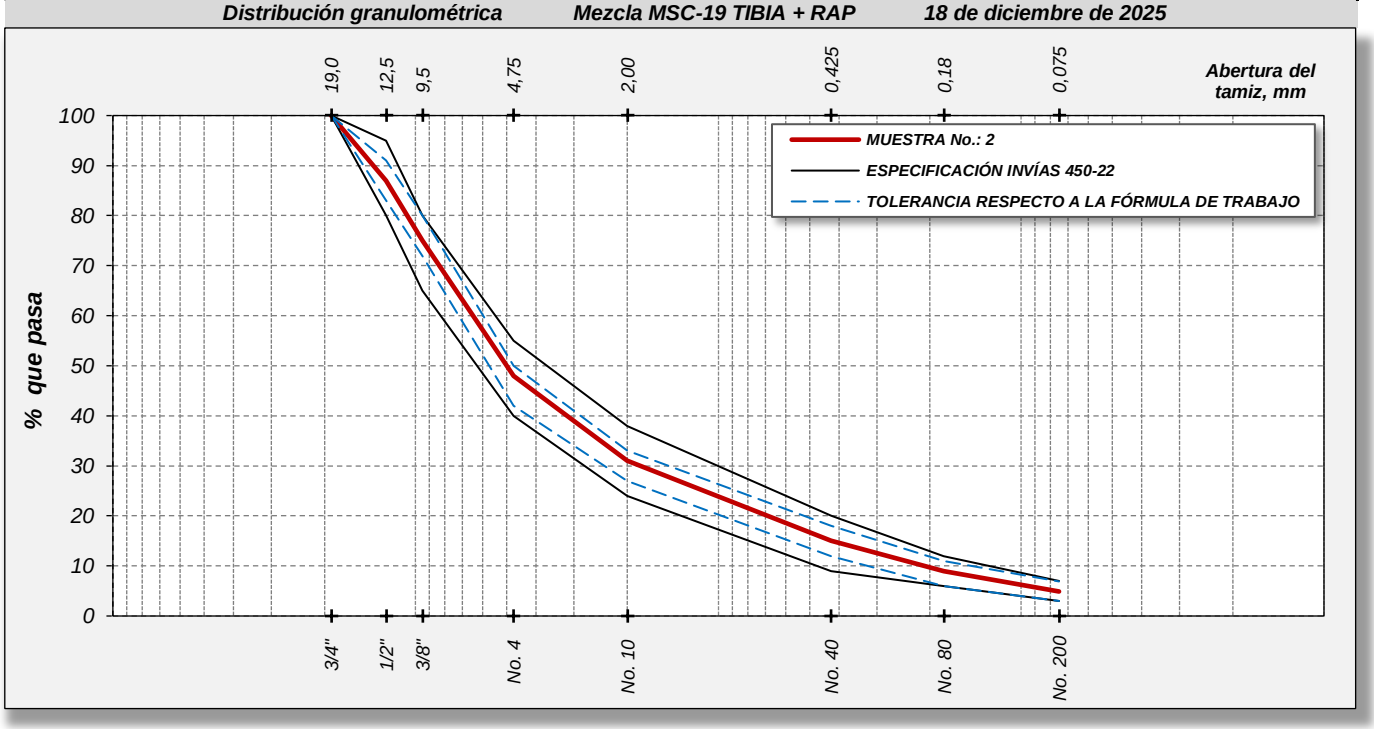

OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	***Revisó***	***Aprobó***
Pablo Tejada	*Aux. Ing. Maylen Martinez*	*Ing. Jorge A. Tobón García*
18 de diciembre de 2025	*20 de enero de 2026*	*20 de enero de 2026*

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	CONSORCIO VIALMED 2025
Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-0039-2026**

CONTRATO:	MALLA VIAL MEDELLÍN 2025		
CLIENTE:	CONSORCIO VIALMED 2025		
FECHA DE MUESTREO:	18 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**LUGAR Y HORA DE ENSAYO:**	Evaltec / 5:00 pm
FECHA DE ENSAYO:	22 de diciembre de 2025	**LUGAR DE ENSAYO**	Laboratorio Evaltec S.A.S
RECEPCIÓN No.:	804-25	**MUESTRA No.:**	3

CONTENIDO DE ASFALTO

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS (CENTRÍFUGA) INV E-732-13

Masa inicial de la muestra, g	2153,8	Masa final de la muestra, g	2047,0	**% DE ASFALTO**
Masa inicial del filtro, g	21	Masa final del filtro, g	21,6	**4,93%**

Equipo utilizado: G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025
G2-058 Centrifuga PINZUAR


GRADACIÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200	Pasa No.200
	mm	19,0	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075	
Masa retenida, g		0,0	247,7	264,1	505,6	386,9	317,3	129	94,4	102,0
% agregado retenido		0,0	12,1	12,9	24,7	18,9	15,5	6,3	4,6	5,0
% agregado retenido acumulado		0,0	12,1	25,0	49,7	68,6	84,1	90,4	95,0	100,0
% que pasa		**100**	**88**	**75**	**50**	**31**	**16**	**10**	**5,0**	**-**
Fórmula de trabajo		100,0	87,0	75,6	45,8	29,9	14,9	8,3	4,9	-
Especificación INV 450 MSC-19 Mín.		100	80	65	40	24	9	6	3,0	-
Especificación INV 450 MSC-19 Máx.		100	95	80	55	38	20	12	7,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		100	83	72	42	27	12	6	3,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		100	91	80	50	33	18	11	6,9	-

Equipo utilizado: G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025

Distribución granulométrica **Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP** **18 de diciembre de 2025**

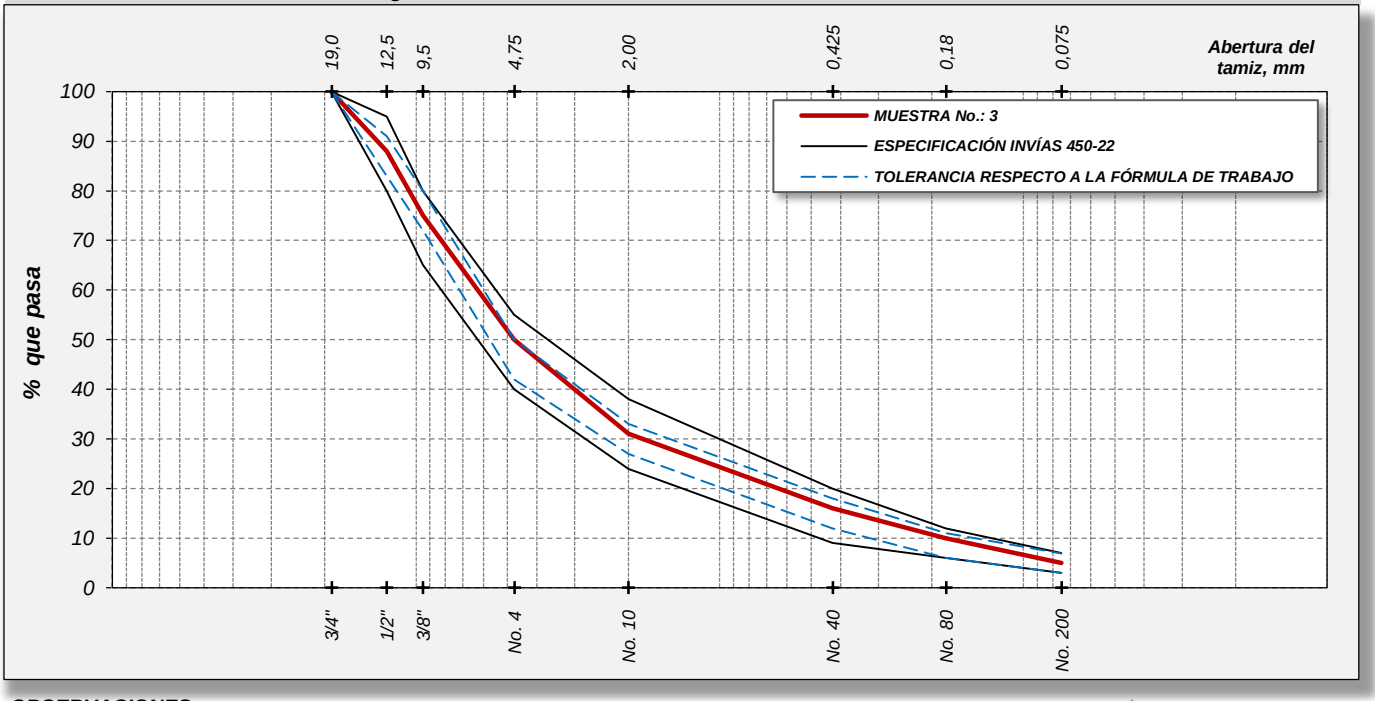

OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	**Revisó**	**Aprobó**
Yamil Escalona	Aux. Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García
22 de diciembre de 2025	20 de enero de 2026	20 de enero de 2026

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**ENSAYOS GENERALES SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-0039-2026**

CONTRATO:	MALLA VIAL MEDELLÍN 2025		
CLIENTE:	CONSORCIO VIALMED 2025		
FECHA DE MUESTREO:	18 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**RECEPCIÓN No.**	804-25
FECHA DE ENSAYO:	18 y 19 de diciembre de 2025		

DENSIDAD, ESTABILIDAD, FLUJO Y VACÍOS DE BRIQUETAS COMPACTADAS EN LABORATORIO

Muestra No.	1		2	
Vehículo muestreado, hora muestreo	SMV677 - 3:30 pm		SMV677 - 3:30 pm	
Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	Procesado - Laboratorio planta		Procesado - Laboratorio Evaltec	
Briqueta No.	1	2	3	4
Compactación - Número de golpes	75	75	75	75
Diámetro, cm	10,16	10,16	10,16	10,16
Altura, cm	6,35	6,35	6,38	6,35

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECÍMENES SATURADOS SUPERFICIALMENTE SECOS INV E-733-13 MÉTODO A

Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
A: Masa en el aire del espécimen seco, g	1248,6	1248,4	1248,9	1247,6
C: Masa del espécimen en agua, g	750,9	750,8	751,1	751,8
B: Masa en el aire del espécimen saturado y superficie seca, g	1250,1	1250,3	1252,2	1250,3
Volumen de la briqueta, cm^3	499	500	501	499
T: Temperatura del agua, °C	25	25,0	25	25
K: Factor de corrección por temperatura	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
Densidad del agua, kg/m^3	997,1	997,1	997,1	997,1
Gravedad Específica Bulk	2,501	2,499	2,492	2,503
Gravedad Específica Bulk a 25°C	**2,501**	**2,499**	**2,492**	**2,503**
Gravedad Específica Bulk Promedio	**2,500**		**2,498**	
Densidad del espécimen, kg/m^3	**2494**	**2492**	**2485**	**2496**
Densidad del espécimen Promedio	**2493**		**2490**	
% de agua absorbida	0,3	0,4	0,7	0,5

EQUIPO UTILIZADO: G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025, Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080
G3-047 Pie de rey L&W TOOLS

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS INV E 735-13

Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	Procesado - Laboratorio planta	
Muestra No.	1	
Determinación No.	1	2
A: Masa de la muestra seca en el horno, g	2000,0	2000,0
T: Temperatura del agua en el ensayo, °C	25,0	25,0
D: Masa del pignómetro con agua a la temperatura T, g	7474	7474
E: Masa del pignómetro lleno con agua y muestra, g	8711	8710
Gmm: Gravedad específica máxima	**2,621**	**2,618**
Gmm: Gravedad específica máxima promedio	**2,620**	

EQUIPO UTILIZADO: Bomba rice Fabricante: Emerson ELC-019, G2-155 Mesa vibratoria - Picnometro PINZUAR, G2-223 Picnometro de vacío HUMBOLDT
Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080, G3-164 Balanza digital LEXUS Calibración 21/febrero/2025, G2-322 Bomba de vacío FISCHER

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS INV E 736-13

Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
% de vacíos con aire (valor individual)	**4,52**	**4,59**	**4,86**	**4,46**
% de vacíos con aire promedio por lote	**4,61**			

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL INV E-748-13

Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	Procesado - Laboratorio planta		Procesado - Laboratorio Evaltec	
Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
Estabilidad medida, N	14250	13980	11221	13006
Factor de corrección por volumen	1,04	1,04	1,04	1,04
Estabilidad corregida (valor individual), N	**14820**	**14539**	**11670**	**13526**
Estabilidad corregida promedio por lote, N	**13639**			
Flujo (valor individual), mm	**2,8**	**2,9**	**2,7**	**2,4**
Flujo promedio por lote, mm	**2,72**			
Estabilidad/Flujo kN/mm	**5,3**	**5,0**	**4,2**	**5,6**

EQUIPO UTILIZADO: G3-205 Prensa Master Loader HUMBOLDT Calibración 18/noviembre/2024, Baño de maría Fabricante: Humboldt ELC-020, Prensa Fabricante: Controls ELC-042
G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025, Martillo mecánico Fabricante: ELE international ELC-016, G2-234 Baño María PINZUAR

OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	**Revisó**	**Aprobó**
Yoice Vargas Pablo Tejada 18 y 19 de diciembre de 2025	Aux. Ing. Maylen Martinez 20 de enero de 2026	Ing. Jorge A. Tobón García 20 de enero de 2026

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.	**RESUMEN DE ENSAYOS DE RESULTADOS SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MSC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-0039-2026**

CONTRATO: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025

CLIENTE: CONSORCIO VIALMED 2025

FECHA DE MUESTREO:	18 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**RECEPCIÓN No.:**	804-25
FECHA DE ENSAYO:	18, 19 y 22 de diciembre de 2025		

CONTENIDO DE ASFALTO

Parámetro	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Vehículo muestreado - Hora - Lugar de ensayos (Hora)	SMV677 - 3:30 pm	SMV677 - 3:30 pm	SMV677 - 3:30 pm
	Planta / 5:05 pm	Planta / 5:42 pm	Evaltec / 5:00 pm
Contenido de asfalto, ARI%	4,92	4,98	4,93
Contenido de asfalto promedio, ART%	4,94		
Contenido óptimo de asfalto, ARF %	4,90		

Criterios de aceptación

Valor promedio (ART%) ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3%	ARF%-0.3% = 4,60	ARF%+0.3% = 5,20	CUMPLE
Valor individual (ARI%) ART%-0.5% ≤ ARI% ≤ ART%+0.5% (se admite un valor por fuera)	ART%-0.5% = 4,44	ART%+0.5% = 5,44	
	Muestra 1 4,92% CUMPLE	Muestra 2 4,98% CUMPLE	Muestra 3 4,93% CUMPLE

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MEZCLAS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO		% QUE PASA POR TAMIZ							
		3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
		19	12,5	9,5	4,75	2	0,425	0,18	0,075
Gradación fórmula de trabajo		**100,0**	**87,0**	**75,6**	**45,8**	**29,9**	**14,9**	**8,3**	**4,9**
Especificación INV 450 MSC-19	Mínimo	100	80	65	40	24	9	6	3,0
	Máximo	100	95	80	55	38	20	12	7,0
Toleración fórmula de trabajo	Mínimo	100	83	72	42	27	12	6	3,0
	Máximo	100	91	80	50	33	18	11	6,9
RESULTADOS	**Muestra 1**	**100**	**87**	**76**	**49**	**32**	**16**	**9**	**4,8**
Fecha de producción:	**Muestra 2**	**100**	**87**	**75**	**48**	**31**	**15**	**9**	**4,9**
18 de diciembre de 2025	**Muestra 3**	**100**	**88**	**75**	**50**	**31**	**16**	**10**	**5,0**

DENSIDAD, ESTABILIDAD, FLUJO Y VACÍOS DE BRIQUETAS COMPACTADAS EN LABORATORIO

ANÁLISIS DE PARAMÉTROS	Muestra	Briqueta	Gravedad específica Bulk	Gravedad específica máxima, RICE	Vacíos con aire %	Estabilidad N	Flujo mm	Estabilidad/Flujo kN/mm
RESULTADOS	1	1	2,501	2,620	4,52	14820	2,80	5,29
		2	2,499		4,59	14539	2,90	5,01
Fecha de producción:	2	3	2,492		4,86	11670	2,75	4,24
18 de diciembre de 2025		4	2,503		4,46	13526	2,42	5,59
	Valor Promedio por lote		**2,499**	**2,620**	**4,61**	**13639**	**2,72**	**5,03**
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	**Fórmula de trabajo**		**2,476**	**2,608**	**4,80**	**13491**	**3,00**	**4,40**
	Valor Promedio mínimo		-	-	4,0	12142	2,4	-
FLUJO	Valor Promedio máximo		-	-	6,0		3,5	-
0.80 Ft ≤ Fm ≤ 1.20 Ft y	**Conclusión valor promedio**				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2 mm ≤ Fm ≤ 3.5 mm	Valor individual mínimo		-	-	3,5	9000	-	3,0
						9714		
ESTABILIDAD	Valor individual máximo		-	-	6,5	16864	-	6,0
Em ≥ 0.90Et	**Conclusión valor individual**	**Briqueta 1**	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
1.25 Et ≥ Ei ≥ 9000 N		**Briqueta 2**	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
Ei ≥ 0,80 Em		**Briqueta 3**	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
(se admite solo un valor individual inferior)		**Briqueta 4**	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE

OBSERVACIONES

Elaboró	Revisó	Aprobó
Maylen Martínez		
Aux. Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García	Ing. Jorge A. Tobón García
20 de enero de 2026	20 de enero de 2026	20 de enero de 2026
