


CURVA S PRESUPUESTO PROGRAMADO OBRA VS PRESUPUESTO EJECUTADO OBRA
PRESUPUESTO PROGRAMADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
PORCENTAJE EJECUTADO
$ 40,000,000,000.00
$ 35,000,000,000.00
$ 30,000,000,000.00
$ 25,000,000,000.00
$ 15,000,000,000.00
$ 10,000,000,000.00
$ 5,000,000,000.00
$ -
$ 36,403,016,614.13
$ 32,961,323,911.32
$ 30,651,766,966.02
$ 33,106,224,660.04
$ 32,235,439,011.15
$ 30,360,844,045.98
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
ENERO - MES 17
MES 18
MES 19
MES 20
MES 21
MES 22
MES 23
MES 24
SEPT MES 25
MES 26
MES 27
MES 28
MES 29


CURVA S PRESUPUESTO PROGRAMADO OBRA VS PRESUPUESTO EJECUTADO OBRA
PORCENTAJE EJECUTADO
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
% PROGRAMADO
% EJECUTADO
56.27%
50.95%
47.38%
51.17%
49.83%
46.93%
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
ENERO - MES 17
MES 18
MES 19
MES 20
MES 21
MES 22
MES 23
MES 24
SEPT MES 25
MES 26
MES 27
MES 28
MES 29

FEBRERO

"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"

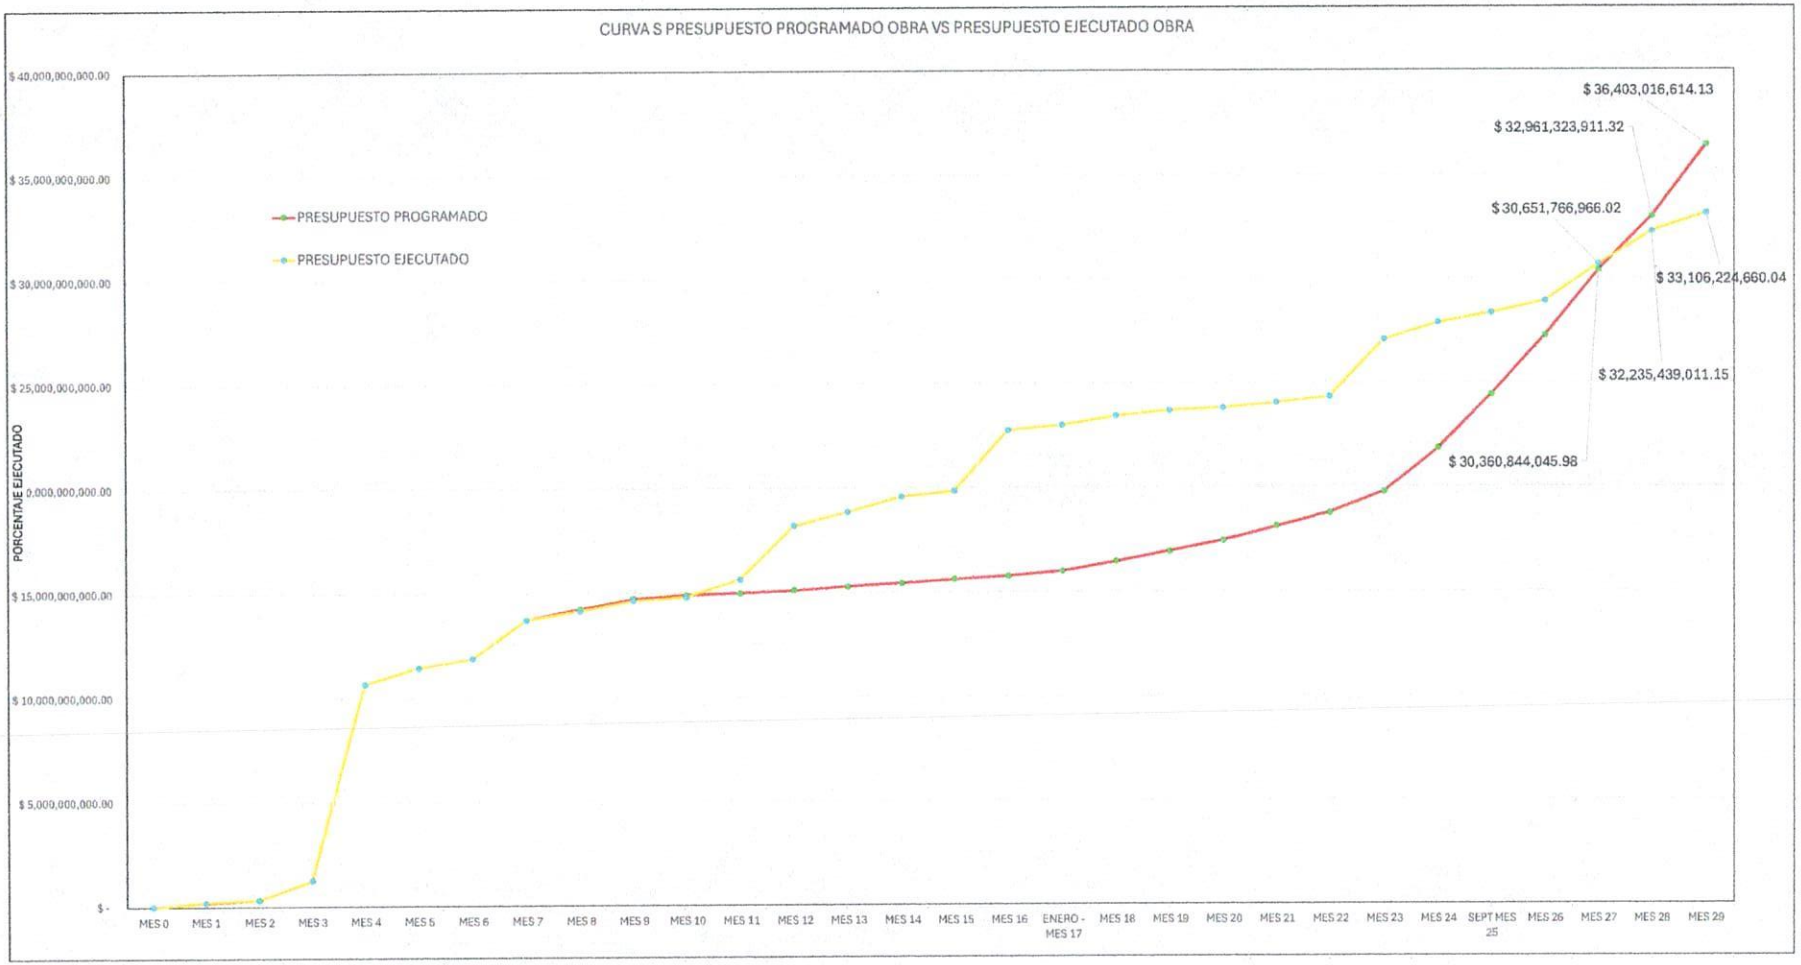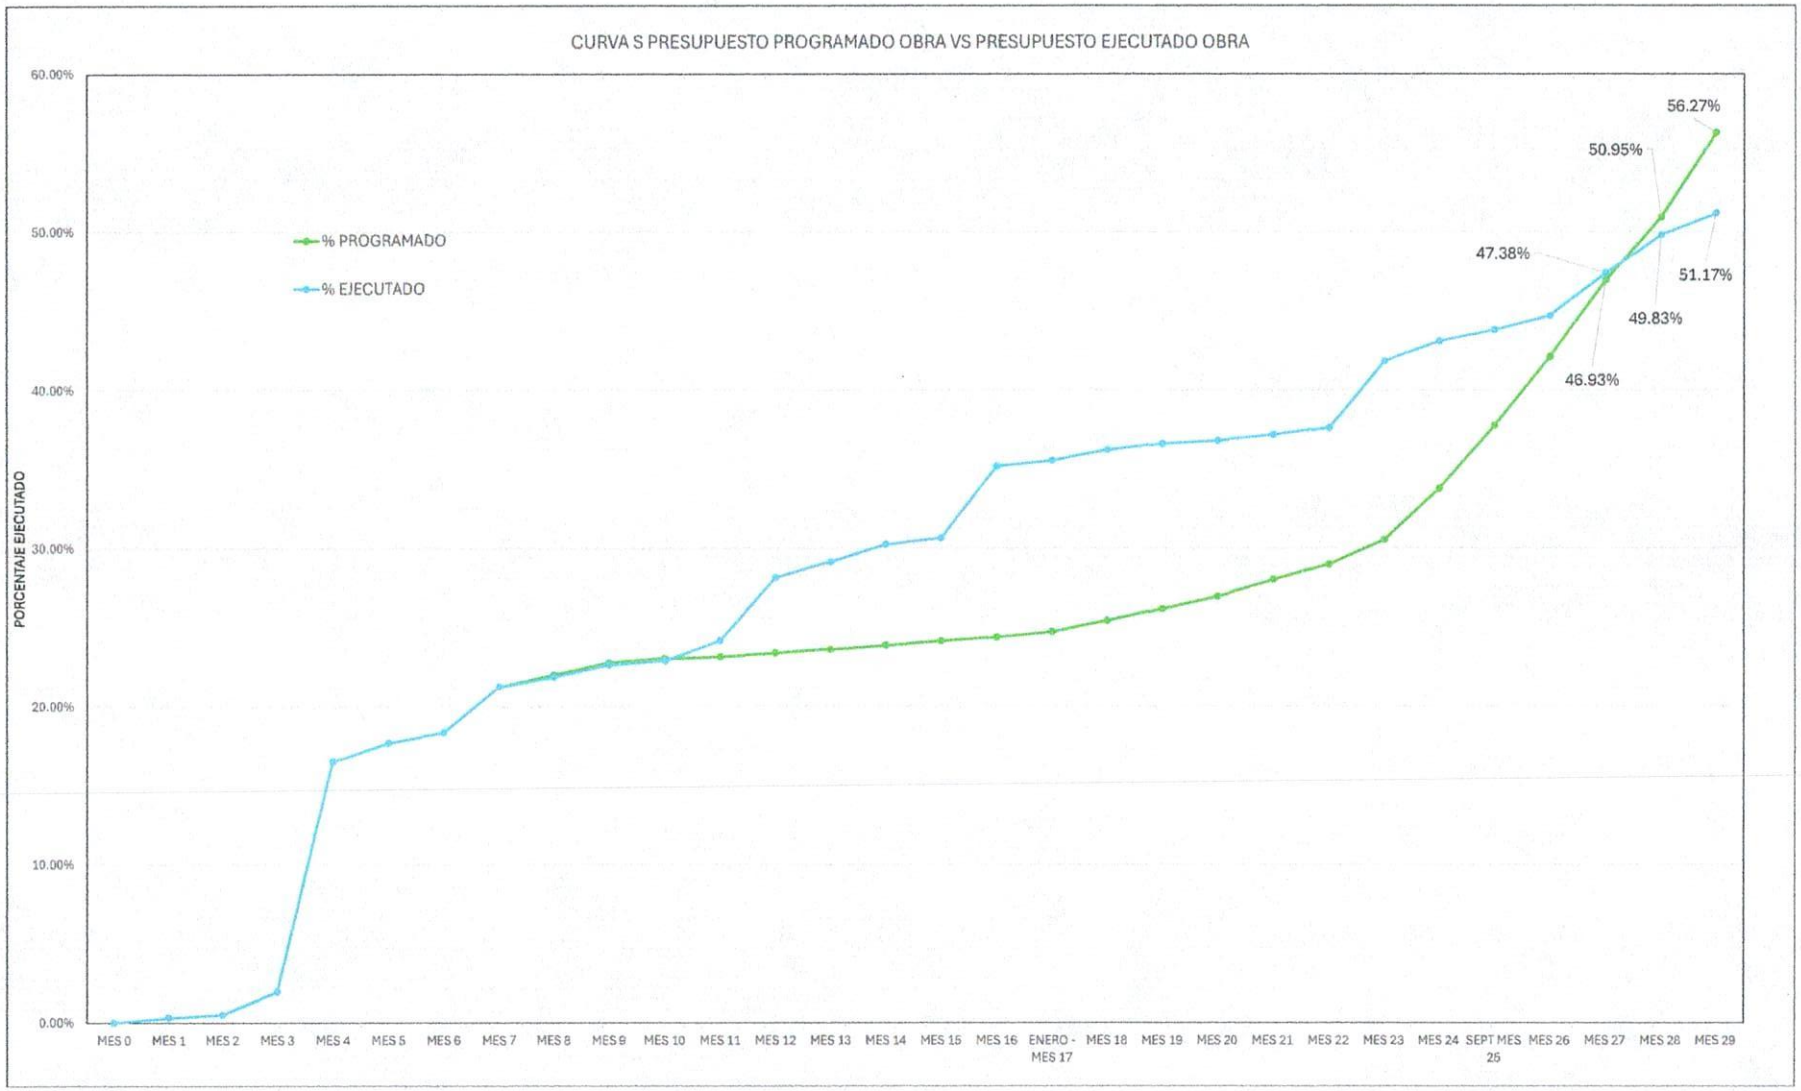

INFORME DE COBRO PARCIAL No 8

CONTRATO DE OBRA No. 087

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

26 de enero de 2025 – 25 de febrero de 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

TIPO DE CONTRATO: 3

INTRODUCCION 4

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 4

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 4

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 5

Construcción módulo A: 5

Construcción módulo D: 6

Adecuación área de UCI 6

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DEL PRESENTE PERIODO 7

Cimentación foso de ascensor punto fijo módulo D 7

Estructura metálica 8

Modulo A 10

Plan de contingencia 10

Plan de acción 10

Inspección de calidad de trabajos ejecutados y materiales 12

Acero estructural 14

Instalación de acero de refuerzo 16

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO 18

TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS PERIODOS DEL PRESENTE INFORME 18

PRESUPUESTO DE OBRA 24

PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO DESDE EL 26/01/2026 HASTA 25/02/2026 24

ACTA PARCIAL No 8 27

Presupuesto de obra ejecutado corte no 8 27

GRAFICA PRESUPUESTO PROGRAMADO DE OBRA VS PRESUPUESTO EJECUTADO DE OBRA ... 32

GRAFICA PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA VS PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRA 33

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 34

TIPO DE CONTRATO:

Contrato de obra incluida dotación de equipos No. 87

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			
NUMERO	**87**	**FECHA**	**09-08-2023**
TIPO	CONTRATO DE OBRA INCLUIDA DOTACIÓN DE EQUIPOS		
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTRAVOS ($64.028.082.699,20)		
ADICIONAL No 1	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($665.389.158,15)		
ENTIDAD CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA		
NIT	901.740.580-3		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO		
IDENTIFICACION	C.C. 91.273.201		
SUPERVISOR	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA		
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE SANDOVAL		
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL		
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

INTRODUCCION

Este informe tiene como propósito presentar una visión integral y detallada sobre el desarrollo y estado actual del proyecto de adecuación y ampliación de la infraestructura física de la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira. El documento abarca los avances ejecutados, las actividades desarrolladas, los recursos utilizados, y las condiciones técnicas y administrativas que han influido en el progreso del proyecto durante el periodo mencionado.

El proyecto de adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira representa un hito significativo en el ámbito de la construcción civil, no solo por su magnitud y complejidad técnica, sino también por su impacto directo en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de la provincia de García Rovira.

Concebido para responder a las crecientes necesidades de atención medica especializado, el proyecto busca optimizar la capacidad instalada del hospital, garantizando espacios adecuados para la prestación de servicios de salud en condiciones óptimas de calidad, seguridad y eficiencia.

La ejecución del proyecto ha implicado la superación de diversos desafíos técnicos, logísticos y ambientales, los cuales han sido abordados con profesionalismo y experiencia por parte del equipo de trabajo del Consorcio de García Rovira, asegurando el cumplimiento de los estándares constructivos y normativos vigentes.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

Se deberá identificar la ubicación exacta del proyecto y los límites geográficos que definirán los predios colindantes. Por el costado sur nos encontramos con la calle 16, por el costado norte colinda con la pista de aterrizaje y viviendas vecinas, por el costado oriente se colinda con la vía de la carrea 6 y por el costado occidental colinda con las viviendas vecinas de la carrera 8, esto con el fin de verificar los impactos directos o indirectos al realizar la ejecución y realizar los correctivos pertinentes para todos esos casos eventuales que se presenten.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Málaga, Santander, en la Calle 16 con Carrera 6. Donde se realizará la adecuación y ampliación de la estructura física del hospital regional.



Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto abarca la adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira" del municipio de Málaga, Santander, dividido en varios módulos con funciones específicas para optimizar la infraestructura hospitalaria.

Construcción módulo A:

Este módulo se encuentra ubicado en el sector occidental del predio y no cuenta con estructura existente inicial del hospital, este módulo contara con los siguientes servicios.

- Parqueaderos
- Cuarto de máquinas hidráulica y red contra incendios
- Morgue
- Cuarto de monitoreo y vigilancia
- Salas de cirugía
- Salas de partos

Construcción módulo D:

El módulo D se encuentra ubicado al este del ingreso actual del hospital existente, el módulo contará con 2 plantas que tendrá los respectivos servicios.

- área administrativa
- Servicio de terapia física, respiratoria y ocupacional

Adecuación área de UCI

El área UCI se encuentra en la zona occidental del hospital, en el cual se busca abordar de manera integrada las acciones de asistencia, cuidado y recuperación y para su implementación se deben considerar las necesidades actuales del hospital en términos de espacios y ambientes que cumplan con la normatividad vigente. Este módulo con su adecuación prestara los siguientes servicios:

- 12 habitaciones de cuidados intensivos
- 2 estaciones de enfermería
- 1 cuarto de descanso medico

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DEL PRESENTE PERIODO

Cimentación foso de ascensor punto fijo módulo D

Al cierre del mes de enero se culminaron actividades correspondientes a la cimentación del foso del ascensor, ejecutado hasta la cota de nivel -2.95 m, incluyendo la fundida de la losa inferior con un espesor de 0.30 m, conforme a las especificaciones técnicas y estructurales del proyecto.

De manera simultánea, se adelantaron los trabajos asociados al punto fijo en la cota -2.05 m, comprendiendo la excavación manual y mecánica, la ejecución de concreto ciclópeo y armado de acero de refuerzo de las zapatas aisladas y vigas de cimentación, las cuales se relacionan a continuación.

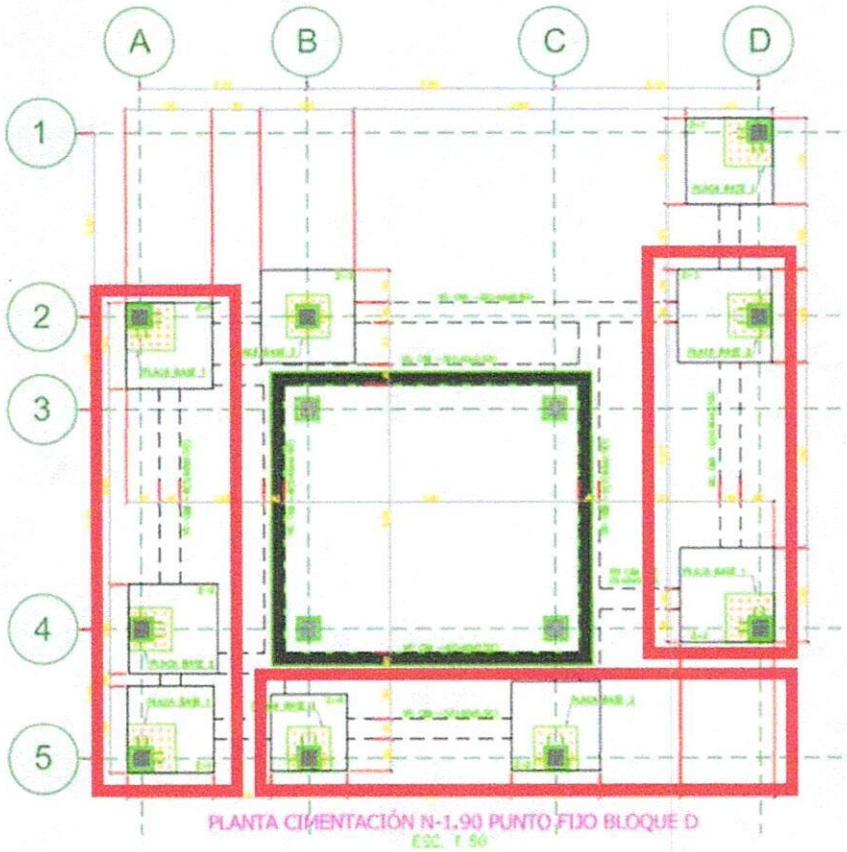


Ilustración 2 Planta cimentación punto fijo módulo D

Así mismo, se ejecutó el encofrado y la fundida en concreto estructural en 4000 psi de los muros del foso del ascensor correspondientes al punto fijo, alcanzando una

altura de 1.10 m, considerando su integración monolítica con la cimentación ubicada en la cota -2.05 m.

De manera complementaria, se realizó el armado y disposición del acero de refuerzo de vigas de cimentación apoyadas sobre el muro de contención y vigas externas, identificadas en planos estructurales como VG CIM-B, VIG CIM-4, VIG CIM-3, VIG CIM-A y VIG CIM-5, quedando listas para su posterior proceso de encofrado y fundida en concreto de 4000 psi.

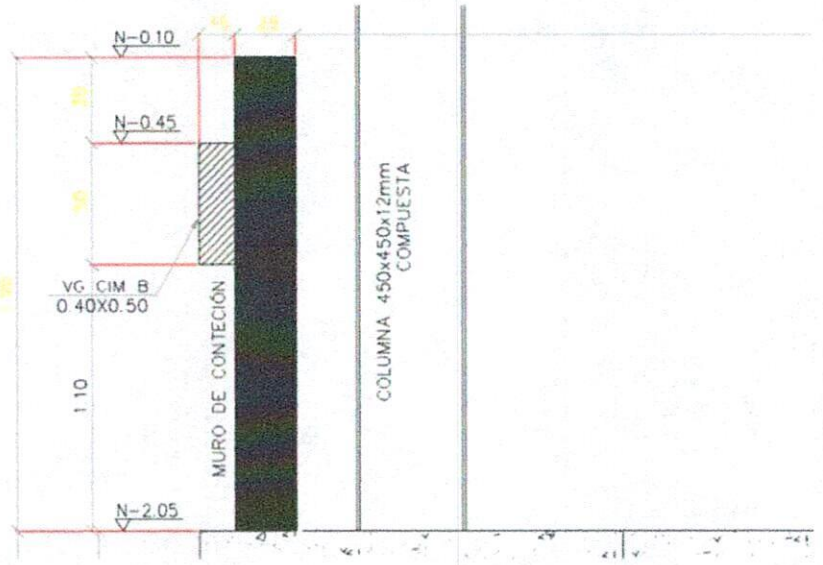


Ilustración 3 Corte muro de foso de ascensor y columnas compuestas

Estructura metálica

En el módulo A se continúa con la fabricación de columnas metálicas en los ejes J2, J3 y J4, con el fin de completar las columnas de la edificación. De manera simultánea, se da inicio a la fabricación de las columnas correspondientes al foso de ascensor y al punto fijo en general. Se logró el posicionamiento de las columnas en los ejes J2 y J3 al cierre de la tercera semana de febrero, y se instalaron las vigas principales y secundarias de entrepiso para continuar con la colocación de la placa colaborante en los niveles −0.10 y +4.30 entre los ejes G–H.

Actualmente se trabaja desde el eje G hasta el K en vigas principales y entrepiso como se muestra en la siguiente ilustración donde se muestra el cierre de pórticos que actualmente está haciendo el consorcio para poder avanzar en actividades de obra civil en el nivel -0.10 m y +4.30m.

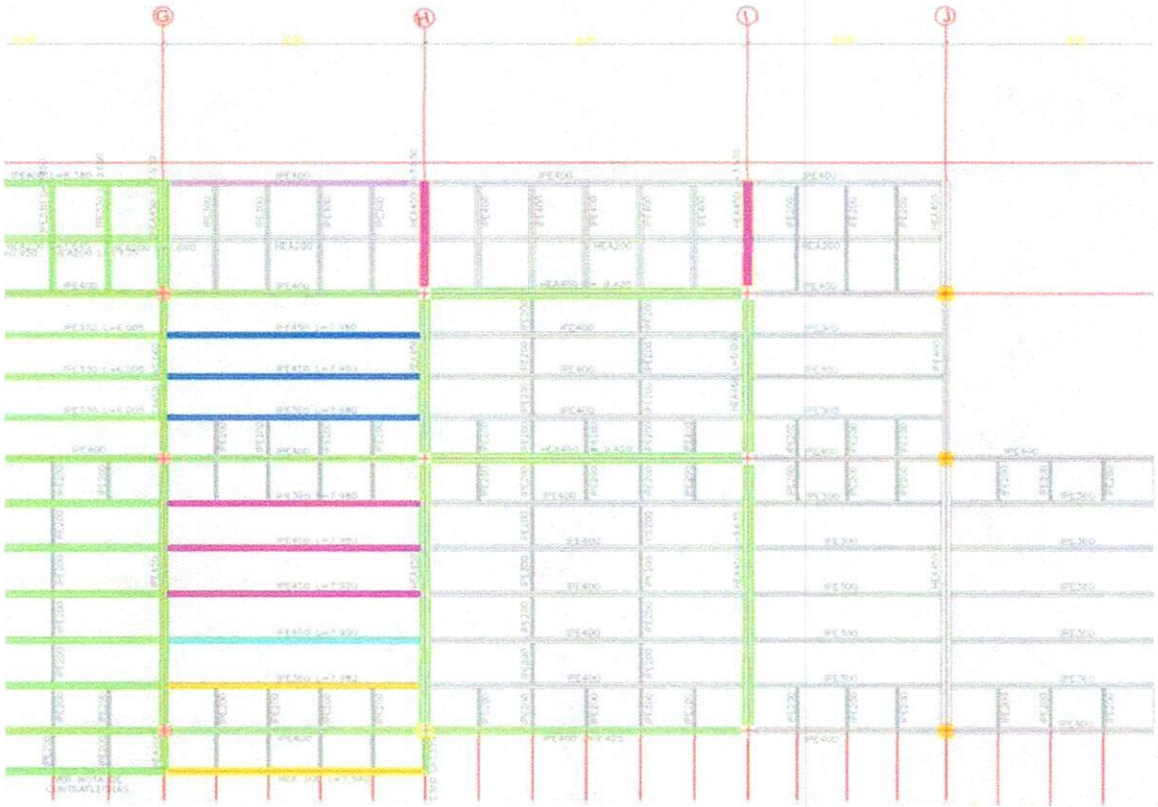


Ilustración 4 Estructura metálica planta nivel +4.30 – Modulo A

Durante el mes de febrero se recibieron elementos estructurales como perfiles IPE 400, IPE 360, IPE 300 e IPE 450, PTC (tubería circular para arriostramiento vertical) y láminas de ½", 5/8", 1" y 1½", destinadas a conexiones, fabricación de columnas y rigidizadores.



Ilustración 5 Llegada de material estructural

Actualmente, el consorcio cuenta con los materiales requeridos para las actividades de estructura del módulo A, la cubierta del módulo A y el punto fijo del módulo D; asimismo, se encuentra en proceso la compra de los elementos estructurales correspondientes al punto fijo del módulo A.

Modulo A

En el módulo A se continúa con la ejecución de regatas en muros para la instalación de los puntos hidrosanitarios, incluyendo la realización de los respectivos pases entre placa. De manera paralela, se avanza en la adecuación de los componentes eléctricos, tales como tomas reguladas y críticas, sistema de llamado de enfermería, voz y datos. Asimismo, se dio inicio a la instalación de las arañas por cielo raso.

Plan de contingencia

Durante el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 25 de febrero de 2026, el Consorcio continuó con la estructuración, socialización y articulación del Plan de Contingencia requerido para habilitar la ejecución del ingreso a la plazoleta de urgencias y del Punto Fijo del Módulo A. Este instrumento técnico tiene como propósito principal gestionar las interferencias existentes al interior del hospital en operación, garantizando la continuidad de los servicios asistenciales mientras se desarrollan las actividades constructivas.

Dentro del análisis realizado se identificaron áreas tales como la central de gases medicinales, el tanque criogénico, la portería principal, la cafetería y los tableros eléctricos, para los cuales se definieron medias para la reubicación temporal, aislamientos físicos, control de accesos y coordinación operativa con la E.S.E. Hospital.

De igual manera, se estableció que la liberación de áreas para iniciar con la construcción del muro perimetral, plazoleta de acceso a urgencias y punto fijo del modulo A se encuentra condicionada al traslado previo de las áreas que están interfiriendo.

A la fecha de corte, el proyecto presenta un avance ejecutado del 53.18% frente a un 59.88% programado por lo que se hace necesario iniciar rápidamente la adecuación de las contingencias y así el consorcio poder implementar el plan de acción con el fin de mitigar el atraso y aumentar el rendimiento mensual de ejecución.

Plan de acción

Durante el periodo reportado, el consorcio formulo el plan de acción orientado a mitigar el desfase evidenciado entre el avance programado y el ejecutado del proyecto. Este plan contempla medidas técnicas, operativas y de gestión enfocadas en la recuperación progresiva de la programación contractual y en la atención de las actividades que actualmente se encuentran en la ruta crítica. De igual manera,

se establecieron plazos de cumplimiento y mecanismos para el seguimiento de cada actividad con el fin de garantizar la trazabilidad y efectividad de las medidas adoptadas.

El plan de acción se encuentra articulado con el plan de contingencia y con la programación actualizada de la obra, permitiendo enfocar los esfuerzos del proyecto en la recuperación del atraso registrado. No obstante, la efectividad de algunas acciones continua sujeta a la liberación oportuna de áreas por parte de la E.S.E Hospital identificadas y describan en este plan de contingencia.

Como medida para mejorar el rendimiento en la fabricación de la estructura metálica, el Consorcio instaló un punto provisional de energía de 45 kVA en el taller de producción. No obstante, la capacidad disponible resulta insuficiente para la conexión simultánea de todos los equipos de fabricación requeridos.

En consecuencia, se realizó la adquisición de una planta eléctrica de 50 kVA, la cual permitirá ampliar la disponibilidad energética del taller y habilitar la operación de un mayor número de equipos. Con esta medida se espera optimizar el rendimiento de los procesos de corte, armado y terminado de los elementos metálicos.



A la fecha de corte, el consorcio mantiene el seguimiento periodo al cumplimiento del plan de acción y continuara implementando medidas de ajusta operativo y de gestión que permitan mejorar el rendimiento de obra y encaminar el proyecto hacia el cumplimiento de las metas contractuales.

Inspección de calidad de trabajos ejecutados y materiales

El presente informe tiene como objetivo verificar la correcta ejecución de los procesos constructivos y el control de calidad de los materiales requeridos para el desarrollo del proyecto, conforme a los requisitos técnicos y contractuales aplicables, garantizando la conformidad del producto final y el aseguramiento de la calidad en cada una de las etapas del proyecto.

Relación de materiales granulado

Se efectuó el control de recepción de material granular (arena, triturado y piedra bolo), verificando su conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto. Dichos materiales fueron incorporados en las actividades de construcción en el punto fijo del módulo D, para el mezclado del concreto de 4000 psi de vigas y zapatas de cimentación y concreto de muros de contención.

La actividad se desarrolló bajo supervisión técnica y quedo debidamente registrada en los reportes de control de obra.


Anexo 1 – Registro y control de materiales cantera

Vaciado de concreto

Se ejecutaron las actividades de vaciado de concreto conforme a los diseños estructurales y diseños de concreto para 4000 y 3000 psi.

A la fecha de corte, las estructuras construidas comprenden.

- Concreto ciclópeo para el mejoramiento de suelo en la cimentación de las zapatas del punto fijo del módulo D.
- Concreto de 4000 psi para la escalera y el muro de contención, incluyendo la instalación de acero de refuerzo correspondiente para el muro de contención.
- Concreto de 4000 psi para zapatas y vigas de cimentación.

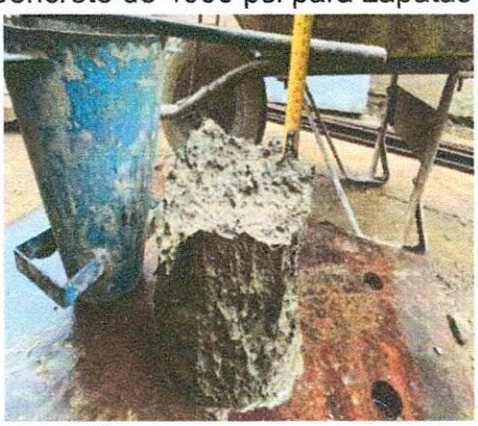



Prueba de asentamiento – slump test concreto de 4000 psi



Cilindros de concreto para ensayo de compresión



Realización de cilindros para ensayo de compresión

Previamente a cada vaciado se verifico el proceso de mezclado y la conformidad del concreto con los parámetros de diseños para los elementos. Todas las actividades se ejecutaron bajo supervisión técnica y quedaron debidamente registradas en los reportes de control de obra.

Anexo 2 - Registro de inspección de vaciado de concreto

Acero estructural

Se realiza el corte, armado, soldadura y acabado final de elementos estructurales en el módulo A y punto fijo del módulo D. Esto se realizó bajos los parámetros establecidos en el diseño estructural



Estructura metálica módulo D



Fabricación de columnas metálicas del punto fijo del módulo D



Fabricación de columnas en lamina de ½"



Ensayos no destructivos de líquidos penetrantes

Anexo 3 - Ensayos no destructivos de líquidos penetrantes

Instalación de acero de refuerzo

Se ejecutaron las actividades de instalación de acero de refuerzo conforme a los diseños estructurales aprobados y a las especificaciones técnicas del proyecto.

A la fecha de corte, se ha instalado acero de refuerzo en los siguientes elementos estructurales.

- Zapatas y vigas de cimentación
- Muro de contención de ascensores

Durante la ejecución se verifico la conformidad del proceso de figurado, amarre y colocación de acero, contando con la aprobación correspondiente antes de las actividades de fundida.

Todas las actividades se desarrollaron bajo supervisión técnica y quedaron debidamente registradas en los formatos de control de obra.



Instalación de acero PDR60 para cimentación del punto fijo D



Instalación de acero PDR60 para cimentación del punto fijo D.





Instalación de acero PDR60 para cimentación del punto fijo D.




Anexo 4 – Certificados de calidad de materiales y equipos

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO


TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS PERIODOS DEL PRESENTE INFORME

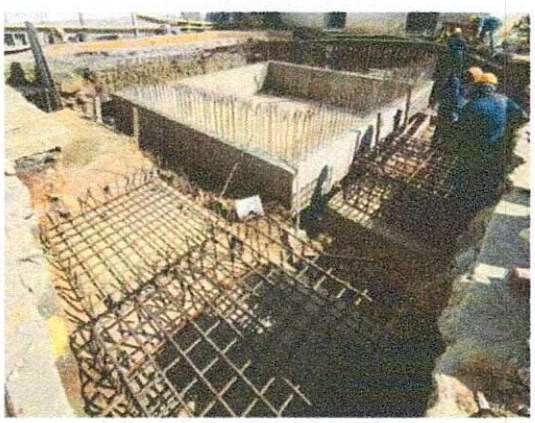AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Punto fijo módulo D		En esta imagen se muestra el encofrado de las zapatas y vigas de cimentación de la viga de CIM – 5.
Punto fijo módulo D		En esta imagen se muestra la instalación de acero PDR60 en la cimentación.
Punto fijo módulo D		Instalación de acero PDR60 en zapatas.

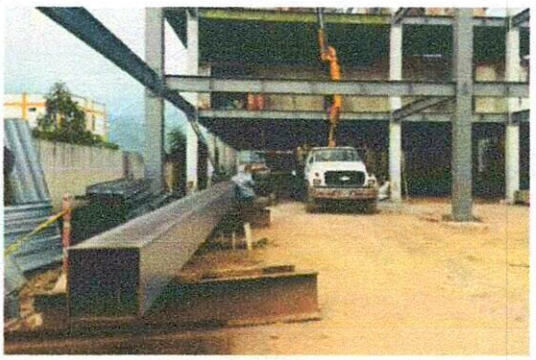AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Punto fijo módulo D		Muro en concreto para foso de ascensor fundido en su primera parte antes de viga de cimentación sobre el nivel -2.05 y concreto ciclópeo para ubicación de zapatas.
Modulo A		En esta imagen se observa la fabricación de una columna de 500x500 mm del eje J2.
Modulo A - cubierta		Se muestra la instalación de la cercha tipo 1 sobre el eje G.

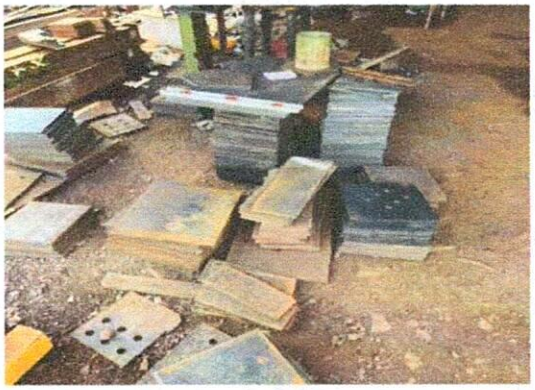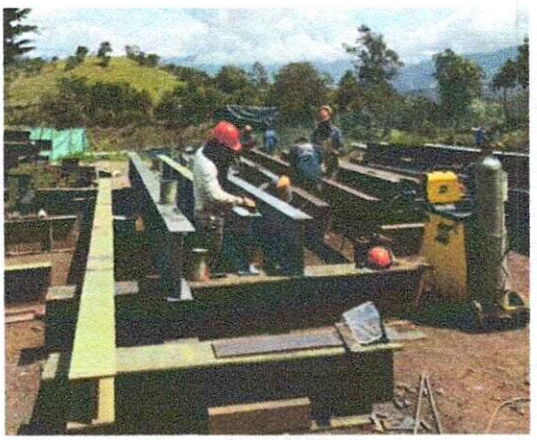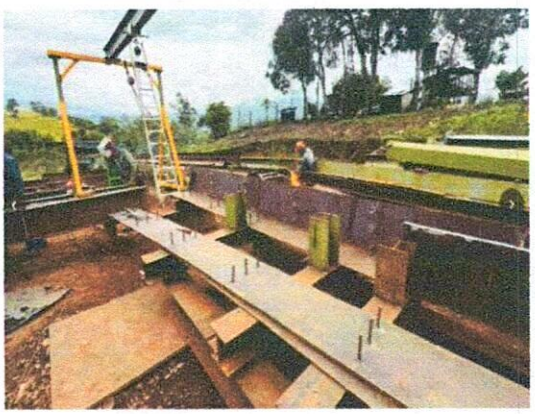AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Taller de fabricación Consorcio de García Rovira		En esta imagen se logra ver la platinaría de conexión y rigidizadores para los elementos como vigas principales y entrepiso.
Taller de fabricación Consorcio de García Rovira		Se logra mostrar la fabricación de elementos estructurales y aplicación de pintura de acabado final.
Taller de fabricación Consorcio de García Rovira		Fabricación de estructura interna de columnas de 450x450 para el foso de ascensor del modulo D

AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Modulo A		Instalación de entrepiso en el nivel +4.30 entre ejes G – H y 2 – 3. IPE 360 e IPE 400.
Modulo A – Nivel -0.10m		Esta imagen muestra el avance en la instalación de las redes eléctricas de iluminación sobre el cielo raso.
Modulo A – Nivel -0.10m		Esta imagen muestra el avance en la instalación de las redes eléctricas de iluminación sobre el cielo raso.

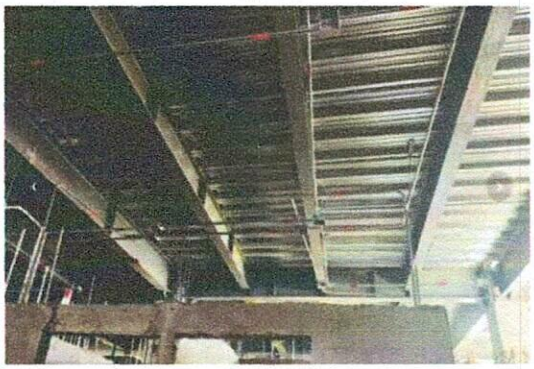AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Modulo A – Nivel -0.10m		Instalación de redes eléctricas por cielo raso.
Modulo A – Nivel +4.30 m		Instalación de puntos sanitarios del nivel +4.30m
Modulo A – Nivel -0.10 m		Instalación de puntos sanitarios del nivel -0.10m

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades:

- Control y registro del personal en obra (asistencia, rendimientos y novedades)
- Pagos de seguridad social y nómina de la persona administrativa y de obra.
- Revisión de hojas de vida y de personal de obra.
- Gestión y control de materiales (solicitudes, ingresos, consumos y acopios)
- Elaboración y diligenciamiento de bitácoras de obra.
- Archivo y actualización de registro fotográficos y reportes diarios.
- Verificación de cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) y realización de informes mensuales de obra.
- Realización de informes mensuales, presentación de actividades semanales ejecutadas.
- Comités de obra semanales y mensuales.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el municipio de Málaga, Santander durante el periodo del presente informe se presentaron lluvias parciales. Debido a esto se han presentado dificultades significativas para el desarrollo normal de las actividades programadas en el proyecto. Las condiciones climáticas adversas han generado retrasos, complicaciones logísticas y limitaciones en el acceso y operación en las áreas de intervención.

A continuación, se muestran las horas del estado del clima diario del mes de enero - febrero de 2026.

ESTADO GENRAL DEL TIEMPO (ENERO - FEBRERO)																															
CLASE DE TIEMPO	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Seco	18	24	24	20	16	24	24	24	24	24	24	24	19	6	24	24	24	24	24	18	19	16	19	20	21	18	20	22	16	19	24	21
Lluvia moderada	6			4	8								5	18						4	5	8	3	4	3	6	4	2	8	5		3
Lluvia intensa																				2			2									
Total de horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO DESDE EL 26/01/2026 HASTA 25/02/2026

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		25 DE FEBRERO DE 2026	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**				**$ 728,933,688.22**		**$ 6,543,547.50**
1.11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	M2	$ 52,348.38	905.44	$ 47,398,317.19	125.00	$ 6,543,547.50
2.0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES**				**$ 1,164,695,269.72**		**$ 6,447,823.09**
2.03	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 42,456.20	944.55	$ 40,102,003.71	151.87	$ 6,447,823.09

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		25 DE FEBRERO DE 2026	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 7,720,722,476.73**		**$ 84,978,488.76**
3.02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	$ 13,486.01	199229.86	$ 2,686,815,884.26	4000.00	$ 53,944,040.00
3.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1,609,411.12	730.88	$ 1,176,286,399.39	6.35	$ 10,219,760.61
	ITEMS NO PREVISTOS						
3-NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS	M3	$ 795,530.16	212.97	$ 169,424,058.18	12.21	$ 9,713,423.25
3-NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	$ 1,006,187.28	237.04	$ 238,506,632.85	1.70	$ 1,710,518.38
3-NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS	M3	$ 1,575,628.61	142.18	$ 224,022,875.77	5.96	$ 9,390,746.52
4.0	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 11,410,924,220.28**		**$ 847,339,261.61**
	ITEMS NO PREVISTOS						
4-NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	259201.99	$ 5,572,842,721.36	36863.40	$ 792,563,100.00
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	$ 236,532.35	3169.96	$ 749,798,088.21	231.58	$ 54,776,161.61
6.0	**MAMPOSTERÍA**				**$ 924,372,126.28**		**$ 703,546.91**
6.01	MURO EN BLOQUE NO 5	M2	$ 89,396.05	3016.79	$ 269,689,109.68	7.87	$ 703,546.91
13.0	**PAÑETES**				**$ 1,252,087,083.59**		**$ 2,440,155.31**
13.01	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	M2	$ 39,980.00	12784.38	$ 511,119,512.40	61.03	$ 2,440,155.31

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		25 DE FEBRERO DE 2026	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
15.0	**ACABADOS PISOS**				**$ 1,160,657,133.42**		**$ 16,160,205.48**
15.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BALDOSA EN GRANITO 30X30CM (BH 2 COLEGIOS), INCLUYE INSTALACIÓN -DESTRONQUE - PULIDA - BRILLADA DE PISO - TIPO ALFA O SIMILAR	M2	$ 175,007.64	3983.88	$ 697,209,436.84	92.34	$ 16,160,205.48
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 40,717,077,922.11**		**$ 964,613,028.66**
	ADMINISTRACIÓN		29%		$ 11,807,952,597.41		$ 279,737,778.31
	IMPREVISTOS		1%		$ 407,170,779.22		$ 9,646,130.29
	UTILIDAD		5%		$ 2,035,853,896.11		$ 48,230,651.43
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 14,250,977,272.74		$ 337,614,560.03
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 54,968,055,194.85**		**$ 1,302,227,588.69**
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				**$ 6,608,850,125.95**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN		29.00%		$ 1,916,566,536.53		$ -
	VALOR TOTAL EQUIPOS				**$ 8,525,416,662.48**		**$ -**
	DIFERENCIA POR AJUSTE				**$ 0.01**		
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				**$ 63,493,471,857.35**		**$ 1,302,227,588.69**
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023				**$ 1,200,000,000.00**		
	ADICIONAL No 01						
	VALOR TOTAL CONTRATO 087				**$ 64,693,471,857.35**		**$ 1,302,227,588.69**
	% EJECUTADO MENSUAL						**2.01%**
	% EJECUTADO ACUMULADO - CORTE 25 DE FEBRERO DE 2026						**53.18%**

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		25 DE FEBRERO DE 2026	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	% PROGRAMADO ACUMULADO - CORTE 25 DE FEBRERO DE 2026						59.88%

ACTA PARCIAL No 8

El presente documento corresponde al acta de cobro parcial No. 8, mediante la cual se relacionan y soportan las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra durante el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2025 y el 25 de febrero de 2026.

En este lapso se desarrollaron diferentes procesos constructivos conforme a la programación establecida, las especificaciones técnicas y los lineamientos de calidad definidos. Así mismo, en la presente acta se consolidan en las memorias de cantidades y registro fotográfico.

Presupuesto de obra ejecutado corte no 8

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4		ACTA DE COBRO 8	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**				**$ 728,933,688.22**		**$ 6,543,547.50**
1.11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	M2	$ 52,348.38	905.44	$ 47,398,317.19	125.00	$ 6,543,547.50
2.0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES**				**$ 1,164,695,269.72**		**$ 6,447,823.09**
2.03	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 42,456.20	944.55	$ 40,102,003.71	151.87	$ 6,447,823.09

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4		ACTA DE COBRO 8	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 7,720,722,476.73**		**$ 90,653,914.34**
3.02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	$ 13,486.01	199229.86	$ 2,686,815,884.26	1223.57	$ 16,501,141.94
3.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	$ 19,505.00	5444.61	$ 106,197,118.05	412.99	$ 8,055,369.95
3.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1,609,411.12	730.88	$ 1,176,286,399.39	6.35	$ 10,219,760.61
	ITEMS NO PREVISTOS						
3-NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS	M3	$ 795,530.16	212.97	$ 169,424,058.18	21.81	$ 17,350,512.79
3-NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	$ 1,006,187.28	237.04	$ 238,506,632.85	8.60	$ 8,653,210.61
3-NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS	M3	$ 1,575,628.61	142.18	$ 224,022,875.77	18.96	$ 29,873,918.45
4.0	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 11,410,924,220.28**		**$ 1,009,029,151.61**
	ITEMS NO PREVISTOS						
4-NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	133654.73	$ 2,873,576,674.62	7520.46	$ 161,689,890.00
4-NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	259201.99	$ 5,572,842,721.36	36863.40	$ 792,563,100.00
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	$ 236,532.35	3169.96	$ 749,798,088.21	231.58	$ 54,776,161.61

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4		ACTA DE COBRO 8	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
6.0	**MAMPOSTERÍA**				**$ 924,372,126.28**		**$ 46,802,572.92**
6.01	MURO EN BLOQUE NO 5	M2	$ 89,396.05	3016.79	$ 269,689,109.68	33.83	$ 3,024,268.37
	ITEMS NO PREVISTOS						
6-NP65	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	$ 88,172.05	6193.93	$ 546,131,505.66	496.51	$ 43,778,304.55
10.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**				**$ 5,493,210,590.57**		**$ 49,896,593.84**
	ILUMINACIÓN						
10.78	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 40W.	UND	$ 300,397.32	388.00	$ 116,554,160.16	131.00	$ 39,352,048.92
	BANDEJA PORTACABLE						
10.90	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES SELLADA (DUCTO CERRADO CON TAPA) 54/500 PARA RED ELECTRICA. INCLUYE SOPORTE DE SUJECIÓN, VARILLAS ROSCADAS, TORNILLOS DE UNIÓN.	ML	$ 405,559.42	593.00	$ 240,496,736.06	26.00	$ 10,544,544.92
	ITEMS NO PREVISTOS						
13.0	**PAÑETES**				**$ 1,252,087,083.59**		**$ 40,308,635.60**
13.01	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	M2	$ 39,980.00	12784.38	$ 511,119,512.40	1008.22	$ 40,308,635.60
15.0	**ACABADOS PISOS**				**$ 1,160,657,133.42**		**$ 16,160,205.48**
15.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BALDOSA EN GRANITO 30X30CM (BH 2 COLEGIOS), INCLUYE INSTALACIÓN - DESTRONQUE - PULIDA - BRILLADA DE PISO - TIPO ALFA O SIMILAR	M2	$ 175,007.64	3983.88	$ 697,209,436.84	92.34	$ 16,160,205.48
17	**PINTURA**				**$ 865,874,459.00**		**$ 7,340,190.00**


PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4		ACTA DE COBRO 8	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
17.04	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	$ 22,000.00	12366.97	$ 272,073,340.00	333.65	$ 7,340,190.00
18.0	**CIELOS RASOS**				**$ 453,057,836.57**		**$ 16,859,650.00**
18.01	CIELO RASO SUSPENDIDO EN DRY WALL (LAMINA DE YESO), INCLUYE PINTURA	M2	$ 95,000.00	4099.83	$ 389,483,850.00	177.47	$ 16,859,650.00
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 40,717,077,922.11**		**$ 1,290,042,284.38**
	ADMINISTRACIÓN		29%		$ 11,807,952,597.41		$ 374,112,262.47
	IMPREVISTOS		1%		$ 407,170,779.22		$ 12,900,422.84
	UTILIDAD		5%		$ 2,035,853,896.11		$ 64,502,114.22
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 14,250,977,272.74		$ 451,514,799.53
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 54,968,055,194.86**		**$ 1,741,557,083.91**
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				**$ 6,608,850,125.95**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29		$ 1,916,566,536.53		$ -
	VALOR TOTAL EQUIPOS				**$ 8,525,416,662.48**		**$ -**
	DIFERENCIA POR AJUSTE				**$ 0.01**		
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				**$ 63,493,471,857.35**		**$ 1,741,557,083.91**
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023				**$ 1,200,000,000.00**		
	ADICIONAL No 01						

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4		ACTA DE COBRO 8	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	VALOR TOTAL CONTRATO 087				$ 64,693,471,857.35		$ 1,741,557,083.91
	% EJECUTADO CORTE No 8						2.69%
	% EJECUTADO ACUMULADO						50.35%

Durante el cobro No 8 se ejecutó el 2.69% del valor total del proyecto, alcanzando un porcentaje acumulado de ejecución financiero del 50.35%. Así mismo, el porcentaje acumulado total a cierre del mes de febrero asciende al 53.18%, mientras que el porcentaje acumulado de avance a corte del 25 de febrero de 2026 se ubica en el 59.88%.


CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**

GRAFICA PRESUPUESTO PROGRAMADO DE OBRA VS PRESUPUESTO EJECUTADO DE OBRA

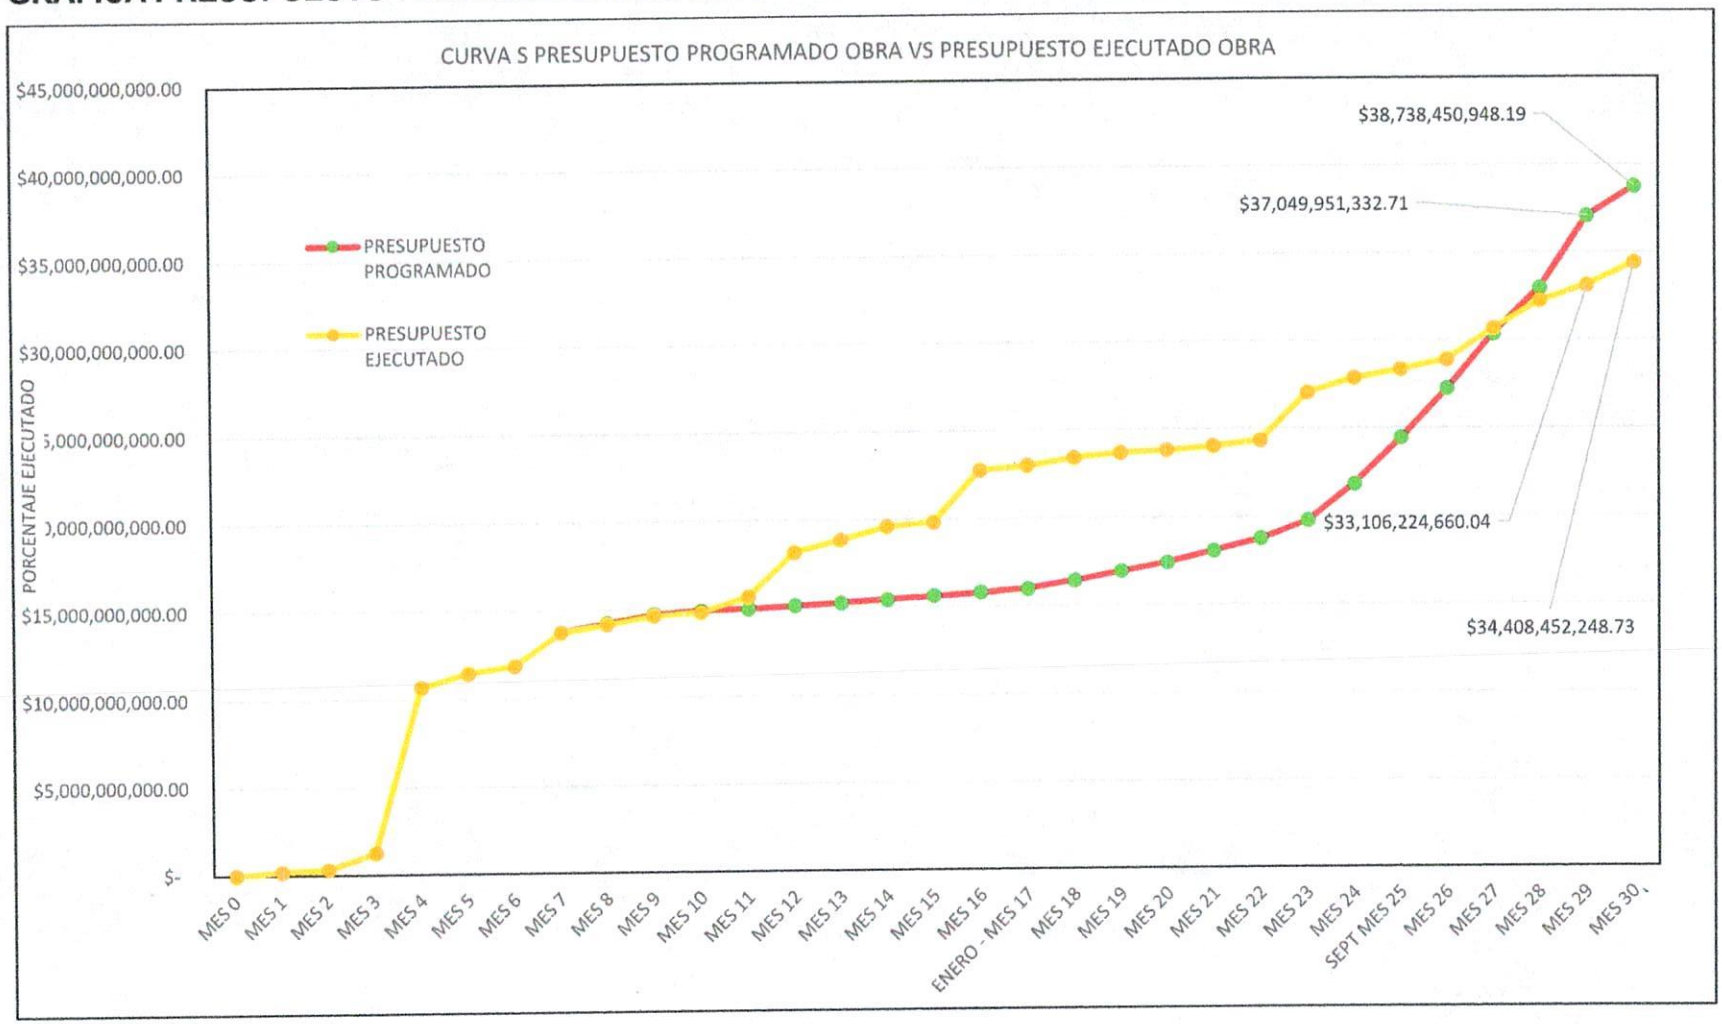

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**

GRAFICA PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA VS PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRA

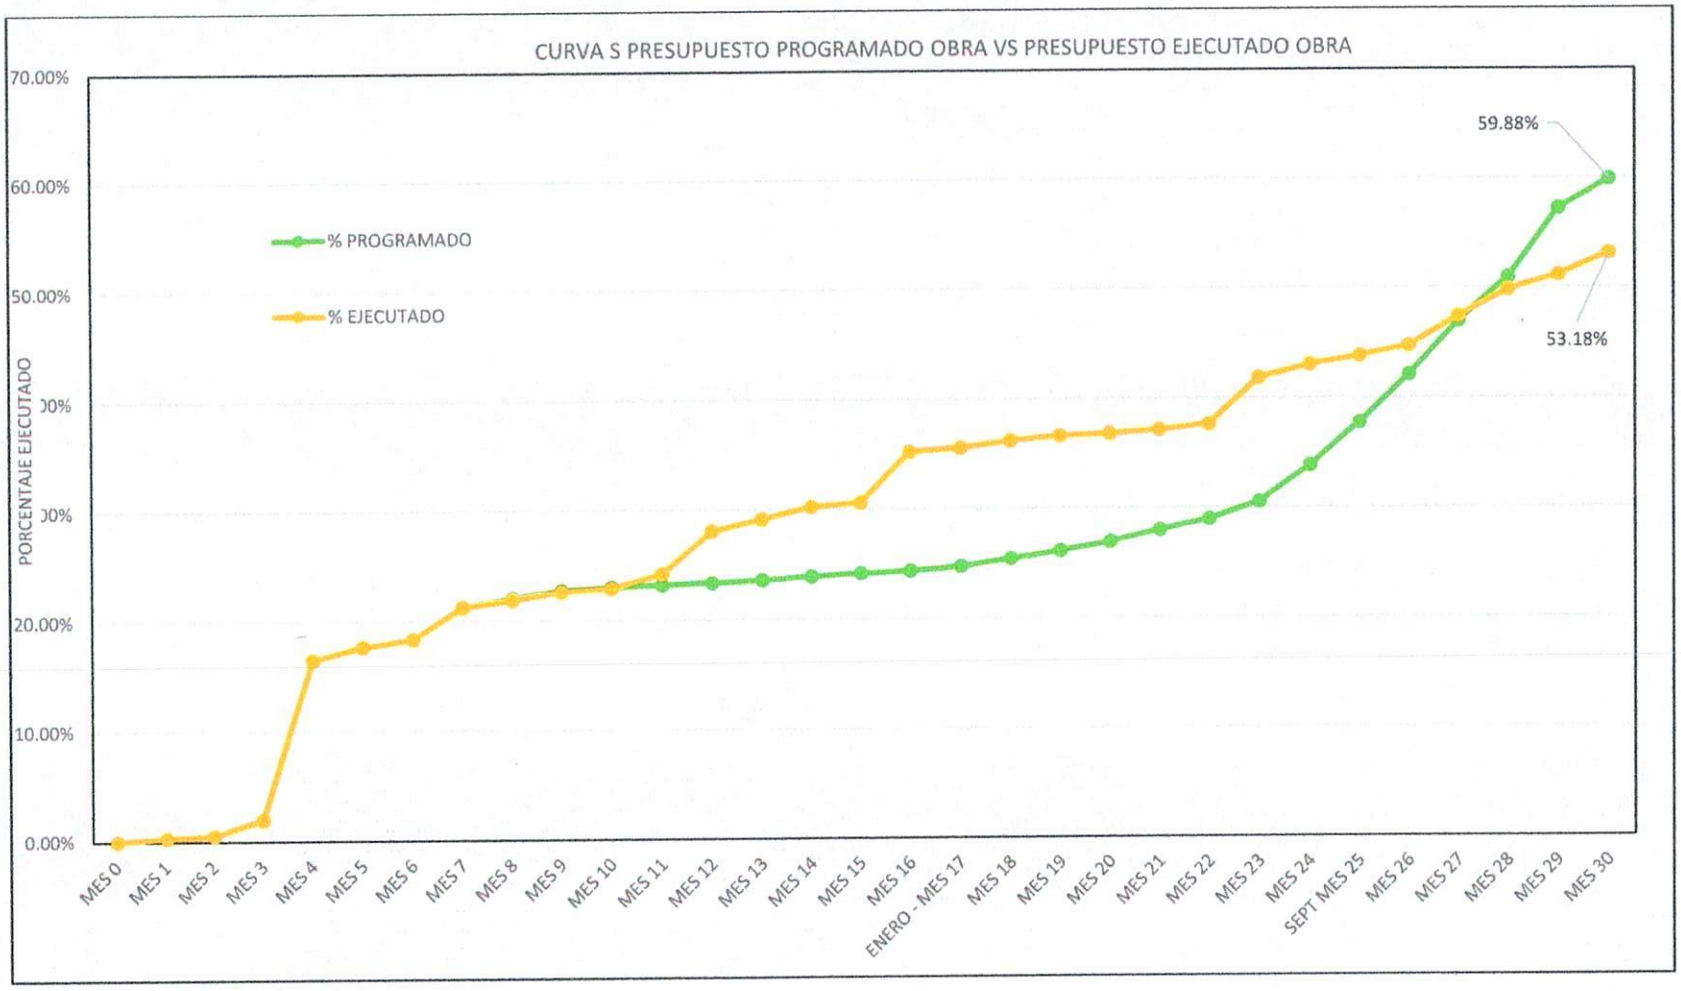

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

- A la fecha de corte del 25 de febrero de 2026, el proyecto registra un avance físico acumulado de 53.18% frente a un programado de 59.88% evidenciándose un atraso del 6.70% respecto al cronograma contractual. Este desfase se asocia principalmente a restricciones operativas, condiciones climáticas, demora en despachos por parte de proveedores e interferencias con la estructura existente del hospital.

- El consorcio dispone actualmente del material estructural para realizar actividades del módulo A y punto fijo del modulo D, reduciendo riesgos de desabastecimiento de elementos; sin embargo, permanece en gestión la adquisición de elementos para el punto fijo del modulo A el cual se continua a la espera de despacho por parte del proveedor.

- Las condiciones climáticas adversas presentadas en el periodo incidieron negativamente en el rendimiento de actividades críticas, especialmente en procesos de fabricación, montaje e izaje de la estructura metálica, generando afectaciones logísticas y de productividad tanto en el taller como en el modulo A.

- Se encuentra pendiente la definición técnica para la reubicación del tanque criogénico y gases medicinales por parte del subcontratista de la E.S.E., actividad que resulta critica para habilitar nuevos frentes de intervención.

- La recuperación del atraso depende de la implementación efectiva y oportuna del plan de contingencia y de plan de acción, así como de la liberación de áreas de intervención dentro del hospital en operación.

CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO
Representante legal
Consorcio de García Rovira.
C.C. 91.273.201 de Bucaramanga

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
1.11	DEMOLICION DE PLACA DE PISO

UNIDAD	M2
TOTAL	731.55


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D						
PUNTO FIJO MODULO D	12.69	9.85		125.00		125.00
						0.00

ACUMULADO	731.55
ACTA MODIFICATORIA 4	905.44
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	173.89
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	7.81
COBRADAS PARCIAL No3	340.21
COBRADAS PARCIAL No 4	72.21
COBRADAS PARCIAL No 5	99.37
COBRADAS PARCIAL No 6	33.88
COBRADAS PARCIAL No 7	53.07
COBRADAS PARCIAL No 8	125.00

OBSERVACIONES:





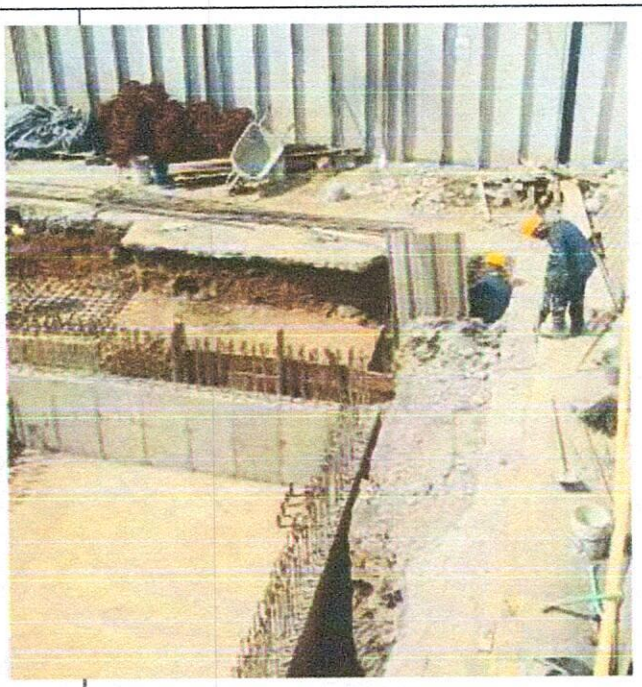

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
2.03	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION

UNIDAD	M3
TOTAL	581.24

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Volumen	Elementos	SUBTOTAL
PUNTO FIJO -MODULO D						
EXCAVACION PUNTO FIJO	12.69	9.84	2.05	255.98	255.98	255.98
ZAPATA Z1	1.70	1.70	1.45	4.19	-2.00	-8.38
ZAPATA Z2	1.75	1.75	1.45	4.44	-2.00	-8.88
ZAPATA Z3	1.85	1.85	1.45	4.96	-3.00	-14.89
ZAPATA Z4	1.50	1.50	1.45	3.26	-1.00	-3.26
VIGAS DE CONEXIÓN	0.50	21.45	0.40	4.29	-1.00	-18.40
						0.00

ACUMULADO	581.24
ACTA MODIFICATORIA 4	944.55
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	363.31
COBRADAS PARCIAL No 3	205.00
COBRADAS PARCIAL No 5	224.37
COBRADAS PARCIAL No 8	151.87

OBSERVACIONES:



UBICACION PLANO



IMAGENES


ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3.02	ACERO DE REFUERZO FG					UNIDAD	KG
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	199144.88
		No Varilla	Largo (M)	Peso ml/kg	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D - PUNTO FIJO							
PLANTA NIVEL -2.95							
VG- CIM - B							0.00
	Superior	7.00	6.65	3.04	6	1.00	121.38
		4.00	6.45	1.00	2	1.00	12.85
	Inferior	7.00	6.65	3.04	6	1.00	121.38
		4.00	6.45	1.00	2	1.00	12.85
	Flejes	3.00	2.80	0.56	41	1.00	63.94
	Ganchos	3.00	0.86	0.56	123	1.00	58.92
VG- CIM - C							0.00
	Superior	7.00	6.90	3.04	6	1.00	125.94
		4.00	6.70	1.00	2	1.00	13.35
	Inferior	7.00	6.90	3.04	6	1.00	125.94
		4.00	6.70	1.00	2	1.00	13.35
	Flejes	3.00	2.80	0.56	41	1.00	63.94
	Ganchos	3.00	0.86	0.56	123	1.00	58.92
VG- CIM - 3							
	Superior	7.00	7.33	3.04	6	1.00	133.79
		4.00	7.13	1.00	2	1.00	14.20
	Inferior	7.00	7.33	3.04	6	1.00	133.79
		4.00	7.13	1.00	2	1.00	14.20
	Flejes	3.00	2.80	0.56	45	1.00	70.18
	Ganchos	3.00	0.86	0.56	135	1.00	64.67
						ACUMULADO	199144.88
						ACTA MODIFICATORIA 4	199229.86
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	84.98
						COBRADAS PARCIAL No 1	32716.10
						COBRADAS PARCIAL No 3	115909.58
						COBRADAS PARCIAL No 4	27209.05
						COBRADAS PARCIAL No 5	11114.32
						COBRADAS PARCIAL No 6	10972.26
						COBRADAS PARCIAL No 8	1223.57
OBSERVACIONES:							

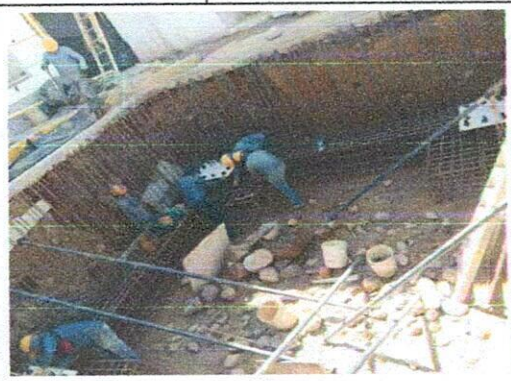

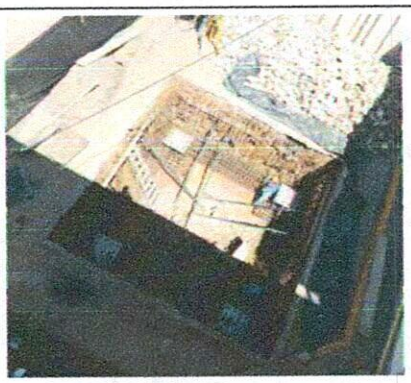

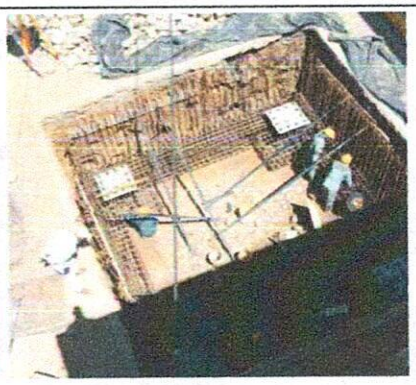

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
3.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					UNIDAD	M2
						TOTAL	3473.93
	Largo	Ancho	ÁreaColum	ÁreaCo	Cant	Area	SUBTOTAL
MODULO A							
PLACA N-0.10							
AREA 1						211.34	211.34
AREA 2						123.61	123.61
AREA 3						189.98	189.98
AREA 4						42.91	42.91
AREA 5						146.51	146.51
AREA 6						42.41	42.41
PLACA N+4.30							
AREA 1						36.83	36.83
AREA 2						202.30	202.30
AREA 3						73.59	73.59
AREA 4						193.42	193.42
AREA 5						143.98	143.98

ACUMULADO	3473.93
ACTA MODIFICATORIA 4	5444.61
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1970.68
COBRADAS PARCIAL No 5	259.65
COBRADAS PARCIAL No 6	2300.75
COBRADAS PARCIAL No 7	500.54
COBRADAS PARCIAL No 8	412.99

OBSERVACIONES:



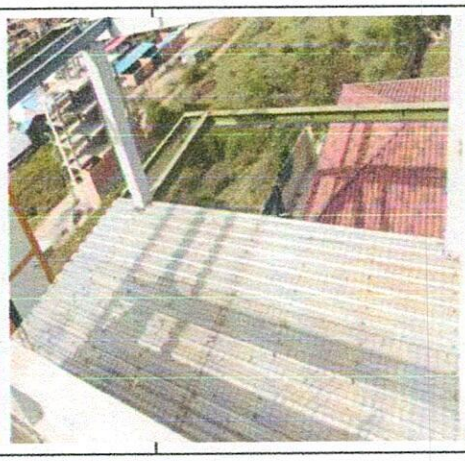

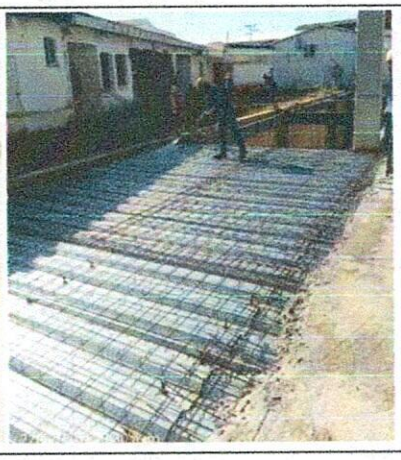

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO				UNIDAD	M3	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	599.37	
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL	
MODULO D - PUNTO FIJO							
ESCALERA DE INGRESO AL AREA	0.25	5.75	1.10		2.00	3.16	
	0.25	5.80	1.10		2.00	3.19	

	ACUMULADO	599.37
	ACTA MODIFICATORIA 4	730.88
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	131.51
	COBRADAS PARCIAL No 2	53.33
	COBRADAS PARCIAL No 3	295.48
	COBRADAS PARCIAL No 4	75.09
	COBRADAS PARCIAL No 5	46.32
	COBRADAS PARCIAL No 6	122.80
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	6.35
OBSERVACIONES:		

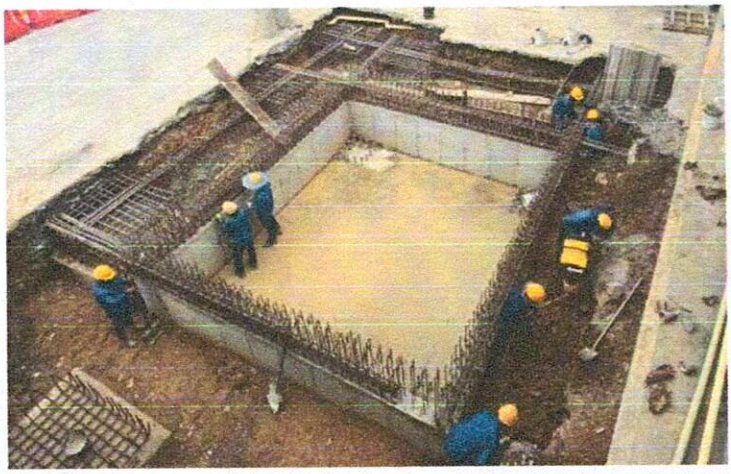



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

3-NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS				UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	196.54
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D - PUNTO FIJO						
ZAPATA 2 - FOSO DE ASCENSOR	2.00	2.00	0.80	2	6.40	6.40
ZAPATA 5 - FOSO DE ASCENSOR	1.75	1.75	0.80	2.00	4.90	4.90
ZAPATA 2 - PUNTO FIJO	2.00	2.00	0.80	2.00	6.40	6.40
ZAPATA 4 - PUNTO FIJO	1.50	1.50	0.80	1.00	1.80	1.80
ZAPATA 1 - PUNTO FIJO	1.70	1.70	0.80	1.00	2.31	2.31

ACUMULADO	196.54
ACTA MODIFICATORIA 4	212.97
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	16.43
COBRADAS PARCIAL No 2	65.54
COBRADAS PARCIAL No3	86.85
COBRADAS PARCIAL No 4	5.80
COBRADAS PARCIAL No 6	16.54
COBRADAS PARCIAL No 8	21.81



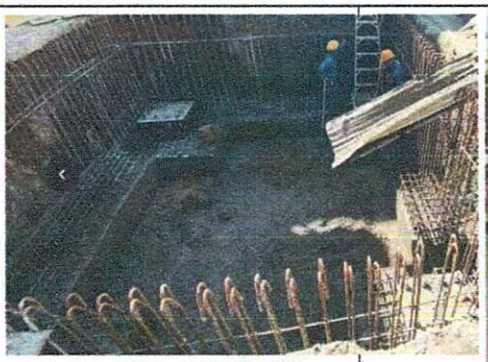



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION
UNIDAD	M3
TOTAL	163.08

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D - PUNTO FIJO						
VIGA CIM - B - FOSO DE ASCENSOR	2.55	0.8	0.8		1.632	1.63
VIGA CIM - 4 - FOSO DE ASCENSOR	2.98	0.80	0.80		1.9072	1.91
VIGA CIM - C - FOSO DE ASCENSOR	2.30	0.8	0.8		1.472	1.47
VIGA CIM - 3 - FOSO DE ASCENSOR	2.98	0.80	0.80		1.9072	1.91
VIGA CIM - 5 - PUNTO FIJO	3.23	0.5	0.4		0.646	0.65
	1.12	0.50	0.40		0.224	0.22
VIGA CIM - A - PUNTO FIJO	0.25	0.50	0.40		0.05	0.05
	3.83	0.50	0.40		0.766	0.77

ACUMULADO	163.08
ACTA MODIFICATORIA 4	212.97
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	49.89
COBRADAS PARCIAL No 2	20.09
COBRADAS PARCIAL No 3	52.38
COBRADAS PARCIAL No 4	9.86
COBRADAS PARCIAL No 5	4.53
COBRADAS PARCIAL No 6	67.62
COBRADAS PARCIAL No 8	8.60



UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS

UNIDAD	M3
TOTAL	70.97

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					
		Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
E4	COLUMNA 450X450 MM	0.43	0.43	13.08			2.37
F1	COLUMNA 450X450 MM	0.43	0.43	4.30			0.78
F2	COLUMNA 450X450 MM	0.43	0.43	13.08			2.37
F3	COLUMNA 450X450 MM	0.43	0.43	13.08			2.37
F4	COLUMNA 450X450 MM	0.43	0.43	13.08			2.37
G1	COLUMNA 450X450 MM	0.43	0.43	4.30			2.00
G2	COLUMNA 450X450 MM	0.43	0.43	13.08			2.37
G3	COLUMNA 450X450 MM	0.43	0.43	13.08			2.37
G4	COLUMNA 450X450 MM	0.43	0.43	13.08			2.37

ACUMULADO	70.97
ACTA MODIFICATORIA 4	142.18
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	71.21
COBRADAS PARCIAL No 6	25.46
COBRADAS PARCIAL No 7	26.55
COBRADAS PARCIAL No 8	18.96

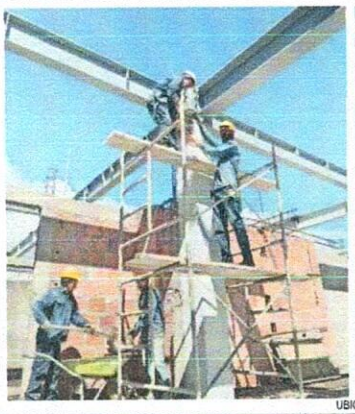



UBICACIÓN PLANO

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36					UNIDAD	M3
		DIMENSIONES				TOTAL	131824.34
LOCALIZACIÓN		Area acero exterior	Kg/m2	Kg interno	Kg rigidizadores internos	Elementos	SUBTOTAL
	MODULO A						
I4	COLUMNA 500X500 LAMINA 5/8"	25.74	124.62	205.20	7	1	3420.60
J1	HEA450	4.30	140.00		125.66	1	727.66
J3							
J4							
K3	COLUMNA 450X450	15.3475	99.70	205.20	7	1	1742.53
K4	COLUMNA 450X450	15.3475	99.70	205.20	7	1	1742.53
PORCENTAJE DE SOLDADURA 1.8%							2330.88

ACUMULADO	131824.34
ACTA MODIFICATORIA 4	133654.73
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1830.39
COBRADAS PARCIAL No 1	73033.33
COBRADAS PARCIAL No 6	22059.84
COBRADAS PARCIAL No 7	29210.71
COBRADAS PARCIAL No 8	7520.46



UBICACIÓN PLANO



IMÀGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO		PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER											
ITEM No.													
4-NP6		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36										UNIDAD	KG
		DIMENSIONES										TOTAL	176557.89
LOCALIZACIÓN		LONG	KG/ML	CANT	AREA RIGIDIZADORES EN L	AREA RIGIDIZADORES EN RECTANGULARES	AREA CONEXIÓN ENTRE VIGA Y PLATINA (M2)	AREA TOTAL RIGIDIZADORES	LAMINA A36 DE 1/2" X KG/M2	KG TOTAL VIGA	KG TOTAL RIGIDIZADORES	KG TOTAL	
MODULO A													
VIGAS PRINCIPALES													
EJE E ENTRE 1-2	NIVEL 1	IPE 400	3.95	66.3	1					99.7	261.885	0.00	261.89
EJE E ENTRE 2-3	NIVEL 1	IPE 400	5.07	66.3	1		0.18	0.084	0.264	99.7	336.141	26.32	362.46
EJE E ENTRE 3-4	NIVEL 1	IPE 400	8.69	66.3	1	0.0652	0.15	0.048	0.293	99.7	576.147	29.23	605.38
EJE F ENTRE 1-2	NIVEL 1	IPE 400	3.95	66.3	1					99.7	261.885	0.00	261.89
EJE F ENTRE 2-3	NIVEL 1	IPE 450	5.07	77.6	1		0.22798944	0.084	0.312	99.7	393.432	31.11	424.54
EJE F ENTRE 3-4	NIVEL 1	IPE 400	8.69	66.3	1	0.0652	0.15	0.048	0.293	99.7	576.147	29.23	605.38
EJE G ENTRE 1-2	NIVEL 1	IPE 400	3.95	66.3	1					99.7	261.885	0.00	261.89
EJE G ENTRE 2-3	NIVEL 1	IPE 450	5.07	77.6	1		0.22798944	0.084	0.312	99.7	393.432	31.11	424.54
EJE G ENTRE 3-4	NIVEL 1	IPE 400	8.69	66.3	1	0.0652	0.15	0.048	0.293	99.7	576.147	29.23	605.38
EJE H ENTRE 1-2	NIVEL 1	IPE 450	3.94	77.60	1.00					99.7	305.744	0.00	305.74
EJE H ENTRE 2-3	NIVEL 1	IPE 450	5.06	77.60	1.00					99.7	392.656	0.00	392.66
EJE H ENTRE 3-4	NIVEL 1	HEA 450	8.66	140.00	1.00					99.7	1212.4	0.00	1212.40
EJE I ENTRE 1-2	NIVEL 1	IPE 450	3.94	77.60	1.00					99.7	305.744	0.00	305.74
EJE I ENTRE 2-3	NIVEL 1	IPE 450	5.00	77.60	1.00					99.7	388	0.00	388.00
EJE I ENTRE 3-4	NIVEL 1	HEA 450	8.64	140.00	1.00					99.7	1209.6	0.00	1209.60
EJE J ENTRE 1-2	NIVEL 1									99.7	0	0.00	0.00
EJE J ENTRE 2-3	NIVEL 1									99.7	0	0.00	0.00
EJE J ENTRE 3-4	NIVEL 1									99.7	0	0.00	0.00
EJE K ENTRE 2-3	NIVEL 1									99.7	0	0.00	0.00
EJE K ENTRE 3-4	NIVEL 1									99.7	0	0.00	0.00
ENTREPISOS										99.7	0	0.00	0.00
EJES E - F ENTRE 2 - 3	NIVEL 1	IPE 360	7.95	57.10	3.00	0.26			0.780	99.7	1361.835	77.77	1439.60
EJES E - F ENTRE 3 - 4	NIVEL 1	HEA 200	7.98	42.30	5.00					99.7	1687.77	0.00	1687.77
EJES F - G ENTRE 1 - 2	NIVEL 1	IPE 400	8.43	66.30	2.00	0.13			0.260	99.7	1117.818	25.92	1143.74
EJES F - G ENTRE 2 - 3	NIVEL 1	IPE 360	8.43	57.10	3.00	0.28			0.840	99.7	1444.059	83.75	1527.81
EJES F - G ENTRE 3 - 4	NIVEL 1	HEA 200	8.44	42.30	5.00					99.7	1785.06	0.00	1785.06
EJES G - H ENTRE 1 - 2	NIVEL 1								0.000	99.7	0	0.00	0.00
EJES G - H ENTRE 2 - 3	NIVEL 1	IPE 360	7.99	57.10	2.00				0.000	99.7	912.458	0.00	912.46
EJES G - H ENTRE 3 - 4	NIVEL 1	IPE 360	7.99	57.10	2.00				0.000	99.7	912.458	0.00	912.46
EJES G - H ENTRE 3 - 4	NIVEL 1	IPE 400	7.99	66.30	3.00				0.000	99.7	1589.211	0.00	1589.21
VIGAS PRINCIPALES										99.7	0	0.00	0.00
EJE F ENTRE 1-2	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
EJE F ENTRE 2-3	NIVEL 2	IPE 450	5.06	79.54	1.00	0.09			0.090	99.7	402.4724	8.97	411.45
EJE F ENTRE 3-4	NIVEL 2	IPE 450	8.70	79.54	1.00					99.7	691.998	0.00	692.00
EJE G ENTRE 1-2	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
EJE G ENTRE 2-3	NIVEL 2	HEA 450	5.06	140.00	1.00					99.7	708.4	0.00	708.40
EJE G ENTRE 3-4	NIVEL 2	IPE 450	8.70	79.54	1.00					99.7	691.998	0.00	692.00
EJE H ENTRE 1-2	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
EJE H ENTRE 2-3	NIVEL 2	HEA 450	5.06	140.00	1.00					99.7	708.4	0.00	708.40
EJE H ENTRE 3-4	NIVEL 2	HEA 450	8.66	140.00	1.00					99.7	1212.4	0.00	1212.40
EJE I ENTRE 1-2	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
EJE I ENTRE 2-3	NIVEL 2	HEA 450	5.00	140.00	1.00					99.7	700	0.00	700.00
EJE I ENTRE 3-4	NIVEL 2	HEA 450	8.64	140.00	1.00					99.7	1209.6	0.00	1209.60
EJE 2 ENTRE G-H	NIVEL 2	IPE 400	7.54	66.30	1.00		0.13		0.129	99.7	499.902	12.83	512.73
EJE 2 ENTRE H-I	NIVEL 2	HEA 450	9.42	140.00	1.00					99.7	1318.8	0.00	1318.80
EJE 2 ENTRE I-J	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
EJE 3 ENTRE F-G	NIVEL 2	IPE 400	8.02	66.30	1.00					99.7	531.726	0.00	531.73
EJE 3 ENTRE G-H	NIVEL 2	IPE 400	7.54	66.30	1.00					99.7	499.902	0.00	499.90
EJE 3 ENTRE H-I	NIVEL 2	HEA 450	9.42	140.00	1.00					99.7	1318.8	0.00	1318.80
EJE 3 ENTRE I-J	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
EJE 3 ENTRE J-K	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
EJE 4 ENTRE A-B	NIVEL 2	IPE 400	5.78	66.30	1.00	0.00	0.18	0.02	0.204	99.7	383.214	20.34	403.55
EJE 4 ENTRE B-C	NIVEL 2	IPE 400	6.25	66.30	1.00	0.00	0.18	0.02	0.204	99.7	414.375	20.34	434.71
EJE 4 ENTRE C-D	NIVEL 2	IPE 400	3.73	66.30	1.00	0.07	0.06	0.02	0.149	99.7	247.299	14.88	262.17
EJE 4 ENTRE D-E	NIVEL 2	IPE 400	6.23	66.30	1.00	0.07	0.18	0.02	0.269	99.7	413.049	26.84	439.89
EJE 4 ENTRE E-F	NIVEL 2	IPE 400	7.53	66.30	1.00	0.00	0.24	0.05	0.288	99.7	499.239	28.71	527.95
EJE 4 ENTRE F-G	NIVEL 2	IPE 400	8.03	66.30	1.00					99.7	532.389	0.00	532.39
EJE 4 ENTRE G-H	NIVEL 2	IPE 400	7.54	66.30	1.00					99.7	499.902	0.00	499.90
EJE 4 ENTRE H-I	NIVEL 2	IPE 400	9.43	66.30	1.00					99.7	625.209	0.00	625.21
EJE 4 ENTRE I-J	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
EJE 4 ENTRE J-K	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
VOLADIZO EJE I COSTADO EJE 1	NIVEL 2	HEA 450	3.53	140.00	1.00					99.7	494.2	0.00	494.20
VOLADIZO EJE 1 COSTADO EJE A	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
VOLADIZO EJE 2 COSTADO EJE A	NIVEL 2	HEA 400	4.26	125.00	1.00					99.7	532.5	0.00	532.50
VOLADIZO EJE 3 COSTADO EJE A	NIVEL 2	HEA 340	4.26	99.30	1.00					99.7	423.018	0.00	423.02
VOLADIZO EJE 4 COSTADO EJE A	NIVEL 2	HEA 400	4.26	125.00	1.00					99.7	532.5	0.00	532.50
ENTREPISOS										99.7	0	0.00	0.00
EJES A - B ENTRE 1 - 2	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
EJES A - B ENTRE 2 - 3	NIVEL 2	HEA 200	6.25	42.30	3.00					99.7	793.125	0.00	793.13
EJES A - B ENTRE 3 - 4	NIVEL 2	HEA 200	6.25	42.30	5.00					99.7	1321.875	0.00	1321.88
EJES B - C ENTRE 1 - 2	NIVEL 2									99.7	0	0.00	0.00
PORCENTAJE DE SOLDADURA 1.8%													3000.89

ACUMULADO MOD A	176557.89
ACUMULADO MODULO D CUBIERTA	15035.15
ACUMULADO MODULO D	55632.70
ACTA MODIFICATORIA 4	259201.99
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	42046.55
COBRADAS PARCIAL No 1	167621.87
COBRADAS PARCIAL No 6	27705.32
COBRADAS PARCIAL No 7	15035.15
COBRADAS PARCIAL No 8	36863.40

OBSERVACIONES:		





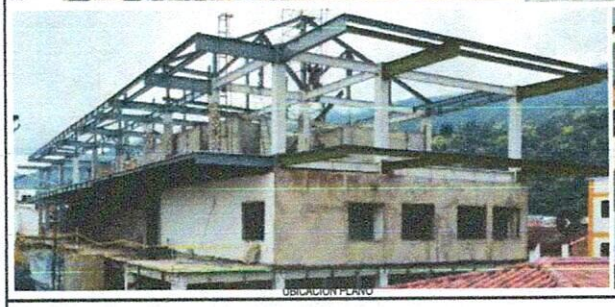

UBICACION PLANO

IMAGENES


ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	2489.29
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ares	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
PLACA N-0.10							
AREA 7							37.93
AREA 8							79.58
PLACA N+4.30							
AREA 6							81.01
AREA 7							33.06
						ACUMULADO	2489.29
						ACTA MODIFICATORIA 4	3169.96
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1454.54
						COBRADAS PARCIAL No 5	121.58
						COBRADAS PARCIAL No 6	1593.84
						COBRADAS PARCIAL No 7	542.29
						COBRADAS PARCIAL No 8	231.58

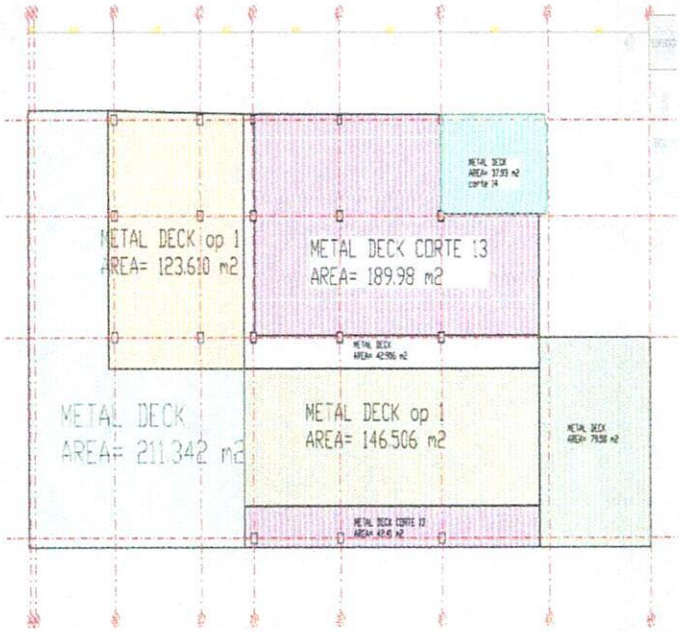


PLANTA AEREA N-0.10

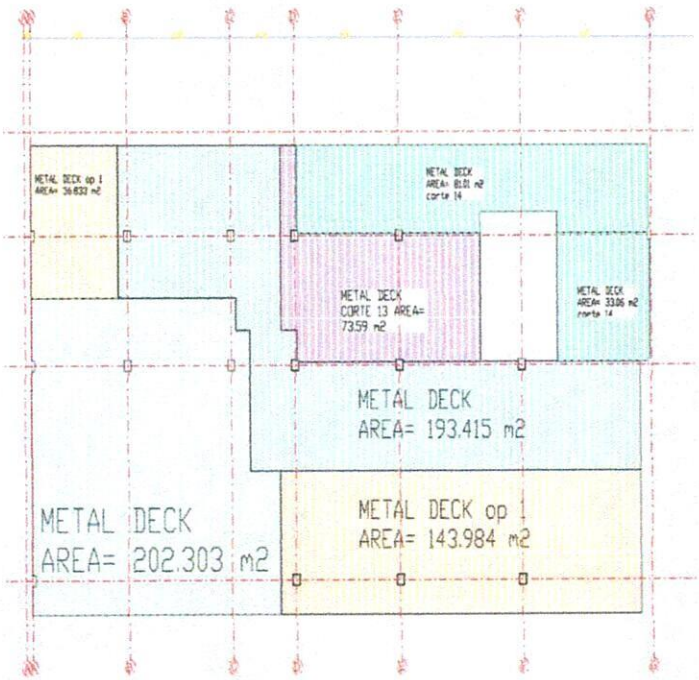

PLANTA AEREA N+4.30

UBICACIÓN PLANO

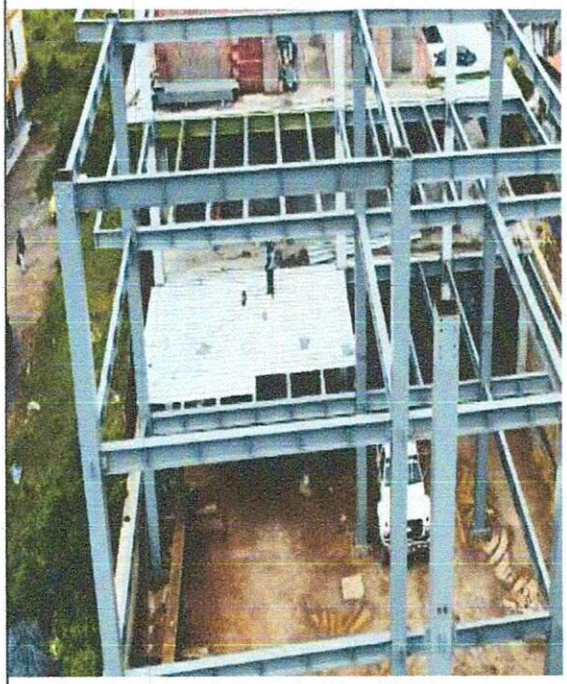



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
6.01	MURO EN BLOQUE NO 5
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	1592.33
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
PISO 1						
M83		3.40	3.42	11.63		11.63
M84		3.40	3.42	11.63		11.63
M85		3.50	3.42	11.97		11.97

ACUMULADO	1592.33
ACTA MODIFICATORIA 4	3016.79
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1424.46
COBRADAS PARCIAL No 2	385.90
COBRADAS PARCIAL No 5	46.05
COBRADAS PARCIAL No 6	937.79
COBRADAS PARCIAL No 7	188.76
COBRADAS PARCIAL No 8	33.83


OBSERVACIONES:



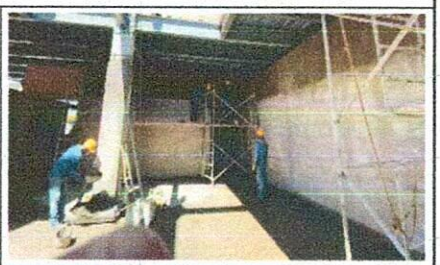





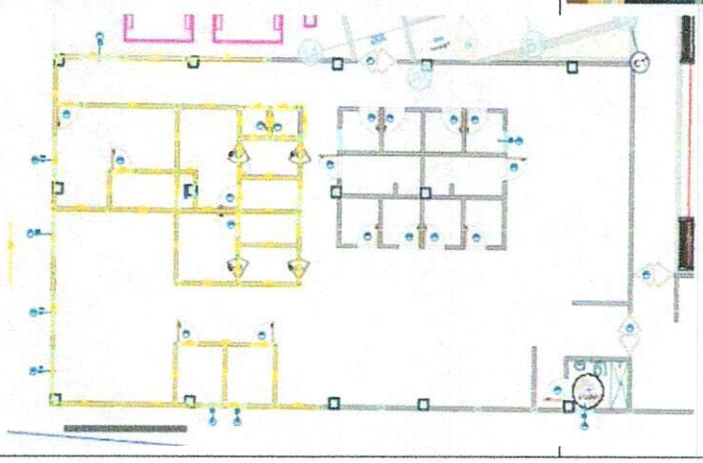

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
6-NP65	MURO EN BLOQUE No 4

UNIDAD	M2
TOTAL	2374.64


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
PRIMERA PLANTA						
M86		2.77	3.42			9.47
M87		2.86	3.42			9.78
M88		2.82	3.42			9.64
M89		1.8	2.52			4.54
M90		1.77	2.52			4.46
M91		3.02	2.52			7.61
M92		2.62	2.52			6.60
M93		2.65	2.52			6.68
M94		1.95	2.52			4.91
M95		2.6	3.42			8.89
M96		2.37	3.42			8.11
M97		1.95	2.52			4.91
M98		2.85	3.42			9.75
M99		2.9	3.42			9.92
M100		4.3	3.42			14.71
M101		0.39	2.52			0.98
M102		3.12	2.52			7.86
SEGUNDO PLANTA						
M1		2.78	2.52			7.01
M2		2.57	2.52			6.48
M3		0.48	2.52			1.21
M4		1.23	2.52			3.10
M5		1.03	2.52			2.60
M6		2.52	2.52			6.35
M7		2.67	2.52			6.73
M8		2.77	2.52			6.98
M9		1.26	2.52			3.18
M10		0.97	2.52			2.44
M11		1.5	2.52			3.78
M12		2.7	2.52			6.80
M13		2.7	2.52			6.80
M14		2.72	2.52			6.85
M15		2.32	2.52			5.85
M16		1.55	2.52			3.91
M17		1.6	2.52			4.03
M18		1.45	2.52			3.65
M19		1.54	2.52			3.88
M20		1.6	2.52			4.03
M21		1.45	2.52			3.65
M22		0.64	2.52			1.61
M23		0.98	2.52			2.47
M24		1.13	2.52			2.85
M25		3.67	2.52			9.25
M26		1.6	2.52			4.03
M27		1.01	2.52			2.55
M28		1.89	2.52			4.76
M29		3.01	2.52			7.59
M30		3.2	2.52			8.06
M31		2.5	2.52			6.30
M32		1.8	2.52			4.54
M33		2.43	2.52			6.12
M34		2.36	2.52			5.95
M35		3.2	2.52			8.06
M36		2.4	2.52			6.05


M37		0.78	2.52			1.97
M38		2,13	2.52			5.37
M39		1.42	2.52			3.58
M40		3.25	2.52			8.19
M41		2.27	2.52			5.72
M42		1.55	2.52			3.91
M43		3.67	2.52			9.25
M44		3.96	2.52			9.98
M45		2.72	2.52			6.85
M46		3.57	2.52			9.00
M47		1.1	2.52			2.77
M48		4.3	2.52			10.84
M49		1.31	2.52			3.30
M50		2.11	2.52			5.32
M51		1.5	2.52			3.78
M52		1	2.52			2.52
M53		3.94	2.52			9.93
M54		4.7	2.52			11.84
M55		3.19	2.52			8.04
M56		1.26	2.52			3.18
M57		1.15	2.52			2.90
M58		4.9	2.52			12.35
M59		2	2.52			5.04
M60		0.5	2.52			1.26
M61		2.46	2.52			6.20
M62		2.15	2.52			5.42
M63		2.78	2.52			7.01
M64		2.2	2.52			5.54
M65		2.08	2.52			5.24
M66		0.64	2.52			1.61
M67		0.75	2.52			1.89
M68		1.11	2.52			2.80
M69		1.45	2.52			3.65
M70		1.41	2.52			3.55
M71		1.83	2.52			4.61
M72		1.46	2.52			3.68
M73		0.62	2.52			1.56
M74		0.84	3.52			2.96

	ACUMULADO	**2374.64**
	ACTA MODIFICATORIA 4	**6193.93**
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**3819.29**
	COBRADAS PARCIAL No 2	346.76
	COBRADAS PARCIAL No 5	11.56
	COBRADAS PARCIAL No 6	1095.83
	COBRADAS PARCIAL No 7	423.98
	COBRADAS PARCIAL No 8	**496.51**

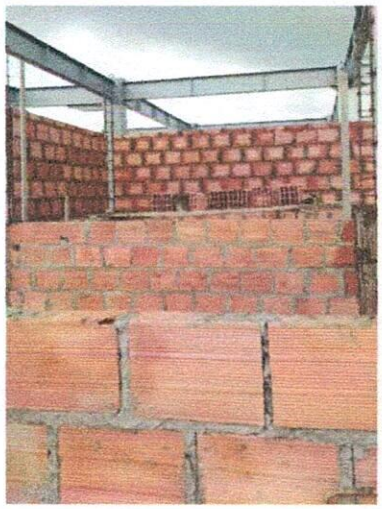



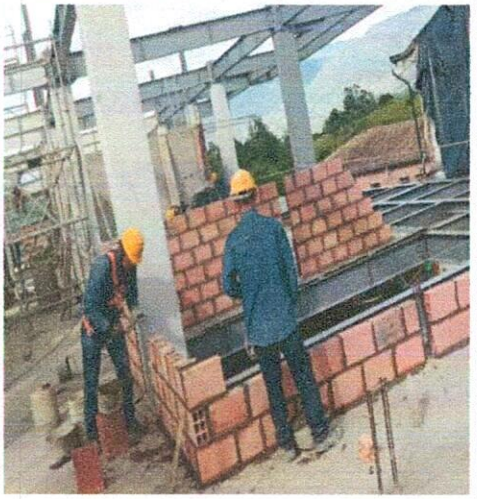

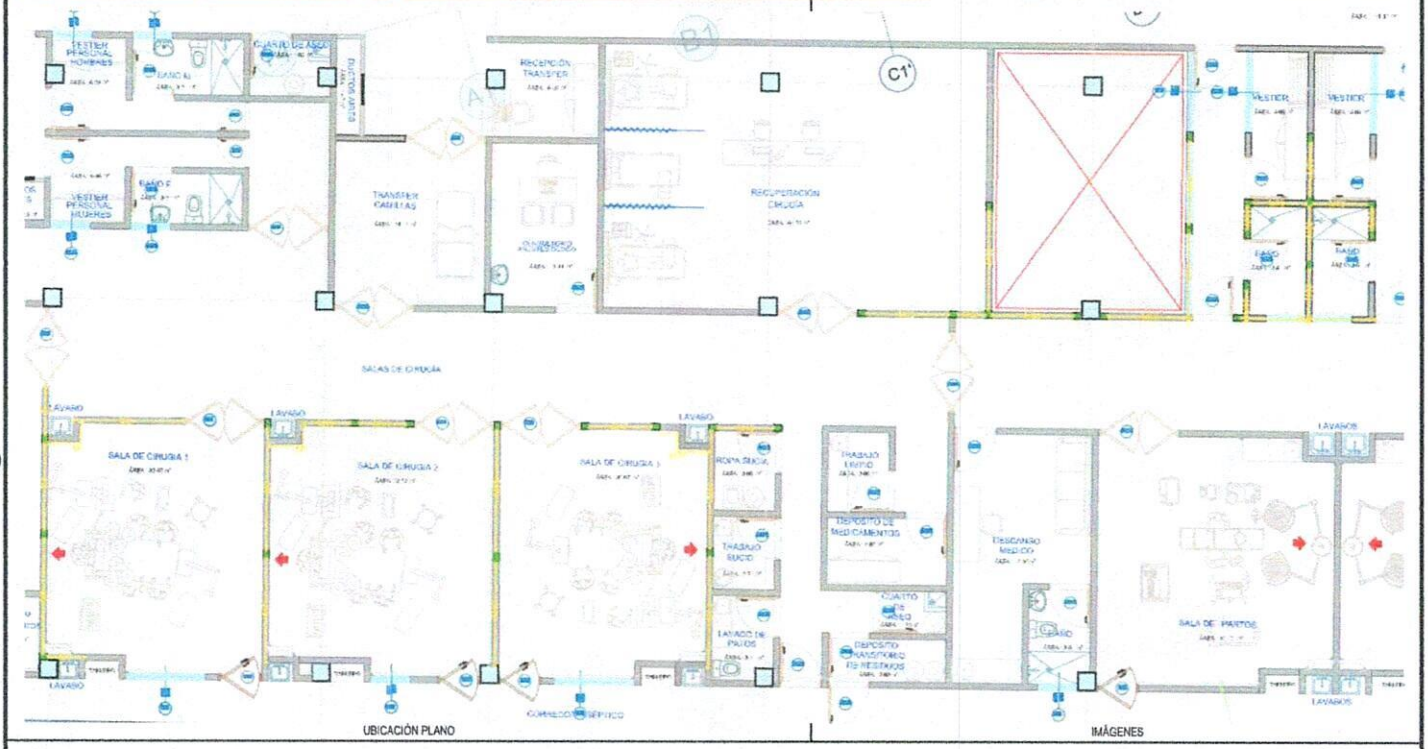

UBICACIÓN PLANO

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES

RESIDENTE DE OBRA

UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.78	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 40W.	TOTAL	181.00


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
MODULO D						
OFICINA COORDINADOR CON BAÑO "PRIMER PISO O PLANTA				2.00		2.00
OFICINA INFORMACION "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				2.00		2.00
TERAPIA PEDIATRICOS, BODEGA INSUMO, BAÑO , LOCKERS " PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				8.00		9.00
TERAPIA OCUPACIONAL CUBICULO 1 "PRIMER PISO O PLANTA				3.00		3.00
TERAPIA OCUPACIONAL CUBICULO 2 "PRIMER PISO O PLANTA				3.00		3.00
MASO TERAPIA 2 "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				3.00		3.00
MASO TERAPIA 1 "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				2.00		2.00
ELECTROTERAPIA "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				2.00		2.00
REHABILITACION CARDIACA CARDIOLOGIA "PRIMER PISO O				4.00		4.00
FONOAUDIOLOGIA 1 "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				3.00		4.00
FONOAUDIOLOGÍA 2 "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				3.00		4.00
SALA DE REANIMACION "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				4.00		4.00
GIMNASIO "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				9.00		10.00
CONSULTORIO DE VALORACION "PRIMER PISO O PLANTA				4.00		4.00
TERAPIA RESPIRATORIA 1 "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				1.00		1.00
TERAPIA RESPIRATORIA 2 "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				1.00		1.00
TERAPIA RESPIRATORIA 3 "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				1.00		1.00
AREA HIDROTERAPIA "PRIMER PISO O PLANTA MODULO D"				9.00		9.00
GERENCIA MAS BAÑO" SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO D"				2.00		2.00
SALA DE JUNTAS MAS BAÑO" SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO				12.00		12.00
SUBGERENTE " SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO D"				3.00		3.00
OFICINA DE AUDITORIA " SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO D"				8.00		8.00
OFICINA DE CONTABILIDAD " SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO D"				4.00		4.00
OFICINA DE TESORERIA " SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO D"				2.00		2.00
REVISOR FISCAL " SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO D"				1.00		1.00
OFICINA DE FACTURACIÓN " SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO				10.00		10.00
OFICINA DE CALIDAD " SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO D"				*10.00*		*10.00*
OFICINA PLANTA FISICA " SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO D"				3.00		3.00
OFICINA DE MANTENIMIENTO " SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO				3.00		3.00
OFICINA DE SISTEMAS " SEGUNDO PISO O PLANTA MODULO D"				3.00		3.00
RECEPCION SALA DE ESPERA MAS DOS (2) BAÑOS " SEGUNDO				2.00		2.00


	ACUMULADO	181.00
	ACTA MODIFICATORIA 4	388.00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	207.00
	COBRADAS PARCIAL No 5	47.00
	COBRADAS PARCIAL No 6	3.00
	COBRADAS PARCIAL No 8	131.00
OBSERVACIONES:		

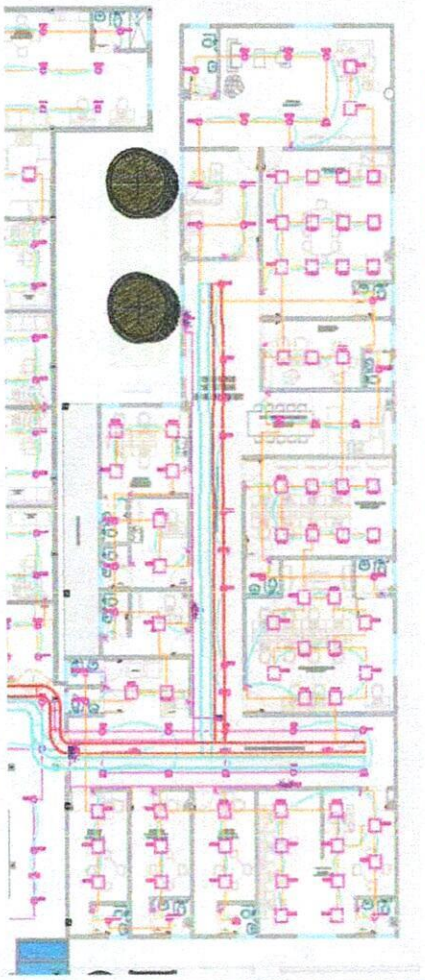


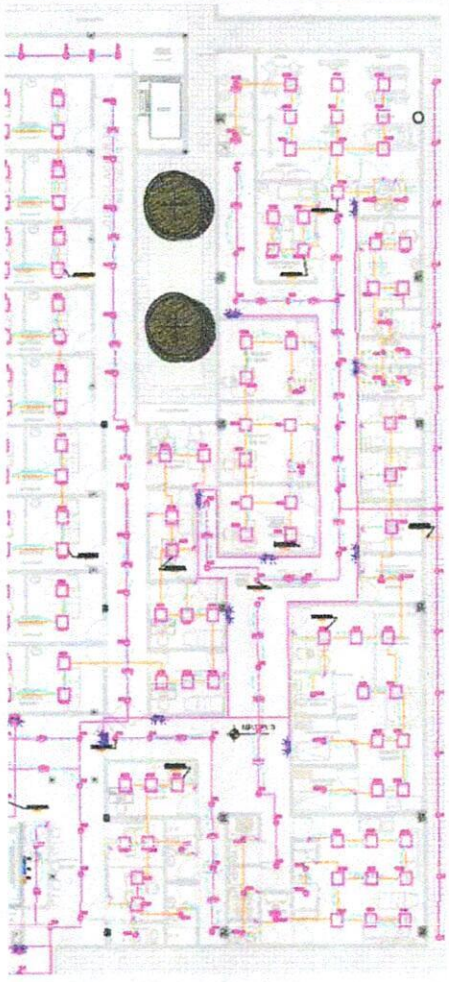







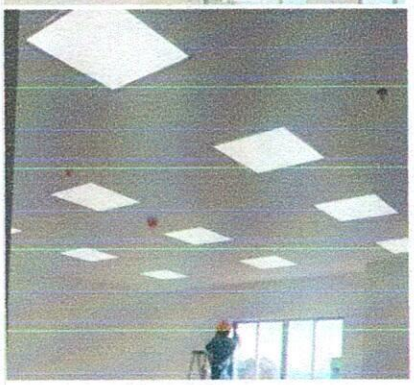

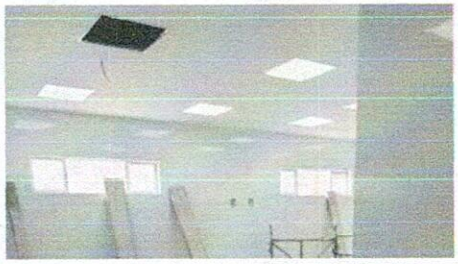



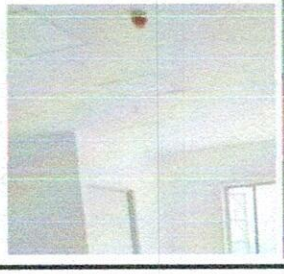

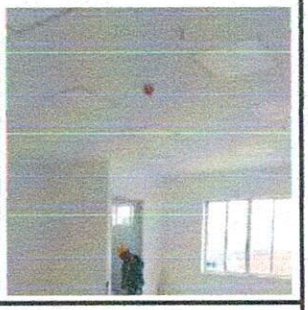

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL


PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.90	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES SELLADA (DUCTO CERRADO CON TAPA) 54/500 PARA RED ELECTRICA. INCLUYE SOPORTE DE SUJECIÓN, VARILLAS ROSCADAS, TORNILLOS DE UNIÓN.	TOTAL	108.20

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				ML
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad	
MODULO D					
PRIMER PISO	67.00				67.20
SEGUNDO PISO	26.00				26.00
				ACUMULADO	108.20
				ACTA MODIFICATORIA 3	593.00
				SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	484.80
				COBRADAS PARCIAL No 4	15.00
				COBRADAS PARCIAL No 7	67.20
				COBRADAS PARCIAL No 8	26.00

OBSERVACIONES: Bandejas ubicadas en primer y segundo piso modulo D - Pendiente tramos

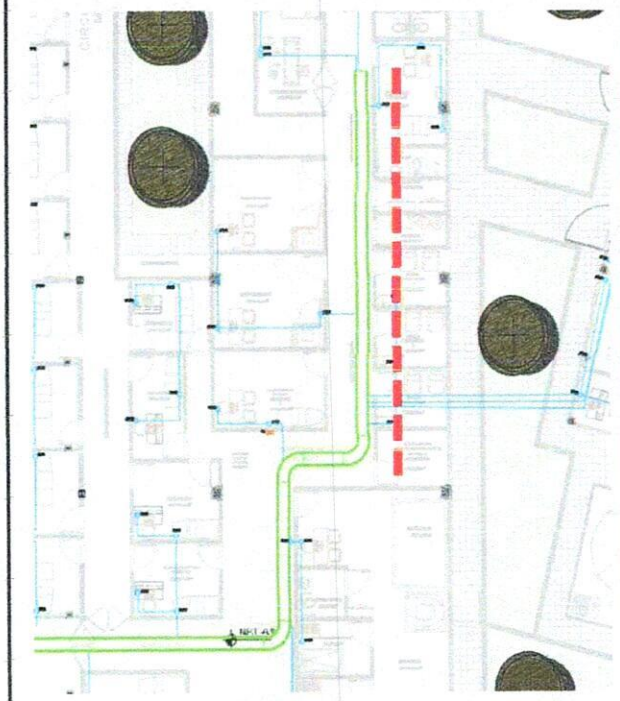



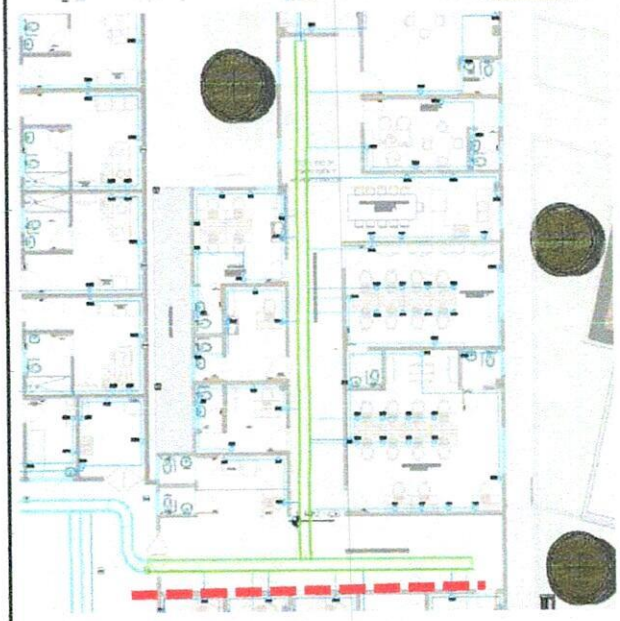



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
13.01	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4					TOTAL	6148.92
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					M2
		Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad	Caras	
MODULO A							
Primera planta							
M83			2.08	2.72			5.66
M84			2.20	2.72			5.98
M85			2.65	2.72			7.21
M86			1.94	2.72			5.28
M87			5.30	2.72			14.42
M88			1.94	2.72			5.28
M89			2.08	2.72			5.66
M90			5.56	2.72			15.12
M91			2.08	1.20			2.50
M92			5.45	3.72			20.27
M93			10.55	3.72			39.25
M94			1.40	2.72			3.81
M95			1.57	2.72			4.27
M96			1.03	2.72			2.80
M97			5.90	2.72			16.05
M98			1.58	2.72			4.30
M99			6.00	2.72			16.32
M100			3.80	2.72			10.34
M101			8.50	3.72			31.62
M102			2.40	3.72			8.93
M103			9.00	3.72			33.48
Segunda planta							
M1			5.27	2.72			14.33
M2			1.23	2.72			3.35
M3			2.59	2.72			7.04
M4			2.05	2.72			5.58
M5			2.72	2.72			7.40
M6			5.30	2.72			14.42
M7			1.59	2.72			4.32
M8			2.88	2.72			7.83
M9			2.75	2.72			7.48
M10			1.24	2.72			3.37
M11			3.80	2.72			10.34
M12			5.97	2.72			16.24
M13			5.97	2.72			16.24
M14			2.28	2.72			6.20
M15			1.30	2.72			3.54
M16			5.21	2.72			14.17
M17			2.34	2.72			6.36
M18			1.68	2.72			4.57
M19			1.84	2.72			5.00
M20			6.05	2.72			16.46
M21			1.06	2.72			2.88
M22			5.67	2.72			15.42
M23			0.87	2.72			2.37
M24			1.67	2.72			4.54
M25			6.02	2.72			16.37
M26			4.00	2.72			10.88
M27			1.83	2.72			4.98
M28			1.03	2.72			2.80
M29			6.29	2.72			17.11
M30			6.47	2.72			17.60
M31			4.40	2.72			11.97
M32			6.80	2.72			18.50
M33			2.42	2.72			6.58
M34			5.82	2.72			15.83
M35			3.24	2.72			8.81
M36			2.56	2.72			6.96
M37			5.97	2.72			16.24


M38			2.99	2.72			8.13
M39			1.43	2.72			3.89
M40			5.02	2.72			13.65
M41			3.12	2.72			8.49
M42			1.47	2.72			4.00
M43			5.12	2.72			13.93
M44			4.25	2.72			11.56
M45			7.20	2.72			19.58
M46			1.98	2.72			5.39
M47			5.08	2.72			13.82
M48			5.08	2.72			13.82
M49			3.92	2.72			10.66
M50			4.67	2.72			12.69
M51			4.21	2.72			11.45
M52			1.63	2.72			4.43
M53			1.63	2.72			4.43
M54			4.23	2.72			11.51
M55			1.63	2.72			4.43
M56			3.39	2.72			9.22
M57			4.48	2.72			12.19
M58			12.50	2.72			34.00
M59			3.87	2.72			10.53
M60			4.21	2.72			11.45
M61			2.63	2.72			7.15
M62			2.60	2.72			7.07
M63			2.80	2.72			7.62
M64			3.14	2.72			8.54
M65			2.12	2.72			5.77
M66			3.90	2.72			10.61
M67			2.01	2.72			5.47
M68			5.83	2.72			15.86
M69			4.20	2.72			11.42
M70			7.25	2.72			19.72
M71			3.48	2.72			9.45
M72			7.25	2.72			19.72
M73							0.00
M74							0.00
M75			1.55	2.72			4.22
M76							0.00
M77							0.00
M78			1.54	2.72			4.19
M79			1.70	2.72			4.62
M80			1.70	2.72			4.62

	ACUMULADO	6148.92
	ACTA MODIFICATORIA 4	12784.38
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	6635.46
	COBRADAS PARCIAL No 2	302.91
	COBRADAS PARCIAL No 5	646.01
	COBRADAS PARCIAL No 6	1695.40
	COBRADAS PARCIAL No 7	2496.38
	COBRADAS PARCIAL No 8	1008.22

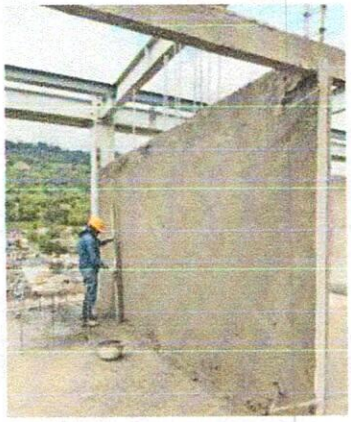

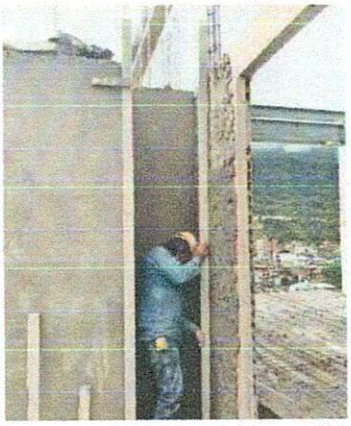



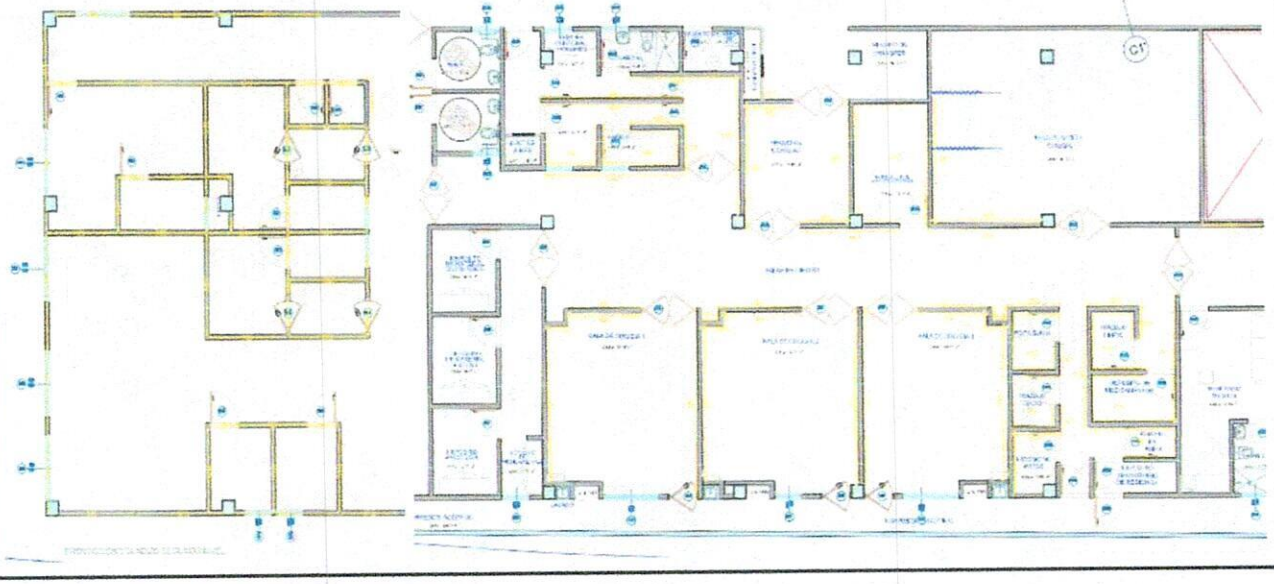

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL



PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
ITEM No.			
15.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BALDOSA EN GRANITO 30X30CM (BH 2 COLEGIOS), INCLUYE INSTALACIÓN -DESTRONQUE - PULIDA - BRILLADA DE PISO - TIPO ALFA O SIMILAR	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	952.58
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cantidad	
PRIMERA PLANTA						
	1.06	1.31			1.0	1.39
TERAPIA PEDIATRICOS	0.77	6.27			1.0	4.83
	4.26	4.22			1.0	17.98
	2.07	2.06			1.0	4.26
	2.50	0.90			1.0	2.25
	4.06	0.38			1.0	1.54
	1.59	4.49			1.0	7.14
	2.20	2.05			1.0	4.51
					1.0	0.00
CIRCULACION VESTIER PERSONAL	6.09	1.38			1.0	8.40
	3.57	1.46			1.0	5.21
CIRCULACION INGRESO	4.64	4.44			1.0	20.60
	1.98	4.86			1.0	9.62
PUERTAS 1.06X0.13	1.06	0.13			22.0	3.03
PUERTAS 1.06X0.06	1.06	0.06			10.0	0.64
PUERTA 2.06X0.13	2.06	0.13			3.0	0.80

	ACUMULADO	952.58
	ACTA MODIFICATORIA 4	3983.88
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	3031.30
	COBRADAS PARCIAL No 5	3.24
	COBRADAS PARCIAL No 7	857.00
	COBRADAS PARCIAL No 8	92.34
OBSERVACIONES:		

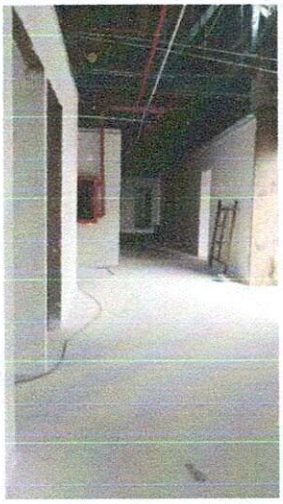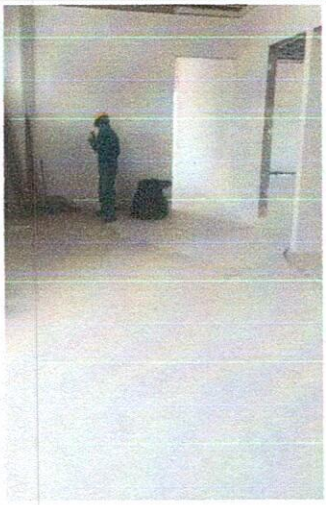

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

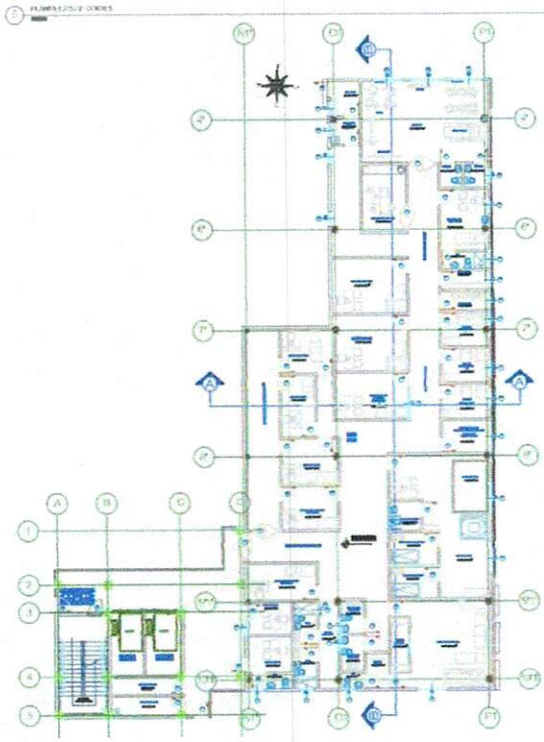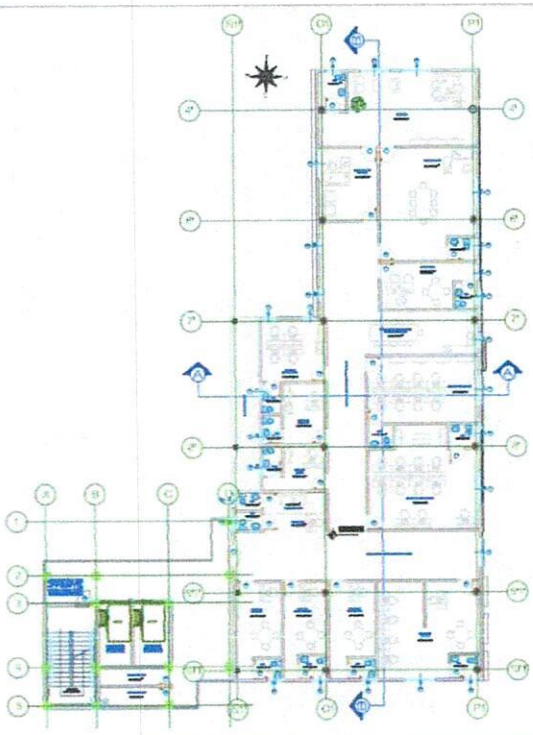CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

17.04	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNIDAD	M2


LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	4903.58
		Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
MODULO D							
M123			11.83	3.20			37.86
M124			4.45	3.20			14.24
M125			4.15	3.20			13.28
M126			2.68	3.20			8.58
M127			2.12	3.20			6.78
M128			1.28	3.20			4.10
M129			2.12	3.20			6.78
M130			1.28	3.20			4.10
M131			1.95	3.20			6.24
M132			1.10	0.65			0.72
M133			1.77	3.20			5.66
M134			5.20	3.20			16.64
M135			1.95	3.20			6.24
M136			1.10	0.65			0.72
M137			1.10	0.65			0.72
M138			1.10	0.65			0.72
M139			1.10	0.65			0.72
M140			1.10	0.65			0.72
M141			1.10	0.65			0.72
M142			1.10	0.65			0.72
M143			1.10	0.65			0.72
M144			1.10	0.65			0.72
M145			1.10	0.65			0.72
M146			1.10	0.65			0.72
M147			1.10	0.65			0.72
M148			1.10	0.65			0.72
M149			1.10	0.65			0.72
M150			1.10	0.65			0.72
M151			3.07	3.20			9.82
M152			3.10	3.20			9.92
M153			1.05	3.20			3.36
M154			0.52	3.20			1.66
M155			3.97	3.20			12.70
M156			3.72	3.20			11.90
M157			1.10	0.65			0.72
M158			3.17	3.20			10.14
M159			1.10	0.65			0.72
M160			1.10	0.65			0.72
M161			1.10	0.65			0.72
M162			1.10	0.65			0.72
M163			1.10	0.65			0.72
M164			1.10	0.65			0.72
M165			1.10	0.65			0.72


M166			1.10	0.65			0.72
M167			1.10	0.65			0.72
M168			1.10	0.65			0.72
M169			1.10	0.65			0.72
M170			1.10	0.65			0.72
M171			1.10	0.65			0.72
M172			1.10	0.65			0.72
M173			1.40	3.20			4.48
M174			1.10	0.65			0.72
M175			1.60	3.20			5.12
M176			1.10	0.65			0.72
M177			1.10	0.65			0.72
M178			1.10	0.65			0.72
M179			1.10	0.65			0.72
M180			1.10	0.65			0.72
M181			1.10	0.65			0.72
M182			1.10	0.65			0.72
M183			2.00	3.20			6.40
M184			2.00	3.20			6.40
M185			2.00	3.20			6.40
M186			2.00	3.20			6.40
M187			1.50	3.20			4.80
M188			0.94	3.20			3.01
M189			1.09	3.20			3.49
M190			0.94	3.20			3.01
M191			6.18	3.20			19.78
M192			0.52	3.20			1.66
M193			0.91	3.20			2.91
M194			2.14	3.20			6.85
M195			1.57	3.20			5.01
M196			0.80	3.20			2.56
M197			0.85	3.20			2.72
M198			1.24	3.20			3.95
M199			1.35	3.20			4.30
M200			1.19	3.20			3.81
M201			1.29	3.20			4.13
M202			0.70	3.20			2.24
M203			0.70	3.20			2.24
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS MODULO D							
PUERTAS DE 1,06 X 2,52			1.06	2.52	-64.00		-170.96
PUERTAS EXTERIOR DE 1,06 X 2,52			1.06	2.52	-7.00		-18.70
PUERTAS DE 2,04 X 2,52			2.04	2.52	-3.00		-15.42
PUERTAS EXTERIOR DE 2,04 X 2,52			2.04	2.52	-2.00		-10.28
VENTANA DE 0,9 X 0,5			0.90	0.50	-1.00		-0.45
VENTANA DE 1 X 0,5			1.00	0.50	-29.00		-14.50
VENTANA INTERIOR DE 1 X 0,5			1.00	0.50	-3.00		-1.50
VENTANA DE 2 X 1,5			2.00	1.50	-9.00		-27.00
VENTANA DE 2 X 0,5			2.00	0.50	-5.00		-5.00
VENTANA INTERIOR DE 2 X 0,5			2.00	0.50	-1.00		-1.00
VENTANA DE 1 X 1,5			1.00	1.50	-2.00		-3.00

	ACUMULADO	**4903.58**
	ACTA MODIFICATORIA 4	**12366.97**
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**7463.39**
	COBRADAS PARCIAL No 5	955.46
	COBRADAS PARCIAL No 6	611.67
	COBRADAS PARCIAL No 7	3002.81
	COBRADAS PARCIAL No 8	**333.65**

OBSERVACIONES:



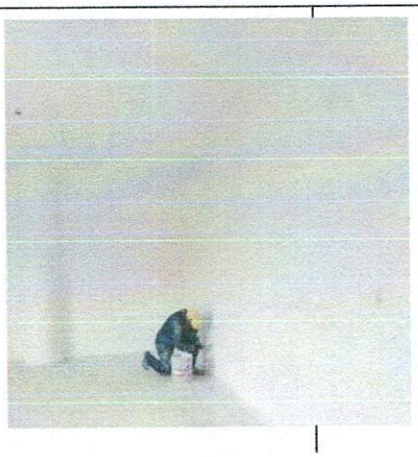

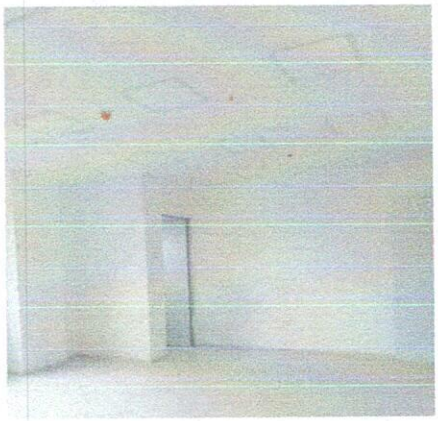



UBICACIÓN PLANO

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA




UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
18.01	CIELO RASO SUSPENDIDO EN DRY WALL (LAMINA DE YESO), INCLUYE PINTURA
UNIDAD	M2
TOTAL	1579.98


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
MODULO D						
SEGUNDA PLANTA						
PASILLO INGRESO DE GERENCIA	3.99	5.85				23.34
SUBGERENTE	3.16	4.89				15.45
	1.30	1.70				2.21
SALA DE JUNTAS	6.70	5.92				39.99
	4.70	1.53				7.19
SECRETARIA DE GERENCIA	4.84	3.84				18.59
GERENCIA	2.00	2.37				4.74
	5.08	8.58				43.43
GERENCIA	2.14		1.85			3.96
	0.39		1.36			0.53
SALA DE JUNTAS	1.75		1.39			2.43
SUBGERENTE	1.71		1.53			2.62
OFICINA DE CONTABILIDAD	1.95		1.26			2.45
OFICINA DE TESORERIA	1.25		1.87			2.34
REVISOR FISCAL	1.92		1.25			2.39
SALA DE ESPERA	1.15		1.72			1.98
RECEPCION	1.71		1.14			1.95
OFICINA DE SISTEMSA	1.30		1.72			2.24
OFICINA DE MANTENIMIENTO	1.55		1.49			2.31
	0.34		0.38			0.12
	0.66		0.34			0.22
OFICINA PLANTA FISICA	1.84		1.32			2.43
OFICINA DE CALIDAD	1.71		1.56			2.67
	0.85		0.45			0.38
OFICINA DE AUDITORIA	1.51		1.63			2.46
OFICINA DE FACTURACION	1.13		0.45			0.51
	1.34		1.48			1.98

ACUMULADO	1579.98
ACTA MODIFICATORIA 4	4099.83
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2419.85
COBRADAS PARCIAL No 5	568.39
COBRADAS PARCIAL No 6	134.12
COBRADAS PARCIAL No 7	800.00
COBRADAS PARCIAL No 8	177.47

OBSERVACIONES:


UBICACION PLANO

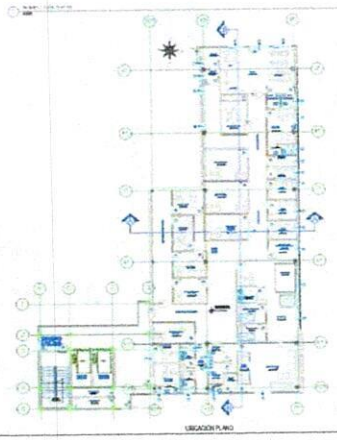
IMAGENES

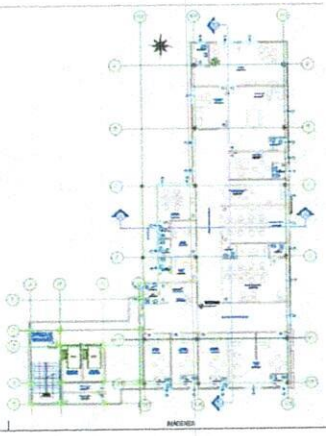ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RAMIREL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES

Bucaramanga, 28 de febrero de 2026

Yo JESSICA MARCELA CAMELO VACA, en mi condición de Contador del CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA identificado con Nit No. 901.740.580-3, me permito CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDADA DE JURAMENTO que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (06) meses anteriores a la presente certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dada en Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2026.

Cordialmente,

CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO
C.C. 91.273.201
Representante legal

JESSICA CAMELO VACA
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 211938-T
CC 1.102.355.623

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

211938-T



JESSICA MARCELA
CAMELO VACA
C.C. 1102355623
RESOLUCION INSCRIPCION 852 **FECHA 22/12/2015**
UNIVERSIDAD UNIDADES TECN. DE SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 224961

214670

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.355.623**

CAMELO VACA

APELLIDOS

JESSICA MARCELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1988**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-ABR-2006 PIEDECUESTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00218366-F-1102355623-20100226 0021312676A 1 32979595

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 4 0 A 9 E B D 6 C D 8 A 0 F 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESSICA MARCELA CAMELO VACA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102355623 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 211938-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740580	3	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 32 28 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	3694059	9497977688	E	2026/01/21	2026/01/23	BANCO DAVIVIENDA	2	$31,162,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13929589	BARAJAS HERNANDEZ JOSE EULISES		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	13929922	BARAJAS ANAYA MARCO ANTONIO		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	13906579	BASTO SANCHEZ CARLOS JULIO		X																25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
4	CC	5613984	BASTO MURILLO SADY ROBERTO		X																25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
5	CC	91487260	CARREÑO SANABRIA ALFONSO		X																230201	26	$9,117,334	$1,550,000	EPS002	26	$9,117,334	$364,700	CCF39	26	$9,117,334	$364,700	14-25	26	$9,117,334	$634,600	26	$0	$0	SI	$2,914,000
6	CC	1096946960	CASTRO AMAYA EDWIN JAVIER		X																230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1098101480	CHAVARRIA CHAPARRO EDINSON ALBERTO											X							230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$0	14-25	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0	SI	$284,800
8	CC	5613736	CONDE OJEDA RAUL		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1127592492	DELGADO CASTELLANOS SERGIO ANDRES		X																230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
10	CC	1102774962	DIAZ RAMOS CAMILO EDUARDO		X																230301	28	$2,146,667	$343,500	ESSC24	28	$2,146,667	$85,900	CCF39	28	$2,146,667	$85,900	14-25	28	$2,146,667	$149,500	28	$0	$0	SI	$664,800
11	CC	1102774962	DIAZ RAMOS CAMILO EDUARDO										X								230301	2	$153,334	$24,600	ESSC24	2	$153,334	$0	CCF39	2	$153,334	$0	14-25	2	$153,334	$0	2	$0	$0	SI	$24,600
12	CC	13749125	DIAZ RINCON JORGE		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
13	CC	77097078	DIAZ ORTIZ JOSE GUILLERMO		X																230901	30	$3,324,479	$532,000	EPS010	30	$3,324,479	$133,000	CCF39	30	$3,324,479	$133,000	14-25	30	$3,324,479	$231,400	30	$0	$0	SI	$1,029,400
14	CC	13927880	ESPINEL IBAÑEZ CARLOS JULIO		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
15	CC	13928984	ESPINEL IBAÑEZ JAIME		X																230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	SI	$411,500
16	CC	13928984	ESPINEL IBAÑEZ JAIME										X								230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$0	CCF39	2	$94,900	$0	14-25	2	$94,900	$0	2	$0	$0	SI	$15,200
17	CC	13930526	FAJARDO MURILLO JAVIER		X																25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
18	CC	1095946093	FAJARDO UNIVIO JHULY DAYANNA		X																230201	26	$3,438,406	$550,200	EPS005	26	$3,438,406	$137,600	CCF39	26	$3,438,406	$137,600	14-25	26	$3,438,406	$239,400	26	$0	$0	SI	$1,064,800
19	CC	13930401	FERNANDEZ BAUTISTA LUIS ARLEY	X	X																230201	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$854,100	$34,200	14-25	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0	SI	$264,600
20	CC	79183413	FUENTES MILLAN VICTOR MANUEL		X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
21	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO		X							X									25-14	30	$2,295,319	$367,300	EPS037	30	$2,295,319	$91,900	CCF39	30	$2,295,319	$91,900	14-25	30	$2,295,319	$159,800	30	$0	$0	SI	$710,900
22	CC	91275443	GONZALEZ GRANADOS CHRISTIAN EDUARDO		X																230301	30	$6,476,259	$1,101,100	EPS017	30	$6,476,259	$259,100	CCF39	30	$6,476,259	$259,100	14-25	30	$6,476,259	$450,800	30	$0	$0	SI	$2,070,100
23	CC	1098761067	GONZALEZ RUEDA CRISTIAN ORLANDO		X																25-14	30	$5,509,137	$881,500	EPS037	30	$5,509,137	$220,400	CCF39	30	$5,509,137	$220,400	14-25	30	$5,509,137	$383,500	30	$0	$0	SI	$1,705,800
24	CC	1096948176	GUERRERO VALDERRAMA LUIS CARLOS		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
25	PT	2356593	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
26	CC	13926125	GUTIERREZ GUTIERREZ EDUAR ENRIQUE		X																230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
27	CC	91232897	GUTIERREZ PINTO IVAN ALONSO		X																25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF39	30	$2,750,000	$110,000	14-25	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	SI	$851,400
28	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE		X																230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700

2026/01/23 04:14 PM

29	CC	1098150989	HUERTAS TARAZONA JUAN ANTONIO		X																230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
30	CC	13924491	LOPEZ CACERES ANDRES		X																231001	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
31	PT	6197969	MEDINA GOMEZ REIBI ALEXANDER		X																25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
32	CC	1096957709	MENDOZA CARRILLO FARID JHOAN CAMILO		X																230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
33	PT	5393250	MONTOYA CHACON GARDELINO DANTES		X																230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
34	CC	5612669	NIÑO CARVAJAL EDRAS		X																230301	30	$3,310,914	$529,800	EPS037	30	$3,310,914	$132,500	CCF39	30	$3,310,914	$132,500	14-25	30	$3,310,914	$230,500	30	$0	$0	SI	$1,025,300
35	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER		X																25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
36	CC	72240872	ORTIZ ORTIZ SILFREDO		X																230301	30	$2,945,600	$471,300	EPS002	30	$2,945,600	$117,900	CCF39	30	$2,945,600	$117,900	14-25	30	$2,945,600	$205,100	30	$0	$0	SI	$912,200
37	CC	5748006	PARRA PARRA ROBERTO		X																230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	SI	$411,500
38	CC	5748006	PARRA PARRA ROBERTO									X									230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$0	CCF39	2	$94,900	$0	14-25	2	$94,900	$0	2	$0	$0	SI	$15,200
39	CC	1099662522	PINZON NOVA CRISTIAN YESID		X																230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
40	CC	1096954022	PINZON CRISTANCHO YORMAN HALI		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
41	CC	1099662017	ROA QUINTERO WEYMAR YECID		X																25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
42	CC	13926262	RODRIGUEZ GUTIERREZ LEONARDO ENRIQUE	X	X																230201	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF39	6	$284,700	$11,400	14-25	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0	SI	$88,300
43	CC	13928428	RODRIGUEZ AVILA LUIS FRANCISCO		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
44	CC	13929337	RODRIGUEZ JAIMES NIXON YESID		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
45	CC	1096950590	ROJAS SANGUINO LEONARDO		X																25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
46	CC	1095510650	ROMERO MANTILLA PATROCINIO	X	X																230301	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$854,100	$34,200	14-25	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0	SI	$264,600
47	CC	2087411	SANCHEZ CASERES RAUL		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
48	CC	1096957220	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY		X																230301	24	$1,471,680	$235,500	EPS005	24	$1,471,680	$58,900	CCF39	24	$1,471,680	$58,900	14-25	24	$1,471,680	$102,500	24	$0	$0	SI	$455,800
49	CC	1096957220	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY									X									230301	6	$367,920	$58,900	EPS005	6	$367,920	$0	CCF39	6	$367,920	$0	14-25	6	$367,920	$0	6	$0	$0	SI	$58,900
50	CC	1099894523	TARAZONA RANGEL FERMIN ALONSO		X																230301	28	$1,716,960	$274,800	EPS005	28	$1,716,960	$68,700	CCF39	28	$1,716,960	$68,700	14-25	28	$1,716,960	$119,600	28	$0	$0	SI	$531,800
51	CC	1099894523	TARAZONA RANGEL FERMIN ALONSO									X									230301	2	$122,640	$19,700	EPS005	2	$122,640	$0	CCF39	2	$122,640	$0	14-25	2	$122,640	$0	2	$0	$0	SI	$19,700
52	CC	1007551709	TORRES RICO JAIDER ANDRES		X																230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	SI	$411,500
53	CC	1007551709	TORRES RICO JAIDER ANDRES									X									230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$0	CCF39	2	$94,900	$0	14-25	2	$94,900	$0	2	$0	$0	SI	$15,200
54	CC	13922207	TUTIRA DIAZ LIBARDO		X																230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
55	CC	1095827911	VELOZA REYES LAURA CAMILA		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total		Afiliados(49)																					$100,947,849	$16,310,200			$100,947,849	$4,002,800			$100,947,849	$3,945,800			$100,947,849	$6,864,500		$0	$0		$31,123,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740580	3	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 32 28 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	3694059	9497977688	E	2026/01/21	2026/01/23	BANCO DAVIVIENDA	2	$31,162,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				49	$16,310,200	$20,400	$0	$16,330,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$294,400	$400	$0	$294,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$3,977,400	$4,900	$0	$3,982,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$7,857,100	$9,800	$0	$7,866,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,649,300	$4,600	$0	$3,653,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$532,000	$700	$0	$532,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$6,864,500	$8,400	$0	$6,872,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	49	$6,864,500	$8,400	$0	$6,872,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$3,945,800	$4,900	$0	$3,950,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	49	$3,945,800	$4,900	$0	$3,950,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				49	$4,002,800	$5,400	$0	$4,008,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$85,900	$200	$0	$86,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$243,000	$300	$0	$243,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$259,100	$400	$0	$259,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$1,068,400	$1,400	$0	$1,069,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$277,800	$400	$0	$278,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$914,800	$1,200	$0	$916,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,153,800	$1,500	$0	$1,155,300
TOTAL				49	$31,123,300	$39,100	$0	$31,162,400

2026/01/23 04:14 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740580	3	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 32 28 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	73501619	9499610101	E	2026/02/18	2026/02/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$24,939,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13929922	BARAJAS ANAYA MARCO ANTONIO	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
2	CC	5613984	BASTO MURILLO SADY ROBERTO	X						X											25-14	26	$1,764,474	$282,400	EPS005	26	$1,764,474	$70,600	CCF39	26	$1,764,474	$70,600	14-25	26	$1,764,474	$122,900	26	$0	$0	SI	$546,500
3	CC	91487260	CARREÑO SANABRIA ALFONSO	X																	230201	26	$10,530,967	$1,790,400	EPS002	26	$10,530,967	$421,300	CCF39	26	$10,530,967	$421,300	14-25	26	$10,530,967	$733,000	26	$0	$0	SI	$3,366,000
4	CC	1096946960	CASTRO AMAYA EDWIN JAVIER	X																	230201	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF39	18	$1,050,543	$42,100	14-25	18	$1,050,543	$73,200	18	$0	$0	SI	$325,500
5	CC	1098101480	CHAVARRIA CHAPARRO EDINSON ALBERTO											X							230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$0	14-25	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0	SI	$350,300
6	CC	1127592492	DELGADO CASTELLANOS SERGIO ANDRES	X	X					X											230301	18	$1,243,342	$199,000	EPS037	18	$1,243,342	$49,800	CCF39	18	$1,243,342	$49,800	14-25	18	$1,243,342	$86,600	18	$0	$0	SI	$385,200
7	CC	1102774962	DIAZ RAMOS CAMILO EDUARDO	X																	230301	26	$2,197,649	$351,700	ESSC24	26	$2,197,649	$88,000	CCF39	26	$2,197,649	$88,000	14-25	26	$2,197,649	$153,000	26	$0	$0	SI	$680,700
8	CC	13749125	DIAZ RINCON JORGE	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
9	CC	77097078	DIAZ ORTIZ JOSE GUILLERMO	X																	230901	26	$3,028,157	$484,600	EPS010	26	$3,028,157	$121,200	CCF39	26	$3,028,157	$121,200	14-25	26	$3,028,157	$210,800	26	$0	$0	SI	$937,800
10	CC	13927880	ESPINEL IBAÑEZ CARLOS JULIO	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
11	CC	13928984	ESPINEL IBAÑEZ JAIME	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
12	CC	1095946093	FAJARDO UNIVIO JHULY DAYANNA	X																	230201	15	$2,084,864	$333,600	EPS005	15	$2,084,864	$83,400	CCF39	15	$2,084,864	$83,400	14-25	15	$2,084,864	$145,200	15	$0	$0	SI	$645,600
13	CC	1095946093	FAJARDO UNIVIO JHULY DAYANNA											X							230201	3	$277,982	$44,500	EPS005	3	$277,982	$11,200	CCF39	3	$277,982	$0	14-25	3	$277,982	$0	3	$0	$0	SI	$55,700
14	CC	13930401	FERNANDEZ BAUTISTA LUIS ARLEY	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
15	CC	79183413	FUENTES MILLAN VICTOR MANUEL	X																	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
16	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO	X																	25-14	26	$2,010,757	$321,800	EPS037	26	$2,010,757	$80,500	CCF39	26	$2,010,757	$80,500	14-25	26	$2,010,757	$140,000	26	$0	$0	SI	$622,800
17	CC	1098761067	GONZALEZ RUEDA CRISTIAN ORLANDO	X																	25-14	26	$5,018,090	$802,900	EPS037	26	$5,018,090	$200,800	CCF39	26	$5,018,090	$200,800	14-25	26	$5,018,090	$349,300	26	$0	$0	SI	$1,553,800
18	CC	1096948176	GUERRERO VALDERRAMA LUIS CARLOS	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS041	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
19	PT	2356593	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO	X	X																25-14	19	$1,108,907	$177,500	EPS002	19	$1,108,907	$44,400	CCF39	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,108,907	$77,200	19	$0	$0	SI	$343,500
20	CC	91232897	GUTIERREZ PINTO IVAN ALONSO	X																	25-14	26	$2,677,721	$428,500	EPS010	26	$2,677,721	$107,200	CCF39	26	$2,677,721	$107,200	14-25	26	$2,677,721	$186,400	26	$0	$0	SI	$829,300
21	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE	X						X											230301	26	$1,764,474	$282,400	EPS005	26	$1,764,474	$70,600	CCF39	26	$1,764,474	$70,600	14-25	26	$1,764,474	$122,900	26	$0	$0	SI	$546,500
22	CC	1098150989	HUERTAS TARAZONA JUAN ANTONIO	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
23	CC	1099302117	ISAQUITA DUARTE WILMER	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
24	CC	13924491	LOPEZ CACERES ANDRES	X						X											231001	26	$1,764,474	$282,400	EPS005	26	$1,764,474	$70,600	CCF39	26	$1,764,474	$70,600	14-25	26	$1,764,474	$122,900	26	$0	$0	SI	$546,500
25	PT	6197969	MEDINA GOMEZ REIBI ALEXANDER	X						X											25-14	26	$1,764,474	$282,400	EPS041	26	$1,764,474	$70,600	CCF39	26	$1,764,474	$70,600	14-25	26	$1,764,474	$122,900	26	$0	$0	SI	$546,500
26	CC	1096957709	MENDOZA CARRILLO FARID JHOAN CAMILO	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
27	PT	5393250	MONTOYA CHACON GARDELINO DANTES	X	X					X											230301	26	$1,764,474	$282,400	EPS002	26	$1,764,474	$70,600	CCF39	26	$1,764,474	$70,600	14-25	26	$1,764,474	$122,900	26	$0	$0	SI	$546,500
28	CC	5612669	NIÑO CARVAJAL EDRAS	X																	230301	26	$3,015,750	$482,600	EPS037	26	$3,015,750	$120,700	CCF39	26	$3,015,750	$120,700	14-25	26	$3,015,750	$209,900	26	$0	$0	SI	$933,900

aportes en línea

Planilla Resumen

29	CC	72240872	ORTIZ ORTIZ SILFREDO	X						X											230301	17	$1,755,276	$280,900	EPS002	17	$1,755,276	$70,300	CCF39	17	$1,755,276	$70,300	14-25	17	$1,755,276	$122,200	17	$0	$0	SI	$543,700
30	CC	72240872	ORTIZ ORTIZ SILFREDO											X							230301	9	$619,166	$99,100	EPS002	9	$619,166	$24,800	CCF39	9	$619,166	$0	14-25	9	$619,166	$0	9	$0	$0	SI	$123,900
31	CC	5748006	PARRA PARRA ROBERTO	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
32	CC	1099662522	PINZON NOVA CRISTIAN YESID	X						X											230301	26	$1,764,474	$282,400	EPS005	26	$1,764,474	$70,600	CCF39	26	$1,764,474	$70,600	14-25	26	$1,764,474	$122,900	26	$0	$0	SI	$546,500
33	CC	1096954022	PINZON CRISTANCHO YORMAN HALI	X																	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS005	18	$1,050,543	$42,100	CCF39	18	$1,050,543	$42,100	14-25	18	$1,050,543	$73,200	18	$0	$0	SI	$325,500
34	CC	1099662017	ROA QUINTERO WEYMAR YECID	X						X											25-14	26	$1,764,474	$282,400	EPS041	26	$1,764,474	$70,600	CCF39	26	$1,764,474	$70,600	14-25	26	$1,764,474	$122,900	26	$0	$0	SI	$546,500
35	CC	13929337	RODRIGUEZ JAIMES NIXON YESID	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
36	CC	1096950590	ROJAS SANGUINO LEONARDO	X						X											25-14	26	$1,683,163	$269,400	EPS037	26	$1,683,163	$67,400	CCF39	26	$1,683,163	$67,400	14-25	26	$1,683,163	$117,200	26	$0	$0	SI	$521,400
37	CC	1095510650	ROMERO MANTILLA PATROCINIO	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
38	CC	2087411	SANCHEZ CASERES RAUL	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
39	CC	1096957220	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY	X						X											230301	26	$1,683,163	$269,400	EPS005	26	$1,683,163	$67,400	CCF39	26	$1,683,163	$67,400	14-25	26	$1,683,163	$117,200	26	$0	$0	SI	$521,400
40	CC	1007551709	TORRES RICO JAIDER ANDRES	X																	230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS037	24	$1,400,724	$56,100	CCF39	24	$1,400,724	$56,100	14-25	24	$1,400,724	$97,500	24	$0	$0	SI	$433,900
41	CC	1007551709	TORRES RICO JAIDER ANDRES										X								230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$0	CCF39	2	$94,900	$0	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0	SI	$18,700
42	CC	13922207	TUTIRA DIAZ LIBARDO	X						X											230301	26	$1,764,474	$282,400	EPS041	26	$1,764,474	$70,600	CCF39	26	$1,764,474	$70,600	14-25	26	$1,764,474	$122,900	26	$0	$0	SI	$546,500
43	CC	1095827911	VELOZA REYES LAURA CAMILA	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
Total	Afiliados(40)																						$81,181,953	$13,096,400			$81,181,953	$3,244,100			$81,160,126	$3,138,000			$81,181,953	$5,460,600		$0	$0		$24,939,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740580	3	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 32 28 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	73501619	9499610101	E	2026/02/18	2026/02/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$24,939,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				40	$13,096,400	$0	$0	$13,096,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$282,400	$0	$0	$282,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$3,090,100	$0	$0	$3,090,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$5,408,500	$0	$0	$5,408,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$3,830,800	$0	$0	$3,830,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$484,600	$0	$0	$484,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$5,460,600	$0	$0	$5,460,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	40	$5,460,600	$0	$0	$5,460,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$3,138,000	$0	$0	$3,138,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	40	$3,138,000	$0	$0	$3,138,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				40	$3,244,100	$0	$0	$3,244,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$88,000	$0	$0	$88,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$228,400	$0	$0	$228,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$757,400	$0	$0	$757,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$272,500	$0	$0	$272,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$794,900	$0	$0	$794,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,102,900	$0	$0	$1,102,900
TOTAL				40	$24,939,100	$0	$0	$24,939,100

2026/02/18 02:37 PM
