FECHA (D/M/A): 13-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO. CANTIDAD: 4,85TON

ZONA: CINCO.

COMUNA: EL POBLADO

BARRIO: DIAMANTE N2

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 3:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: LLUVIA BAJA INTENSIDAD HASTA 10:00 AM

TARDE: NUBLADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL EN LA CL 78SUR ENTRE CR35 Y CR37 CON APOYO DE LA AUX VIAL PARA CANALIZAR EL FLUJO VEHICULAR.

SE INTERVIENEN BACHES UNO Y DOS EN LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN EN MEDIO DE LLUVIA DE BAJA INTENSIDAD, EL BACHE 1 SE INTERVIENE JUNTO A LA PATRULLERA QUE RONDABA EL DESPRENDIMIENTO DE LA CARPETA GARANTIZANDO UN BACHE DURADERO.

EN EL BACHE SE ENCUENTRO FALLO DEBIDO A UNA ANTIGUA RAIZOMA O RAIZ DE UN ARBOL TALADO, EL CUAL SE PROFUNDIZABA HASTA 0,50M. DICHO FALLO SE CUBRIO CON ESCOMBROS PRODUCTO DE LA OBRA Y PARTE DE LA BASE DEL BACHE. FACILITANDO SU COMPACTACIÓN MANUAL.

EL RESTO DE ACTIVIDADES TRANSCURREN CON NORMALIDAD

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	JOHN FREDY RIVERA Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JAIME ALONSO VERA RODRIGUEZ	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMON URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	V		
10	Ayudante	FABER MUÑOZ	X		
11	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	ALBEIRO ANTONIO	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Conductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	WILSON ALZATE	X		
30	AUX VIAL	LEIDY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQUARNA LP 6500 I	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	HONDA	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SRP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 676	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5017889	165820	1	CL 18SUR CR 35	2,52	3,78	0,135	9,53	1,29	3,09
5017889	165821.	2	CL 18SUR 35-56	2,77	1,27	0,115	3,52	0,40	0,97
5017885	165846	3	CR 41AA 18SUR-12	2,60	1,68	0,14	2,35	0,33	0,79
TOTALES							15,40	2,02	4,85

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
533289	SMV676	4,85	4,85	145	24934	SMV676	SENCILLA	1	PAVIMANTAR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-01-2026

10. ESQUEMAS

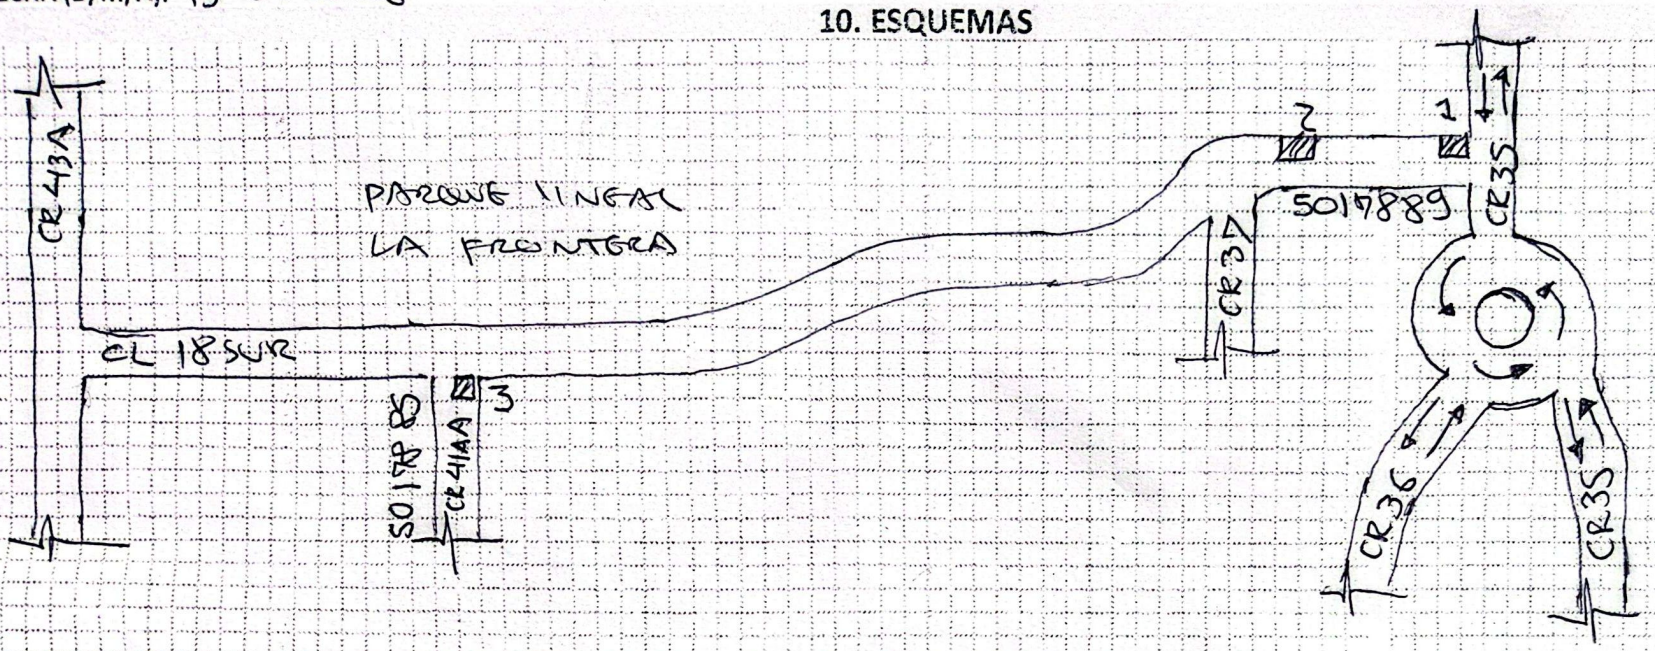

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL BACHES	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4, JSTON
BARRIO	DIAMANTE N2	DIRECCIÓN	CL 18SUR CR 35 CR 41AA 18SUR-17

Powered by CamScanner

20260113 09:06
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533289
PLACA: SNV676
CONDUCTOR: WILSON ALZATE

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia - asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 4,85 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 7.320,00
PESO BRUTO:12.170,00

ENTRADA: 13 ene 2026 - 09:07 a.
SALIDA: 13 ene 2026 - 09:07 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24934

PROVEEDOR: SUM 2055
VALE POR UN VIAJE: Prueba
13/1/26
PLACA No: SNV 676 CAPACIDAD: 3 M3
DESTINO: Pavimentar
RECIBIDO POR: Juan Cano

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner



REMISION DE MATE[illegible] 06:33
PAVIMENTAR[illegible]
NIT: 800.[illegible]
Vigencia [illegible]

TIQUETE DE BASCULA[illegible]
PLACA: SNV876
CONDUCTOR: WILSON ALZATE

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.320,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 14 ene 2026 - 06:37 a.
SALIDA: 14 ene 2026 - 06:37 a.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL [illegible]

FIR[illegible]
CUADRILLA:[illegible]
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 11830
Peso tara : 7320
Peso neto : 4510

Powered by CamScanner
