FECHA (D/M/A): 14-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO

CANTIDAD: 4,84 TON

ZONA: CINCO

COMUNA: PUBLADO

BARRIO: DIAGONAL N 2

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 7:00 AM

TERMINACIÓN: 3:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: NUBLADA

TARDE: NUBLADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE INTERVIENEN BACHES EN MULTIPLES DIRECCIONES POR LO QUE SE OPTA POR SEÑALIZACIÓN PUNTUAL EN CADA UNO DE ELLOS, EL BACHE 1 SE ATIENDE CON PARTE DE LA PATOLOGIA, EL BACHE DOS SE ATIENDE TODA LA PATOLOGIA SE REALIZA TAPA VALVULA EMPALMANDO CON PAVIMENTO SANO, SE ATIENDE BACHE TRES DE FORMA PUNTUAL Y SE ATIENDE BACHE EN EL BARRIO DEL TESORO YA QUE ESTE CONSTITUIDA UN RIESGO PARA LOS ACTORES VIALES.

LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS TRANSCURREN CON ENTERA NORMALIDAD.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Jose Rodriguez	NOMBRE: Edwin D. Correa A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 14-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JAIME ALONSO VERA RODRIGUEZ	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	HELDER PADILLA OSURIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMON URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	FABER QUIROZ	X		
11	Ayudante	ALBERO SUAREZ MANDUCA	X		
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	ALBEIRO ANTONIO	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	HELDER PADILLA OSURIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Conductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	WILSON ATZATE	X		
30	AUXILIAR	YEISY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 6500 I	X		
2	Compresor	INGERSOLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	HONDA FECON 6X	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camion	SZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 676	X		

FECHA (D/M/A): 14-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5017887	161657	1A	CL 18B SUR 39A-139	1,56	0,95	0,10	1,48	0,15	0,36 ✓
5017887	161657	1B	CL 18B SUR 39A-139	2,48	2,01	0,10	4,98	0,50	4,20 ✓
5017900	122093	2A	CL 20 SUR 35-15	2,06	1,34	0,13	2,76	0,36	0,86 ✓
5017900	122093	2B	CL 20 SUR 35-15	3,70	1,77	0,13	6,55	0,85	2,04 ✓
5017885	165841	3	CR 41AA 18 SUR-35	1,01	0,70	0,11	0,71	0,08	0,19 ✓
4001070	165822	4	CL 15 SUR 29-251	1,30	0,60	0,10	0,78	0,08	0,19 ✓
TOTALES							17,26	2,01	4,84 ✓

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235762	SMV 676	4,84	4,84	142

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24935 ✓	SMV 676	SENCILLA	1	PROCAPCOL ✓

FECHA (D/M/A): 14-01-2026

10. ESQUEMAS

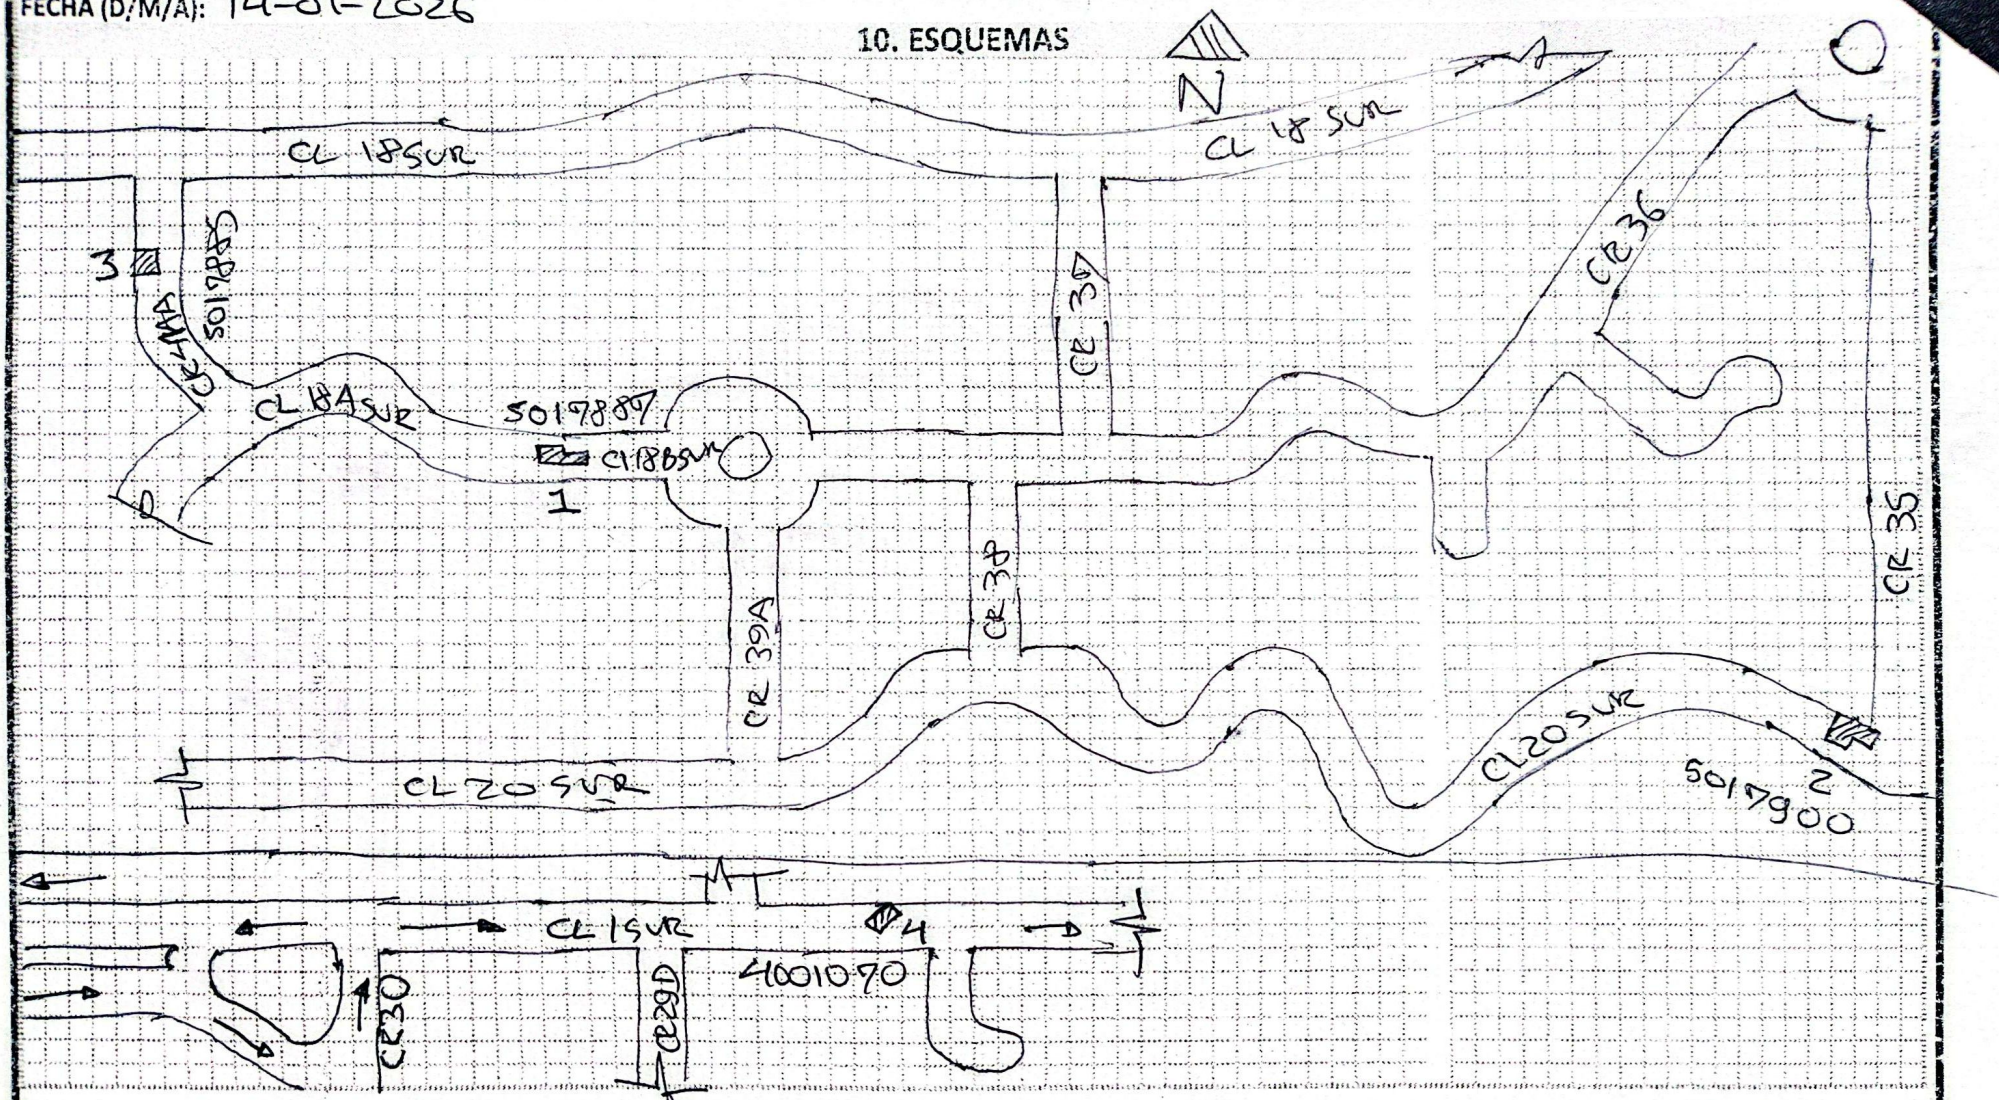

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,84 TON ✓
BARRIO	DIAMANTE N2	DIRECCIÓN	MULTIPLES DIRECCIONES

PAVNS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

FECHA: 14/01/2026

HORA: 8:12:52 AM

CONDUCTOR: WILSON ALZATE

PLACA: SMV676

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 12.40 Tonnes

PESO TARA: 7.56 Tonnes

PESO NETO: 4.84 Tonnes

TEMPERATURA:

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.84 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 24935**

PROVEEDOR: SUM 2080

VALE POR UN VIAJE: Excabas

14/1/26

PLACA No: SMV 676 CAPACIDAD: _____ M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

TIQUETE DE BASCULA: 235762

FECHA: 14/01/2026

HORA: 8:12:52 AM

CONDUCTOR: WILSON ALZATE

PLACA: SMV676

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.40 Tonnes

PESO TARA: 7.56 Tonnes

PESO NETO: 4.84 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140 °C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.84 Tonnes
