FECHA (D/M/A): 19-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL BACHES

RANGO: CERO

CANTIDAD: 4186 TON

ZONA: CINCO

COMUNA: EL POBLADO

BARRIO: LOS BALSOS N2

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 2:30 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO.

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL EN LA CR35 PARA INTERVENIR BACHE DOS, CONTROLANDO EL TRAFICO VEHICULAR CON AYUDA DE UNA AUX VIAL. LOS BACHES UNO, TRES, CUATRO Y CINCO ESTAN SOBRE CARPETA BASTANTE FRACTURADA SE ATIENDE EL BACHE ABARCANDO LA PATOLOGIA MAS SEVERA. SE ATIENDE BACHE SEIS EN UN SEGMENTO DIFERENTE AL IGUAL QUE LAS MITIGACIONES SOBRE LA CL 45 SUR DEBIDO A QUE CONSTITUIAN UN RIESGO PARA LOS ACTORES VIALES. LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA TRANSCURREN CON NORMALIDAD. LA MEZCLA ASFALTICA LLEGO AL FRENTE A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A LA REQUERIDA POR PLANTA DEBIDO A QUE ESTA PRESENTABA APARENTEMENTE UN CONTENIDO SUPERIOR DE LIGANTE ASFALTICO LO QUE AFECTABA LA TRABAJABILIDAD DE LA MISMA.

EL BACHE CINCO QUEDA EN PRIMERA CAPA; LA CUAL DEBE SER REPROGRAMADO.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	JOHN FREDY RINCON Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	JAIME ALONSO VERA RODRIGUEZ	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	FABER CORTEZ	X		
11	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	ALBEIRO ANTONIO	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	WILSON ALZATE	X		
30	NX UAM	LEIDY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 65001	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	HONDA 200X FECOM	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SEP 329 CHE VAOLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 676 INTERNA CHUNTE	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 9-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4003483	150813	1A	CR 35 CL7A SUR	1,94	1,17	0,13	2,27	0,30	0,71
4003483	150813	1B	CR 35 CL7A SUR	1,31	1,87	0,13	2,45	0,32	0,76
4004461	157257	2	CR 35 SSUR-350	1,97	1,17	0,09	2,07	0,19	0,45
4003483	150817	3	(CR 35) CL7A SUR 35-45	2,71	3,14	0,075	8,51	0,64	1,53
4003483	165986	4A	CL7A SUR 35-55	2,46	0,96	0,08	2,36	0,19	0,45
4003483	165986	4B	CL7A SUR 35-55	1,17	1,65	0,08	1,93	0,15	0,37
4003483	165987	5A	CL7A SUR 35-50	1,41	0,71	0,05	1,00	0,05	0,12
4003483	165987	5B	CL7A SUR 35-50	0,97	2,52	0,05	2,44	0,12	0,29
5003560	163368	6	CL 2SUR 35-09	0,71	0,60	0,13	0,43	0,06	0,13
4001038	165892	7	CL4SUR 43AA-26	0,40	0,80	0,04	0,32	0,01	0,03
4001038	165988	8	CL4SUR 43A-10	0,25	0,25	0,11	0,06	0,01	0,02
TOTALES							23,85	2,03	4,86 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235836 ✓	SMV676	4,86	4,86 ✓	142


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24938 ✓	SMV 676	SENCILLA	1	PROCOPAL ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-01-2026

10. ESQUEMAS

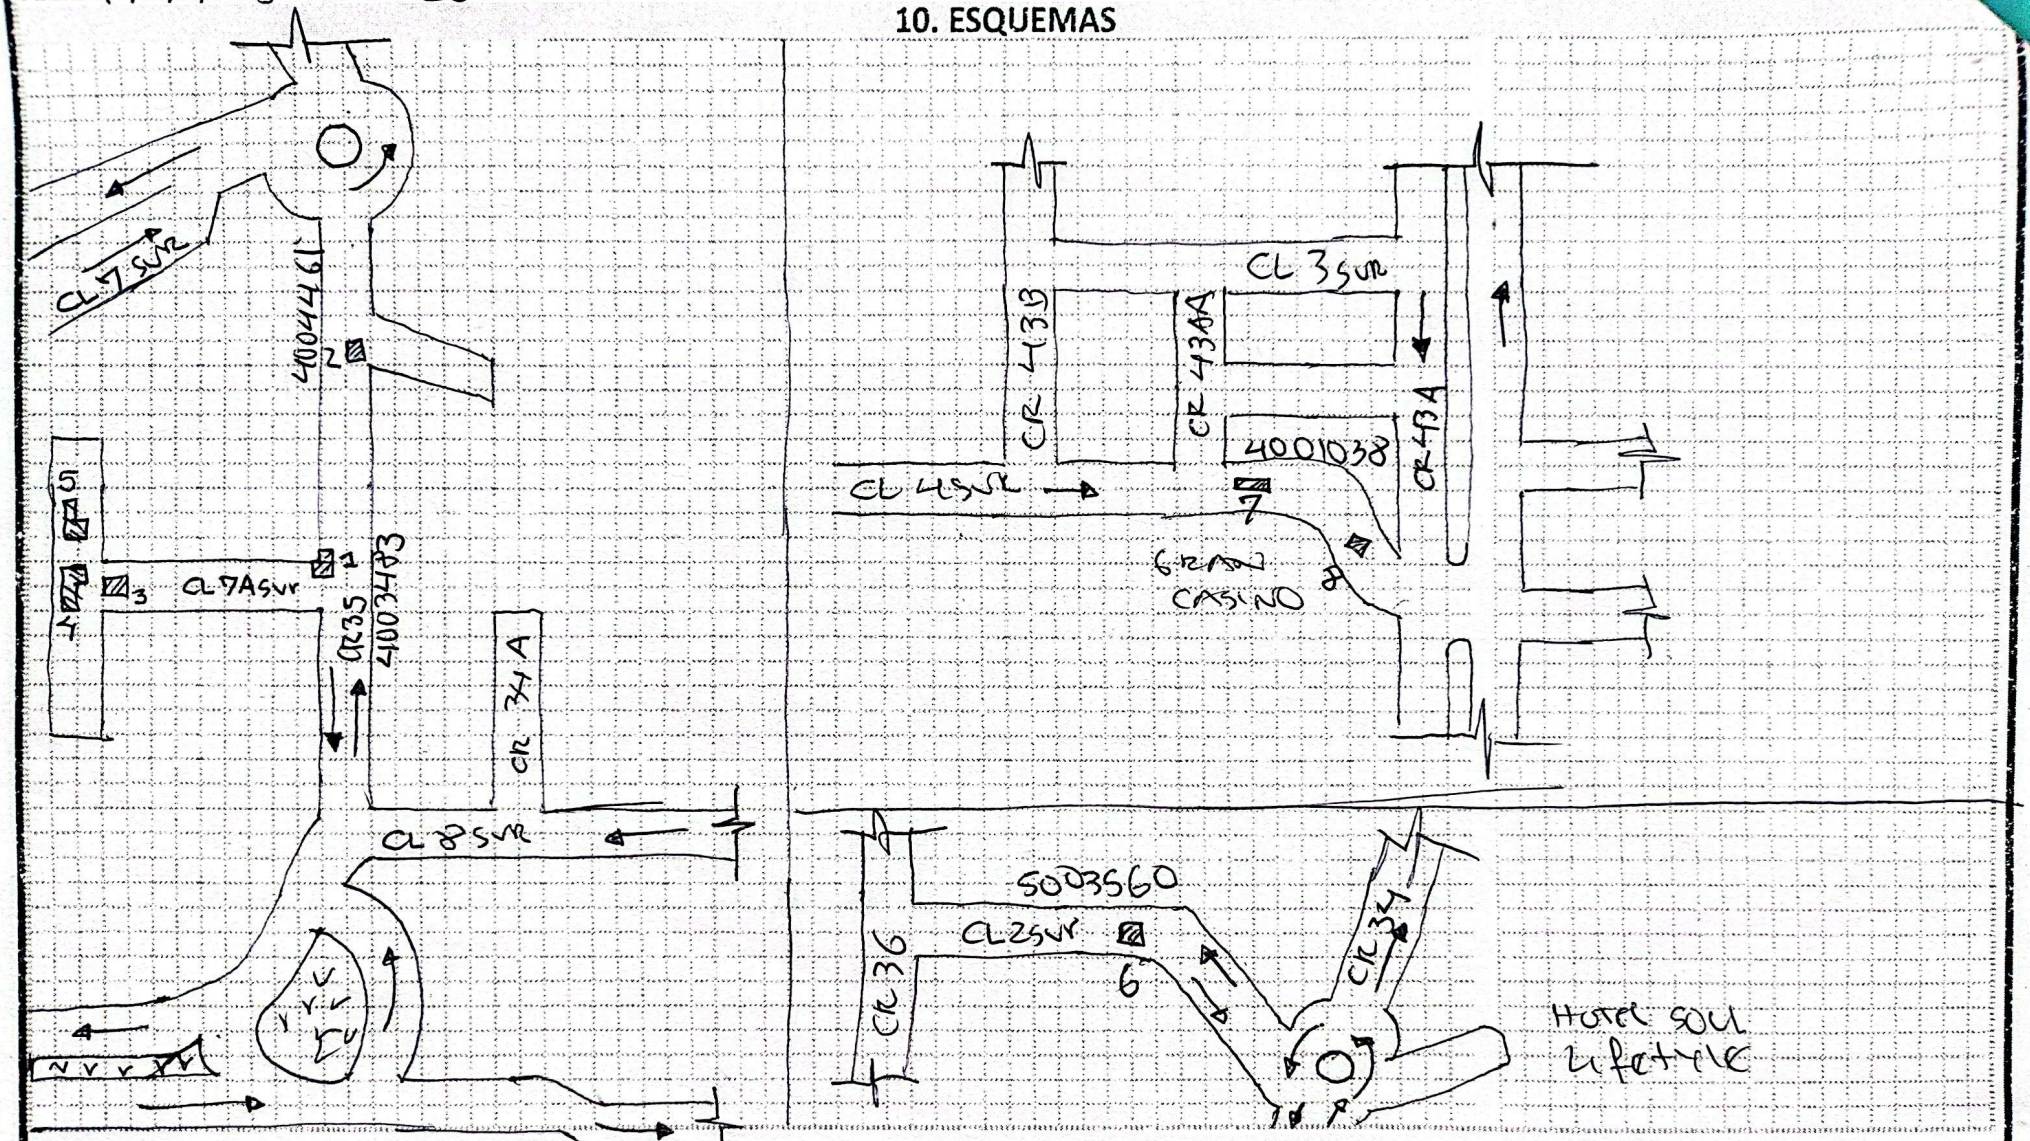

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL PARCHEO	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4 18 TON ✓
BARRIO	LOS BALSOS N 2	DIRECCIÓN	CR 35 ENTRE CL 7A SUR Y CL 5 SUR

Powered by CamScanner

EST y PAVS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 235834

FECHA: 19/01/2026

HORA: 9:04:18 AM

CONDUCTOR: WILSON ALZATE

PLACA: SMV676

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.388-0

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.43 Tonnes

PESO TARA: 7.57 Tonnes

PESO NETO: 4.86 Tonnes ✓

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.86 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24938 ✓

PROVEEDOR: SUM 2059

VALE POR UN VIAJE: Econ 501

PLACA No: SMV 672 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO:

RECIBIDO POR:

19/1/26

PROCOPAL S.A.
20 ENE 2026
DESPACHOS

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
