FECHA (D/M/A): 20-01-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: 0	CANTIDAD: 4180 TON
ZONA	TRES
COMUNA	1A CANDELARIA
BARRIO	BOSTON
FRENTE DE TRABAJO:	2

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005877 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 7:00 AM

TERMINACIÓN: 3:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE INICIAL DE UN CARRIL SOBRE LA CL50 ENTRE CR39 Y CR 40. Y A MEDIDA QUE AVANZAMOS SE REALIZO EL CIERRE DEL CARRIL CENTRAL DESVIANDO EL TRAFICO VEHICULAR POR EL CARRIL RESTANTE; LO CUAL FUE NECESARIO. TRASLADAR EN LAS HORAS DE LA MAÑANA EL PARADERO DE BUSES DE SANTA ELENA

SE INTERVIENE BACHES SOLICITADOS POR LA SIF SOBRE LA CR 50 ENTRE EL CL44 Y CL45 YA QUE CONSTITUIAN UN RIESGO PARA LOS ACTORES VIALES.

SE INTERVIENE BACHE SOBRE LA CR42 49-29 YA QUE ESTE CONSTITUIA RIESGO INMINENTE PARA VEHICULOS Y PEATONES.

EN TOTAL SE INTERVIENEN OCHO BACHES DISPERSOS POR LA ZONA CENTRO ATENDIENDO LOS MAS PRIORITARIOS IGUALMENTE ESTA PENDIENTE POR ATENDER EN LA CL48 CON CR42.

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA TRANSCURREN CON NORMALIDAD

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): (19-) 20-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JAIME ALONSO VERA RODRIGUEZ	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMON URIAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	FABER QUIROZ	X		
11	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	ALBEIRO ANTONIO	X		
17	Operador compresor	JAIME RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILMAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	WILSON MAZATE	X		
30	AUX VIAL	IFINY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQUARNA LP 6500I	X		
2	Compresor	INGER SOLLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	HONDA 200X FECOM	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET			
16	Volqueta(s)	SMV 676 INTERNACIONAL	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4004484	166050	1	CR 50 CL 44 - 19	0,60	1,85	0,11	1,11	0,12	0,29
4004485	166051	2	CR 50 CL 44 - 91	0,50	1,25	0,10	0,63	0,06	0,15
4004241	165802	3	CL 50 39 - 65	0,91	5,23	0,15	4,76	0,71	1,71
5007689	166053	4	CL 49A 39 - 112	3,22	2,11	0,13	6,79	0,88	2,12
5007689	158280	5	CL 49A 39 - 105	3,25	0,70	0,03	2,28	0,09	0,16
5007686	161684	6	CR 49 49 - 29	0,73	1,55	0,12	1,13	0,14	0,33
4004218	165955	7	CR 39 51 - 30	0,30	0,50	0,03	0,15	0,005	0,01
4004218	166052	8	CR 39 51 - 34	0,60	0,60	0,03	0,36	0,07	0,03
TOTALES							17,21	2,00	4,80 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235843	SMV 676	4,80 ✓	4,80	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24939 ✓	SMV 676	SENCILLA	1	procopal ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20 - 01 - 2026

10. ESQUEMAS

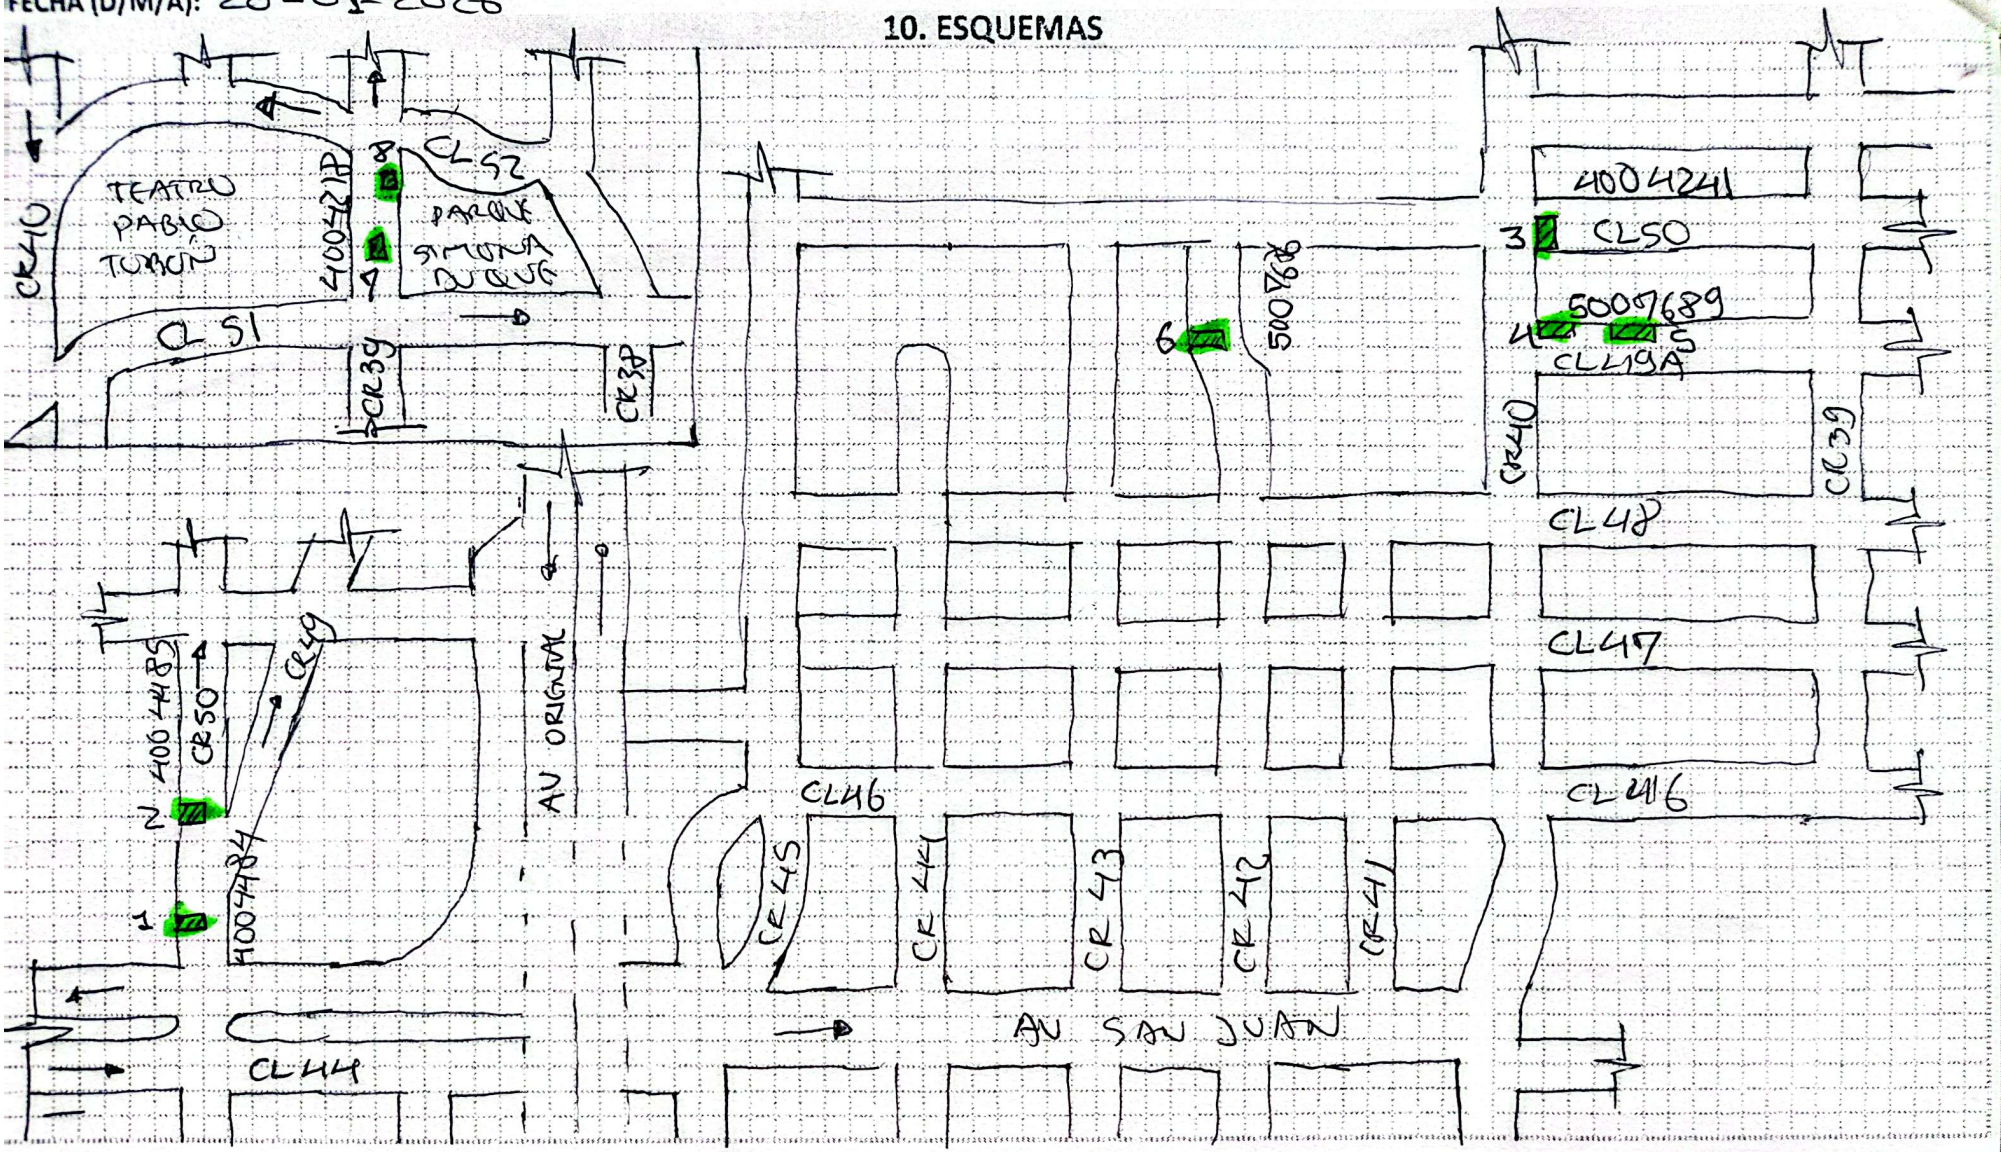

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL PARCHEO	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,80 TON
BARRIO	BOSTON	DIRECCIÓN	MULTIPLES DIRECCIONES

Powered by CamScanner

EST Y PAVNS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235843 ✓

FECHA: 20/01/2026

HORA: 7:13:52 AM

CONDUCTOR: WILSON ALZATE

PLACA: SMV676

OBRA: 230

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 12.37 Tonnes

PESO TARA: 7.57 Tonnes

PESO NETO: 4.80 Tonnes ✓

PRODUCTO: 11

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.80 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24939 ✓

PROVEEDOR: SUM 2010

VALE POR UN VIAJE: 8 cambios

PLACA No: SMV 676 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO:

RECIBIDO POR:

20/1/20

PROCOPAL S.A. ✓
NIT. 890.900.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
