FECHA (D/M/A): 23-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1 - Nocturno

CANTIDAD: 12,03 TON

ZONA: Corregimiento

COMUNA: 80

BARRIO: San Antonio de Prado

FRENTE DE TRABAJO: 11

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 08:00 PM.

TERMINACIÓN: 06:00 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Pavimento duro, intervenciones retiradas.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

~~MAÑANA~~: Noche = Despejada

~~TARDE~~:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones para la jornada teniendo en cuenta la solicitud en listado PDF de la SIF, la cual se termina hoy.
Instalación de señalizacion vertical según PMT. —
Instalacion de señalizacion de cerramiento, ubicación de los dos controladoras vial, ubicacion de baño mobil, punto ecologico, camilla, extintor, botiquin —
Marcado corte y demolicion de las intervenciones, una de estas corresponde a un resalto y se al rededor en muy mal estado, este se repondra con las medidas existentes y se programara para pintar lo mas pronto posible. —
Limpieza de las intervenciones y aplicacion de emulsion A.
Aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC 19 tibia con rap de pavimentar con temperatura de planta de 145 °C.
Cargue de escombros a la volqueta, aseo general.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: L. Paulina Castro Ortiz Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	David Alvarez Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA: Cristian D. Parra
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Karolina Castro	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Jose Palencia	✓		
4	Rastrillero	Vilvert Betancourt	✓		
5	Rastrillero	Miguel A Guerra	✓		
6	Ayudante	Tony Polo	✓		
7	Ayudante	Wilson Caicedo	✓		
8	Ayudante	Kaner Ramirez	✓		
9	Ayudante	Jose Palencia	✓		
10	Ayudante	Hector Velez	✓		
11	Ayudante	Julian Agudelo	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo	✓		
17	Operador compresor	Didier Castaño	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Jose Palencia	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Olmer Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero	✓		
30	Controladora vial	Luz A Jaramillo	✓		
31	Controladora Vial	Juliana Diaz	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Mikasa	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Maimita	✓		
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
6000247	166270	1	CL 41 Sur CR 62B-33	2,30	1,17	0,08	2,69	0,22	0,52
6000195	166271	2A	DG 60E CL 41B SUR-19	4,90	3,20	0,18	15,68	2,82	6,77
6000195	166271	2B	DG 60E CL 41B Sur-19.	2,00	3,00	0,05	6,00	0,30	0,72
6000799	166272	3.	CL 41C Sur CR 60E-03	6,30	1,40	0,19	8,82	1,68	4,02
TOTALES							33,19	5,01	12,03

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
534114	TTO 095	12,03	—	145	25454	TTO 095	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23-01-2026

10. ESQUEMAS

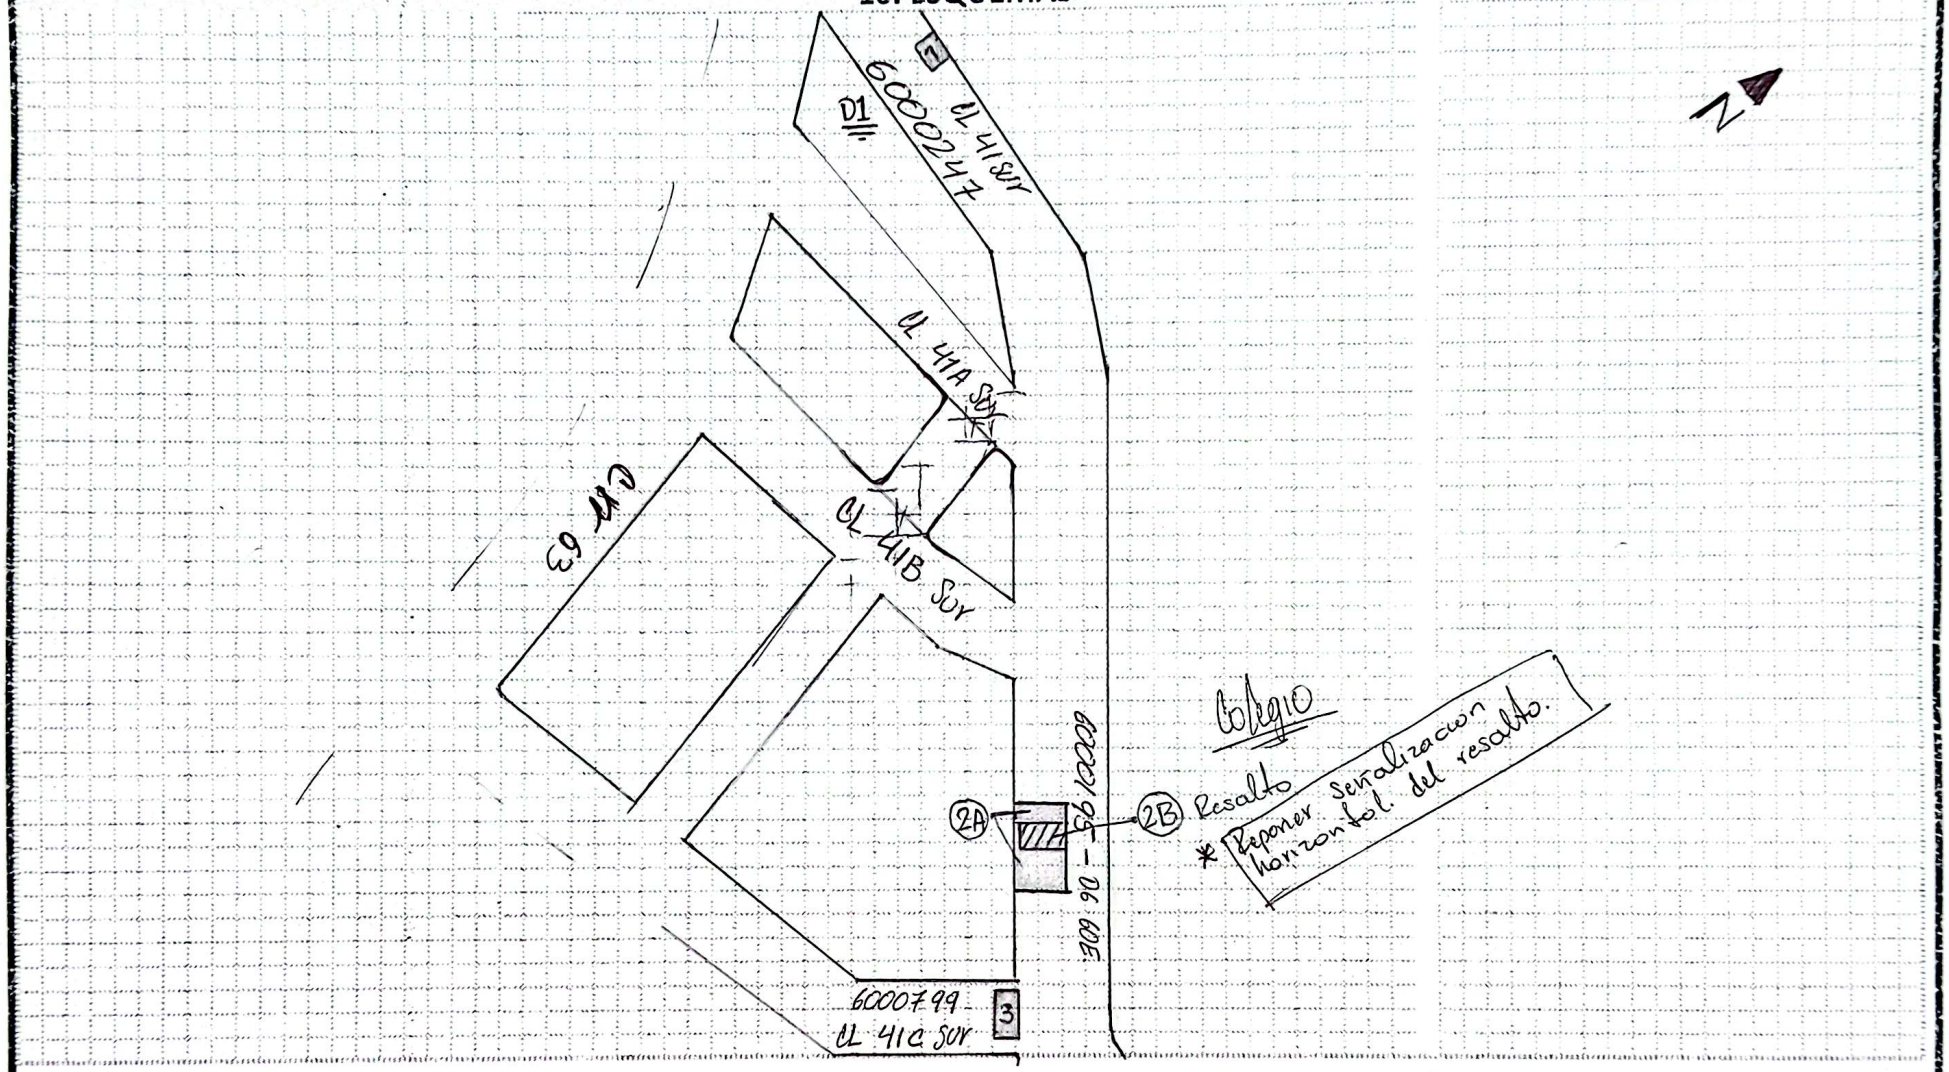

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11
RANGO:	1 - Nocturno	CANTIDAD:	12, 03
BARRIO	San Antonio de prado	DIRECCIÓN	CL 41 SUR CR. 60 y 63.

Powered by CamScanner

20260123 21:40
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 534114
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,03 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED
#2055
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:19.430,00

ENTRADA: 23 ene 2026 - 09:51 p.
SALIDA: 23 ene 2026 - 09:51 p.
TEMPERATURA:145,00

Santiago Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Quintero
FIRMA DEL CONDUCTOR David A.

Yhamilmar CM.
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25454

PROVEEDOR: Sum 2058 Vial med F V
VALE POR UN VIAJE: Escombro
23 Enero 26
PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Tocopal
RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT. 890.500.300-0 David A.

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
