FECHA (D/M/A): 26-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1-Nocturno	CANTIDAD: 10,16 TON
ZONA	5
COMUNA	14
BARRIO	Villa Carlota
FRENTE DE TRABAJO:	11

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 08:00 pm.	Lluvias Constantes de noche y madrugada.
TERMINACIÓN: 06:30 Am	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Noche = lluvias

TARDE: Mañana = Nublada.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones de la jornada junto al contratista.
Instalacion de señalizacion vertical y señalizacion nocturna, esta segunda está muy deficiente, se solicita al contratista mejorar en ese aspecto.
Instalacion de señalizacion de cerramiento, ubicacion de baño mobil, punto ecologico, camilla, extintor, botiquin.
Marcado, corte y demolicion de pavimento, durante este proceso se presentan fuertes lluvias que paran la ejecucion de la obra y mojan considerablemente la base, una vez escampa en horas de la madrugada el contratista seca la base lo que mas se puede con trapeadora y calienta con la pipeta y dragon de gas para la posterior aplicacion de la emulsion asfaltica.
Aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 tibia con rap de pavimentar, Cargue de escombros a la volqueta, aseo general de obra, recogida de herramiento y señalizacion.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Yohana Lina Castro Martinez	David Alvarez
Vo Bo TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE.:
Vo Bo INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Karolina Castro	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Jose Palencia	✓		
4	Rastrillero	Julvert Betancourt	✓		
5	Rastrillero	Miguel A Guerra	✓		
6	Ayudante	Tony Polo	✓		
7	Ayudante	Wilson Caicedo	✓		
8	Ayudante	Kaner Ramirez	✓		
9	Ayudante	Jose Palencia	✓		
10	Ayudante	Hector Velez	✓		
11	Ayudante	Julian Agudelo	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo	✓		
17	Operador compresor	Didier Castaño	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Jose Palencia	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Olmer Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Edison Yaly	✓		
30	Controladora Vial	Luz A. Jaramillo	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Mikasa	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Harmita	✓		
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford Cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-01-2026.

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5003911	166287	1	CL 16A CR 48-67.	3,00	2,00	0,12	6,00	0,72	1,73
5003911	166288	2	CL 16A CR 48-62	1,80	2,60	0,11	4,68	0,51	1,24
5003911	166289.	3	CL 16A CR 48-48	1,20	2,50	0,11	3,00	0,33	0,79.
5003911	166290	4A	CL 16A CR 48-38	3,80	2,30	0,11	8,74	0,96	2,31
5003911	166290	4B	CL 16A CR 48-38	3,85	3,35	0,11	12,90	1,42	3,40
5003911	166292.	5.	CL 16A. CR 48-08.	1,75	1,10	0,15	1,93	0,29.	0,69.
TOTALES							37,24.	4,23	10,16

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
534244	WLW 714	10,16	—	145	25455	WLW 714	Sencillo	1	Procopal.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-01-2026

10. ESQUEMAS

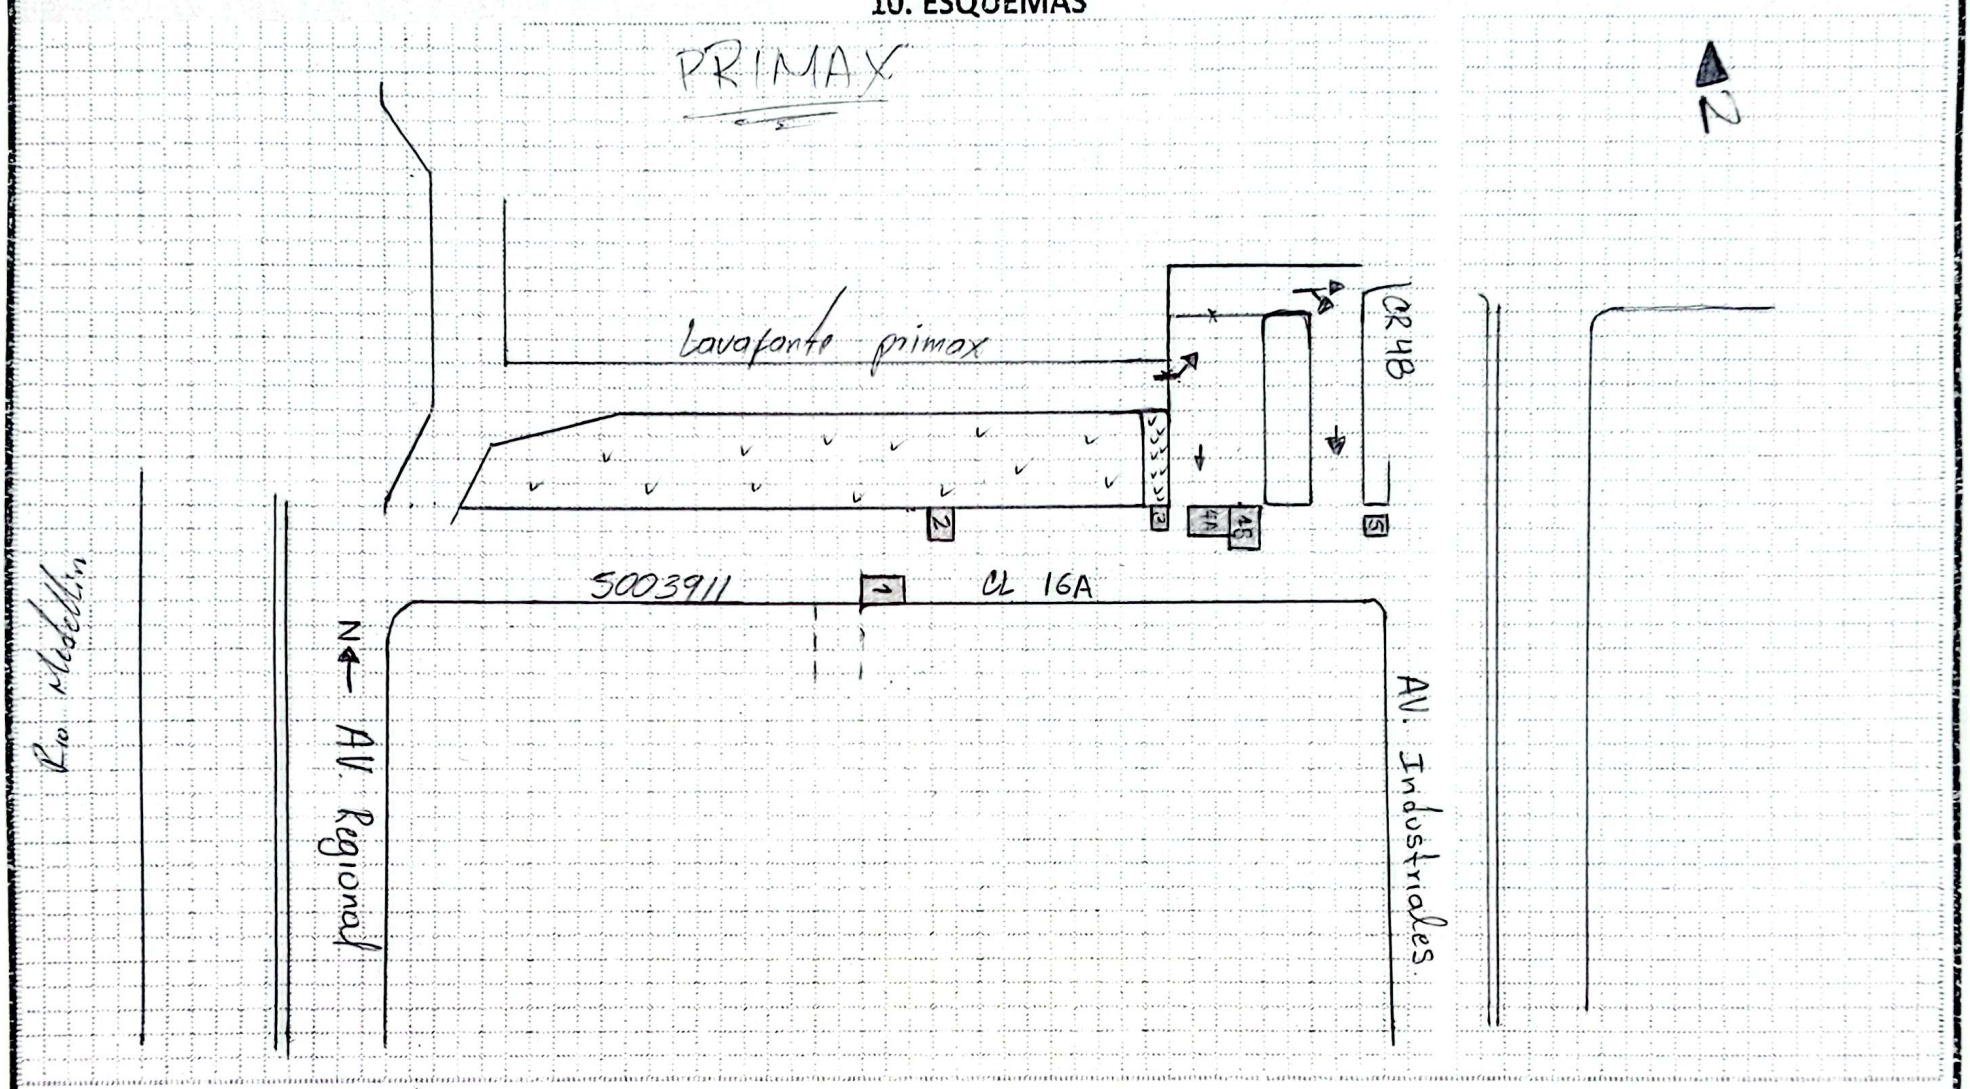

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11
RANGO:	1- Nocturno	CANTIDAD:	10,16 TON
BARRIO	Villa Carlota	DIRECCIÓN	CL 16A CR. 48 y 49.

Powered by CamScanner

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 534244
PLACA: WLW714
CONDUCTOR:

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,16 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALNED
2026 M2149
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:18.070,00

ENTRADA: 26 ene 2026 - 09:16 p.
SALIDA: 26 ene 2026 - 09:16 p.
TEMPERATURA:145,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

1020472702

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 25455**

PROVEEDOR: Sum 2058 Vialmod 7-71
VALE POR UN VIAJE: Escombro
26 Ener 2026
PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Procopal
PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.308-0
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
