FECHA (D/M/A): 27-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 0-Nocturno

CANTIDAD: 4,91 TON

ZONA: 3

COMUNA: 9

BARRIO: La Asomadera #1

FRENTE DE TRABAJO: 11

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 08:00 Pm.

TERMINACIÓN: 03:30 Am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

~~MAÑANA~~: Noche = Despejada

~~TARDE~~:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones de la jornada (via palmas)
Instalacion de señalizacion vertical según PMT.
Instalacion de señalizacion de cerramiento, ubicacion de baño mobil, punto ecologico, camilla, extintor, botiquin...
Marcado, corte y demolicion del pavimento afectado, (junta del puente), limpieza de las intervenciones y acopio de escombros.
Aplicacion de emulsion asfaltica, aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 tibia con rap de pavimento.
Cargue de escombros a la volqueta.
Aseo general de obra
Recogida de herramienta y señalizacion

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Y. Paulina Castro Martinez	Daniel Alvarez.
~~Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA~~	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Karolina Castro	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Jose Palencia	✓		
4	Rastrillero	Yulvert Betancourt	✓		
5	Rastrillero	Miguel A Guerra	✓		
6	Ayudante	Tony Polo	✓		
7	Ayudante	Wilson Calcedo	✓		
8	Ayudante	Kaner Ramirez	✓		
9	Ayudante	Jose Palencia	✓		
10	Ayudante	Hector Velez	✓		
11	Ayudante	Julian Agudelo	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo	✓		
17	Operador compresor	Didier Castaño	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Jose Palencia	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Olmer Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Edison Yaly	✓		
30	Controladora Vial	Luz A Jaramillo	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Mikasa	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2001056	166341	1A	CR 38 CL 29-64	1,40	9,02	0,06	12,63	0,76	1,82
2001056	166341	1B	CR 38 CL 29-64	0,79	9,05	0,18	7,15	1,29	3,09
			TOTALES				19,78	2,04.	4,91

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
534380	WLW 714	4,91	—	145.	25456	WLW 714	Sencilla.	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-01-2026

10. ESQUEMAS

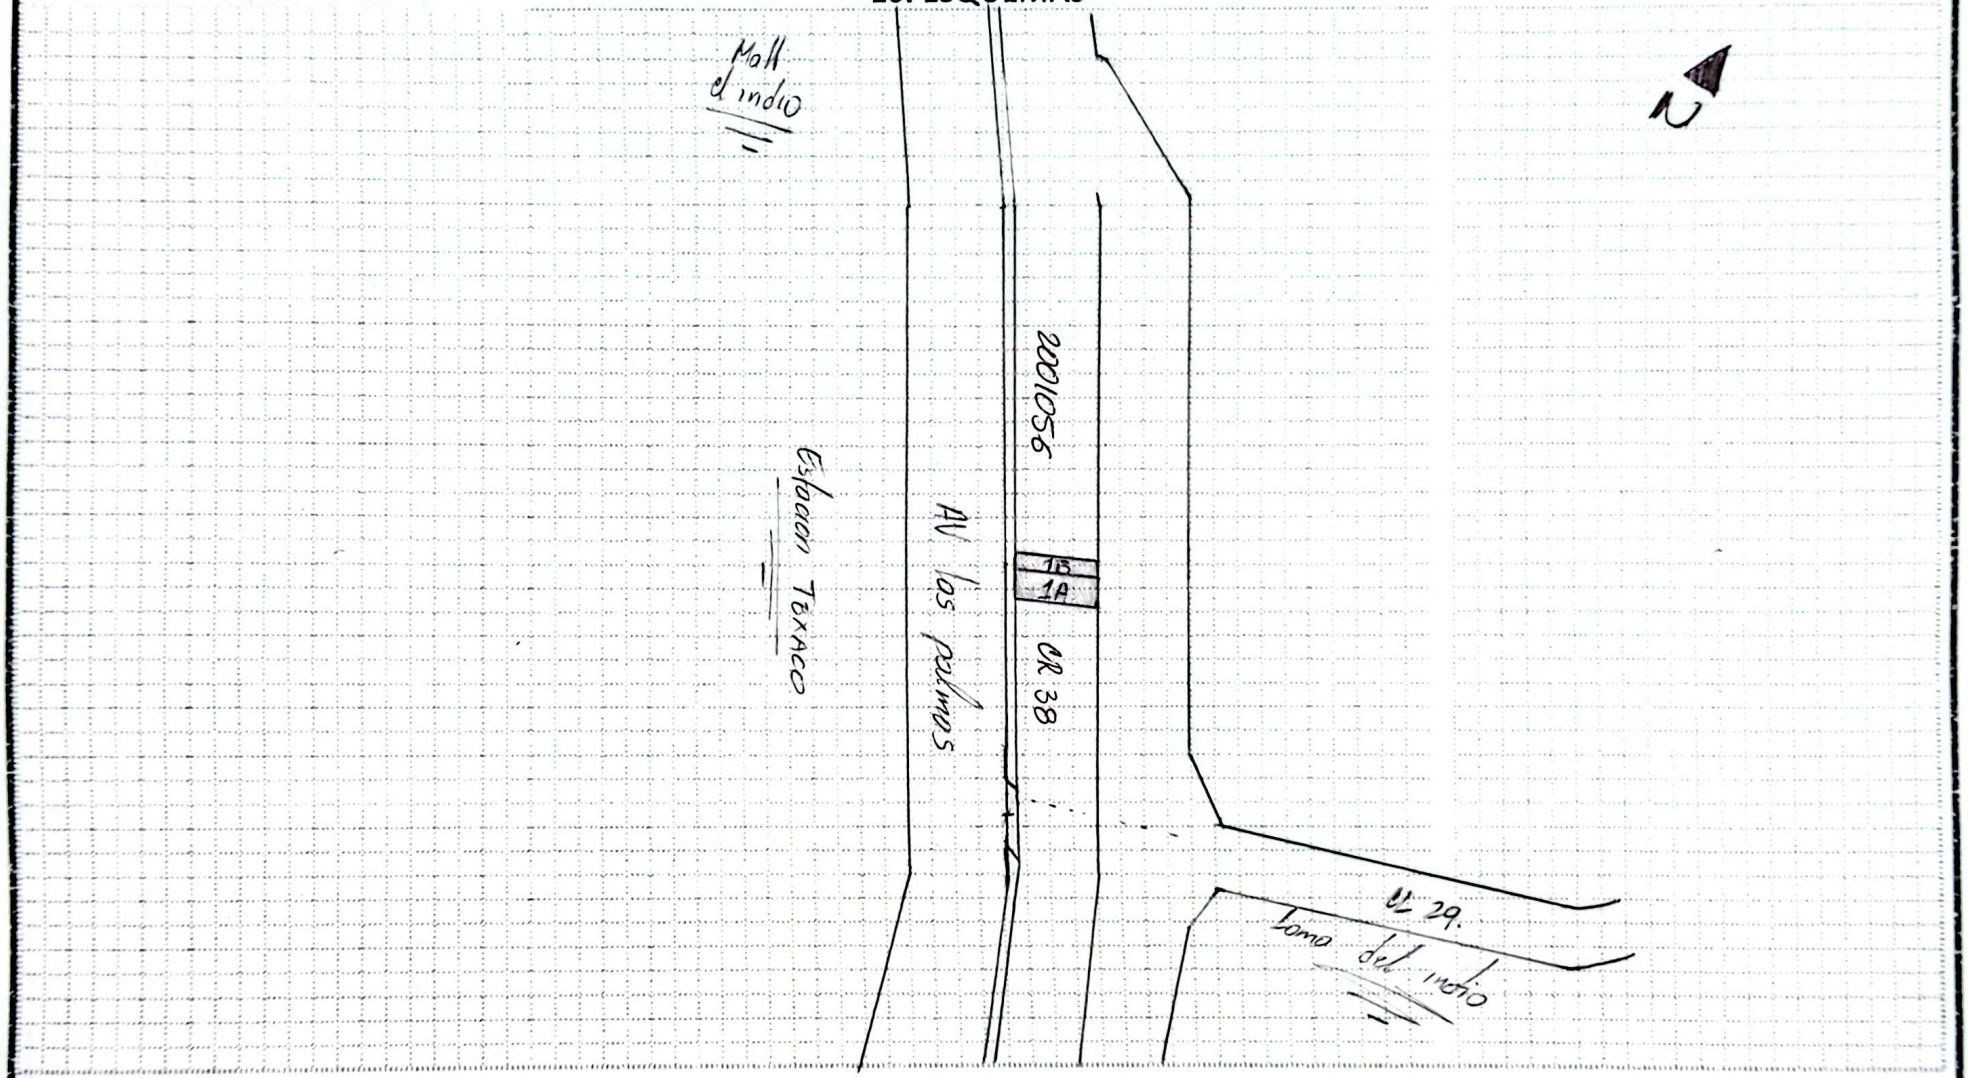

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11
RANGO:	0	CANTIDAD:	4,91 TON
BARRIO	La Asomadera #1	DIRECCIÓN	CR 38 CL 29 y 30

Powered by CamScanner

REMISION DE MATERIALES 20260127 22:38
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 534380
PLACA: WLW714
CONDUCTOR: JHON EDINSON YALY

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 4,91 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:12.820,00

ENTRADA: 27 ene 2026 - 10:46 p.
SALIDA: 27 ene 2026 - 10:46 p.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

REMISION DE MATERIALES 20260127 13:30
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25456
PLACA: WLW714
CONDUCTOR: EDISON YALI

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 28 ene 2026 - 06:27 a.
SALIDA: 28 ene 2026 - 06:27 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 12650
Peso tara : 7910
Peso neto : 4740

Powered by CamScanner
