FECHA (D/M/A): 28-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Rutinario

RANGO: 1- Nocturno

CANTIDAD: 10,17 TON

ZONA: 3

COMUNA: 10

BARRIO: La Candelaria

FRENTE DE TRABAJO: 11

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 08:00 Pm.

TERMINACIÓN: 05:30 Am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

~~MAÑANA~~ Noche = Despejada.

~~TARDE~~

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones para la jornada —
Instalacion de señalizacion vertical según PMT. —
Instalacion de señalizacion de cerramiento, ubicacion de bano mobil, camillo, extintor, botiquin, punto ecologico..
Marcado, corte, demolicion de las intervenciones y limpieza de las mismas. Acopio de escombros. —
Aplicacion de emulsion asfaltica en cada intervencion.
Aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 tibia con rap de pavimentar con temperatura de mezcla al momento del cargue 147°C. y a las 2:50 am. 130°C en campo.
Cargue de escombros a la volqueta —
limpieza general de la obra —
Recogida de herramienta y señalizacion en general.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Yhaulina Castro Martinez Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniel Alvarez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cano A
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 28-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Karolina Castro	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Jose Palencia	✓		
4	Rastrillero	Yulvert Betancourt	✓		
5	Rastrillero	Miguel A Guerra	✓		
6	Ayudante	Tony polo	✓		
7	Ayudante	Wilson Caicedo	✓		
8	Ayudante	Kaner Ramirez	✓		
9	Ayudante	Jose Palencia	✓		
10	Ayudante	Hector velez	✓		
11	Ayudante	Julian agudelo	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo	✓		
17	Operador compresor	Didier Castaño	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Jose Palencia	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Olmer Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Edison Yaly	✓		
30	Controladora Vial	Luz A Jaramillo	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Mikasa	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	Toyama		✓	
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional.	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 28-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5007530	166435	1A	CL 53 CR 49-155	1,85	1,70	0,12	3,15	0,38	0,91
5007530	166435	1B	CL 53 CR 49- 155	2,50	2,00	0,12	5,00	0,60	1,44
5007530	166164	2A	CL 53 CR 49-145	1,80	3,20	0,15	5,76	0,86	2,07
5007530	166164	2B	CL 53 CR 49- 145	2,80	2,10	0,15	5,88	0,88	2,12
5007531	165607	3	CL 53 CR 47-55	4,30	2,20	0,16	9,46	1,51	3,63
TOTALES							29,25	4,24	10,17

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICION
534483	WLW714	10,17	—	147	25457	WLW 714	Sencilla	1	Pavimentos

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 28-01-2026

10. ESQUEMAS

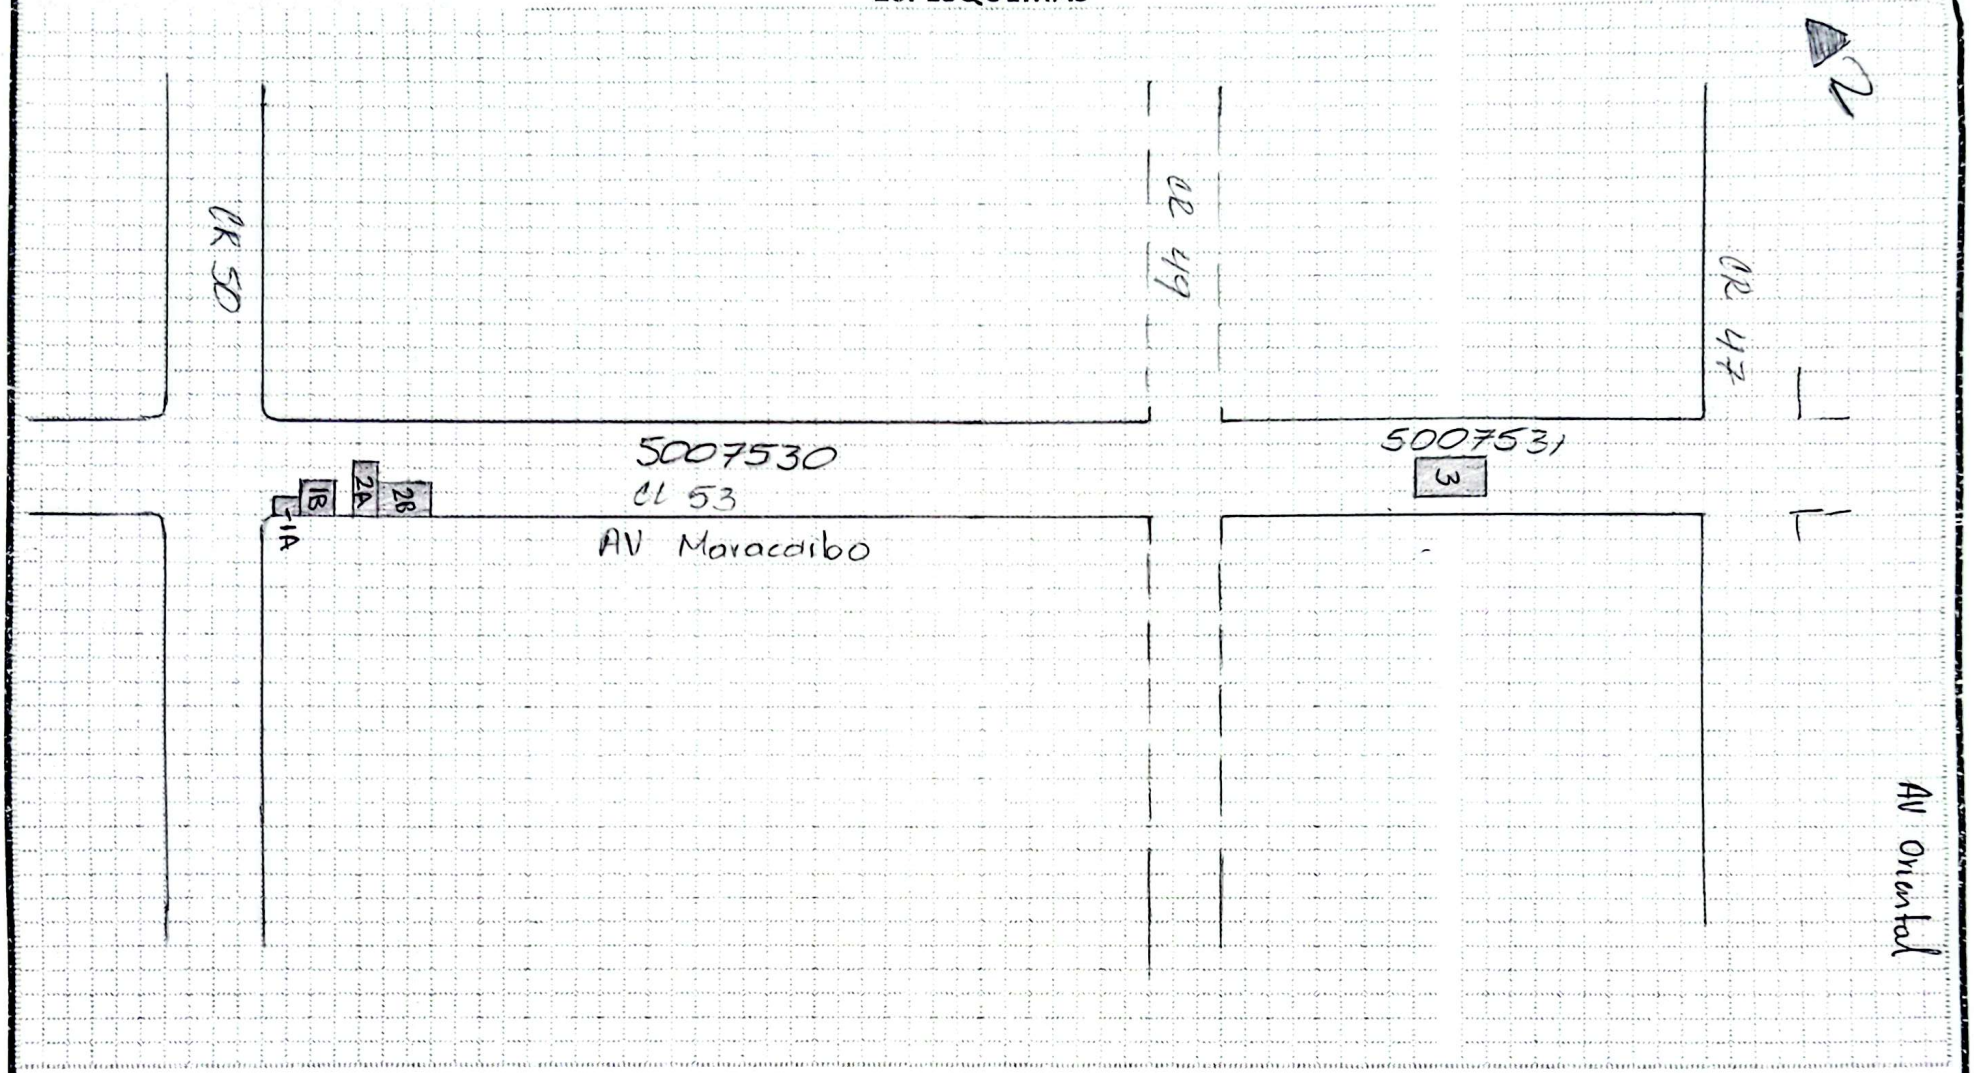

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11
RANGO:	1 - Nocturno	CANTIDAD:	10,17
BARRIO	La Candelaria.	DIRECCIÓN	CL 53 CR 47 y 50

Powered by CamScanner

20260121 00:48

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 534483
PLACA: WLW714
CONDUCTOR: JHON EDINSON YALY

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,17 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:18.080,00

ENTRADA: 28 ene 2026 -m10:12 p.
SALIDA: 28 ene 2026 - m10:12 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260129 07:57

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25457
PLACA: WLW714
CONDUCTOR: EDISON YALI

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 29 ene 2026 -m09:02 a.
SALIDA: 29 ene 2026 - m09:02 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 19180
Peso tara : 7910
Peso neto : 11270

Powered by CamScanner
