FECHA (D/M/A): 30-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual.

RANGO: 1 Nocturno | CANTIDAD: 10,17 TON.

ZONA: 3

COMUNA: 10 - la Candelaria

BARRIO: Perpetuo Socorro

FRENTE DE TRABAJO: 11

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 08: 00 PM.

TERMINACIÓN: 03: 30 Am.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

~~MAÑANA~~ NOCHE = Despejada

~~TARDE~~ MAÑANA = Lluvias Aisladas.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones para la jornada con el contratista.
Instalacion de señalizacion vertical —
Instalacion de señalizacion de cerramiento, ubicacion de baño mobil, punto ecologico, camilla, extintor, botiquin...
Marcado del pavimento a intervenir —
limpieza de las intervenciones y acopio de escombros
Aplicacion de emulsion asfaltica. —
Aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 tibia con Rap de Pavimentar con temperatura de cargue de 148°C.
Cargue de escombros a la volqueta.
limpieza general, recogida de herramienta y señalizacion

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Yikaudina Castro Martinez.	Daniel Alvarez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA: Cristian D. Correa
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 30-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Karolina castro	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Jose Palencia	✓		
4	Rastrillero	Vluert Betancourt	✓		
5	Rastrillero	Migue A. Guerra	✓		
6	Ayudante	Tony Polo	✓		
7	Ayudante	Wilson Caicedo	✓		
8	Ayudante	Kaner Ramirez	✓		
9	Ayudante	Jose Palencia	✓		
10	Ayudante	Hector Velez	✓		
11	Ayudante	Julian Agudelo	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo	✓		
17	Operador compresor	Didier castaño	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimacion	Jose Palencia	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Olmer Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexis Mejia.	✓		
30	Controladora Vial	Luz A Jaramillo	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Mikasa	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	Toyama		✓	
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional Freightliner	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 30-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
3000012	166349	1A	CR 51 CL 35-69.	3,40	2,80	0,14	9,52.	1,33.	3,20
3000012	166349	1B	CR 51 CL 35-69.	3,00	1,80	0,14	5,40	0,76	1,81
3000012	166552.	2A	CR 51 CL 35-74	1,90	1,70	0,15	3,23	0,48	1,16
3000012	166552.	2B	CR 51 CL 35-74	5,50	1,57.	0,15	8,64	1,30	3,11
5003745	166553.	3.	CL 35 CR 51-11	2,10.	1,60.	0,11.	3,36.	0,37.	0,89.
TOTALES							30,15	4,24.	10,17

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
534697	SNZ073	10,17	—	148.


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
	SNZ 073	Sencilla	1	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 30-01-2026

10. ESQUEMAS

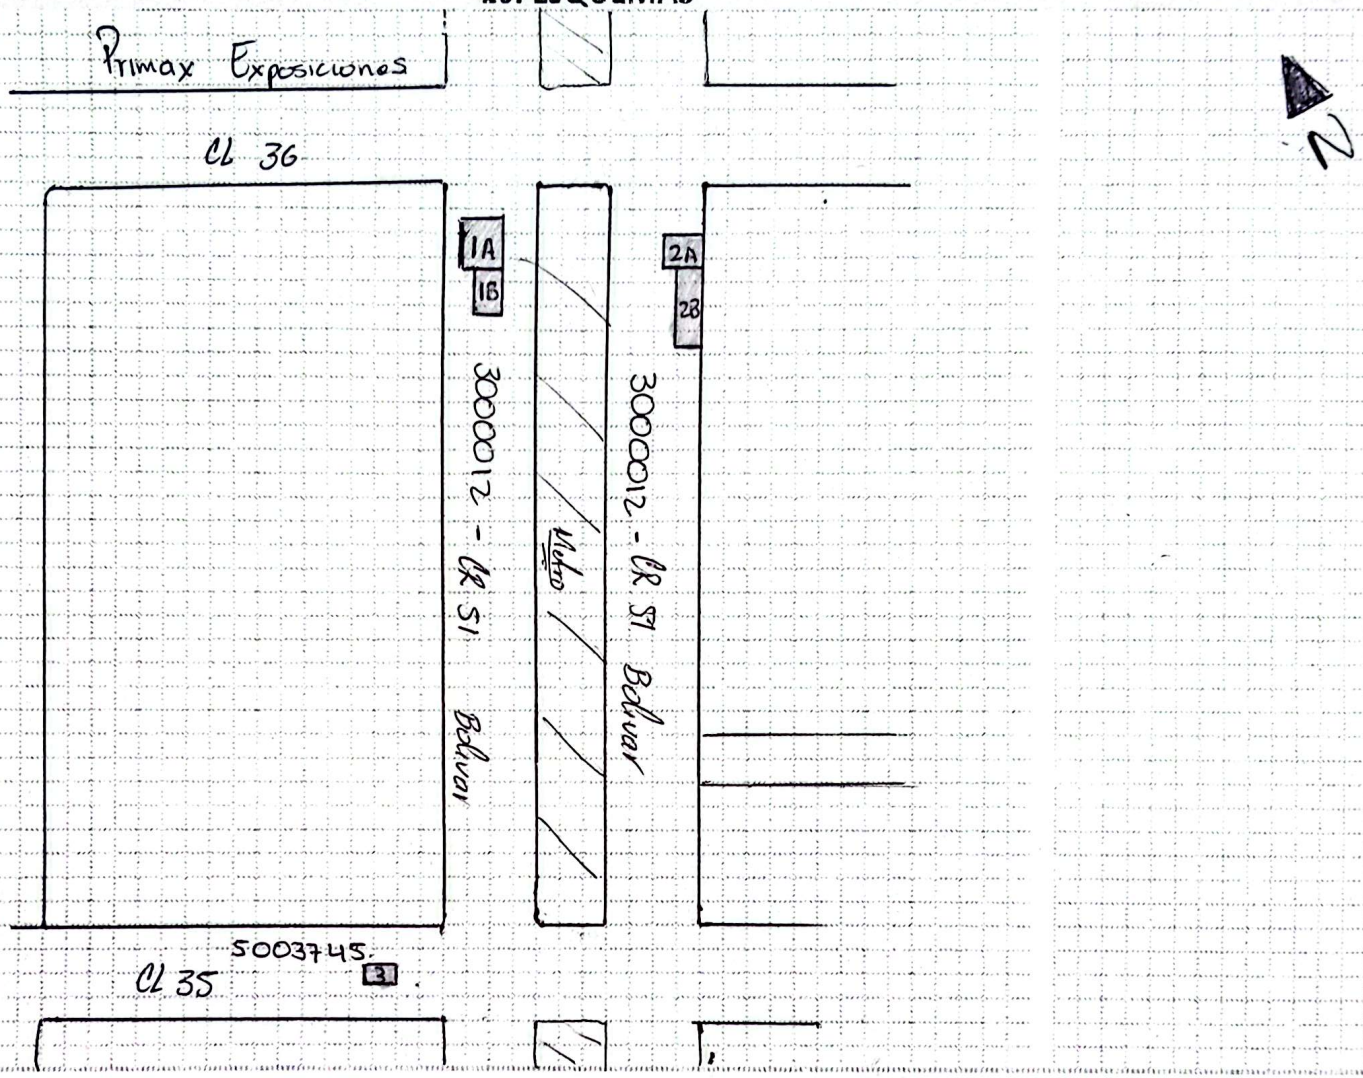

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11
RANGO:	1 - Nocturno	CANTIDAD:	10,17 TON.
BARRIO	Perpetuo Socorro	DIRECCIÓN	CR 51 Cl 35 y 36.

Powered by CamScanner

20260130 21:35

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 534697
PLACA: SNZ073
CONDUCTOR: ALEXIS MEJIA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,17 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 6.800,00
PESO BRUTO:16.970,00

ENTRADA: 30 ene 2026 - 09:36 p.
SALIDA: 30 ene 2026 - 09:36 p.
TEMPERATURA:140,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
-Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260202 12:02

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25460
PLACA: SNZ073
CONDUCTOR: ALEXIS MEJIA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 6.800,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 30 ene 2026 - 12:03 p.
SALIDA: 30 ene 2026 - 12:03 p.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 15460
Peso tara : 7280
Peso neto : 8660

Powered by CamScanner
