FECHA (D/M/A): 13-01-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 12.02
ZONA	4
COMUNA	12
BARRIO	El Velodromo
FRENTE DE TRABAJO:	14

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 Am	
TERMINACIÓN: 03:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Llovia hasta las 9:50 Am

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista se presenta a la hora de inicio para comenzar Actividades, se observan lloviznas moderadas, se da inicio a las actividades de demolicion, las cuales deben ser detenidas a las 8:40 Am debido a la intensidad de las lluvias, siendo las 9:50 Am se logran retomar las Actividades, Durante la ejecucion de estas Actividades se Ejecta señalizacion Horizontal en los siguientes puntos Cl 44A #76-51 Linea de detencion y 4 lineas de paso peatonal, CR77 #44-09 Flecha de giro, y en CR 77 entre Cl 44 - Cl 44A) linea Amarilla de eje central

Visita ambiental Se observa cargue de YCD en volqueta sin lona Banner, se requiere lona Banner para identificación del contrato. Se observa valla Tijera en el frente de obra luego se traslada el personal hacia Cl 45EE entre CR77 - CR77A) Para realizar mitigacion en esta zona que inicialmente tenia reportes para rango 1 pero luego de observar su estado esta se propuso para Rango 4.

5. VISITANTES

Yuli Paola Catalina Martinez. — Jorge Manrique

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga.	Cleiton Perea
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

ECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Uruga			
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Perez	✓		E y P
4	Rastriliero	Johnny Londiño	✓		
5	Rastrillero	Sebastian Toro	✓		
6	Ayudante	Esneider Cerquera Escudero	✓		
7	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		
8	Ayudante	David Manuel Lozano	✓		
9	Ayudante	Yadiri Jenny Perez	✓		
10	Ayudante	Victor Alfonzo Cordoba	✓		
11	Ayudante	Victor Alfonzo Mejia	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jeferson Lopera	✓		
30	Auxiliar Vial	Leidy Ponce	✓		
31	Auxiliar Vial	Paola Aguirre			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ECO ROAD	✓		
2	Compresor	HAESER	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton 3VO 420	✓		
16	Volqueta(s)	ZNM 444 Sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
165819	4002742	1A	CL44A CR76 S1	1,9	3,6	0,15	6,84	1,03	2,46
165819	4002742	1B	CL44A CR76 S1	3,8	3	0,15	11,40	1,71	4,10
165824	5004132	2	CR77 CL44 09	2,95	1,9	0,15	5,61	0,84	2,02
165825	5004132	3	CR77 CL44 21	1,65	1	0,15	1,65	0,25	0,59
165826	5004132	4	CR77 CL44 14	3,2	1	0,15	3,20	0,48	1,15
165827	5004132	5	CR77 CL44 29	3,7	1	0,15	3,70	0,56	1,33
143113	5004250	M2	CLASEE CR77 93	0,5	0,5	0.5 (0,15) 0.05	0,25	0,01	0,03
143113	5004250	M2	CLASEE CR77 97	0,5	0,6	0,05	0,30	0,02	0,04
143113	5004250	M3	CLASEE CR77 95	0,5	0,5	0,07	0,25	0,02	0,04
162554	5004221	M4	CLASEE CR77 73	1,3	1	0,08	1,30	0,10	0,25
TOTALES									12,02

MEZCLA ASFALTICA

REMISION No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
533281	ZNM449	12,02		144


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24517	ZNM449	Sencilla	1	Parimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-01-2023

10. ESQUEMAS

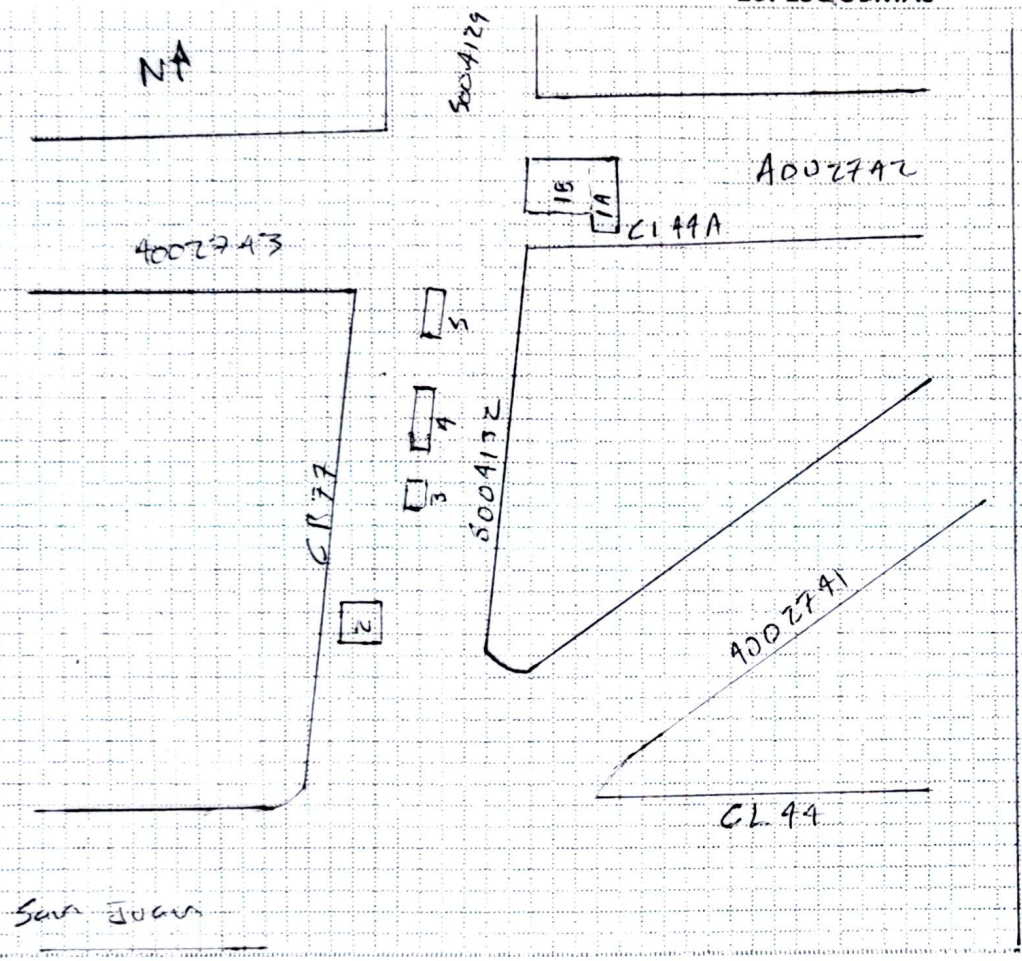

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,02
BARRIO	El velodromo	DIRECCIÓN	CL44A con CR77

Powered by CamScanner

----------20260113 08:42
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533281
PLACA: ZNM449
CONDUCTOR: ALEJANDRO ESTRADA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED
#2055
PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:12.020,00

ENTRADA: 13 ene 2026 -m08:43 a.
SALIDA: 13 ene 2026 - m08:43 a.
TEMPERATURA:144,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Alejandro E
FIRMA DEL CONDUCTOR

Angel Usuga

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20260114 06:27
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 24517
PLACA: ZNM449
CONDUCTOR: ALEJANDRO ETARDA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 14 ene 2026 -m06:33 a.
SALIDA: 14 ene 2026 - m06:33 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Alejandro E
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 18030
Peso tara : 7400
Peso neto : 10630

Powered by CamScanner
