7. Frente de Luis J. José

FECHA (D/M/A): 07-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,02 Ton
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 12	
BARRIO: Calasanz	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 Am	
TERMINACIÓN: 02:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista se Presenta al frente de trabajo siendo las 7 am, se realiza Inspeccion en la zona, replanteo y planteo de los baches a intervenir, se define la Jornada y se Inicio a las Actividades de demolicion. se realiza las intervenciones en los tramos mas Afectados de la zona logrando asi la mitigacion de los puntos mas críticos Para los Actores Viales

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga	Cleyton Perea
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE: Juan J. Burnes R
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Ubeda			
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Perea	✓		E y P
4	Rastrillero	Johnny Londoño	✓		
5	Rastrillero	Sebastian Toro	✓		
6	Ayudante	Esneider Cosquera Escudero	✓		
7	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		
8	Ayudante	Yadiel Leury Perea	✓		
9	Ayudante	Jose Manuel Lozano	✓		
10	Ayudante	Victor Alfonzo Cordoba	✓		
11	Ayudante	Victor Alfonzo Mejia	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jenilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jahn Bedoya	✓		
30	Auxiliar vial	Leidy Pouce	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	ECO ROAD	✓		
2	Compresor	KAESER	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SVO 4520	✓		
16	Volqueta(s)	STH139 Sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000284	165655	1A	CR81A CL51 54	3,8	0,55	0,14	3,23	0,45	1,09
4000284	165655	1B	CR81A CL51 54	1,9	1,3	0,14	2,47	0,35	0,83
4000285	165707	2	CL52 CR81 35	6	1,2	0,14	7,20	1,01	2,42
5006096	165655	3	CL51B CR81A 19	6,7	1,65	0,14	11,06	1,55	3,71
5006096	165695	4	CL51B CR81A 40	2,5	2,6	0,15	6,50	0,98	2,34
5006096	165708	5	CL51B CR81A 35	3,95	1,15	0,15	4,54	0,68	1,64
TOTALES									12,02

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
533078	STH139	12,02		145


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24514	STH139	sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-01-2026

10. ESQUEMAS

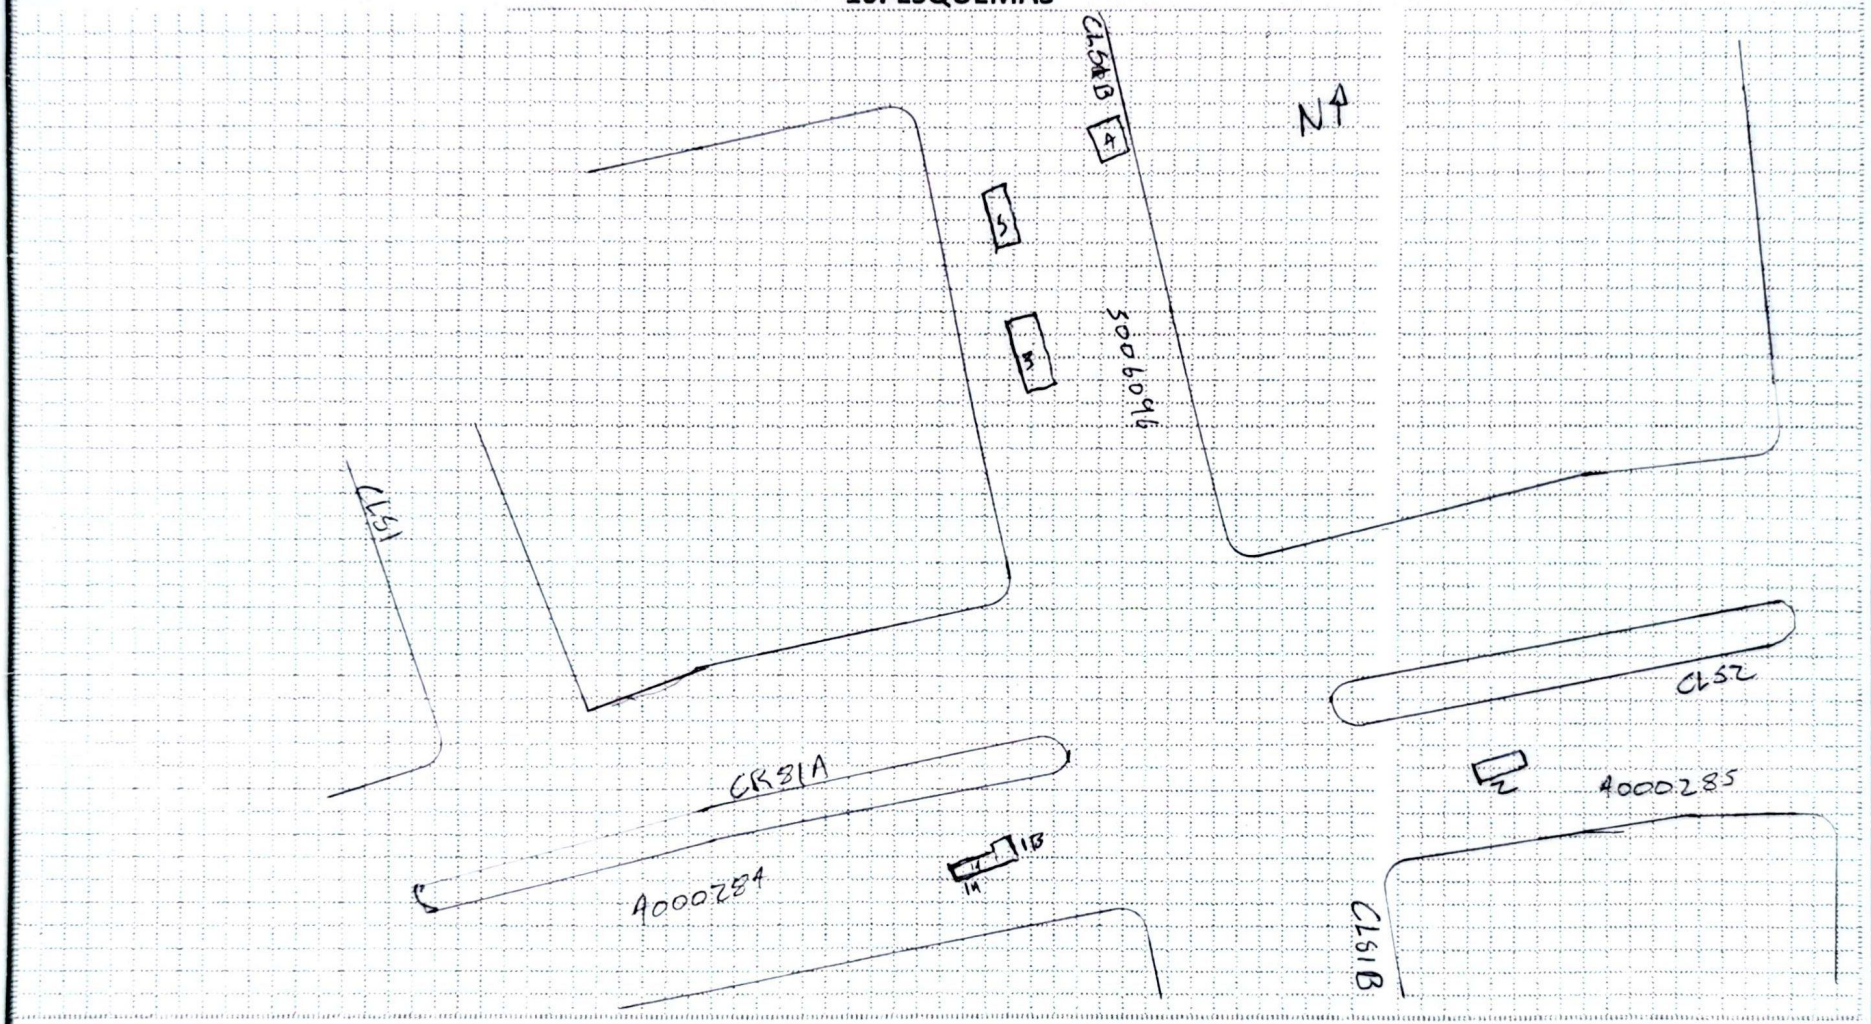

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,02
BARRIO	Calusanz	DIRECCIÓN	CR31A (CL50 - CL51B)

Powered by CamScanner

20260107 00:11

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533078
PLACA: STH139
CONDUCTOR: JHAN BEDOYA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED
#2055
PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:12.020,00

ENTRADA: 07 ene 2026 -m06:00 a.
SALIDA: 07 ene 2026 - m06:00 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Angel Usuga

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260107 12:41

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 24514
PLACA: STH139
CONDUCTOR: JADER BEDOYA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.600,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 07 ene 2026 -m01:41 p.
SALIDA: 07 ene 2026 - m01:41 p.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 18390
Peso tara : 7600
Pesoneto : 10790

Powered by CamScanner
