FECHA (D/M/A): 08-01-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 7	CANTIDAD: 12,04
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 11	
BARRIO: El Velodromo	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 07:00 Am
TERMINACIÓN: 02:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:
MAÑANA: Soleada
TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista se presenta al frente de obra a las 7 am se dispone junto con la interventoria a realizar la marcacion y planteo de los baches a ejecutar, siendo las 8 Am se da inicio a las Actividades de demolicion en los puntos ya establecidos, siendo las 10 Am el Ayudante Jenry Perea sufre un incidente donde un escombro cae sobre su rodilla, es Atendido por el brigadista donde se observa que no tiene Afectaciones visibles que generen gravedad, se deja bajo observacion una hora donde luego el decide continuar sus Actividades, se realiza mitigacion der CR 97 # 45B - 175 Reportado en siro.

5. VISITANTES

Jorge Monsalve - Yilson Perez

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga.	Cleiton Perea
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Tolo	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Usuga			
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Perea	✓		E y P
4	Rastrillero	Johnny Londoño	✓		"
5	Rastrillero	Sebastian Toro	✓		"
6	Ayudante	Esneider Cesquera Escobar	✓		"
7	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		"
8	Ayudante	Yasirl Jenry Perea	✓		"
9	Ayudante	Jose Manuel Lozano	✓		"
10	Ayudante	Victor Alfonzo Cordoba	✓		"
11	Ayudante	Victor Alfonzo Mejia	✓		"
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez			
29	Conductor Volqueta(s)	~~Salvi~~) Jalin			
30	Auxiliar vial	Leidy Ponce			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ECO ROAD	✓		
2	Compresor	KAESER	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	FOTON SVD 420	✓		
16	Volqueta(s)	~~WEX555~~) sencilla STH139	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-01-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5004078	164817	1	CR77 CL45B 115	3	4,55	0,16	13,65	2,18	5,24
5004078	165727	2A	CR77 CL45B 153	3,5	1,2	0,16	4,20	0,67	1,61
5004078	165727	2B	CR77 CL45B 153	1,2	1,9	0,16	2,28	0,36	0,88
5004204	165729	3A	CR77 CL45D 153+2	3,1	2	0,16	6,2	0,99	2,38
5004204	165729	3B	CR77 CL45B 153+2	2,5	1,6	0,16	4	0,64	1,54
500 4078	165745	~~4~~ 4	CR77 CL45B 125	2,2	1,5	0,05	3,3	0,17	0,40
TOTALES									12,04

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
533113	STH139	12,04		144


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICION
24515	~~STH139~~ STH 139	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 08-01-2025

10. ESQUEMAS

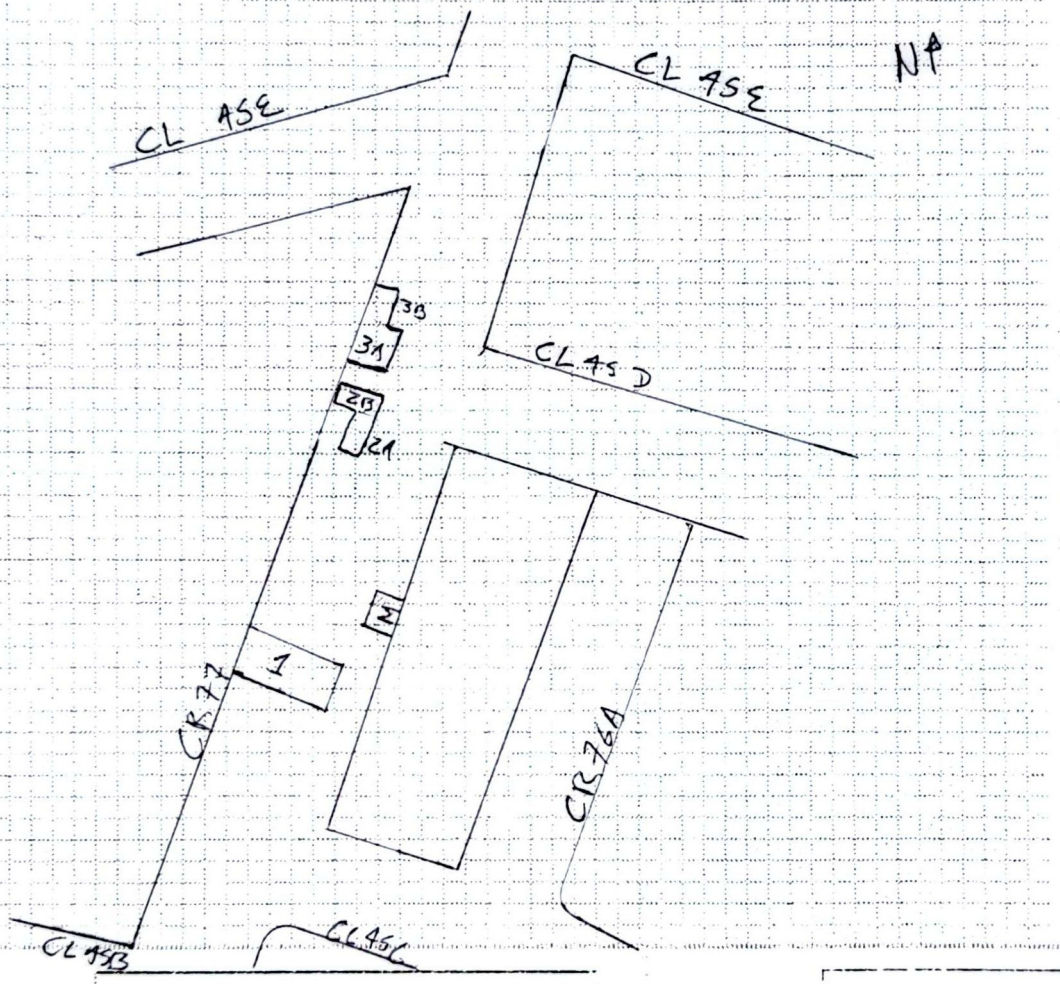

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,04
BARRIO	El Velodromo	DIRECCIÓN	CR 77 (CL 45 - CL 45D)

Powered by CamScanner

20260108 06:15
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 533113
PLACA: STH139
CONDUCTOR: JHAN BEDOYA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,04 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:12.040,00

ENTRADA: 08 ene 2026 -m06:16 a.
SALIDA: 08 ene 2026 - m06:16 a.
TEMPERATURA:144,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Angel Usuga

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260108 11:50
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 24515
PLACA: STH139
CONDUCTOR: JADER BEDOYA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.600,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 08 ene 2026 -m12:35 p.
SALIDA: 08 ene 2026 - m12:35 p.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 16110
Peso tara : 7600
Pesoneto : 8510

Powered by CamScanner
