FECHA (D/M/A): 15-01-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Intervencion puntual

RANGO: 1 CANTIDAD: 1203

ZONA: 4 4

COMUNA: 12 11

BARRIO: LA AMERICA

FRENTE DE TRABAJO: 14

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 07:00 Am

TERMINACIÓN: 02:00 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista inicia sus actividades en la zona programada, se inician las demoliciones de los baches designados, se recibe la mezcla siendo las 9:10 Am con lo que se procede a realizar la terminacion de un bache que estaba en segunda capa de la jornada del dia de Ayer 14-01-26 Luego se procedio a continuar con la toma de espesores donde despues le chequeen se inicia la instalacion de la primera capa para cada uno de los baches, se conduye la instalacion de mezcla en cada uno de los baches de la zona de intervencion. Durante la jornada se vio afectada la siguiente senalizacion horizontal, linea de Eje central durante el tramo vial.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Cristian Perez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Juan J. Bermudez R Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Ubeda	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Pesca	✓		E y P
4	Rastrillero	Johnny Londoño	✓		E y P
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Esneider Cervera Escudero	✓		E y P
7	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		"
8	Ayudante	Manuel Lozano	✓		"
9	Ayudante	Yadiel Jenry Perez	✓		"
10	Ayudante	Victor Alfonzo Cordoba	✓		"
11	Ayudante	victor Alfonzo Mesa	✓		"
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Duvilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jeferson Lopera	✓		
30	Auxiliar vial	Leidy Ponce	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	ECO ROAD	✓		
2	Compresor	KAESER	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marvalco	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton 5VO 4x2	✓		
16	Volqueta(s)	5TH 139 Sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-01-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5005357	165845	4A	CR87 CL42C 35	2,3	1,6	0,06	3,68	0,22	0,53
5005357	165845	4B	CR87 CL42C 35	1,55	3,8	0,06	5,89	0,35	0,85
5005387	165884	1	CR87 CL42C 73	1,35	1,7	0,13	2,30	0,30	0,72
5005C81	165874	2A	CR87 CL42D 05	2,55	3,6	0,13	9,18	1,19	2,86
5005C81	165874	2B	CR87 CL42D 05	1,55	2,2	0,13	3,41	0,44	1,06
5005C81	165855	3	CR87 CL42D 09	4,4	2	0,13	8,80	1,14	2,75
5005081	165858	4A	CR87 CL42D 31	2,3	1,95	0,11	4,28	0,54	1,29
5005C81	165858	4B	CR87 CL42D 31	1,45	2,3	0,11	3,34	0,37	0,88
5005081	165846	5	CR87 CL42D 59	4,15	1	0,11	4,15	0,46	1,10
TOTALES									17,03

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
595723	STH139	12,04		140°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
74514	STH139	Sencilla 7.0M3	1	Acopel

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-01-2026

10. ESQUEMAS

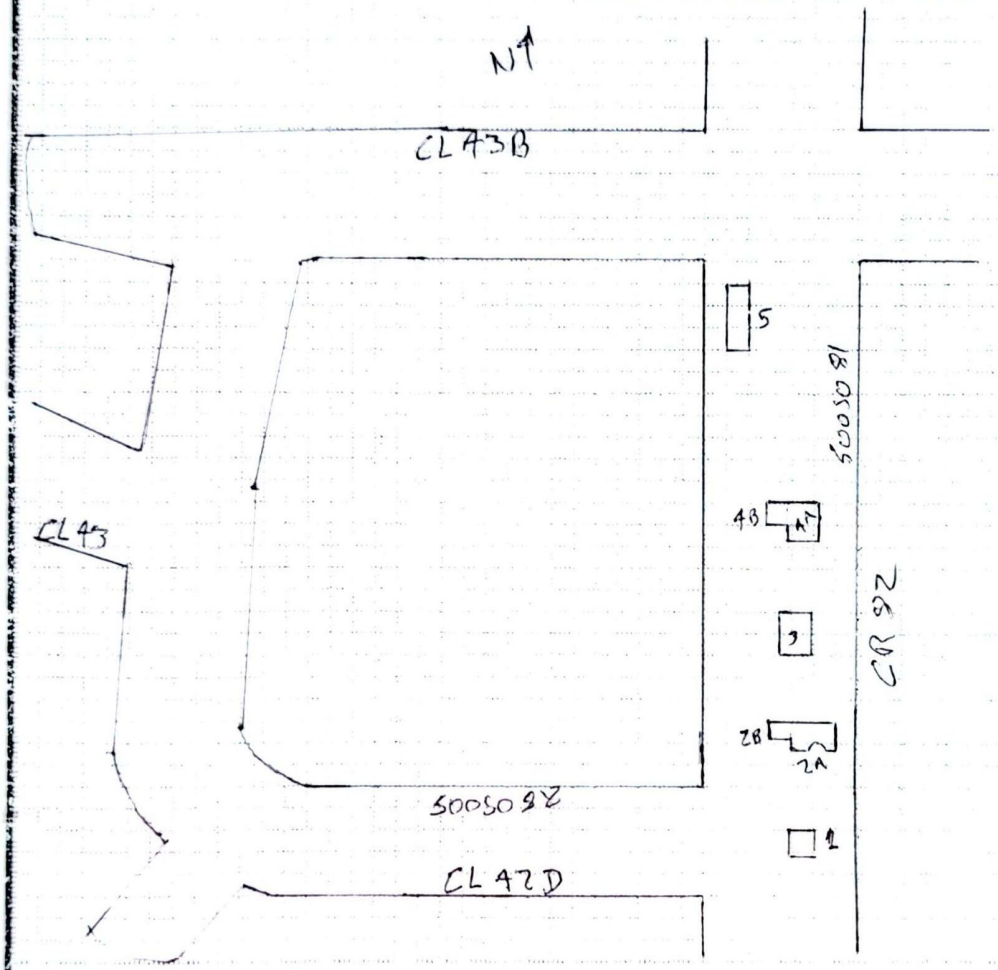

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	I	CANTIDAD:	12,03
BARRIO	La America	DIRECCIÓN	CR82 (CL42D – CL43B)

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235783

FECHA: 15/01/2026

HORA: 8:33:43 AM

CONDUCTOR: ALVARO GOMEZ

PLACA: STH139

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906389

PESO BRUTO: 19.70 Tonnes

PESO TARA: 7.66 Tonnes

PESO NETO: 12.04 Tonnes

Angel Usuga.

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140 C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 50.92 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24519

PROVEEDOR: FRENTE 14 VIALMED 2025

VALE POR UN VIAJE: Escombro

15/01/2026

PLACA No: STH 139 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: PROCOPAL

PROCOPAL S.A.
NIT: 890.906.389-9

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Angel Usuga

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
