
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE GACHETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. ICCU-391-2025**	**$ 1.616.188.365,11**	**155 días**	**mié 4/02/26**	**mar 4/08/26**
2		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	$ 7.990.533,60	10 días	mié 4/02/26	lun 16/02/26
3		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	$ 2.256.297,12	6 días	lun 16/02/26	lun 23/02/26
4		PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	$ 551.960.640,00	60 días	lun 23/02/26	lun 4/05/26
5		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	$ 1.475.486,04	5 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26
6		CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	$ 47.660.581,92	10 días	sáb 9/05/26	jue 21/05/26
7		CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	$ 43.312.918,85	10 días	jue 21/05/26	mar 2/06/26
8		CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	$ 60.012.380,23	5 días	mar 2/06/26	lun 8/06/26
9		SUMINISTRO, TRASPORTE, FABRICACION ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A -516/A572	$ 695.558.479,00	110 días	mié 4/02/26	vie 12/06/26
10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	$ 13.919.901,03	5 días	vie 12/06/26	jue 18/06/26
11		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 114.189.020,10	10 días	jue 18/06/26	mar 30/06/26
12		DREN TUBERIA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	$ 609.560,28	5 días	mar 30/06/26	lun 6/07/26
13		BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	$ 44.688.000,00	10 días	lun 6/07/26	vie 17/07/26
14		JUNTA DE DILATACION	$ 5.266.800,00	3 días	mié 10/06/26	sáb 13/06/26
15		GAVIÓN MALLA PVC	$ 21.122.355,10	20 días	sáb 11/07/26	mar 4/08/26
16		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	$ 6.165.411,84	7 días	lun 27/07/26	mar 4/08/26

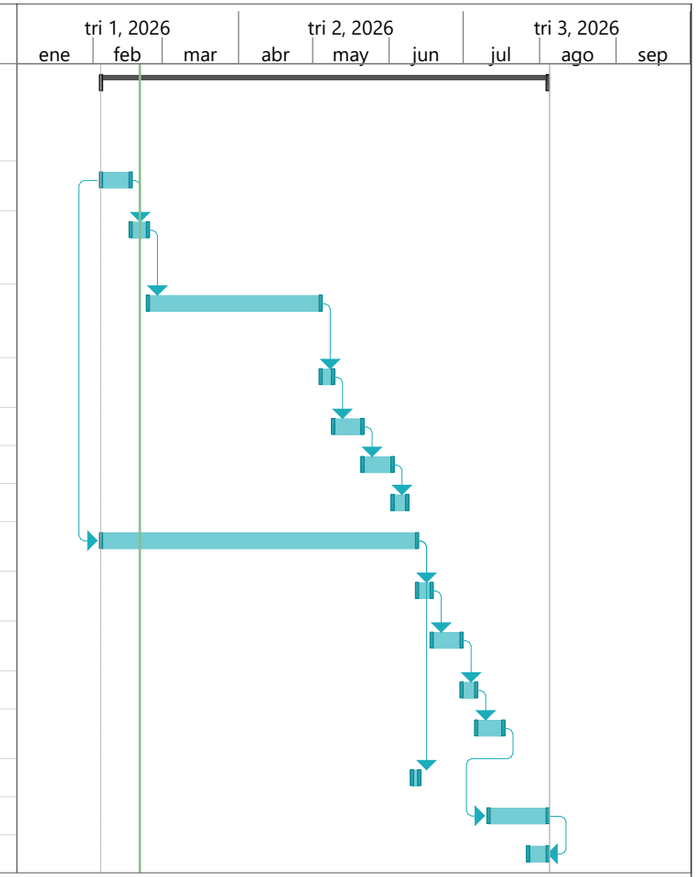

Proyecto: Cronograma Puente G
Fecha: vie 20/02/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	
