Consorcio Puente Gacheta	**INFORME QUINCENAL CONSORCIO PUENTE GACHETA**							U	
								Versión: 1	
								Fecha: 04/02/2026	
FECHA	23 abr 26	**PERIODO NRo.**	08	**DEL**	18 mar 26		**AL**	31-mar-26	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Nro.	LP-098-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE GACHETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. ICCU-391-2025.
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE GACHETÁ-QUEBRADA GRANDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTE GACHETA
INTERVENTORIA:	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ECOLOGICO Y AMBIENTAL S.A.S

CONTRATO DE OBRA						
PLAZO INICIAL:	180 días calendario					
FECHA DE INICIACIÓN:	04/02/26					
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NA					
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	NA					
FECHA DE TERMINACIÓN:	4/08/2026					
PLAZO ACTUALIZADO:	NA					
PLAZO TRANSCURRIDO:	56 días calendario	**EQUIVALE AL**	31,11%	**AVANCE DEL CONTRATO**		
VALOR INICIAL:	$1.616.188.364,87					
VALOR ADICION(ES):	NA			**AVANCE**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR FINAL:	$1.616.188.364,87			**TIEMPO %**	31,11%	31,11%
VALOR PAGADO:	-			**OBRA FÍSICA %**	23,99%	39,00%
VALOR POR PAGAR:	$1.616.188.364,87			**FINANCIERO %**		

2. CONTROL DE ACTIVIDADES


Nro.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
3	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	23 feb 26	04 may 26	70	12 feb 26		47	11	
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572	04 feb 26	12 jun 26	128	04 feb 26		55		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

Nro.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	Descripción	Programado a la fecha (%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecucion total actual (%)
1	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	Se dio inicio a la ejecución de los pilotes en concreto de 3.000 psi mediante construcción manual, realizando las actividades de excavación y anillado de los caisson conforme a diseño, encontrándose el ítem en proceso de desarrollo	42,39%	29,16%	6,25%	35,41%
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572	Actualmente se encuentra en ejecución la fase de fabricación y preparación del acero A-516/A572 en taller, conforme a planos, para su posterior transporte, ensamblaje y montaje en obra.	18,07%	45,72%	13,63%	59,35%
3						
8						

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Quincena Nro.	Desde	Hasta	PROGRAMADO				EJECUTADO				ESTADO	
			SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO			
			$ -		$ -							
1	04 feb 26	10 feb 26	$ 5.748.415,03	0,36%	$ 5.748.415,03	0,36%	$ 41.763.276,80	2,58%	$ 41.763.276,80	2,58%	2,23%	Avance
2	11 feb 26	17 feb 26	$ 9.001.119,20	0,56%	$ 14.749.534,23	0,91%	$ 128.581.403,07	7,96%	$ 170.344.679,87	10,54%	9,63%	Avance
3	18 feb 26	24 feb 26	$ 8.459.908,38	0,52%	$ 23.209.442,61	1,44%	$ 69.021.458,33	4,27%	$ 239.366.138,20	14,81%	13,37%	Avance
4	25 feb 26	03 mar 26	$ 3.395.736,87	0,21%	$ 26.605.179,48	1,65%	$ 72.215.675,00	4,47%	$ 311.581.813,20	19,28%	17,63%	Avance
5	04 mar 26	10 mar 26	$ 21.820.599,45	1,35%	$ 48.425.778,93	3,00%	$ 94.718.289,95	5,86%	$ 406.300.103,15	25,14%	22,14%	Avance
6	11 mar 26	17 mar 26	$ 113.093.827,21	7,00%	$ 161.519.606,14	9,99%	$ 94.718.289,95	5,86%	$ 501.018.393,11	31,00%	21,01%	Avance
7	18 mar 26	24 mar 26	$ 113.093.827,21	7,00%	$ 274.613.433,35	16,99%	$ 64.647.534,59	4,00%	$ 565.665.927,70	35,00%	18,01%	Avance
8	25 mar 26	31 mar 26	$ 113.093.827,21	7,00%	$ 387.707.260,57	23,99%	$ 64.647.534,59	4,00%	$ 630.313.462,30	39,00%	15,01%	Avance
9	01 abr 26	07 abr 26	$ 72.389.361,85	4,48%	$ 460.096.622,41	28,47%						
10	08 abr 26	14 abr 26	$ 113.093.827,21	7,00%	$ 573.190.449,63	35,47%						
11	15 abr 26	21 abr 26	$ 113.093.827,21	7,00%	$ 686.284.276,84	42,46%						
12	22 abr 26	28 abr 26	$ 113.093.827,21	7,00%	$ 799.378.104,05	49,46%						
13	29 abr 26	05 may 26	$ 82.828.503,71	5,12%	$ 882.206.607,76	54,59%						
14	06 may 26	12 may 26	$ 90.783.220,54	5,62%	$ 972.989.828,30	60,20%						
15	13 may 26	19 may 26	$ 159.887.085,82	9,89%	$ 1.132.876.914,12	70,10%						
16	20 may 26	26 may 26	$ 58.746.784,39	3,63%	$ 1.191.623.698,51	73,73%						
17	27 may 26	02 jun 26	$ 106.283.843,25	6,58%	$ 1.297.907.541,75	80,31%						
18	03 jun 26	09 jun 26	$ 53.778.428,30	3,33%	$ 1.351.685.970,06	83,63%						
19	10 jun 26	16 jun 26	$ 39.520.368,13	2,45%	$ 1.391.206.338,18	86,08%						
20	17 jun 26	23 jun 26	$ 39.520.368,13	2,45%	$ 1.430.726.706,31	88,52%						
21	24 jun 26	30 jun 26	$ 39.520.368,13	2,45%	$ 1.470.247.074,44	90,97%						
22	01 jul 26	07 jul 26	$ 39.520.368,13	2,45%	$ 1.509.767.442,57	93,42%						
23	08 jul 26	14 jul 26	$ 41.802.406,53	2,59%	$ 1.551.569.849,10	96,00%						
24	15 jul 26	21 jul 26	$ 17.787.188,40	1,10%	$ 1.569.357.037,50	97,10%						
25	22 jul 26	28 jul 26	$ 36.041.856,67	2,23%	$ 1.605.398.894,17	99,33%						
26	29 jul 26	04 ago 26	$ 10.789.470,72	0,67%	$ 1.616.188.364,89	100,00%						

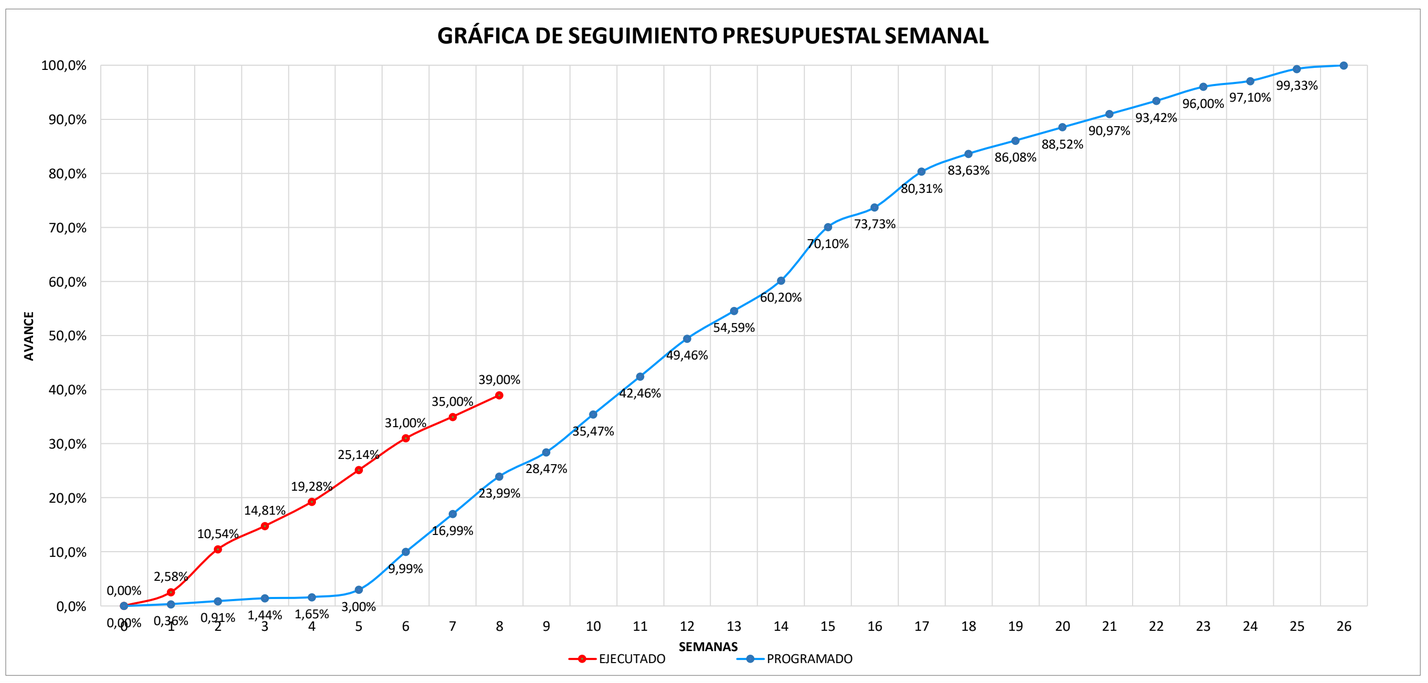

Nro.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 387.707.260,57	23,99%	$242.606.201,73	ADELANTO
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 630.313.462,30	39,00%	15,01%	


5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Respecto a la cimentación profunda, se reporta la ejecución del 6.25 % de avance en el pilotaje, incluyendo las actividades asociadas a la conformación del elemento, control de verticalidad y disposición conforme a los requerimientos técnicos del proyecto. teniendo un total acumulado de 35.41%.

Finalmente, en el componente de superestructura metálica, se deja constancia que se ha realizado la fabricación y disposición en sitio de 4.073 kg de estructura metálica, quedando estos elementos disponibles para las etapas subsiguientes de montaje y ensamble según el plan de obra. teniendo un total acumulado de 17.736 kg en obra.

Contratista:	**Interventoría:**	**Planeación:**
Erika Johana Suarez Santana **REPRESENTANTE LEGAL**	Yarid Marcela Rodriguez Urrego **REPRESENTANTE LEGAL**	Karen Daniela Duarte **SUPERVISION**

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Ing. Daniel Mauricio Olier Restrepo	Ing. Nelson Odens Mora Franco	Erika Johana Suarez Santana
Residente de Obra	Director de Obra	Representante Legal

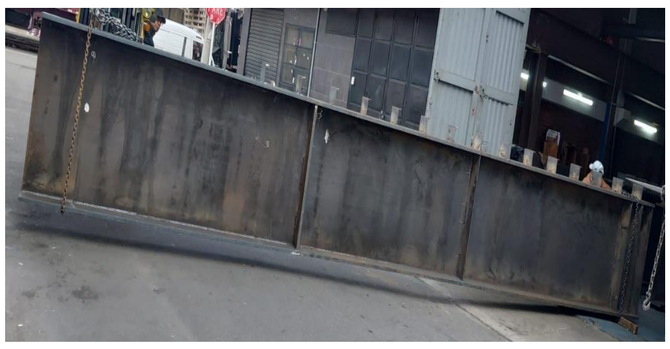INFORME QUINCENAL		
		
PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)
		
PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)
		
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572
