

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**Contratar las instalaciones y la puesta en marcha, a precios unitarios y monto agotable, de sistemas de energía eléctrica basados en soluciones de paneles solares fotovoltaicos, en la localidad de Sumapaz 2689**	**115 días**	**mié 28/01/26**	**sáb 27/06/26**
1		**ETAPA 1 / Verificación y Visitas**	**30 días**	**mié 28/01/26**	**vie 6/03/26**
2		Firma Acta de Inicio	0 días	mié 28/01/26	mié 28/01/26
3		Entrega y definicion de Información de lugares de intervencion	9 días	mié 28/01/26	sáb 7/02/26
4		Visitas de Campo iniciales	2 días	lun 9/02/26	mié 11/02/26
5		Entrega de Plan de trabajo y Programacion	4 días	mié 11/02/26	mar 17/02/26
6		Elaboración Plan de Gestión Social	11 días	lun 9/02/26	lun 23/02/26
7		Elaboracion Plan de Gestión Ambiental	11 días	lun 9/02/26	lun 23/02/26
8		Elaboracion Plan de Gestión SST	11 días	lun 9/02/26	lun 23/02/26
9		Guia y Manual tecnico	11 días	lun 9/02/26	lun 23/02/26
10		Elaboración y presentación de Socializaciones	8 días	mié 18/02/26	vie 27/02/26
11		Elaboracion de planos de Localizacion y distribución interna	17 días	lun 9/02/26	lun 2/03/26
12		Elaboracion de balance y presupuesto inicial	17 días	lun 9/02/26	lun 2/03/26
13		Elaboración y entrega del Informe Tecnico y de Verificacion Predial	17 días	lun 9/02/26	lun 2/03/26
14		Entrega Informe mensual No 1- consolidado de los informes anteriores	20 días	lun 9/02/26	vie 6/03/26
15		**ETAPA 2 / Preparación de kit's de ejecucion por Vivienda**	**28 días**	**jue 26/02/26**	**lun 6/04/26**
16		**Compra de materiales**	**23 días**	**jue 26/02/26**	**sáb 28/03/26**
17		**Compra de estructura portante y cofres**	**14 días**	**jue 26/02/26**	**lun 16/03/26**
18		Aprobación de fichas técnicas	3 días	jue 26/02/26	lun 2/03/26
19		Compra de estructura portante	10 días	lun 2/03/26	sáb 14/03/26
20		Compra de cofres	10 días	lun 2/03/26	sáb 14/03/26
21		Transporte	1 día	sáb 14/03/26	lun 16/03/26
22		**Compra de paneles, inversor, baterías y protecciones**	**13 días**	**lun 2/03/26**	**mié 18/03/26**
23		Aprobación de fichas técnicas	3 días	lun 2/03/26	vie 6/03/26
24		Compra de inversores	5 días	lun 9/03/26	sáb 14/03/26
25		Comra de baterías	5 días	lun 9/03/26	sáb 14/03/26
26		Compra de protecciones	5 días	lun 9/03/26	sáb 14/03/26
27		Compra de paneles	5 días	lun 9/03/26	sáb 14/03/26
28		Transporte	3 días	sáb 14/03/26	mié 18/03/26
29		**Compra de materiales eléctricos**	**12 días**	**jue 12/03/26**	**sáb 28/03/26**
30		Aprobación de fichas técnicas	3 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26
31		Compra de tubería	7 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
32		Compra de cableado	7 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
33		Compra de materiales para puntos eléctricos	7 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
34		Compra de materiales para puesta a tierra	7 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
35		Compra de cemento y grava	7 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
36		Transporte de materiales	5 días	vie 20/03/26	sáb 28/03/26
37		Ensamble de inversores, baterías y protecciones	13 días	mar 17/03/26	lun 6/04/26
38		Organización de kit's por casa	6 días	vie 27/03/26	lun 6/04/26

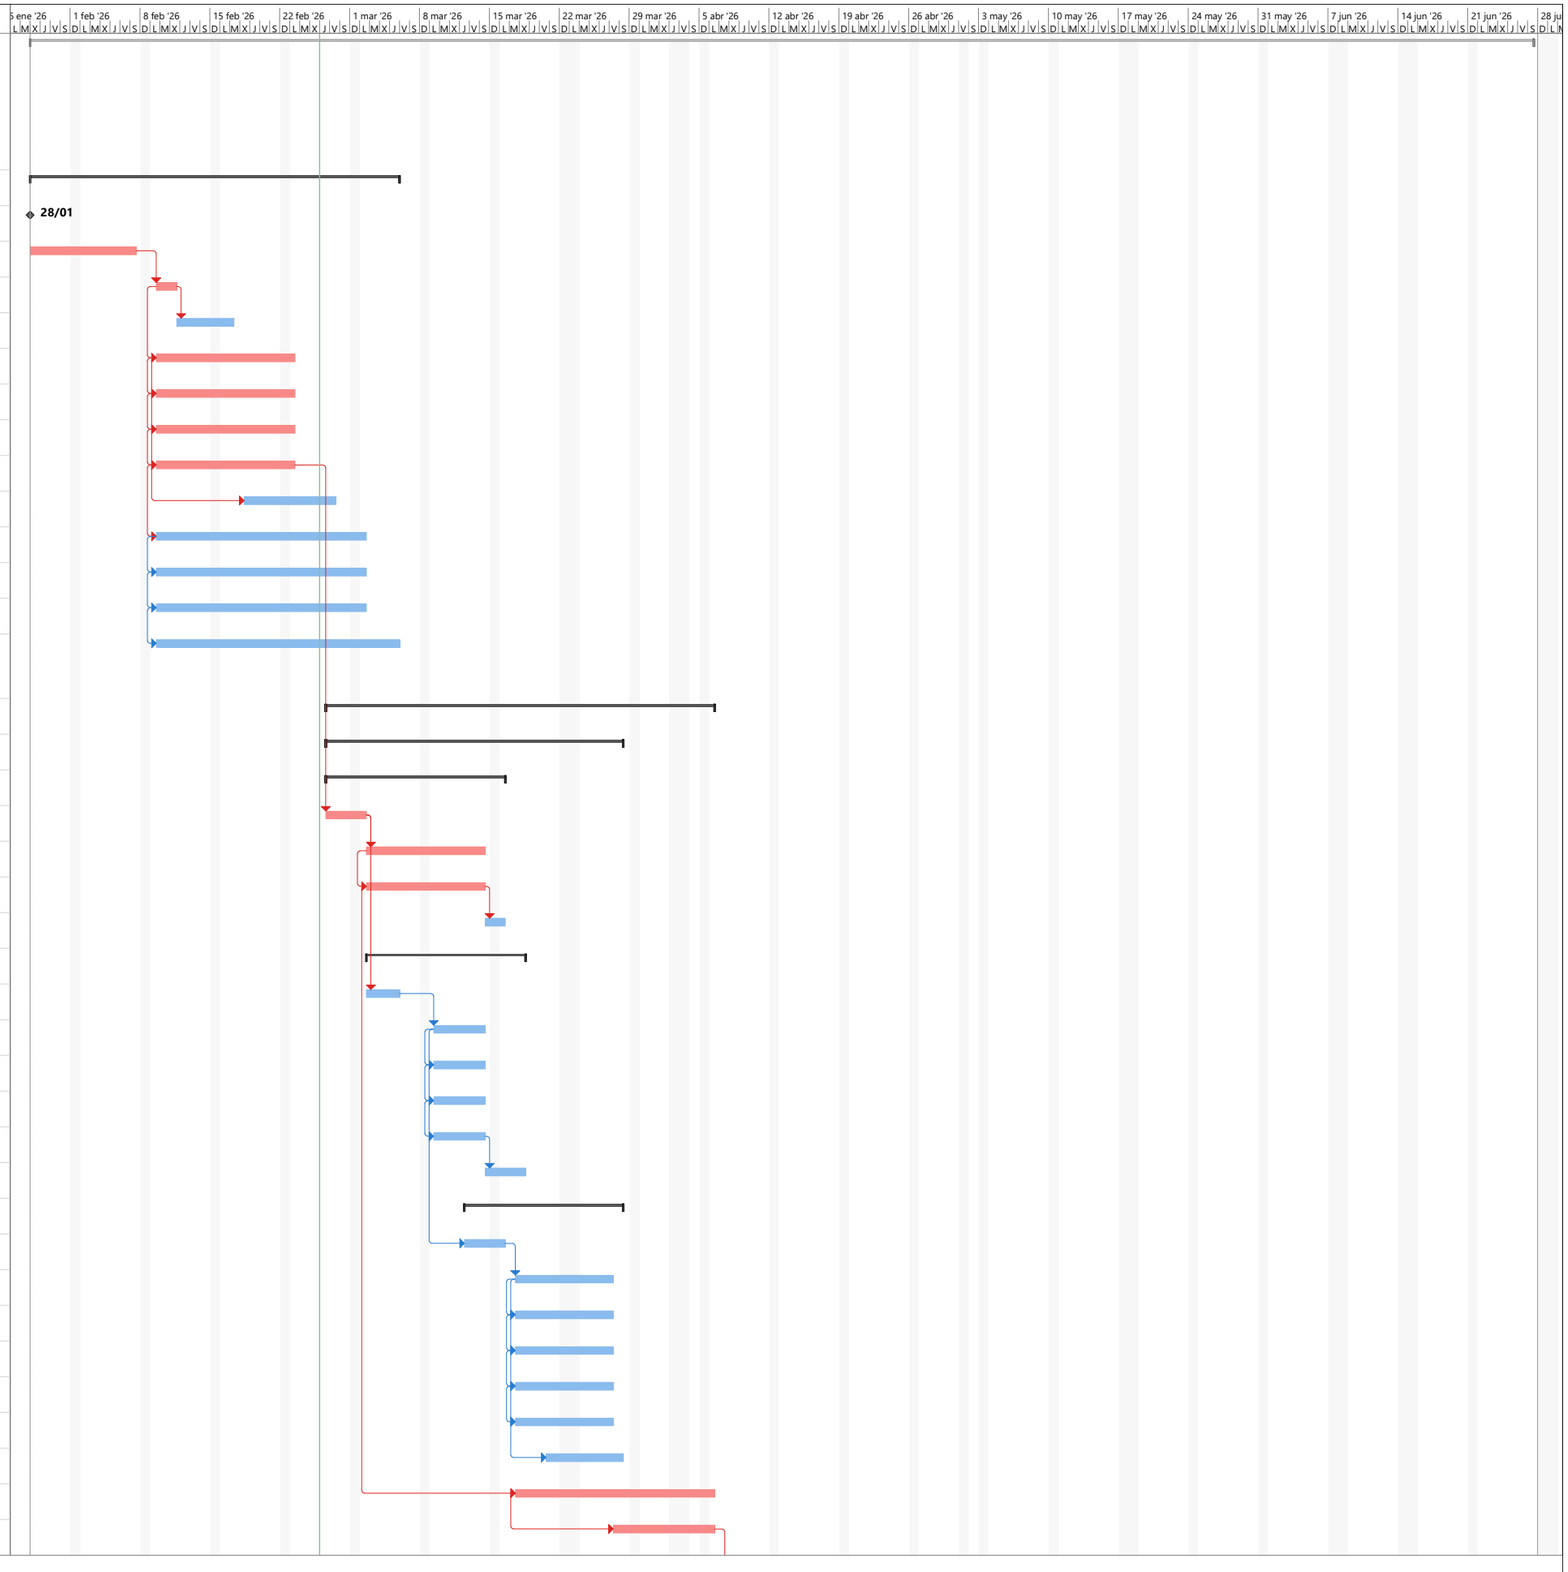

Proyecto: Contratar las instalaci
Fecha: jue 26/02/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
39		**ETAPA 3**	**115 días**	**mié 28/01/26**	**sáb 27/06/26**
40		Gestión ambiental	114 días	mié 28/01/26	vie 26/06/26
41		Gestión social	114 días	mié 28/01/26	vie 26/06/26
42		Transporte y dispercion de kits	2 días	mar 7/04/26	jue 9/04/26
43		**Entrega en Cuenca Rio Sumapaz**	**40 días**	**jue 9/04/26**	**lun 1/06/26**
44		**Instalación por Vivienda**	**40 días**	**jue 9/04/26**	**lun 1/06/26**
45		**Vivienda 1**	**4 días**	**jue 9/04/26**	**mié 15/04/26**
46		Localizacion y replanteo	2 días	jue 9/04/26	sáb 11/04/26
47		Construcion de Zapata	2 días	jue 9/04/26	sáb 11/04/26
48		Instalación de Estructura	2 días	jue 9/04/26	sáb 11/04/26
49		Instalación paneles	2 días	sáb 11/04/26	mié 15/04/26
50		Cableado	2 días	sáb 11/04/26	mié 15/04/26
51		Ducteria:	2 días	sáb 11/04/26	mié 15/04/26
52		Conectores:	2 días	sáb 11/04/26	mié 15/04/26
53		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	sáb 11/04/26	mié 15/04/26
54		Instalación de inversor hibrido	2 días	sáb 11/04/26	mié 15/04/26
55		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	sáb 11/04/26	mié 15/04/26
56		**Vivienda 2**	**4 días**	**mié 15/04/26**	**lun 20/04/26**
57		Localizacion y replanteo	2 días	mié 15/04/26	vie 17/04/26
58		Construcion de Zapata	2 días	mié 15/04/26	vie 17/04/26
59		Instalación de Estructura	2 días	mié 15/04/26	vie 17/04/26
60		Instalación paneles	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26
61		Cableado	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26
62		Ducteria:	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26
63		Conectores:	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26
64		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26
65		Instalación de inversor hibrido	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26
66		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26
67		**Vivienda 3**	**4 días**	**lun 20/04/26**	**vie 24/04/26**
68		Localizacion y replanteo	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26
69		Construcion de Zapata	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26
70		Instalación de Estructura	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26
71		Instalación paneles	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26
72		Cableado	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26
73		Ducteria:	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26
74		Conectores:	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26
75		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26
76		Instalación de inversor hibrido	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26
77		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26
78		**Vivienda 4**	**4 días**	**vie 24/04/26**	**mié 29/04/26**

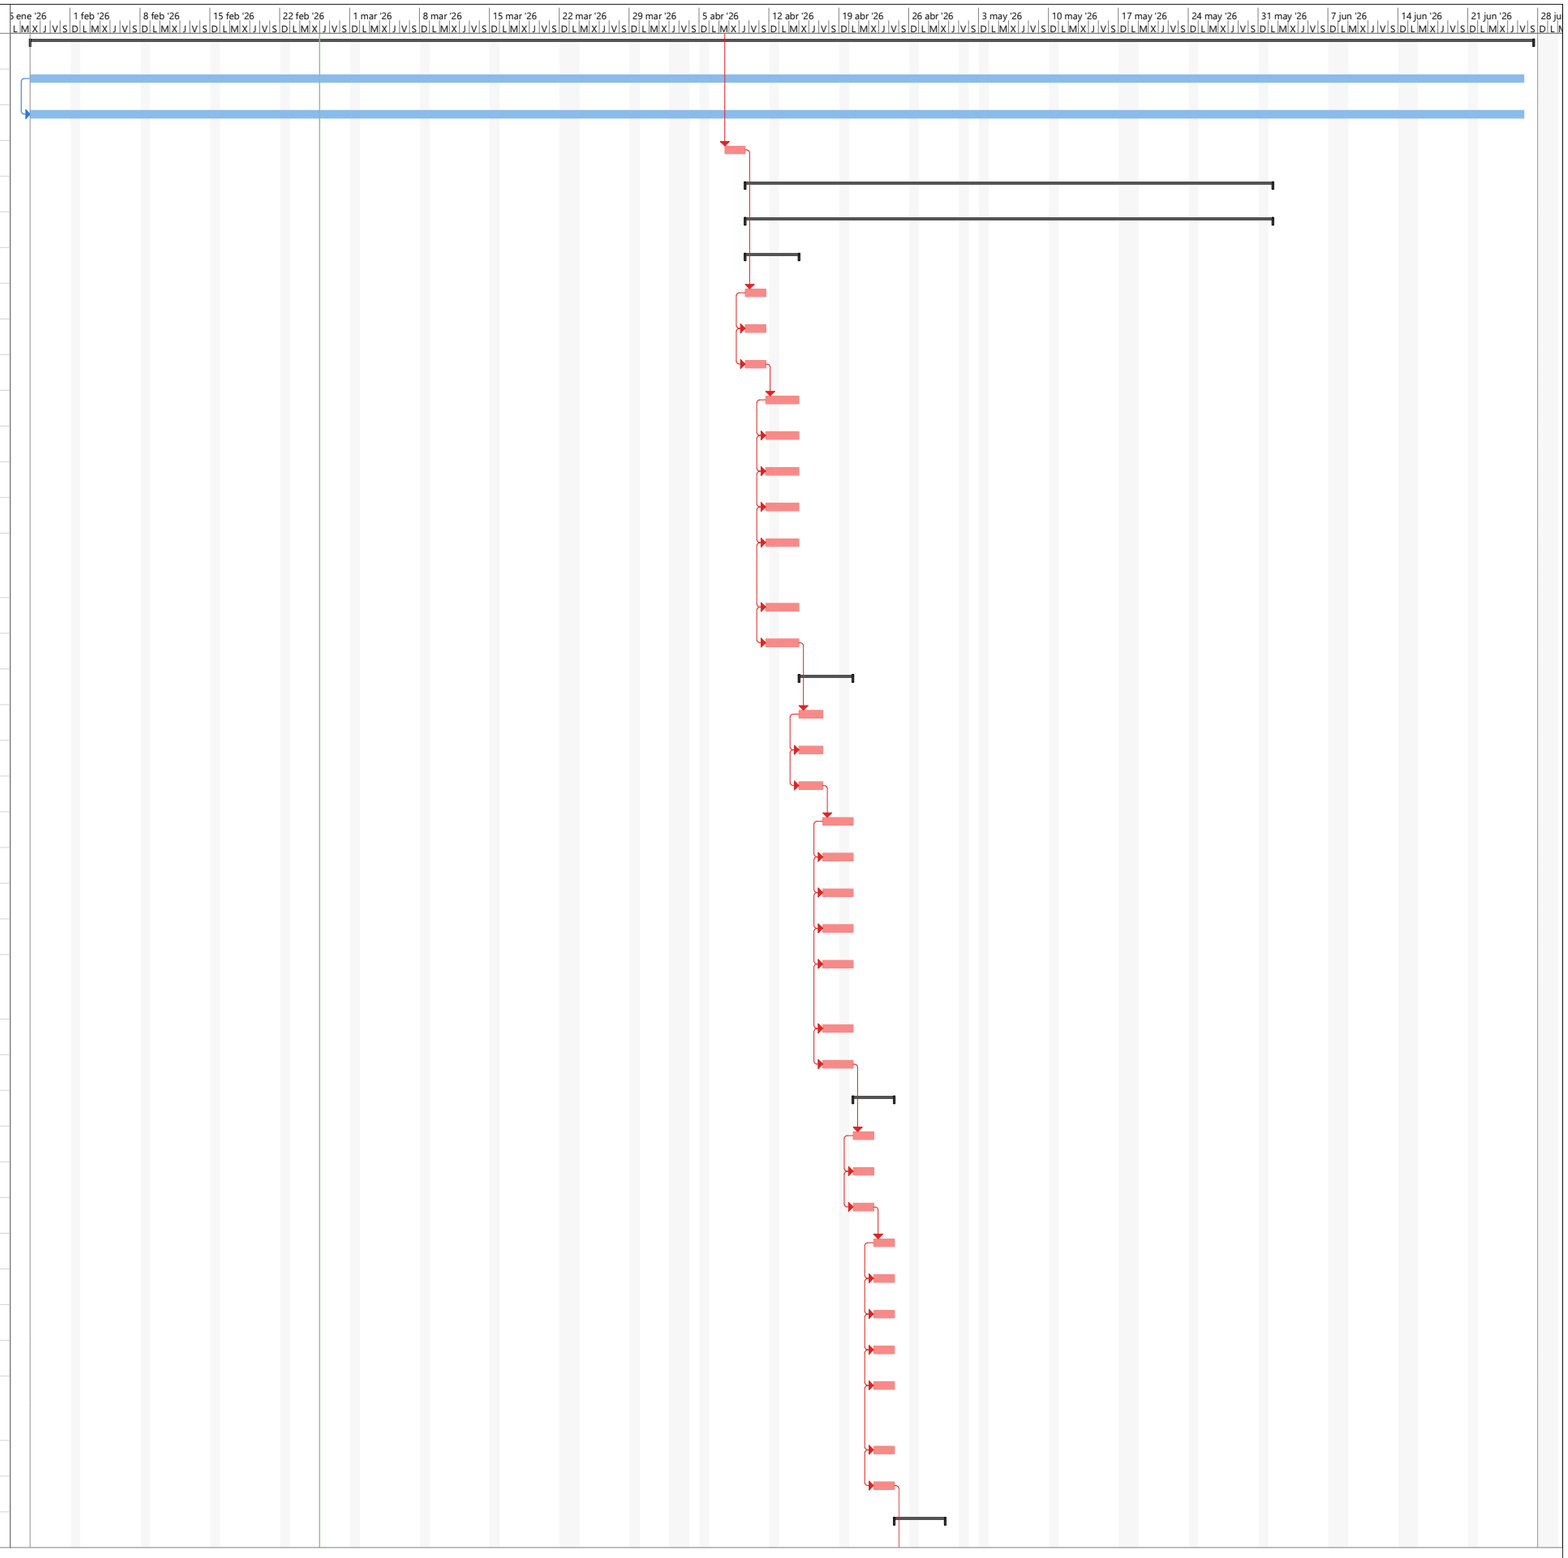

Proyecto: Contratar las instalaci
Fecha: jue 26/02/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
79		Localizacion y replanteo	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26
80		Construcion de Zapata	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26
81		Instalación de Estructura	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26
82		Instalación paneles	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26
83		Cableado	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26
84		Ducteria:	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26
85		Conectores:	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26
86		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26
87		Instalación de inversor hibrido	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26
88		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26
89		**Vivienda 5**	**4 días**	**mié 29/04/26**	**mié 6/05/26**
90		Localizacion y replanteo	2 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26
91		Construcion de Zapata	2 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26
92		Instalación de Estructura	2 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26
93		Instalación paneles	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
94		Cableado	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
95		Ducteria:	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
96		Conectores:	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
97		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
98		Instalación de inversor hibrido	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
99		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
100		**Vivienda 6**	**4 días**	**mié 6/05/26**	**lun 11/05/26**
101		Localizacion y replanteo	2 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26
102		Construcion de Zapata	2 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26
103		Instalación de Estructura	2 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26
104		Instalación paneles	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
105		Cableado	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
106		Ducteria:	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
107		Conectores:	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
108		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
109		Instalación de inversor hibrido	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
110		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
111		**Vivienda 7**	**4 días**	**lun 11/05/26**	**vie 15/05/26**
112		Localizacion y replanteo	2 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26
113		Construcion de Zapata	2 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26
114		Instalación de Estructura	2 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26
115		Instalación paneles	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
116		Cableado	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
117		Ducteria:	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
118		Conectores:	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26

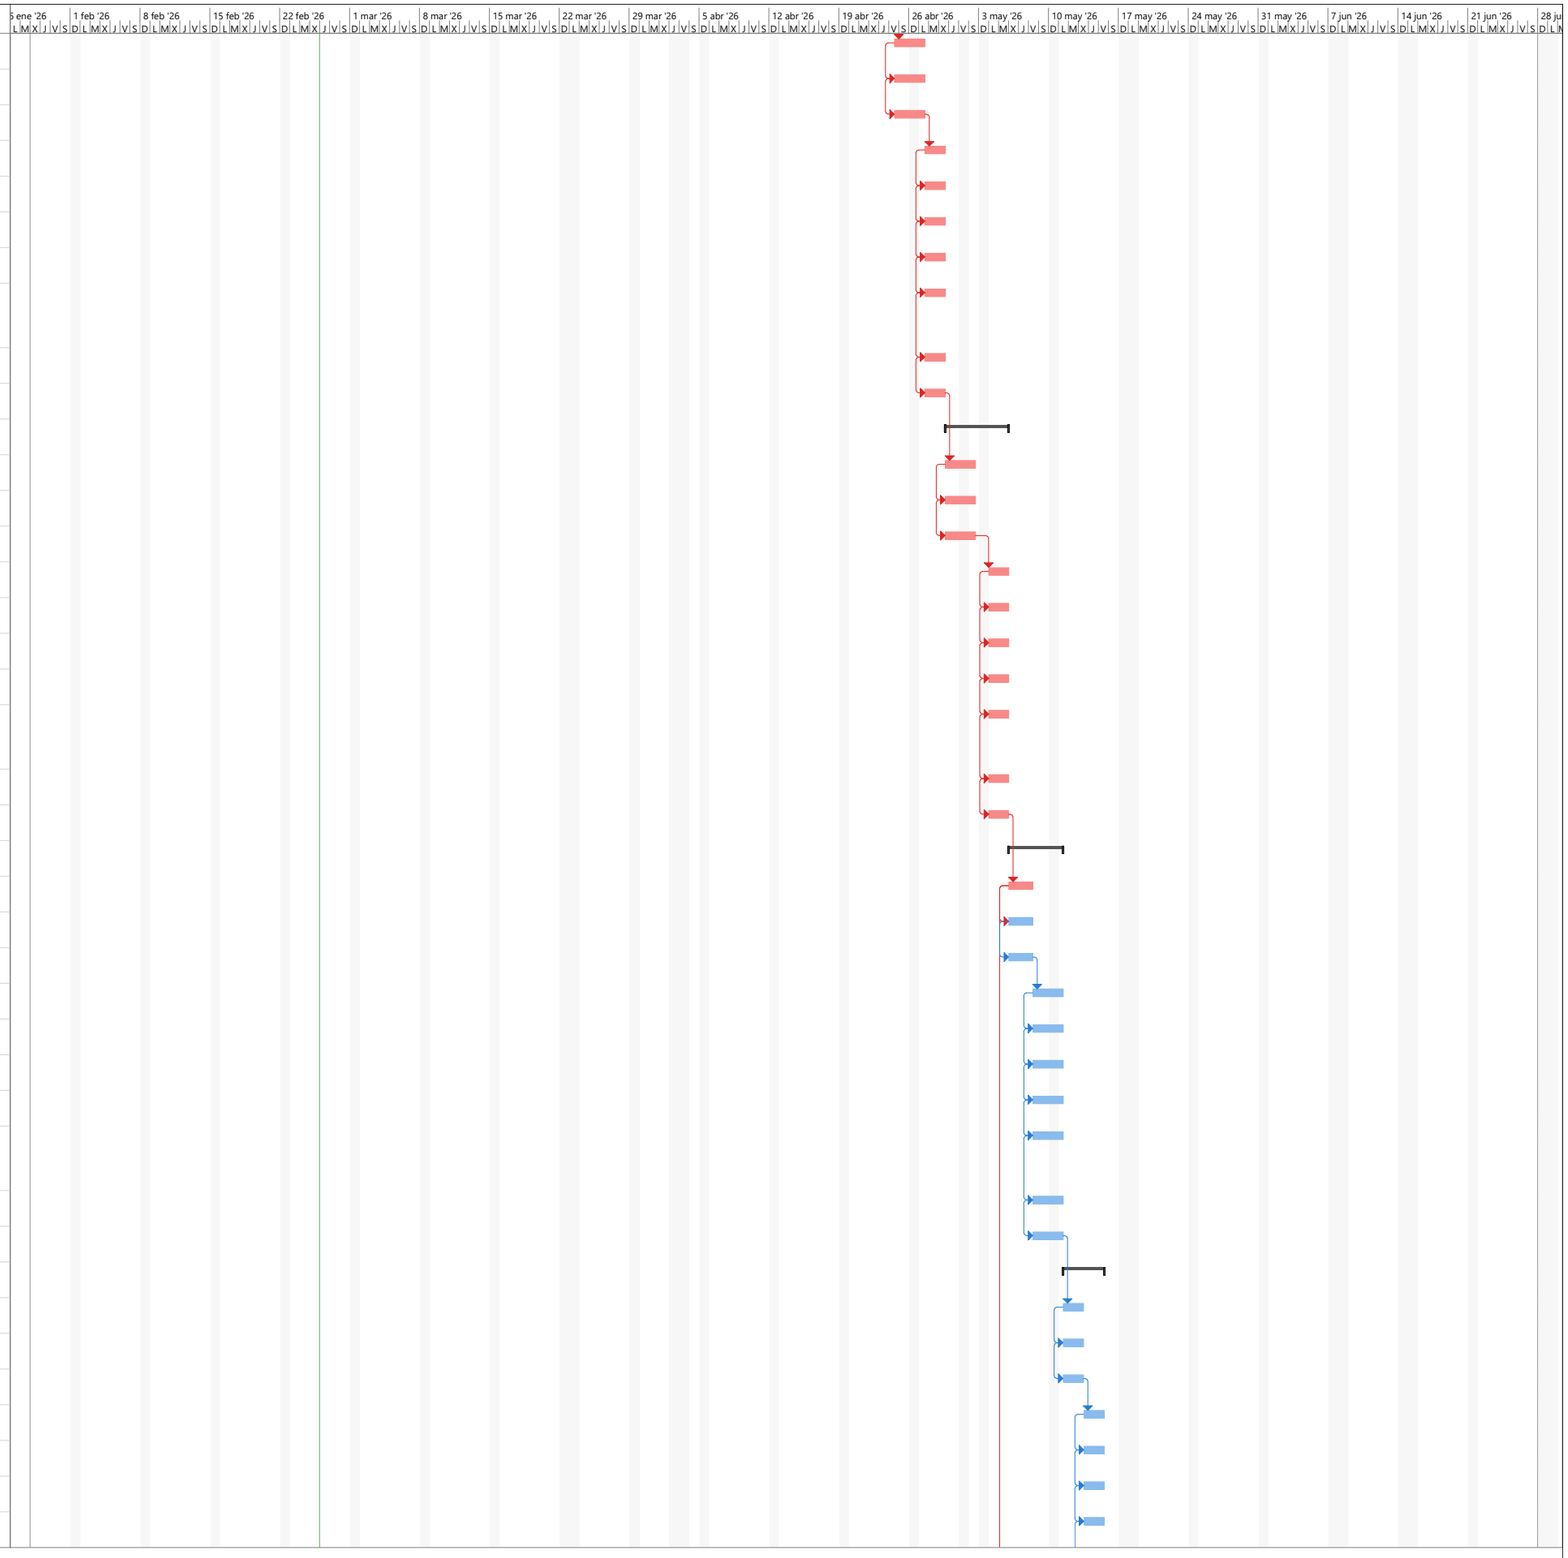

Proyecto: Contratar las instalaci
Fecha: jue 26/02/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
119		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
120		Instalación de inversor hibrido	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
121		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
122		**Vivienda 8**	**4 días**	**vie 15/05/26**	**jue 21/05/26**
123		Localizacion y replanteo	2 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26
124		Construcion de Zapata	2 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26
125		Instalación de Estructura	2 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26
126		Instalación paneles	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
127		Cableado	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
128		Ducteria:	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
129		Conectores:	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
130		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
131		Instalación de inversor hibrido	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
132		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
133		**Vivienda 9**	**4 días**	**jue 21/05/26**	**mié 27/05/26**
134		Localizacion y replanteo	2 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26
135		Construcion de Zapata	2 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26
136		Instalación de Estructura	2 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26
137		Instalación paneles	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
138		Cableado	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
139		Ducteria:	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
140		Conectores:	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
141		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
142		Instalación de inversor hibrido	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
143		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
144		**Vivienda 10**	**4 días**	**mié 27/05/26**	**lun 1/06/26**
145		Localizacion y replanteo	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26
146		Construcion de Zapata	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26
147		Instalación de Estructura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26
148		Instalación paneles	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
149		Cableado	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
150		Ducteria:	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
151		Conectores:	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
152		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
153		Instalación de inversor hibrido	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
154		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
155		Transporte y dispercion de kits	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
156		**Entrega en Cuenca Rio Blanco**	**40 días**	**mié 6/05/26**	**sáb 27/06/26**
157		**Instalación por Vivienda**	**40 días**	**mié 6/05/26**	**sáb 27/06/26**
158		**Vivienda 1**	**4 días**	**mié 6/05/26**	**lun 11/05/26**

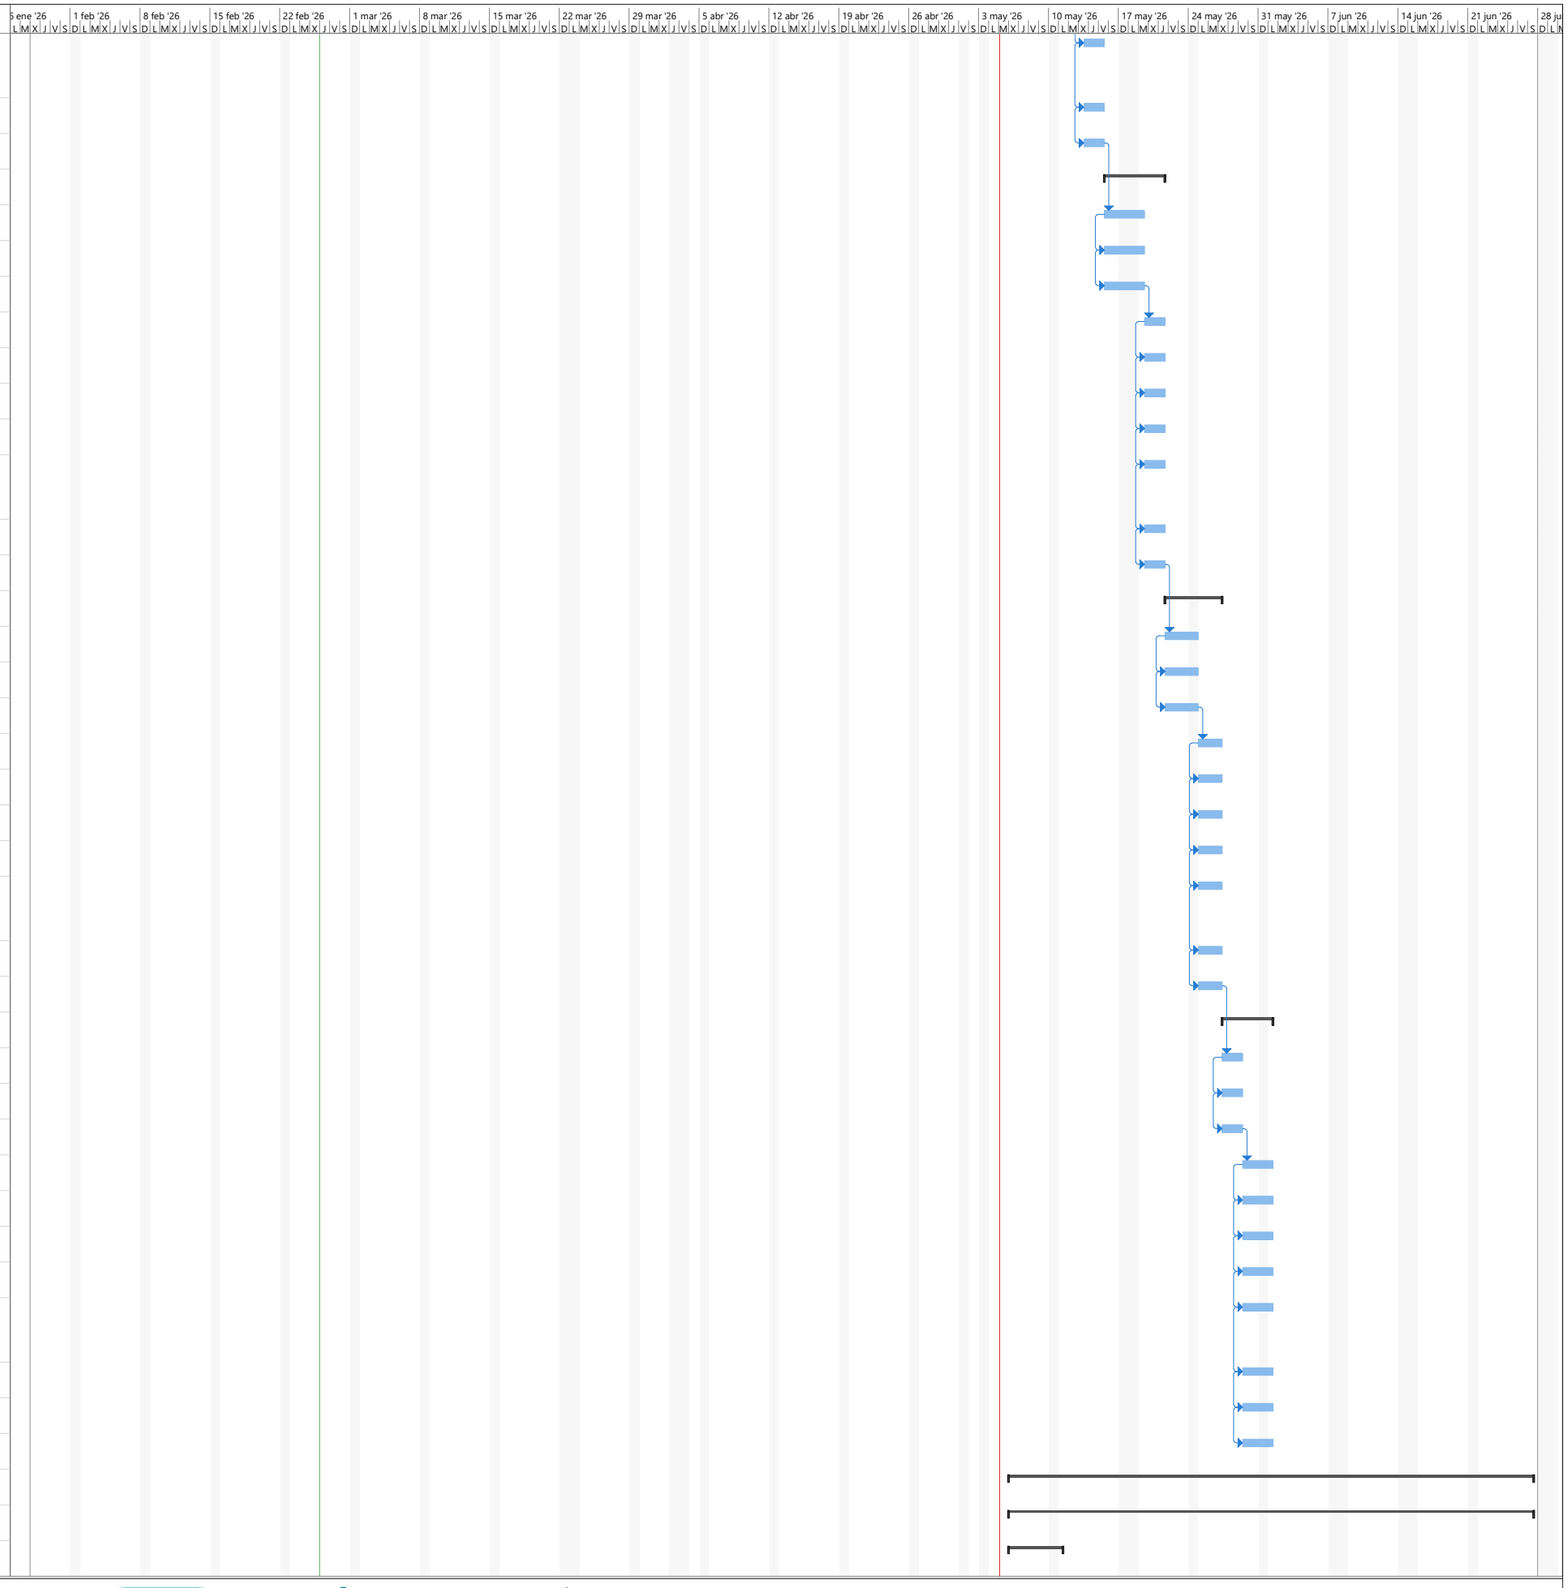

Proyecto: Contratar las instalaci
Fecha: jue 26/02/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
159		Localizacion y replanteo	2 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26
160		Construcion de Zapata	2 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26
161		Instalación de Estructura	2 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26
162		Instalación paneles	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
163		Cableado	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
164		Ducteria:	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
165		Conectores:	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
166		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
167		Instalación de inversor hibrido	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
168		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
169		**Vivienda 2**	**4 días**	**lun 11/05/26**	**vie 15/05/26**
170		Localizacion y replanteo	2 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26
171		Construcion de Zapata	2 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26
172		Instalación de Estructura	2 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26
173		Instalación paneles	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
174		Cableado	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
175		Ducteria:	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
176		Conectores:	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
177		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
178		Instalación de inversor hibrido	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
179		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26
180		**Vivienda 3**	**4 días**	**vie 15/05/26**	**jue 21/05/26**
181		Localizacion y replanteo	2 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26
182		Construcion de Zapata	2 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26
183		Instalación de Estructura	2 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26
184		Instalación paneles	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
185		Cableado	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
186		Ducteria:	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
187		Conectores:	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
188		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
189		Instalación de inversor hibrido	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
190		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
191		**Vivienda 4**	**4 días**	**jue 21/05/26**	**mié 27/05/26**
192		Localizacion y replanteo	2 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26
193		Construcion de Zapata	2 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26
194		Instalación de Estructura	2 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26
195		Instalación paneles	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
196		Cableado	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
197		Ducteria:	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
198		Conectores:	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26

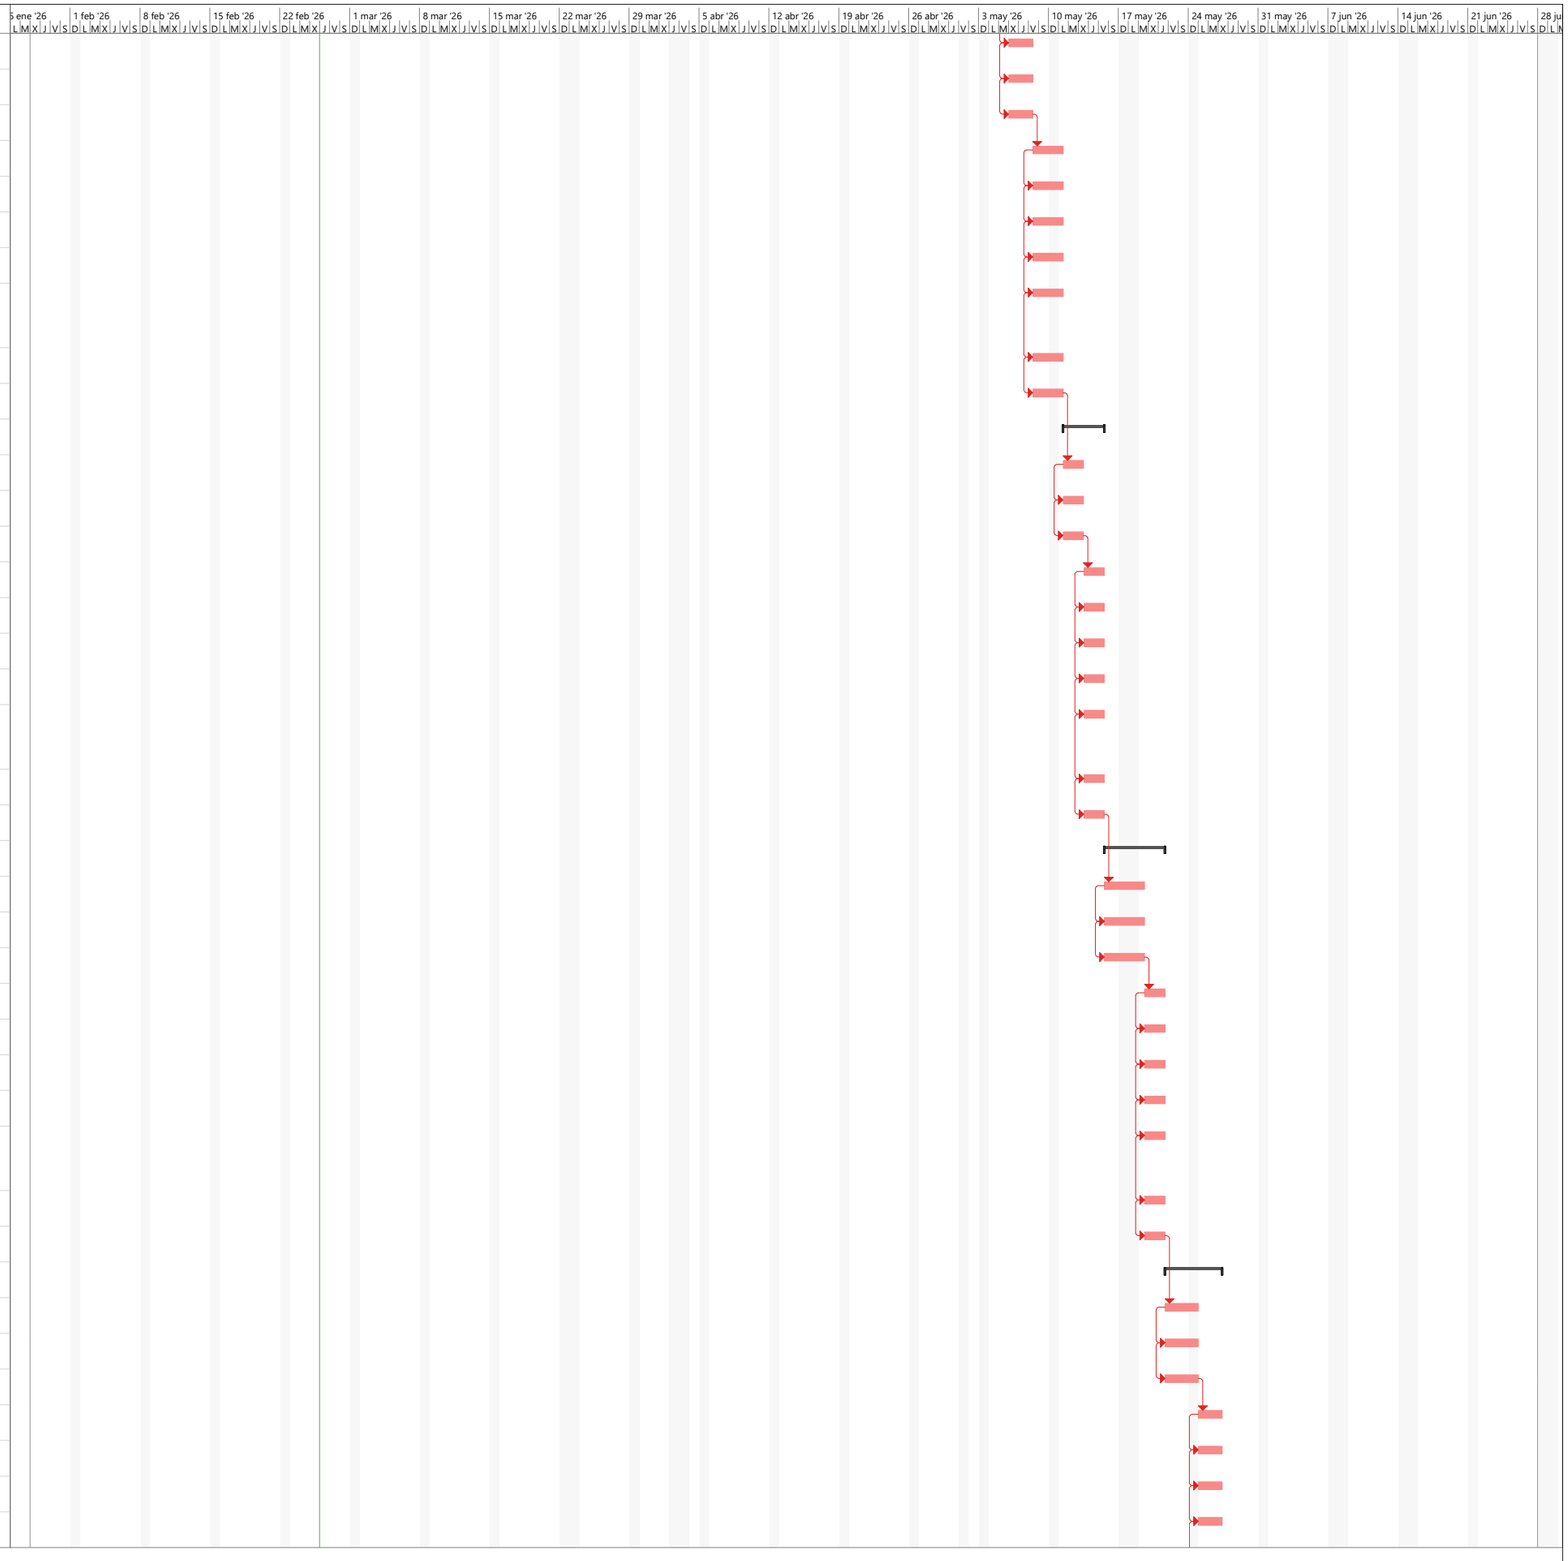

Proyecto: Contratar las instalaci
Fecha: jue 26/02/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
199		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
200		Instalación de inversor hibrido	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
201		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26
202		**Vivienda 5**	**4 días**	**mié 27/05/26**	**lun 1/06/26**
203		Localizacion y replanteo	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26
204		Construcion de Zapata	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26
205		Instalación de Estructura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26
206		Instalación paneles	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
207		Cableado	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
208		Ducteria:	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
209		Conectores:	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
210		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
211		Instalación de inversor hibrido	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
212		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26
213		**Vivienda 6**	**4 días**	**lun 1/06/26**	**vie 5/06/26**
214		Localizacion y replanteo	2 días	lun 1/06/26	mié 3/06/26
215		Construcion de Zapata	2 días	lun 1/06/26	mié 3/06/26
216		Instalación de Estructura	2 días	lun 1/06/26	mié 3/06/26
217		Instalación paneles	2 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26
218		Cableado	2 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26
219		Ducteria:	2 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26
220		Conectores:	2 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26
221		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26
222		Instalación de inversor hibrido	2 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26
223		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26
224		**Vivienda 7**	**4 días**	**vie 5/06/26**	**jue 11/06/26**
225		Localizacion y replanteo	2 días	vie 5/06/26	mar 9/06/26
226		Construcion de Zapata	2 días	vie 5/06/26	mar 9/06/26
227		Instalación de Estructura	2 días	vie 5/06/26	mar 9/06/26
228		Instalación paneles	2 días	mar 9/06/26	jue 11/06/26
229		Cableado	2 días	mar 9/06/26	jue 11/06/26
230		Ducteria:	2 días	mar 9/06/26	jue 11/06/26
231		Conectores:	2 días	mar 9/06/26	jue 11/06/26
232		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	mar 9/06/26	jue 11/06/26
233		Instalación de inversor hibrido	2 días	mar 9/06/26	jue 11/06/26
234		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	mar 9/06/26	jue 11/06/26
235		**Vivienda 8**	**4 días**	**vie 12/06/26**	**jue 18/06/26**
236		Localizacion y replanteo	2 días	vie 12/06/26	mar 16/06/26
237		Construcion de Zapata	2 días	vie 12/06/26	mar 16/06/26
238		Instalación de Estructura	2 días	vie 12/06/26	mar 16/06/26

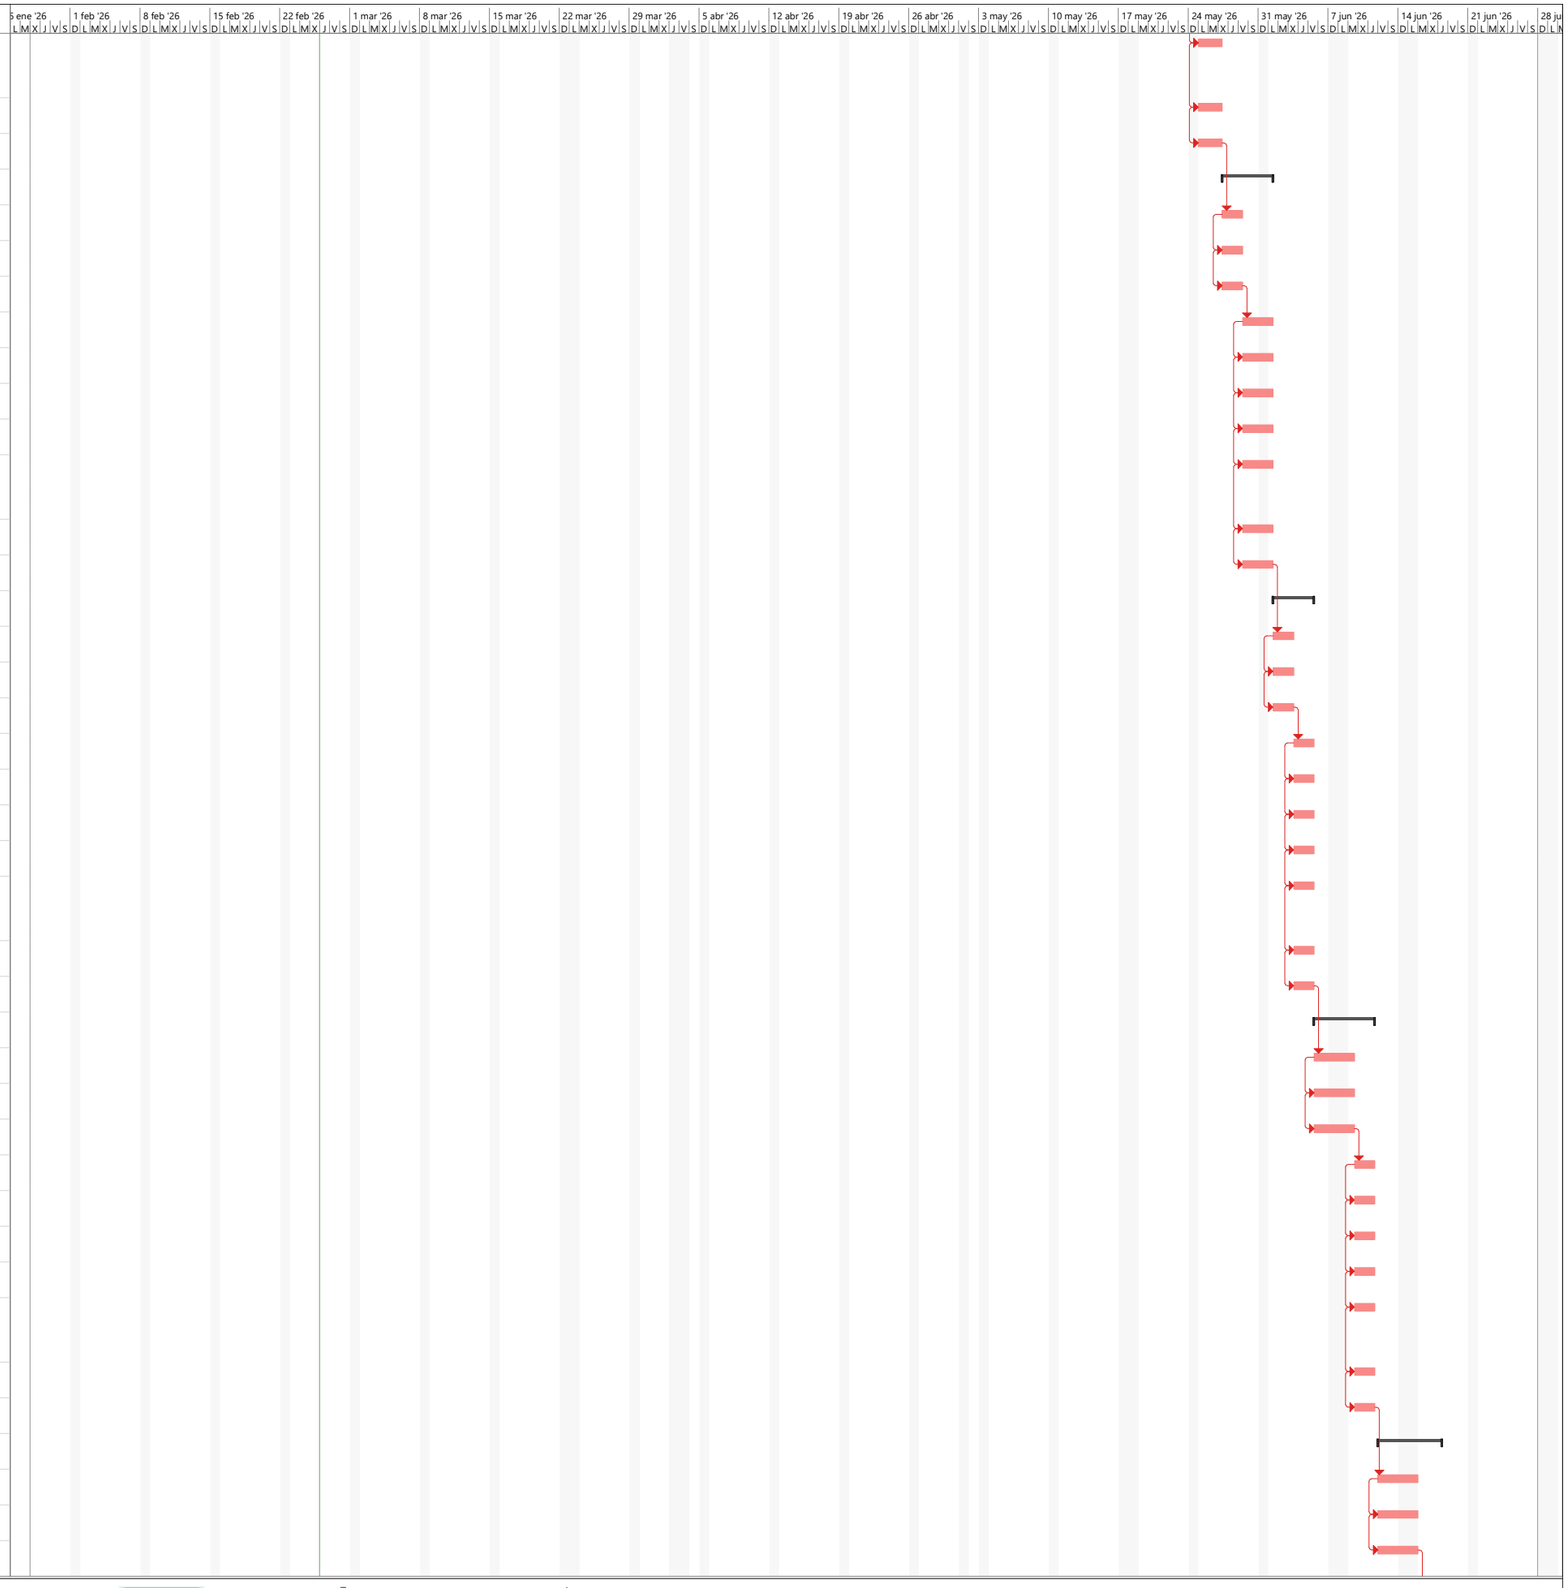

Proyecto: Contratar las instalaci
Fecha: jue 26/02/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
239		Instalación paneles	2 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26
240		Cableado	2 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26
241		Ducteria:	2 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26
242		Conectores:	2 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26
243		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26
244		Instalación de inversor hibrido	2 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26
245		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26
246		**Vivienda 9**	**4 días**	**jue 18/06/26**	**mar 23/06/26**
247		Localizacion y replanteo	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26
248		Construcion de Zapata	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26
249		Instalación de Estructura	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26
250		Instalación paneles	2 días	sáb 20/06/26	mar 23/06/26
251		Cableado	2 días	sáb 20/06/26	mar 23/06/26
252		Ducteria:	2 días	sáb 20/06/26	mar 23/06/26
253		Conectores:	2 días	sáb 20/06/26	mar 23/06/26
254		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	sáb 20/06/26	mar 23/06/26
255		Instalación de inversor hibrido	2 días	sáb 20/06/26	mar 23/06/26
256		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	sáb 20/06/26	mar 23/06/26
257		**Vivienda 10**	**4 días**	**mar 23/06/26**	**sáb 27/06/26**
258		Localizacion y replanteo	2 días	mar 23/06/26	jue 25/06/26
259		Construcion de Zapata	2 días	mar 23/06/26	jue 25/06/26
260		Instalación de Estructura	2 días	mar 23/06/26	jue 25/06/26
261		Instalación paneles	2 días	jue 25/06/26	sáb 27/06/26
262		Cableado	2 días	jue 25/06/26	sáb 27/06/26
263		Ducteria:	2 días	jue 25/06/26	sáb 27/06/26
264		Conectores:	2 días	jue 25/06/26	sáb 27/06/26
265		Instalación y conexión de la batería o acumulador de energía	2 días	jue 25/06/26	sáb 27/06/26
266		Instalación de inversor hibrido	2 días	jue 25/06/26	sáb 27/06/26
267		Instalaciones eléctricas Internas.	2 días	jue 25/06/26	sáb 27/06/26
268		Terminación y entrega final	8 días	jue 18/06/26	sáb 27/06/26



Proyecto: Contratar las instalaci
Fecha: jue 26/02/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
