
NUMERO DE SEMANA	% PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACOMULADO	VALOR PROGRAMADO ACOMULADO	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO ACOMULADO	VALOR EJECUTADO ACOMULADO	RETRASO
SEM 1	0,11%	$ 1.327.549,25	0,11%	$ 1.327.549,25	0,00%	$ -	0,00%	$ -	-0,11%
SEM 2	0,11%	$ 1.327.549,25	0,23%	$ 2.655.098,50	0,00%	$ -	0,00%	$ -	-0,23%
SEM 3	0,10%	$ 1.194.794,33	0,33%	$ 3.849.892,83	0,00%	$ -	0,00%	$ -	-0,33%
SEM 4	0,10%	$ 1.194.794,33	0,43%	$ 5.044.687,15	0,00%	$ -	0,00%	$ -	-0,43%
SEM 5	0,10%	$ 1.194.794,33	0,53%	$ 6.239.481,48	0,00%	$ -	0,00%	$ -	-0,53%
SEM 6	0,10%	$ 1.194.794,33	0,63%	$ 7.434.275,80		$ -		$ -	
SEM 7	0,10%	$ 1.194.794,33	0,73%	$ 8.629.070,13		$ -		$ -	
SEM 8	0,10%	$ 1.194.794,33	0,84%	$ 9.823.864,45		$ -		$ -	
SEM 9	0,10%	$ 1.194.794,33	0,94%	$ 11.018.658,78					
SEM 10	0,10%	$ 1.194.794,33	1,04%	$ 12.213.453,10					
SEM 11	3,00%	$ 35.198.226,42	4,04%	$ 47.411.679,52					
SEM 12	6,37%	$ 74.868.897,20	10,41%	$ 122.280.576,72					
SEM 13	7,82%	$ 91.870.613,24	18,23%	$ 214.151.189,96					
SEM 14	3,72%	$ 43.699.084,44	21,94%	$ 257.850.274,40					
SEM 15	11,44%	$ 134.374.903,36	33,38%	$ 392.225.177,76					
SEM 16	15,54%	$ 182.546.432,16	48,92%	$ 574.771.609,92					
SEM 17	11,68%	$ 137.208.522,70	60,59%	$ 711.980.132,63					
SEM 18	11,68%	$ 137.208.522,70	72,27%	$ 849.188.655,33					
SEM 19	8,78%	$ 103.205.090,61	81,05%	$ 952.393.745,94					
SEM 20	4,92%	$ 57.867.181,15	85,98%	$ 1.010.260.927,09					
SEM 21	5,89%	$ 69.201.658,51	91,87%	$ 1.079.462.585,60					
SEM 22	6,85%	$ 80.536.135,88	98,72%	$ 1.159.998.721,48					
TOTAL	98,72%	$ 1.159.998.721,48							

Rublo monto agotable	**$**	**15.000.000,00**
Valor contractual	**$**	**1.174.998.721,48**

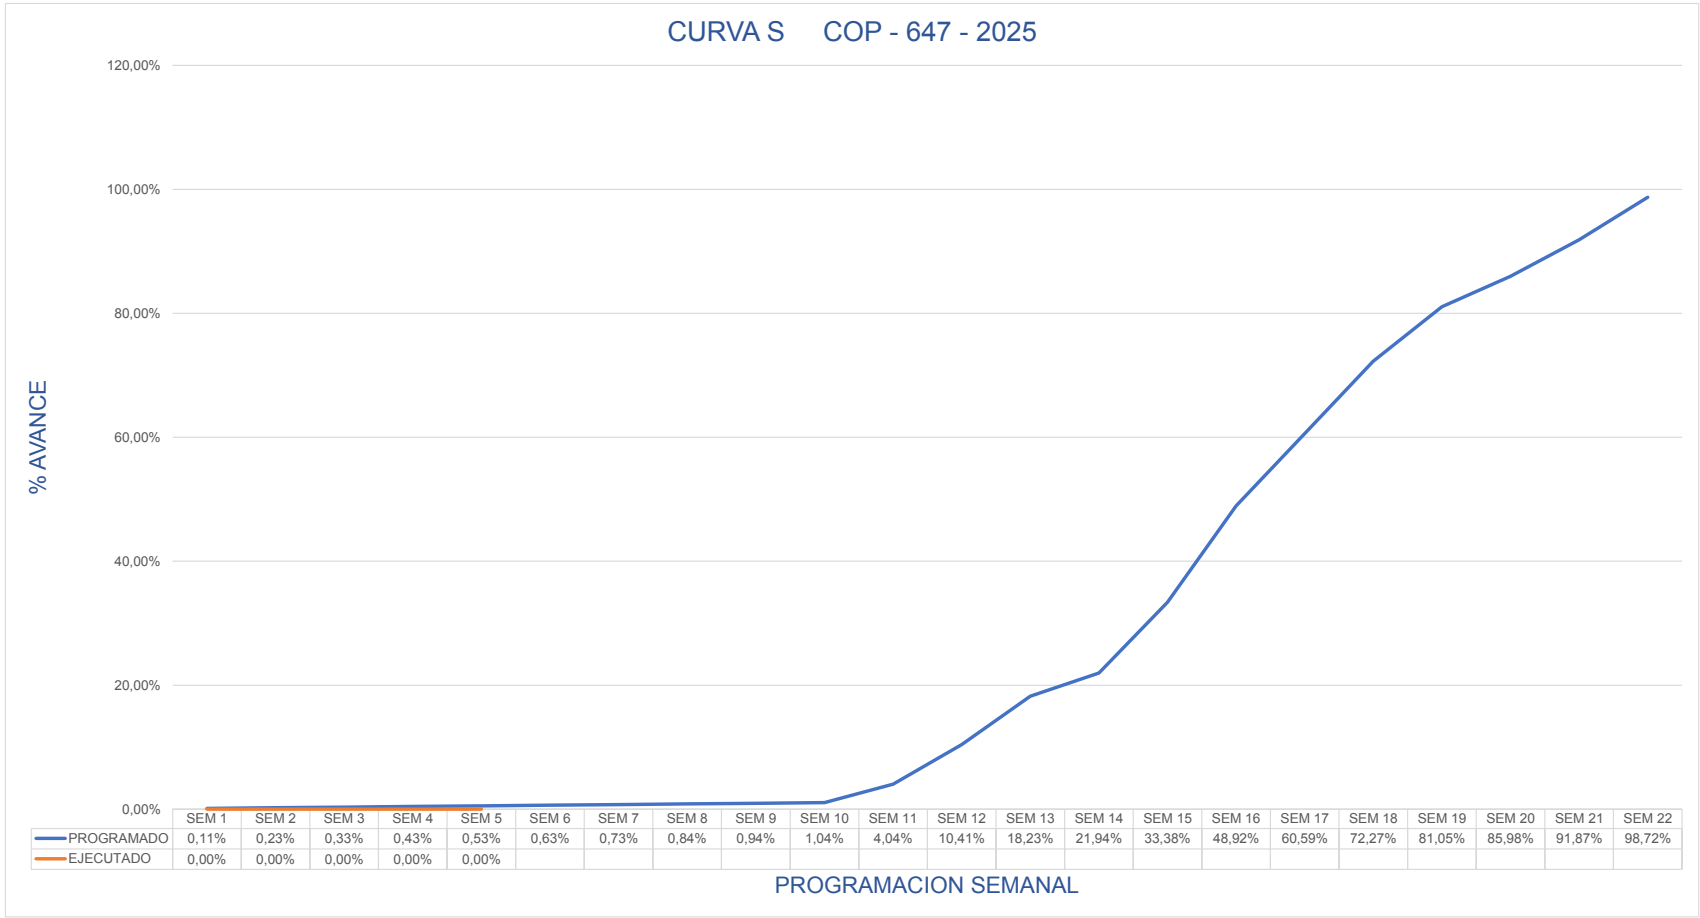

	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22
PROGRAMADO	0,11%	0,23%	0,33%	0,43%	0,53%	0,63%	0,73%	0,84%	0,94%	1,04%	4,04%	10,41%	18,23%	21,94%	33,38%	48,92%	60,59%	72,27%	81,05%	85,98%	91,87%	98,72%
EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																	

JAIRO ENRIQUE PEREZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
