REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DEL ACTA

Carrera 22 No 16-25 Barrio Santa Teresita
consorcioredvial2025@gmail.com
Arauca -Arauca

CAPITULO	1.00	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA			
ITEM	1.1	ACTIVIDAD	BASE GRANULAR		
CANTIDAD EJECUTADA	275.58	UNIDAD	M3	%EJECUTADO	83.89%


REGISTRO FOTOGRAFICO

Se inician las actividades de instalación de la base granular, las cuales comprenden el suministro, extendido, nivelación y compactación del material, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y bajo las condiciones establecidas en el contrato







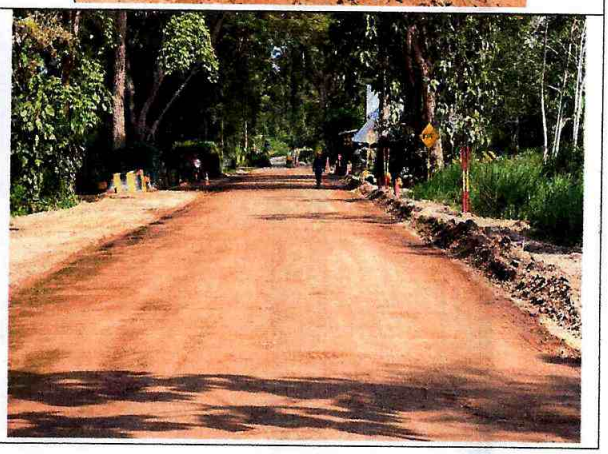



Actividades de aplicación de base granular

Carrera 22 No 16-25 Barrio Santa Teresita
habitatsas20@gmail.com
Arauca -Arauca


CAPITULO	1.00	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA			
ITEM	1.2	ACTIVIDAD	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON ESMULSION ASFALTICA		
CANTIDAD EJECUTADA	2985.70	UNIDAD	M2	%EJECUTADO	86.01&

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se inicia actividades de riego e imprimación asfáltica la cual consiste en la aplicación uniforme de una emulsión asfáltica (un ligante bituminoso de baja viscosidad y rotura lenta) sobre una superficie granular terminada (generalmente la base o subbase de la carretera).





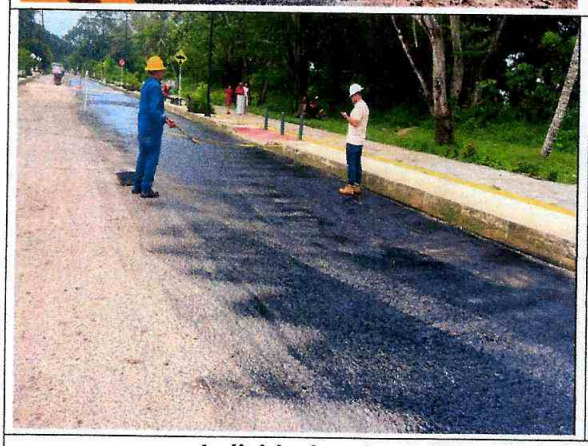



Actividades de aplicación imprimación con emulsión asfáltica


CAPITULO	1.00	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA			
ITEM	1.3	ACTIVIDAD	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19		
CANTIDAD EJECUTADA	238.86	UNIDAD	M3	%EJECUTADO	86.01%

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se realizó la actividad de aplicación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19, que incluyó el transporte, extendido y compactación del material asfáltico, garantizando los espesores requeridos, la temperatura adecuada de colocación y el grado de compactación previsto.





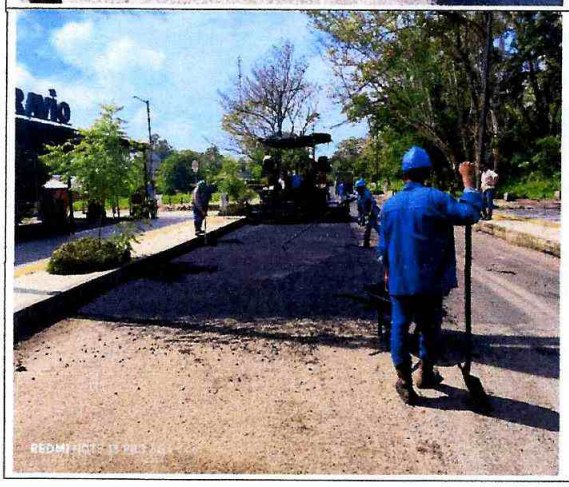





Actividades de aplicación de mezcla en caliente

CAPITULO	2.00	BACHEO			
ITEM	2.1	ACTIVIDAD	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON ESMULSION ASFALTICA (MANUAL)		
CANTIDAD EJECUTADA	2.690,38	UNIDAD	M2	%EJECUTADO	58.47%

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se inicia actividades de riego e imprimación asfáltica (manual) la cual consiste en la aplicación uniforme de una emulsión asfáltica (un ligante bituminoso de baja viscosidad y rotura lenta) sobre la superficie de asfalto existente)








Actividades de aplicación imprimación con emulsión asfáltica sobre asfatlo existente.

CAPITULO	2.00	BACHEO			
ITEM	2.2	ACTIVIDAD	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (MANUAL)		
CANTIDAD EJECUTADA	215.23	UNIDAD	M3	%EJECUTADO	58.47%

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se realizó la actividad de aplicación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (manual), que incluyó el transporte, extendido y compactación del material asfáltico, garantizando los espesores requeridos, la temperatura adecuada de colocación y el grado de compactación previsto.









CAPITULO	4.00	LIMPIEZA DE ZONAS LATERALES			
ITEM	4.1	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE BERMAS, ZONAS BOSCOSAS Y DESMONTE		
CANTIDAD EJECUTADA	50.35	UNIDAD	Ha	%EJECUTADO	100%

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se realizó la limpieza de rocería en el área de intervención, mediante el corte y retiro de maleza, pasto y vegetación existente, con el fin de dejar el terreno limpio y despejado, facilitar el acceso, mejorar la visibilidad








Actividades de limpieza de bermas, zonas boscosas y desmonte
