FECHA (D/M/A): 10-02-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: CERO.	CANTIDAD: 4180 TON ✓
ZONA	CUATRO.
COMUNA	LAURELES - ESTADIO.
BARRIO	LAURELES
FRENTE DE TRABAJO:	2

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00 AM	—
TERMINACIÓN: 4:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA DESPEJADO
	TARDE DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL SOBRE LA DG 74B PARA INTERVENIR BACHE ROCIADO DE UN FRACTURAMIENTO PUNTUAL EL CUAL SE INTERVIENE EN SU TOTALIDAD. SE REALIZA INTERVENCIÓN DE OTROS BACHES DISPERSOS CON SEÑALIZACIÓN PUNTUAL DELIMITANDO LA ZONA DE TRABAJO.

SE REALIZAN MITIGACIONES DISPERSAS EN TOTAL TRES LAS CUALES CONSTITUIAN UN RIESGO PARA LOS ACTORES VIALES.

EN EL PRESENTE DÍA SE REALIZA UN CAMBIO EN EL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA POR ROTACIÓN PROPIA DE ELLOS ASUMIENDO EL CARGO LA ING SORANY ANDREA CEBALLOS EN REEMPLAZO DE JAIME VERA.

SE CONTO CON VISITA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y TECNICO DE LA INTERVENTORIA Y DE SEGURIDAD Y TRABAJO DEL CONTRATISTA REALIZANDO UNA CHARLA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES.

5. VISITANTES

Jorge Morales

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andrea Ceballos	NOMBRE: John Rivera
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS GALEGO	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MANDURA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	N/A			
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELFIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	SANDRA MILENA USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 6500 I	X		
2	Compresor	INGER SOL RAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM FX	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SEP 329 CHE VROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 677	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5000819	166752	1A	D6 74b 33A-136	4,37	1,66	0,12	7,25	0,87	2,09
5000819	166752	1B	D6 74b 33A-136	2,00	2,50	0,12	5,00	0,60	1,44
5000836	166755	2	TV 33AA 74A-34	1,37	1,35	(0,115) 0,12	1,85	0,22	0,53
5000818	166754	3	D6 74B 33A-92	1,92	1,04	0,115	2,00	0,23	0,55
5001496	163865	4	CR 69C 32-58	0,80	0,50	0,09	0,40	0,04	0,09
4000949	166763	5	CL 30A 70-34	1,00	0,40	0,03	0,40	0,01	0,03
2000982	166764	6	CL 33 16B-55	1,10	0,90	0,03	0,99	0,03	0,07
TOTALES							17,89	2,00	4,80 ✓

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236269 ✓	SMV 677	4,80 ✓	4,80	140	25325 ✓	SMV 677	SENCILLA	1	PROCARGAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-02-2026

10. ESQUEMAS

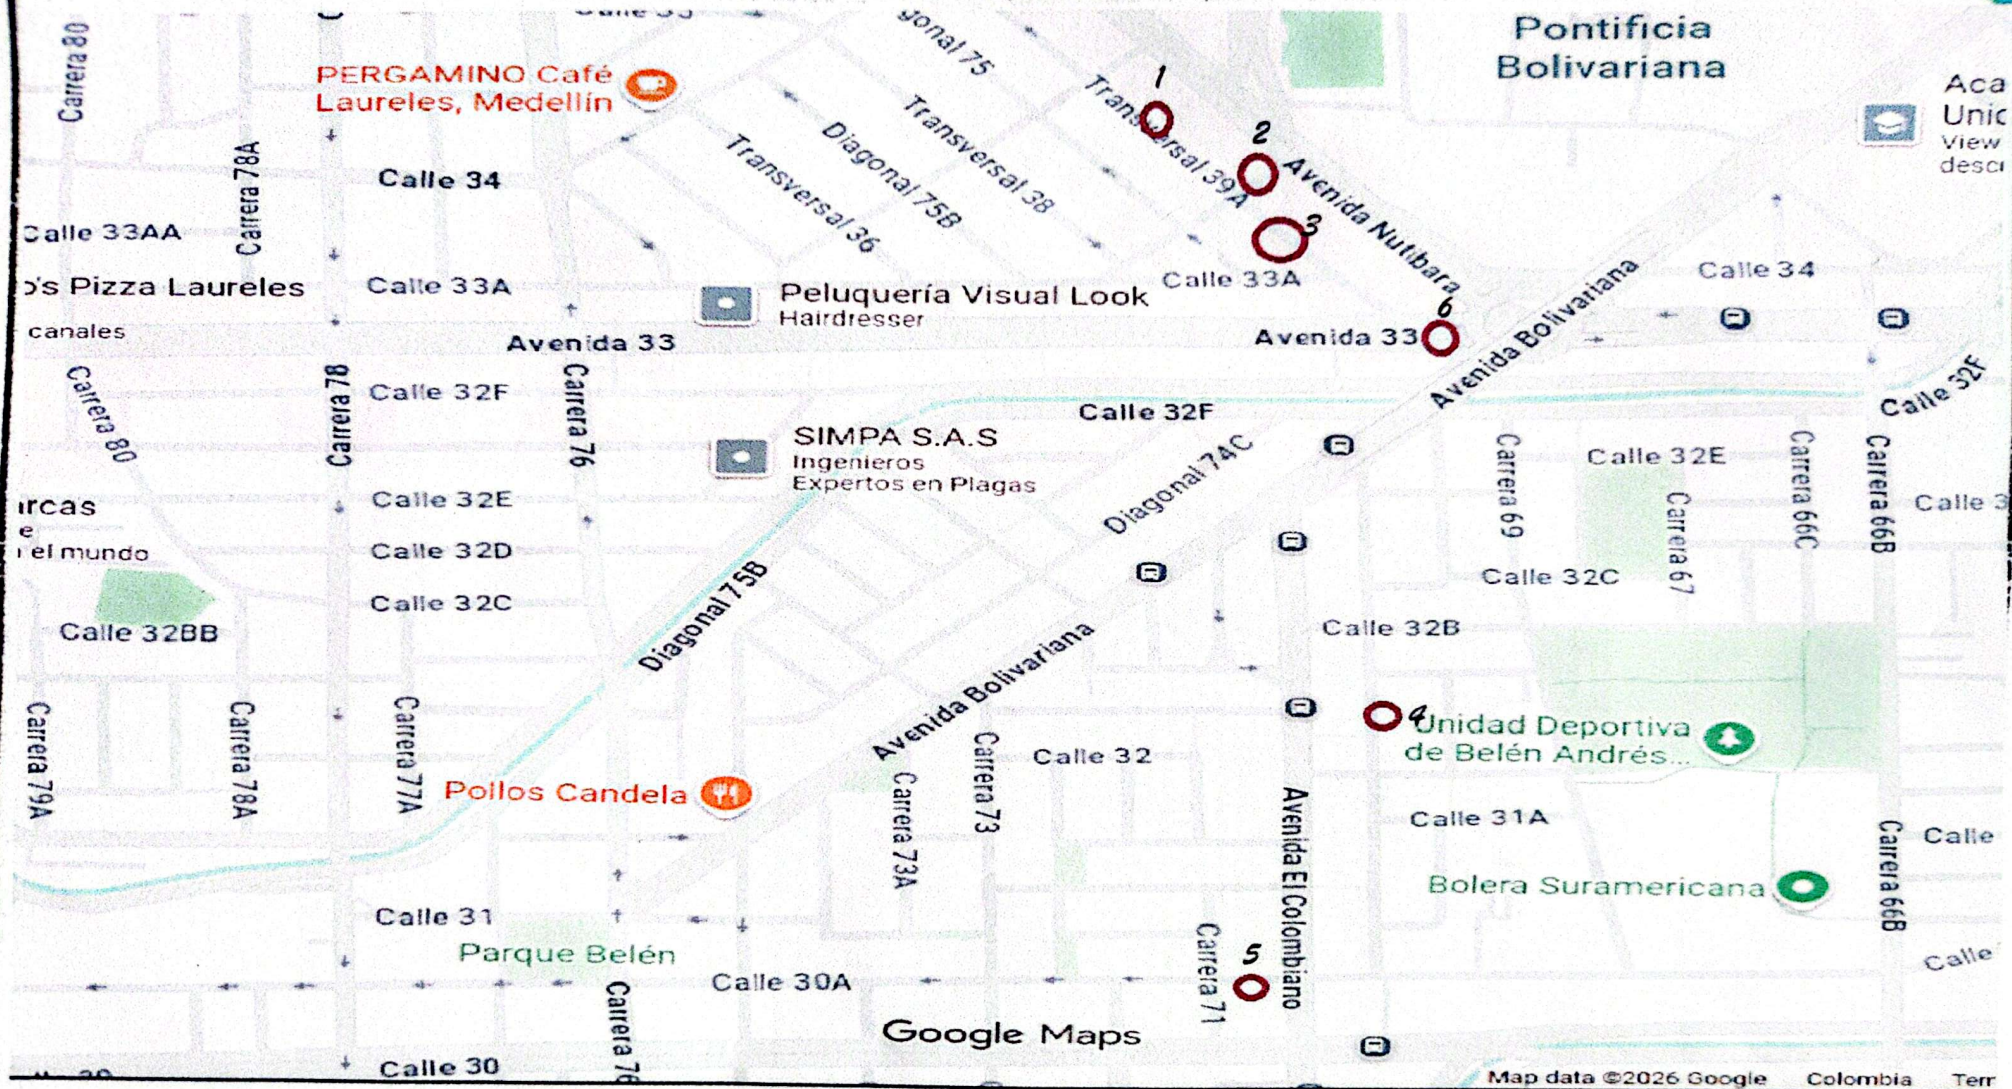

TIPO DE INTERVENCIÓN: MANTENIMIENTO PUNTUAL

FRENTE: DOS

RANGO: CRUCE

CANTIDAD: 4,80 TON ✓

BARRIO: LAURELES ROSALES

DIRECCIÓN: D674B 73A

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236269

FECHA: 10/02/2026

HORA: 9:39:19 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.21 Tonnes

PESO TARA: 7.41 Tonnes

PESO NETO: 4.80 Tonnes

PRODUCTO:11

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.80 Tonnes

Sorany C.

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25325

PROVEEDOR: Frente 2. Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

10-02-2026

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Sorany C.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
