FECHA (D/M/A): 11-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO | CANTIDAD: 4,81 TON

ZONA: CUATRO

COMUNA: LAURELES - ESTADIO

BARRIO: CARLOS E RESTREPO

FRENTE DE TRABAJO: 2.

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 1:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL DE CICLORUTA Y MEDIO CARRIL DE LA VIA VEHICULAR EN LA CL 51 ENTRE CR64A Y CR64B, SE INSTALA SEÑALIZACIÓN DE TIJERA Y UNA AUX DE TRANSITO PARA LOS CIERRES PARCIALES CUANDO ESTOS SE REQUIEREN.

SE ENCONTRO PAVIMENTO FRACTURADO CON BACHE, LOS CUALES SE INTERVIENEN JUNTO CON LA PATOLOGIA ASOCIADA, LA CUAL ES GENERADA POR UN ESPESOR INSUFICIENTE PARA EL ALTO FLUJO VEHICULAR QUE SE REGISTRA.

SE INTERVIENE BACHE EN LA AUTOPISTA CARRIL DERECHO CON PROFUNDIDAD DE 0,10M. LA CUAL CONSTITUYE UN RIESGO INMINENTE PARA LOS ACTORES VIALES.

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA TRANSCURREN CON NORMALIDAD

EL BACHE UNO SE AFECTA DOS LINEAS PINTADAS LAS CUALES DEBEN SER REPUESTO/ REALIZAR REPOSICIÓN

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Caballos Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Juan Rivera Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Eduardo Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO TUNDUÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMON URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MANDZA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAM COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELKIN RUIZ	X		
30	DUX VIAL	SANDRA MILENA USUGA			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQUARNA LP 6500 I	X		
2	Compresor	INTER SOL RAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM F-30			
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	JZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SHW 677	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-05-2022

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001298	166785	1	CL 51 64A-12	5	1,92	0,08	9,60	0,77	1,84
4001298	166784	2	CL 51 64A-18	2,04	1,08	0,13	2,20	0,29	0,69
4001298	166786	3A	CL 51 64A-34	5	1,17	0,12	5,85	0,70	1,68
4001298	166786	3B	CL 51 64A-34	0,80	1,95	0,12	1,56	0,19	0,45
2001097	166783	4	CR 64C 89-61	0,80	0,80	0,10	0,64	0,06	0,15
TOTALES							19,85	2,01	4,81 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236292 ✓	SMV677	4,81 ✓	4,81	141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25326 ✓	SMV 677	SENCILLA	1	PROCOPAN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-02-2026

10. ESQUEMAS

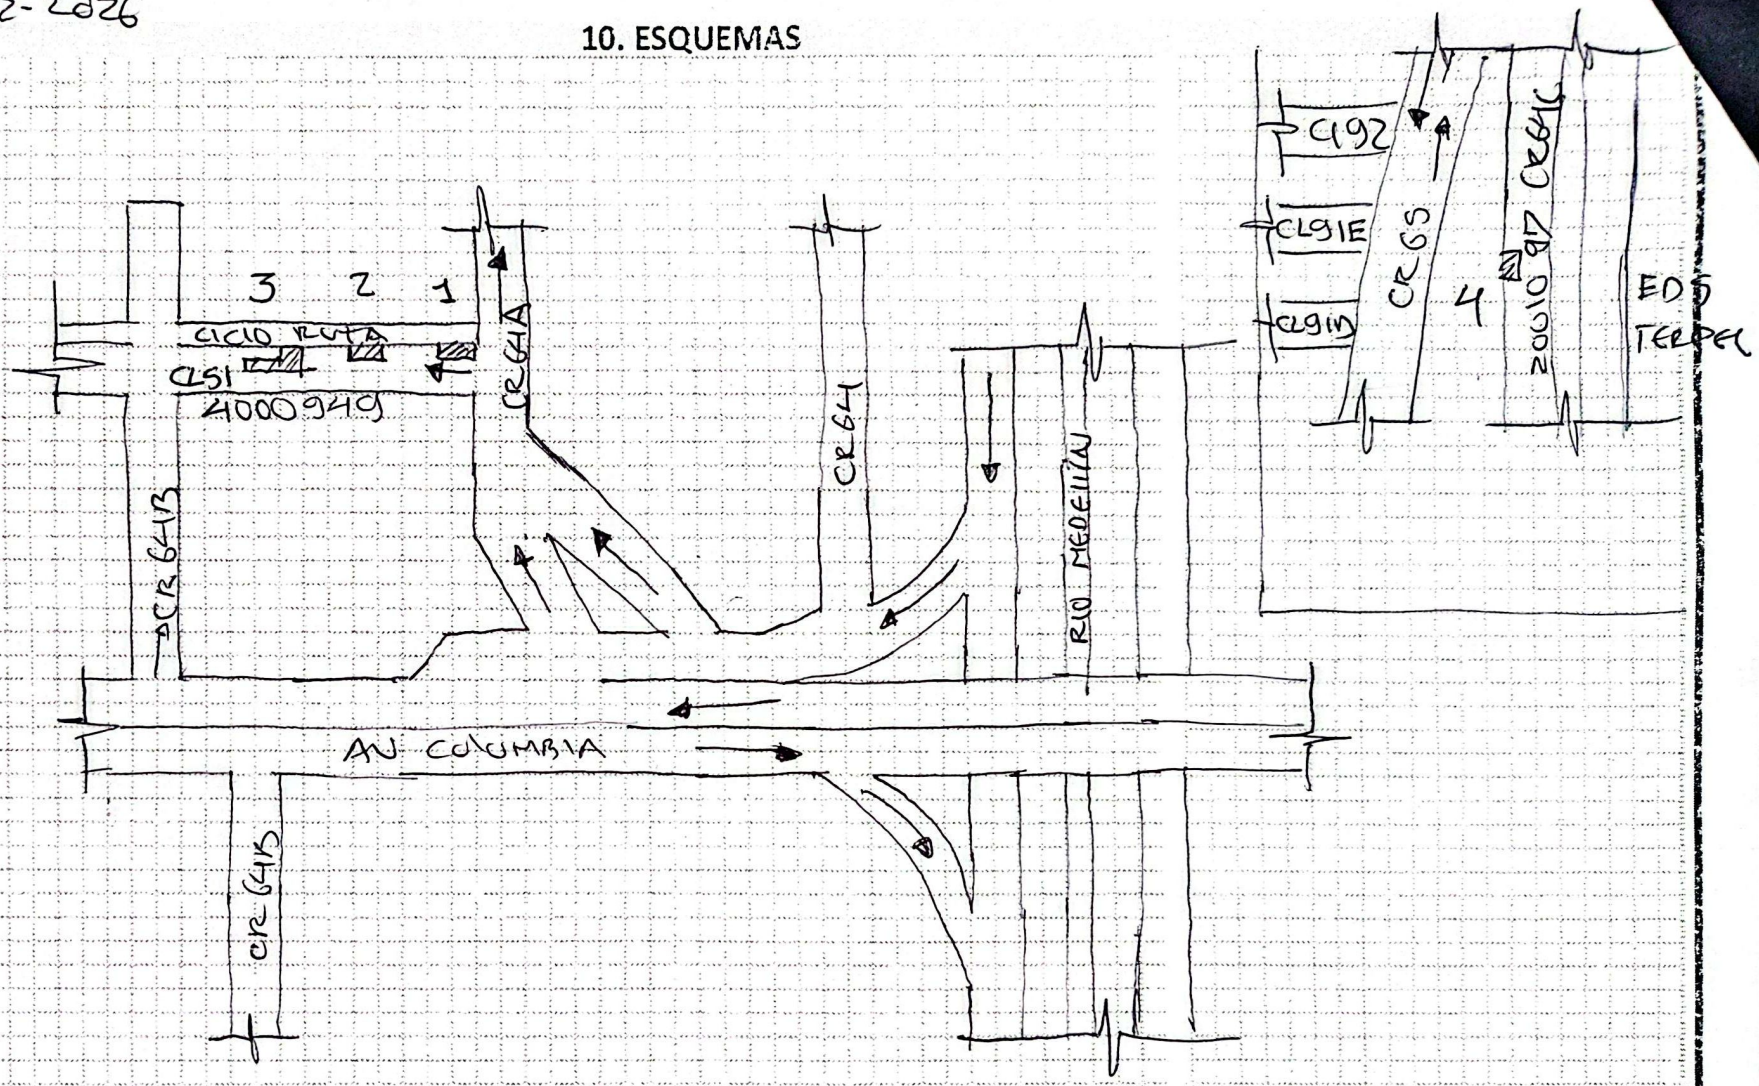

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,81 TON ✓
BARRIO	CARLOS E RESTREPO	DIRECCIÓN	CLSI ENTRE 64A Y CR 64B

Powered by CamScanner

ESTACION PAVIDS

PROCOPAL S.A.

Ingeniero Residente

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236292

FECHA: 11/02/2026

HORA: 7:46:25 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.18 Tonnes

PESO TARA: 7.37 Tonnes

PESO NETO: 4.81 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.81 Tonnes

Sorany C.

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25326

PROVEEDOR: FRENTE 2 - Vialpro

VALE POR UN VIAJE: Escombros

11-02-2026

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Sorany C.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
