FECHA (D/M/A): 12-02-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: CERO	CANTIDAD: 4180 TON
ZONA	CUATRO.
COMUNA	LAURELES - ESTADIO
BARRIO	NARANJA
FRENTE DE TRABAJO:	2.

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00 AM	—
TERMINACIÓN: 2:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA SITIO DE ACOPIO SOBRE LA BAHIA DE MACRO Y ITECFENTER POR LA AV SAN JUAN DEJANDO HABILITADO UNA SECCIÓN DEL CARRIL DERECHO PARA EL TRAFICO VEHICULAR. SE INTERVIENE BACHE CON TRES FIGURAS YA QUE ERA LA FORMA MAS EFICIENTE PARA ATENDER BACHE JUNTO CON SU PATOLOGIA ENCONTRANDOSE PLACA DE CONCRETO DEBAJO DEL PAVIMENTO, SIN FALLAS APARENTE.

SE INTERVIENAN BACHES SOBRE LA CL 45 GENERADOS POR EL ALTO FRACTURAMIENTO DEL PAVIMENTO Y QUE CONSTITUYE UN RIESGO PARA LOS ACTORES VIALES. DICHO SEGMENTO VIAL REQUIERE UNA INTERVENCIÓN MAYOR DEBIDO A SU ESTADO DE ALTO DETERIORO Y ADICIONAL LA VÍA ES FRECUENTADO POR VEHICULOS DE CARGA Y ZONA DE PARQUEO DE LOS MISMO QUEDANDO CORTO EL ESPESOR DE DISEÑO DEL PAVIMENTO PARA TAL USO.

LA MEZCLA ASFALTICA LLEGO CON UNA CONSISTENCIA DIFERENTE A LOS DIAS ANTERIORES CON UNA MANEJABILIDAD INFERIOR Y SE PRESUME QUE CONTENIA MAYOR CONTENIDO DE ASFALTO.

QUEDA PENDIENTE POR SEGUNDA CAPA LOS BACHES CUATRO Y CINCO.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Ceballos Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	John Fredy RIVERA Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Andres Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓ
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELFIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	SANDRA MILENA USUGA		X	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 65001	X		
2	Compresor	INGERSOLLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECCM F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 697	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-02-2026

3. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	To (kg)
2000923	157752	1A	CL 44 65-172	1,78	3,50	0,12	6,23	0,75	1,89
2000923	157752	1B	CL 44 65-172	2,90	1,50	0,12	4,35	0,52	1,25
5018805	166572	2	CL 45 65-317	2,22	0,87	0,115	1,93	0,22	0,53
5018805	162843	3	CL 45 65-269	1,05	0,90	0,115	0,95	0,11	0,26
5018805	166573	4	CL 45 65-251	1,95	1,87	0,06	3,65	0,22	0,53
5018805	166574	5	CL 45 65-234	1,75	1,75	0,06	3,06	0,18	0,44
TOTALES							20,17	2,00	4,80 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236341 ✓	SMV697	4,80 ✓	4,80	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25329 ✓	SMV697	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-02-2026

10. ESQUEMAS

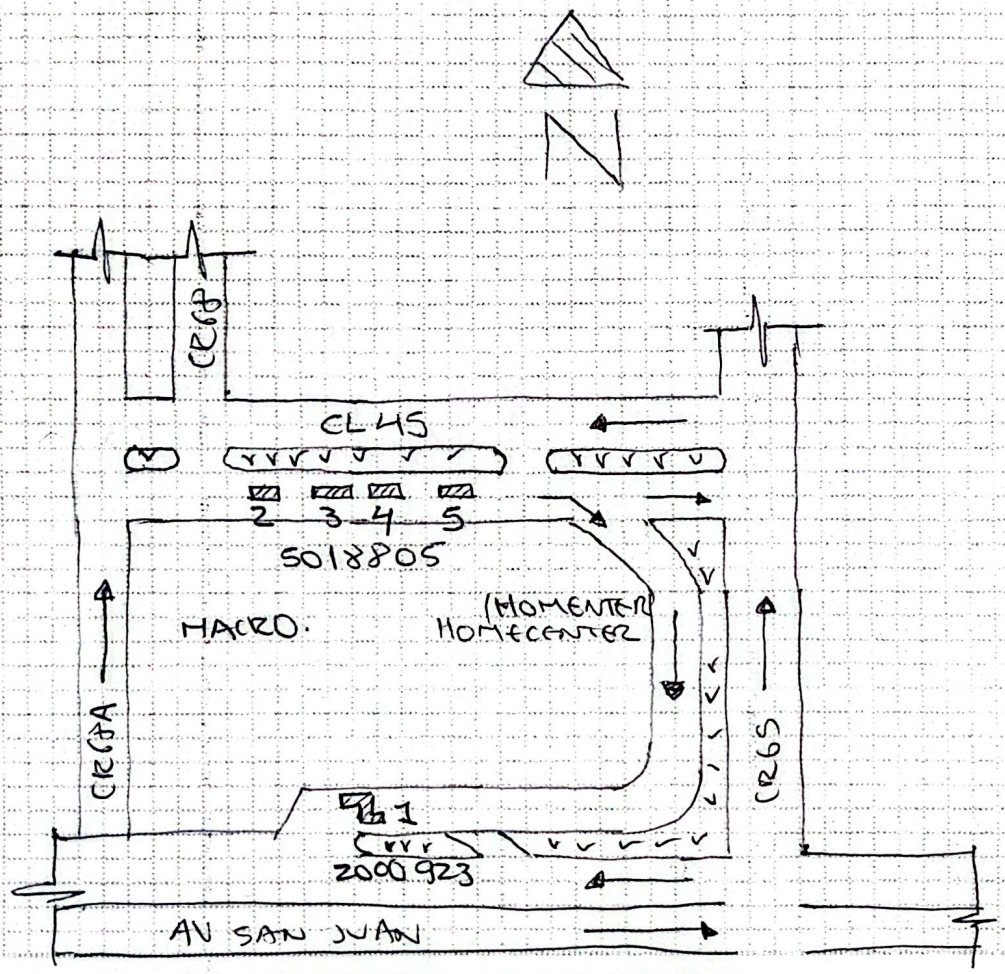

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,80 TON ✓
BARRIO	NARANJAL	DIRECCIÓN	CL 45 ENTRE CR65 Y CR68. CL 44 65-172

Powered by CamScanner

ESTIN POUDS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

TIQUETE DE BASCULA: 236341

FECHA: 12/02/2026
HORA: 9:26:36 AM
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ
PLACA: SMV677

OBRA: 2307
SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED
CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.27 Tonnes
PESO TARA: 7.47 Tonnes
PESO NETO: 4.80 Tonnes

Sorany C.

PRODUCTO:112
MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19
TEMPERATURA: 140°C
VIAJE NUMERO: 1
TOTAL DESPACHADA: 4.80 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 25327**

PROVEEDOR: Fuente 2. Vial Inv
VALE POR UN VIAJE: Escombros
12-02-26
PLACA No: SMV677 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Procopal
PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Sorany C.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
