FECHA (D/M/A): 13-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: CERO	CANTIDAD: 4,82 TON
ZONA: CUATRO	FRENTE DE TRABAJO: 2
COMUNA: LAURELES - ESTADIO	
BARRIO: LAURELES	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA.

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	—
TERMINACIÓN: 1:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL EN LA TV 40B ENTRE AV NUTIBARA Y TV 41 APROVECHANDO QUE ES VÍA DE UN SOLO SENTIDO PARA INTERVENIR LOS BACHES 1 Y 2 UBICADOS EN DICHO SEGMENTO. SE ATIENDEN BACHES UNO Y DOS ABARCANDOLO JUNTO A SU PATOLOGIA PARA EVITAR UN DETERIORO PREMATURO DEL PERIMETRO DE LOS BACHES.

SE REALIZA ATENCIÓN DE SEGUNDA CAPA EN LOS BACHES DE LA JORNADA ANTERIOR LOCALIZADOS EN LA CL 45 ENTRE CR 65 Y CR 68; DANDO POR FINALIZADO LA ATENCIÓN DE BACHES EN DICHO SEGMENTO.

EN EL SECTOR SE IDENTIFICAN MAS BACHES LOS CUALES SE ATENDERÁ EN LAS PROXIMAS JORNADAS.

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA TRANSCURREN CON ENTERA NORMALIDAD.

5. VISITANTES

Laura Vargas Rojas - SST.

6. FIRMAS

NOMBRE: Sonany Andrea Ceballos Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Duvan Andres Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	NIA			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	NIA			
6	Ayudante	SIMÓN ORAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
11	Ayudante	NIA			
12	Ayudante	NIA			
13	Ayudante	NIA			
14	Ayudante	NIA			
15	Ayudante	NIA			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO	X		
18	Operador fresadora	NIA			
19	Operador finisher	NIA			
20	Operador Retroexcavadora	NIA			
21	Operador Vibrocompactador	NIA			
22	Operador Compactador llantas	NIA			
23	Operador Cortador Asfalto	NIA			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	NIA			
26	Operador Barredora	NIA			
27	Coductor Carrotanque	NIA			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELFIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	SANDRA MILENA USUGA		X	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 6500I	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND.	X		
3	Fresadora	NIA			
4	Finisher	NIA			
5	Retroexcavadora	NIA			
6	Vibrocompactador	NIA			
7	Compactador llantas	NIA			
8	Cortador Asfalto	NIA			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM FV30	X		
11	Soplador	NIA			
12	Mini cargador	NIA			
13	Barredora	NIA			
14	Carrotanque	NIA			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SNV 697 INTERNACIONAL	X		

Powered by CamScanner

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5004242	166838	1A	TV 40B 74A-39	2,12	2,57	0,14	5,45	0,76	1,83
5004242	166838	1B	TV 40B 74A-39	2,98	1,29	0,14	3,84	0,54	1,29
5004242	166868	2	TV 40B 74A-95	1,92	1,76	0,11	3,38	0,37	0,89
5018805	166573	3	CL 45 65-251	1,95	1,87	0,05	3,65	0,18	0,44
5018805	166574	4	CL 45 65-234	1,75	1,75	0,05	3,06	0,15	0,37
TOTALES							19,38	2,01	4,82 ✓

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236372 ✓	SMV 677	4,82 ✓	4,82	140	25328 ✓	SMV 677	SENCILLA	1	PROCOPAL ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-02-2026

10. ESQUEMAS

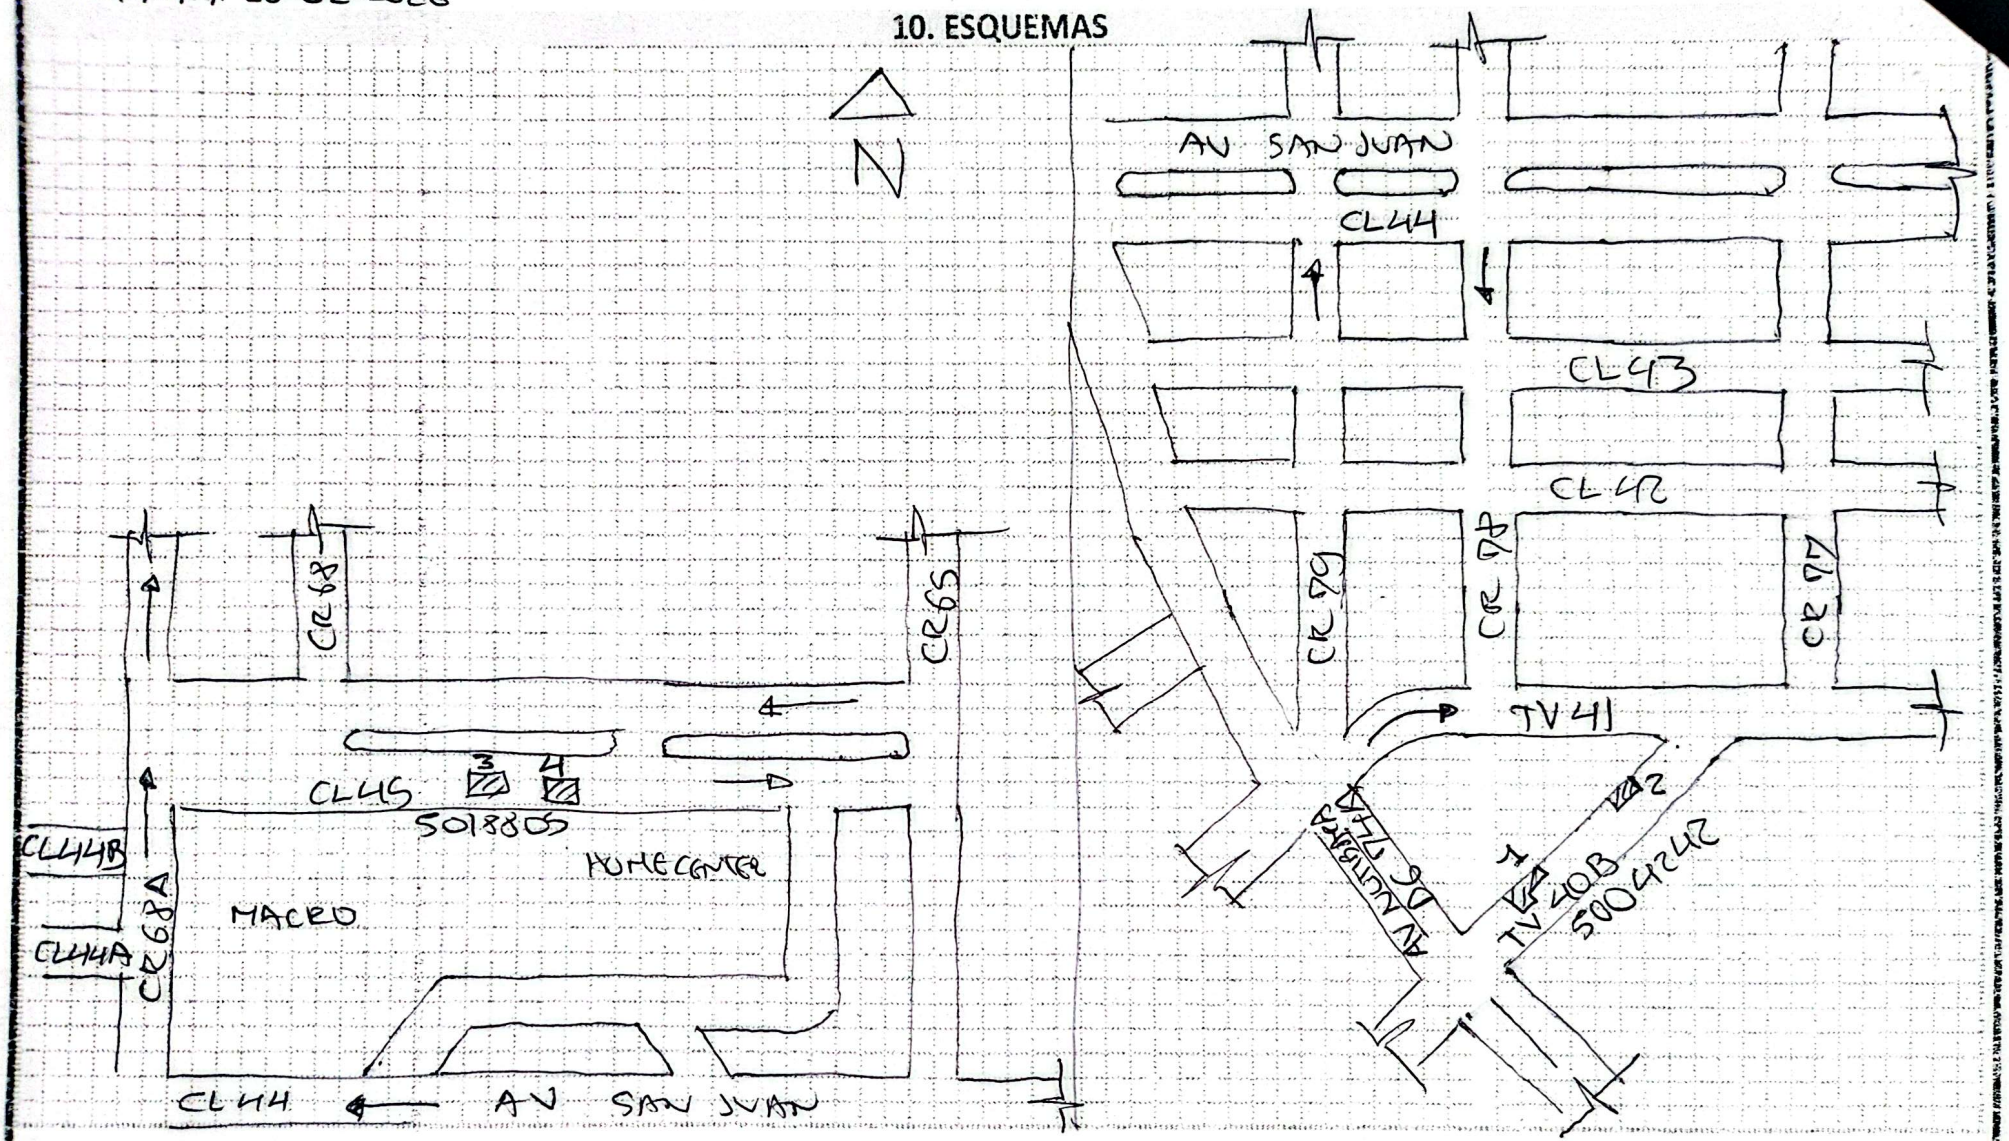

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,82 TON
BARRIO	LAURELES / NARANJAL	DIRECCIÓN	TV 40B CRA Y TV 41

Powered by CamScanner

ESTRUCTURAS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL

Ingeniería

TIQUETE DE BASCULA: 236372

FECHA: 13/02/2026

HORA: 8:22:06 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.25 Tonnes

PESO TARA: 7.43 Tonnes

PESO NETO: 4.82 Tonnes

PRODUCTO: 11

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 16.83 Tonnes

Soriny C.

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 25328**

PROVEEDOR: Frente 2. Vialmec

VALE POR UN VIAJE: Escombros

13-02-2026

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Soriny C.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
