FECHA (D/M/A): 16-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIANTO PUNTUAL
RANGO: CERO.	CANTIDAD: 4 (P 3 TON
ZONA	TRES
COMUNA	BUENOS AIRES
BARRIO	LA MILAGROSA
FRENTE DE TRABAJO:	2

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 9:00 AM	—
TERMINACIÓN: 2:30 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: NUBLADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL EN LA CL 41 ENTRE CR30 Y CR29A CON INSTALIZACIÓN DE SEÑALIZACIÓN; PERMITIENDO EL FLUJO VEHICULAR POR LA ZONA.

SE IDENTIFICA QUE EL SECTOR PRESENTA MULTIPLES BACHES LOS CUALES DEBEN SER ATENDIDOS YA QUE ESTOS SON PRONUNCIADOS Y CONSTITUYE UN RIESGO PARA LOS ACTORES VIALES

EL BACHE UNO SE INTERVIENE JUNTO A LA PATOLOGIA Y LOS EMPOZAMIENTOS DE AGUA PERMITIENDO EL FLUJO DE AGUA DE ESCORRENTIA. LOS BACHES DOS Y TRES SE INTERVIENEN JUNTO A LOS FALLOS EN BLOQUE MAS PRONUNCIADOS DISMINUYENDO NOTABLEMENTE LA FILTRACIÓN DE AGUA POR LAS MISMAS.

SE CONTO CON VISITA DE LA PARTE AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EL CUAL SE ATIENDEN LOS REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN DE MALLA EN SUMIDEROS Y LA PROTECCIÓN DEL ESCOMBRO CON PLASTICO.

LAS ACTIVIDADES TRANSCURREN CON ENTERA NORMALIDAD

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andreea Ceballos Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	JOHN RIVERA Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSURIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA			
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA			
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTUNEZ	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSURIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN CORREDOR	X		
29	Conductor Volqueta(s)	RAFA RUIZ	X		
30					

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 65501	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOH F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZP 329 CHE VROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 677 INTERNACIONAL			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
50079977	166510	1	CL 41 - CR 30	2,45	3,53	0,14	8,65	1,21	2,91
50079978	166906	2	CL 41 29-31	2,40	1,55	0,14	3,72	0,52	1,25
40023477	166905	3A	CL 42 29-68	1,54	1,86	0,055	2,86	0,16	0,38
40023477	166905	3B	CL 42 29-68	0,93	1,07	0,055	0,99	0,05	0,13
20012982	166907	4	CR 46 CL 39	3,00	0,76	0,03	2,28	0,07	0,16
TOTALES							18,46	2,01	4,83 ✓


MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236418 ✓	SMV 697	4,83 ✓	4,83	142	25329 ✓	SMV 697	SENCILLA	1	PROCOPAL ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-02-2026

10. ESQUEMAS

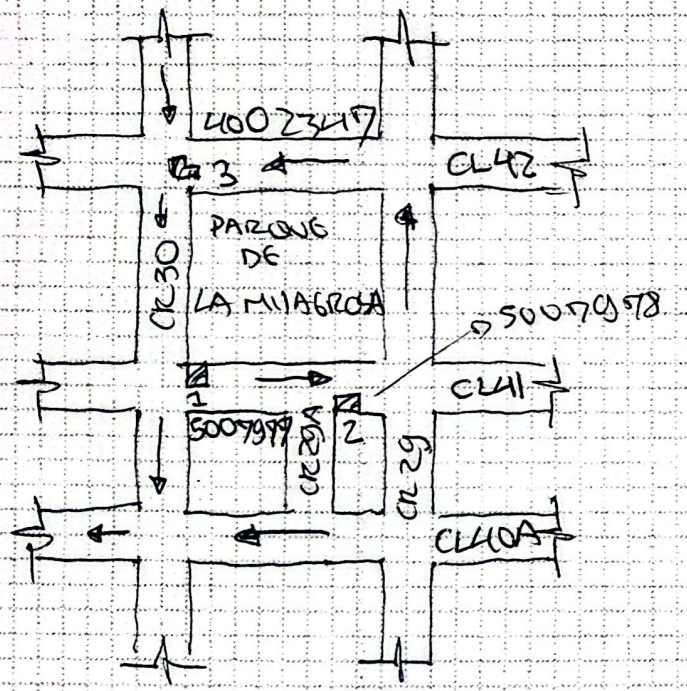

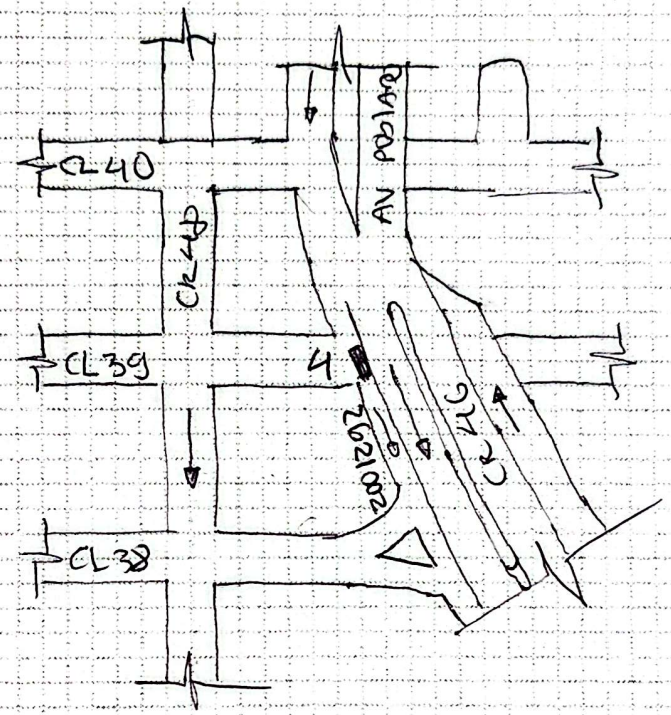

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,183 TON ✓
BARRIO	LA MILAGROSA	DIRECCIÓN	CL41 ENTRE CR29 Y CR30 CL42 ENTRE CR29 Y CR30

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingenieros

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236418

FECHA: 16/02/2026

HORA: 9:19:58 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 230

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.24 Tonnes

PESO TARA: 7.41 Tonnes

PESO NETO: 4.83 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.83 Tonnes

Sorany C.

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25329

PROVEEDOR: Frente 2. Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

16-02-26

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Sorany C.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
