FECHA (D/M/A): 17-02-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: UNO	CANTIDAD: 12,04 TON
ZONA: TRES	FRENTE DE TRABAJO: 2
COMUNA: BUENOS AIRES	
BARRIO: LA MILAGROSA	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00AM	—
TERMINACIÓN: 5:00PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE TOTAL DEL SEGMENTO 50079975 CON DIRECCIÓN CL41 ENTRE CR31 Y CR32 DESVIANDO LOS VEHICULOS POR LA CL40, EL CUAL FUE PREVIAMENTE SOCIALIZADO A LAS RUTAS DE BUSES CONSTRA CATALUÑA Y PLOTA MILAGROSA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DE TRANSITO.

EN EL BACHE UNO SE ENCUENTRAN MULTIPLES BACHES, DESNIVELES, PIEL DE COCODRILO Y UNA SOBRE CADA SOBRE CAMARA DE INSPECCIÓN CON TAPA LOSA, OBLIGANDO A UNA INTERVENCIÓN AJUSTANDO AL NIVEL DE LA TAPA LOSA Y DE PASO INTERVENIR LOS BACHES Y PATOLOGIAS EXISTENTE YA QUE ESTABAN UBICADOS EN EL GIRO DE LAS RUTAS DE BUSES CONSTITUYENDO UN RIESGO ALTO PARA TODOS LOS ACTORES VIALES. ADICIONAL EN ESTE BACHE SE REQUIRIO REALIZAR NIVELACIONES PARA UN ADECUADO EMPALME Y ALINEACION DE LA VÍA.

SE INTERVIENE BACHE UNO JUNTO MAS PATOLOGIAS AFECTANDO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE FRENTE AL FRENTE.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andrea Ceballos C. Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	John Fredy Rivera Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-02-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIA AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN CONTRERAS	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ESNEIDER GARCIA	X		
30	AUX VIAL	DIANA GALUS CAICEDO	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 650A	X		
2	Compresor	INGERSOLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL			
10	Placa vibratoria	FECOM F30			
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SFP 329 CHEVROLET			
16	Volqueta(s)	SNM 196			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-02-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5007976	160408	7A	CL 41 30-58	0,71	0,80	0,12	0,57	0,07	0,16
5007976	160408	1B	CL 41 30-58	3,51	2,91	0,12	10,21	1,23	2,94
5007975	166927	2A	CL 41 31-73	6,60	5,51	0,095	36,37	3,45	8,29
5007975	166927	2B	CL 41 31-73	2,01	1,41	0,095	2,83	0,27	0,65
TOTALES							49,98	5,02	12,04 ✓

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236467 ✓	ZNM 196	12,04 ✓	12,04	142	25330 ✓	ZNM 196	SENCILLA	1	ARCOPEN ✓

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-02-2026

10. ESQUEMAS

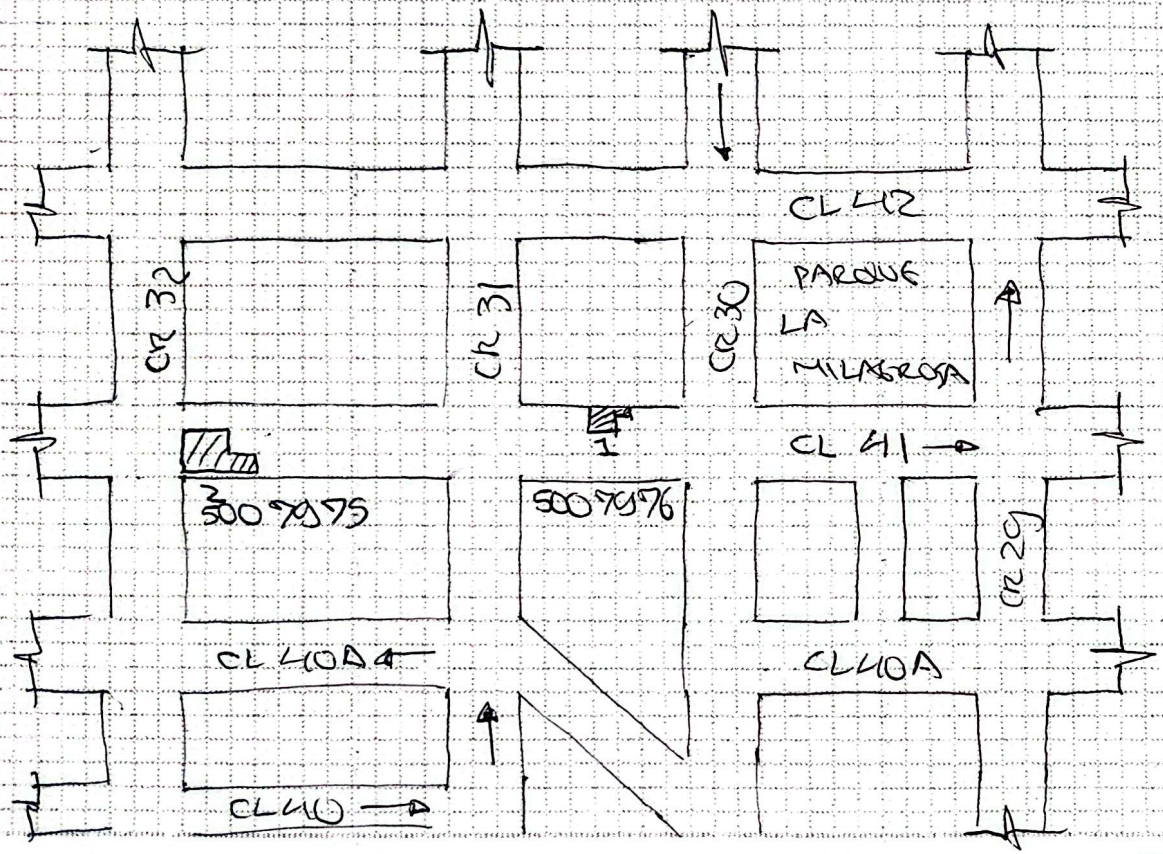

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	UNO	CANTIDAD:	12,04 TON ✓
BARRIO	LA MILAGROSA	DIRECCIÓN	CL 41 ENTRE CR 30 Y CR 32

Powered by CamScanner

E.ST Y P.S.A.

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236467

FECHA: 17/02/2026

HORA: 9:55:21 AM

CONDUCTOR: LUIS GARCIA

PLACA: ZNM196

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 19.96 Tonnes

PESO TARA: 7.92 Tonnes

PESO NETO: 12.04 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 51.37 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 25330**

PROVEEDOR: Frente 2 Vidrio

VALE POR UN VIAJE: Escombros

17-02-2026

PLACA No: ZNM196 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

PROCOPAL S.A.
18 FEB 2026
DESPACHOS-BASCULA

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
